

# PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione M2 - Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica

## Infografiche Progetti ATERSIR

Aggiornamento 30 settembre 2025



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è lo strumento italiano per accedere al Next Generation EU (NGEU), il Fondo, conosciuto come “Recovery Fund” o “Recovery Plan”, che è stato approvato dal Consiglio Europeo a sostegno degli Stati membri colpiti dalla pandemia causata dal virus COVID-19 (Regolamento UE 2021/241).

**ATERSIR, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti, è Soggetto Beneficiario del contributo PNRR e Soggetto Attuatore di primo livello per alcuni progetti relativi alla Missione 2 del PNRR, presentati nelle seguenti infografiche.**

La seconda Missione del PNRR, denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, si occupa dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento, al fine di migliorare la sostenibilità del sistema economico e assicurare una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero.

I dati elaborati nelle seguenti infografiche sono tratti da ReGiS.

ReGiS è il sistema gestionale unico che racchiude, in un unico strumento, le funzionalità che servono a gestire e monitorare le diverse fasi in cui si articolano le Misure ed i Progetti del PNRR. Al sistema informativo ReGiS hanno accesso le Unità di Missione istituite presso le Amministrazioni centrali titolari delle Misure, gli uffici e le strutture coinvolte nell'attuazione del Piano e i Soggetti Attuatori.

# Impianto trattamento e recupero sabbie derivanti da pulizia di fognature e spazzamento stradale (MTE11C\_00000870)

Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - AIMAG S.P.A.  
CUP - G92F21000060006  
Subambito di riferimento - ATO 4 - MO



Missione M2  
Componente C1.1  
Linea di investimento 1.1

## STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

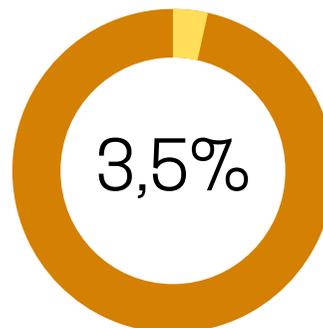

Importo complessivo del progetto

7.500.000 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

268.506 €



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

7.500.000 €

Contributo erogato

750.000 €

# Realizzazione nuovo impianto di essiccamento fanghi da 6.000 ton/anno (MTE11C\_00000848)

Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - CADF S.P.A.  
CUP - J51B22000620005  
Subambito di riferimento - ATO 6 - FE



Missione M2  
Componente C1.1  
Linea di investimento 1.1

## STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

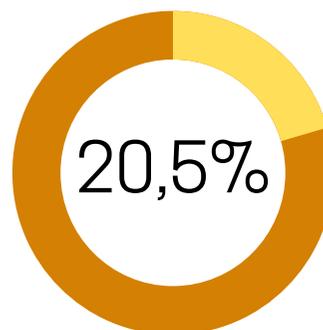

Importo complessivo del progetto

8.798.600 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

1.808.378 €



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

5.290.936 €

Contributo erogato

529.093 €

# Realizzazione impianto Power to Methane e upgrading biogas presso area Depuratore IDAR di Bologna (MTE11C\_00000809)

Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - HERA S.P.A.  
CUP - H32E22000630004  
Subambito di riferimento - ATO 5 - BO




Missione M2  
Componente C1.1  
Linea di investimento 1.1

## STATO DEL PROGETTO

- AGGIUDICAZIONE 
- STIPULA CONTRATTO 
- ESECUZIONE LAVORI 
- COLLAUDO 
- INTERVENTO CONCLUSO 

Percentuale di avanzamento economico finanziario

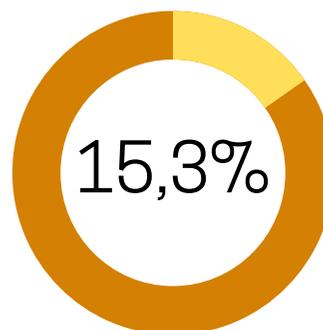

Importo complessivo del progetto

11.891.624 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

1.823.240 €



Totale contributo PNRR

8.091.270 €

Contributo erogato

809.127 €

# Realizzazione impianto di inertizzazione fanghi con produzione di gessi di defecazione presso l'area impiantistica di Mancasale - RE (MTE11C\_00000913)

Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - IREN ACQUA RE  
CUP - H82E22000470001  
Subambito di riferimento - ATO 3 - RE




Missione M2  
Componente C1.1  
Linea di investimento 1.1

## STATO DEL PROGETTO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

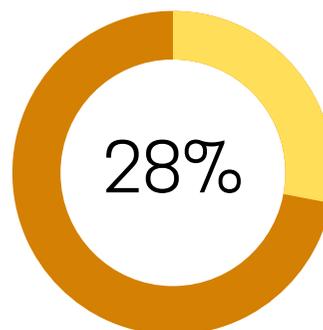

Importo complessivo del progetto

9.320.000 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

2.611.036 €



Totale contributo PNRR

5.744.680 €

Contributo erogato

574.468 €

# Fornitura ed installazione centrifuga fanghi depuratore Mancasale, Reggio Emilia (MTE11C\_00000921)

Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - IREN ACQUA RE  
CUP - H87J21000360001  
Subambito di riferimento - ATO 3 - RE



Missione M2  
Componente C1.1  
Linea di investimento 1.1

## STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento  
economico finanziario

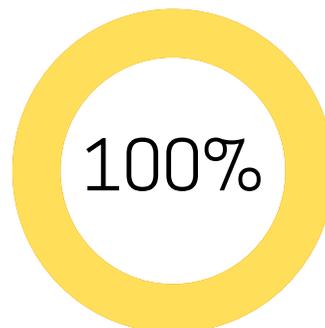

**Importo complessivo del progetto**

461.172 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

461.172 €



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



**Totale contributo PNRR**

461.172 €

Contributo erogato

392.446 €

# Risanamento scarichi 7-33 in località Alfero (DEP440000136)

Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - HERA S.P.A.  
CUP - H82E22000130001  
Subambito di riferimento - ATO 8 - FC




Missione M2  
Componente C4  
Linea di investimento 4.4

## STATO DEL PROGETTO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

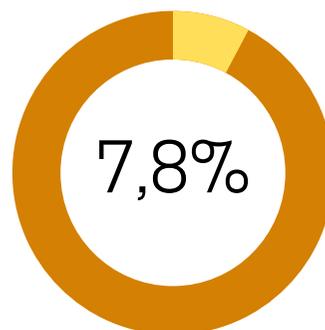

Importo complessivo del progetto

7.300.000 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

570.906 €



Totale contributo PNRR

4.568.162 €

Contributo erogato

1.370.448 €

# Lavori di efficientamento del depuratore di Fidenza (PR) (DEP440000134)

Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - EMILIAMBIENTE  
CUP - J59J21003970005  
Subambito di riferimento - ATO 2 - PR




Missione M2  
Componente C4  
Linea di investimento 4.4

## STATO DEL PROGETTO

- AGGIUDICAZIONE
- STIPULA CONTRATTO
- ESECUZIONE LAVORI
- COLLAUDO
- INTERVENTO CONCLUSO

Percentuale di avanzamento  
economico finanziario

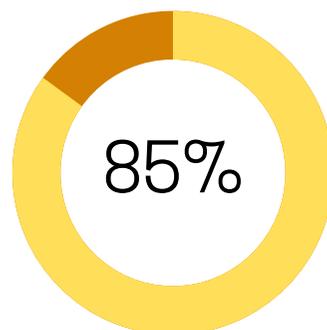

**Importo complessivo del progetto**

**1.097.379 €**

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

**932.883 €**



**Totale contributo PNRR**

**1.097.379 €**

Contributo erogato

**599.579 €**

# Efficientamento tecnologico di 5 impianti di depurazione (DEP440000139)

Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - SORGEAQUA S.R.L.  
CUP - I71D21000090001  
Subambito di riferimento - ATO 4 - MO e ATO 5 - BO



Missione M2  
Componente C4  
Linea di investimento 4.4

## STATO DEL PROGETTO

- AGGIUDICAZIONE 
- STIPULA CONTRATTO 
- ESECUZIONE LAVORI 
- COLLAUDO 
- INTERVENTO CONCLUSO 

Percentuale di avanzamento  
economico finanziario



**Importo complessivo del progetto**

1.512.056 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

1.512.056 €



**Totale contributo PNRR**

1.500.000 €

Contributo erogato

1.329.141 €

# Potenziamento depuratore Ravenna 1° stralcio (DEP440000135)

Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - HERA S.P.A.  
CUP - H62E22000240001  
Subambito di riferimento - ATO 7 - RA



Missione M2  
Componente C4  
Linea di investimento 4.4

## STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento  
economico finanziario

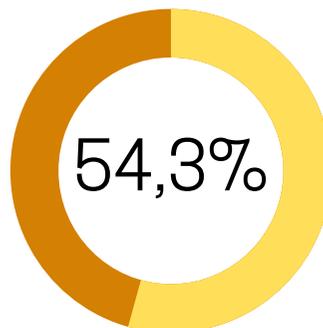

Importo complessivo del progetto

8.504.746 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

4.622.385 €



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

7.383.868 €

Contributo erogato

2.215.160 €

# Efficientamento insufflazione ossidazione depuratore Carpi (DEP440000130)

Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - AIMAG S.P.A.  
CUP - G91D22000030006  
Subambito di riferimento - ATO 4 - MO



Missione M2  
Componente C4  
Linea di investimento 4.4

## STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

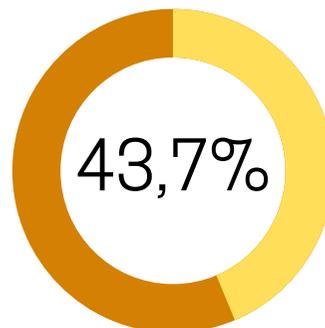

Importo complessivo del progetto

3.200.000 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

1.400.709 €



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

3.200.000 €

Contributo erogato

960.000 €

# Depuratore di Comacchio – Realizzazione quinta linea da 40.000 Abitanti Equivalenti (DEP440000131)

Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - CADF S.P.A.  
CUP - J56H19000040005  
Subambito di riferimento - ATO 6 - FE



Missione M2  
Componente C4  
Linea di investimento 4.4

## STATO DEL PROGETTO

AGGIUDICAZIONE


STIPULA CONTRATTO

ESECUZIONE LAVORI

COLLAUDO

INTERVENTO CONCLUSO

Percentuale di avanzamento economico finanziario

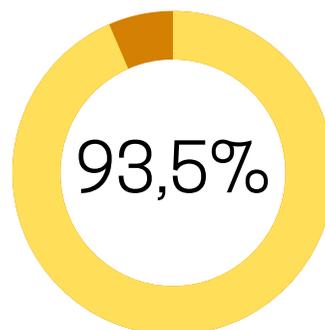

Importo complessivo del progetto

5.300.000 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

4.960.738 €

Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**ATERSIR**  
Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti

Totale contributo PNRR

5.300.000 €

Contributo erogato

1.590.000 €

# Realizzazione collettore fognario in Via Canalino, Cogruzzo (DEP440000138)

Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - IREN ACQUA RE  
CUP - H85H18000280005  
Subambito di riferimento - ATO 3 - RE




Missione M2  
Componente C4  
Linea di investimento 4.4

## STATO DEL PROGETTO

- AGGIUDICAZIONE 
- STIPULA CONTRATTO 
- ESECUZIONE LAVORI 
- COLLAUDO 
- INTERVENTO CONCLUSO 

Percentuale di avanzamento  
economico finanziario

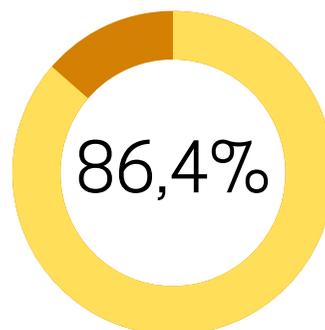

Importo complessivo del progetto

1.220.000 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

1.055.211 €

 Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

 MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**ATERSIR**  
Agenzia  
territoriale  
dell'Emilia-Romagna  
per i SERVIZI  
Idrici e Rifiuti

Totale contributo PNRR

1.220.000 €

Contributo erogato

1.073.535 €

# Adeguamento parametri azoto depuratore di Fiorenzuola d'Arda (DEP440000137)

Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - IREN ACQUA PC  
CUP - H15H19000080005  
Subambito di riferimento - ATO 1 - PC



Missione M2  
Componente C4  
Linea di investimento 4.4

## STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento  
economico finanziario

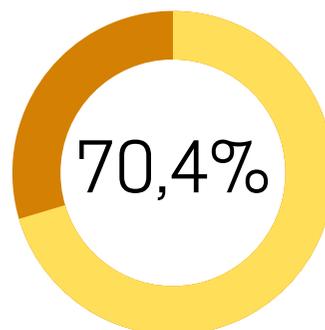

Importo complessivo del progetto

4.900.000 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

3.453.285 €



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

4.900.000 €

Contributo erogato

3.674.823 €

# Ottimizzazione dello schema fognario-depurativo di Ravarino (DEP440000132)

Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - SORGEAQUA S.R.L.  
CUP - I75H21000240001  
Subambito di riferimento - ATO 4 - MO




Missione M2  
Componente C4  
Linea di investimento 4.4

## STATO DEL PROGETTO

- AGGIUDICAZIONE 
- STIPULA CONTRATTO 
- ESECUZIONE LAVORI 
- COLLAUDO 
- INTERVENTO CONCLUSO 

Percentuale di avanzamento  
economico finanziario

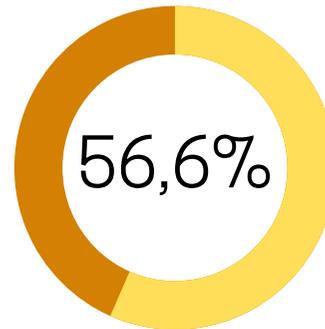

Importo complessivo del progetto

3.500.000 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

1.982.818 €

 Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

 MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**ATERSIR**  
Agenzia  
territoriale  
dell'Emilia-Romagna  
per i **SERVIZI**  
**Idrici e Rifiuti**

Totale contributo PNRR

3.500.000 €

Contributo erogato

1.050.000 €

# Collettamento reflui di Varano capoluogo al dep. di Rubbiano (DEP440000133)

Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - MONTAGNA 2000 S.P.A.  
CUP - Jg1D22000040002  
Subambito di riferimento - ATO 2 - PR



Missione M2  
Componente C4  
Linea di investimento 4.4

## STATO DEL PROGETTO

AGGIUDICAZIONE


STIPULA CONTRATTO

ESECUZIONE LAVORI

COLLAUDO

INTERVENTO CONCLUSO

Percentuale di avanzamento  
economico finanziario

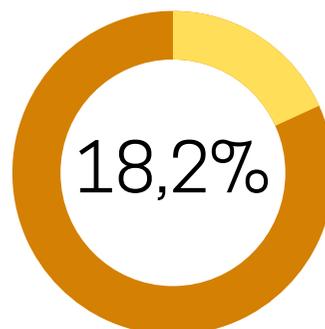

Importo complessivo del progetto

1.160.000 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

211.510 €



Totale contributo PNRR

1.160.000 €

Contributo erogato

348.000 €

# Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione, il monitoraggio delle reti e la riabilitazione dei tratti di rete (M2C4-I4.2\_219)




Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - IRETI S.P.A.  
CUP - H22E22000030002  
Subambito di riferimento - ATO 2 - PR

Missione M2  
Componente C4  
Linea di investimento 4.2

## STATO DEL PROGETTO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

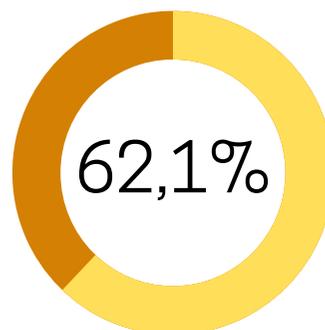

Importo complessivo del progetto

22.277.538 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

12.116.203 €



Totale contributo PNRR

10.687.000 €

Contributo erogato

8.315.008 €

# Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO5 (M2C4-I4.2\_105)

Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - HERA S.P.A.  
CUP - H78B22000020006  
Subambito di riferimento - ATO 5 - BO



Missione M2  
Componente C4  
Linea di investimento 4.2

## STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento  
economico finanziario

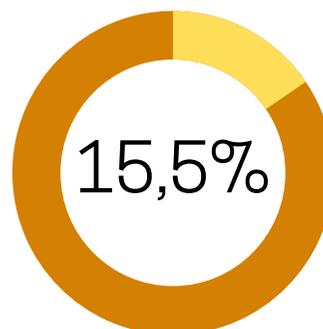

Importo complessivo del progetto

15.020.700 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

2.342.209 €



Totale contributo PNRR

13.520.700 €

Contributo erogato

4.056.210 €

# Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO4 (M2C4-I4.2\_071)

Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - HERA S.P.A.  
CUP - Hg8B22000010006  
Subambito di riferimento - ATO 4 - MO



Missione M2  
Componente C4  
Linea di investimento 4.2

## STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

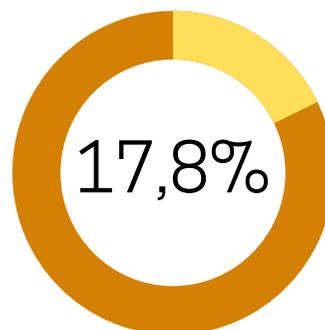

Importo complessivo del progetto

8.205.750 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

1.467.460 €



Totale contributo PNRR

6.245.000 €

Contributo erogato

1.873.500 €

# Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO7 (M2C4-I4.2\_106)

Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - HERA S.P.A.  
CUP - Hg8B22000020006  
Subambito di riferimento - ATO 7 - RA



Missione M2  
Componente C4  
Linea di investimento 4.2

## STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

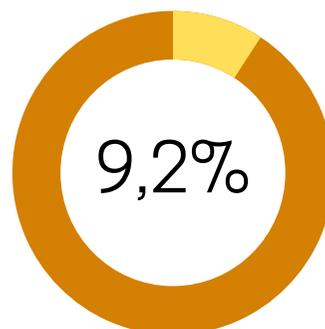

Importo complessivo del progetto

12.450.500 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

1.149.429 €



Totale contributo PNRR

9.260.500 €

Contributo erogato

2.778.150 €

# Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO8 (M2C4-I4.2\_100)

Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - HERA S.P.A.  
CUP - H18B22000050006  
Subambito di riferimento - ATO 8 - FC



Missione M2  
Componente C4  
Linea di investimento 4.2

## STATO DEL PROGETTO

AGGIUDICAZIONE


STIPULA CONTRATTO

ESECUZIONE LAVORI

COLLAUDO

INTERVENTO CONCLUSO

Percentuale di avanzamento  
economico finanziario

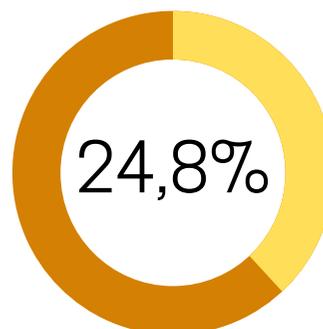

Importo complessivo del progetto

13.582.750 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

3.371.996 €

Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

**ATERSIR**  
Agenzia  
territoriale  
dell'Emilia-Romagna  
per i SERVIZI  
Idrici e Rifiuti

Totale contributo PNRR

10.002.750 €

Contributo erogato

3.000.825 €

# Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATOg (M2C4-I4.2\_098)

Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - HERA S.P.A.  
CUP - H28B22000020006  
Subambito di riferimento - ATO g - RN



Missione M2  
Componente C4  
Linea di investimento 4.2

## STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento  
economico finanziario

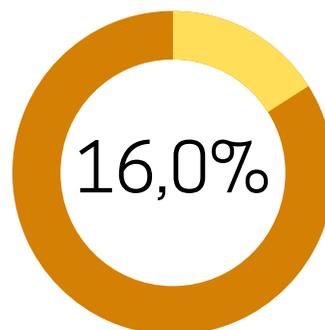

Importo complessivo del progetto

8.732.000 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

1.402.112 €



Totale contributo PNRR

6.832.000 €

Contributo erogato

2.049.600 €

# Interventi straordinari sulla rete idrica di distribuzione funzionali al completamento della distrettualizzazione, al monitoraggio e alla riduzione delle perdite (M2C4-I4.2\_094)



Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - AIMAG S.p.A.  
CUP - G82E22000030002  
Subambito di riferimento - ATO 4 - MO

Missione M2  
Componente C4  
Linea di investimento 4.2

## STATO DEL PROGETTO

AGGIUDICAZIONE


STIPULA CONTRATTO

ESECUZIONE LAVORI

COLLAUDO

INTERVENTO CONCLUSO

Percentuale di avanzamento economico finanziario

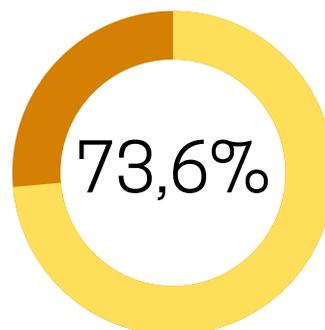

Importo complessivo del progetto

38.852.000 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

28.632.789 €



Totale contributo PNRR

22.246.000 €

Contributo erogato

14.578.403 €

# Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO6 (M2C4-I4.2\_095)

Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - HERA S.P.A.  
CUP - H28B22000010006  
Subambito di riferimento - ATO 6 - FE



Missione M2  
Componente C4  
Linea di investimento 4.2

## STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

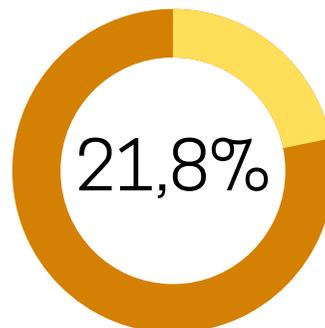

Importo complessivo del progetto

6.165.500 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

2.159.919 €



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



Totale contributo PNRR

5.365.500 €

Contributo erogato

1.609.650 €

# Digitalizzazione, modellazione idraulica, monitoraggio e analisi della rete idrica di distribuzione sull'intero ambito territoriale gestito da SORGEAQUA S.R.L. (M2C4-I4.2\_222)



Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - SORGEAQUA S.R.L.  
CUP - I77J22000020006  
Subambito di riferimento - ATO 4 - MO e ATO 5 - BO

Missione M2  
Componente C4  
Linea di investimento 4.2

## STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

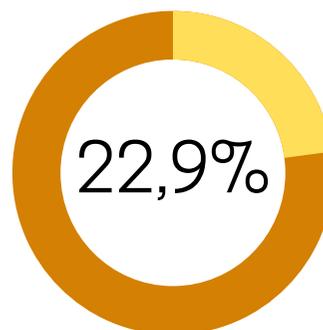

Importo complessivo del progetto

8.968.838 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

2.057.843 €



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



Totale contributo PNRR

6.008.838 €

Contributo erogato

1.802.651 €

# Efficientamento del sistema idrico gestito da MONTAGNA 2000 mediante l'installazione di sistemi di misura e la distrettualizzazione delle reti idriche (M2C4-I4.2\_220)




Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - MONTAGNA 2000 S.P.A.  
CUP - J61D22000080002  
Subambito di riferimento - ATO 2 - PR

Missione M2  
Componente C4  
Linea di investimento 4.2

## STATO DEL PROGETTO

- AGGIUDICAZIONE
- STIPULA CONTRATTO
- ESECUZIONE LAVORI
- COLLAUDO
- INTERVENTO CONCLUSO

Percentuale di avanzamento economico finanziario

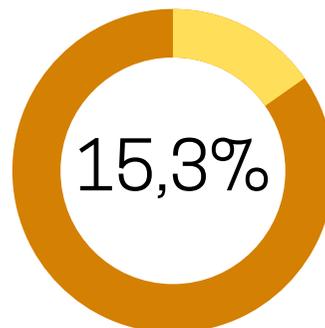

Importo complessivo del progetto

1.175.798 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

180.701 €



Totale contributo PNRR

1.055.798 €

Contributo erogato

316.739 €

# Distrettualizzazione e riduzione delle perdite delle reti di distribuzione acqua per Toano capoluogo (M2C4-I4.2\_107)

Soggetto beneficiario - ATERSIR  
Soggetto attuatore - AZIENDA SPECIALE TOANO  
CUP - E78B22000490005  
Subambito di riferimento - ATO 3 - RE



Missione M2  
Componente C4  
Linea di investimento 4.2

## STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

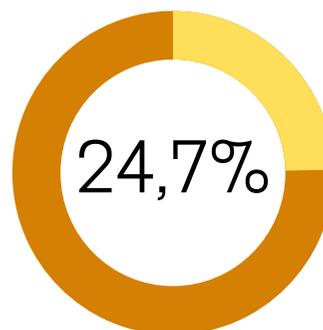

Importo complessivo del progetto

782.000 €

Avanzamento finanziario al 30/09/2025

176.287 €



Totale contributo PNRR

692.000 €

Contributo erogato

207.600 €
