

PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione M2 - Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica

Infografiche Progetti ATERSIR



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è lo strumento italiano per accedere al Next Generation EU (NGEU), il Fondo, conosciuto come “Recovery Fund” o “Recovery Plan”, che è stato approvato dal Consiglio Europeo a sostegno degli Stati membri colpiti dalla pandemia causata dal virus COVID-19 (Regolamento UE 2021/241).

ATERSIR, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti, è Soggetto Beneficiario del contributo PNRR e Soggetto Attuatore di primo livello per alcuni progetti relativi alla Missione 2 del PNRR, presentati nelle seguenti infografiche.

La seconda Missione del PNRR, denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, si occupa dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento, al fine di migliorare la sostenibilità del sistema economico e assicurare una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero.

I dati elaborati nelle seguenti infografiche sono tratti da ReGiS.

ReGiS è il sistema gestionale unico che racchiude, in un unico strumento, le funzionalità che servono a gestire e monitorare le diverse fasi in cui si articolano le Misure ed i Progetti del PNRR. Al sistema informativo ReGiS hanno accesso le Unità di Missione istituite presso le Amministrazioni centrali titolari delle Misure, gli uffici e le strutture coinvolte nell'attuazione del Piano e i Soggetti Attuatori.

Impianto trattamento e recupero sabbie derivanti da pulizia di fognature e spazzamento stradale (MTE11C_00000870)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - AIMAG S.P.A.
CUP - G92F21000060006
Subambito di riferimento - ATO 4 - MO



Missione M2
Componente C1.1
Linea di investimento 1.1

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

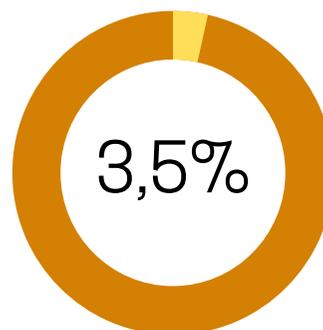

Importo complessivo del progetto

7.500.000 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

268.506 €



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

7.500.000 €

Contributo erogato

750.000 €

Realizzazione nuovo impianto di essiccamento fanghi da 6.000 ton/anno (MTE11C_00000848)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - CADF S.P.A.
CUP - J51B22000620005
Subambito di riferimento - ATO 6 - FE



Missione M2
Componente C1.1
Linea di investimento 1.1

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

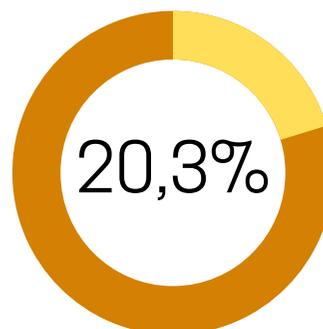

Importo complessivo del progetto

8.798.600 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

1.793.328 €



Totale contributo PNRR

5.290.936 €

Contributo erogato

529.093 €

Realizzazione impianto Power to Methane e upgrading biogas presso area Depuratore IDAR di Bologna (MTE11C_00000809)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - HERA S.P.A.
CUP - H32E22000630004
Subambito di riferimento - ATO 5 - BO




Missione M2
Componente C1.1
Linea di investimento 1.1

STATO DEL PROGETTO

- AGGIUDICAZIONE 
- STIPULA CONTRATTO 
- ESECUZIONE LAVORI 
- COLLAUDO 
- INTERVENTO CONCLUSO 

Percentuale di avanzamento economico finanziario

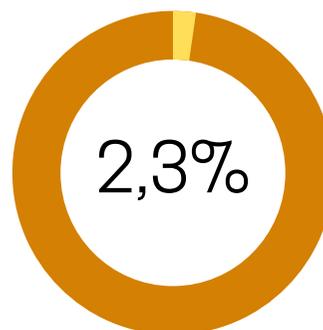

Importo complessivo del progetto

8.122.993 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

190.398 €



Totale contributo PNRR

8.091.270 €

Contributo erogato

809.127 €

Realizzazione impianto di inertizzazione fanghi con produzione di gessi di defecazione presso l'area impiantistica di Mancasale - RE (MTE11C_00000913)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - IREN ACQUA RE
CUP - H82E22000470001
Subambito di riferimento - ATO 3 - RE




Missione M2
Componente C1.1
Linea di investimento 1.1

STATO DEL PROGETTO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

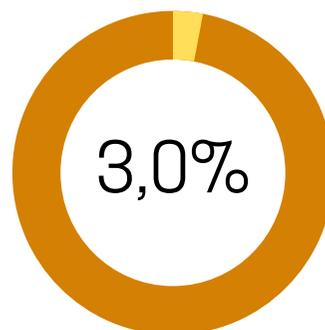

Importo complessivo del progetto

9.320.000 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

283.607 €



Totale contributo PNRR

5.744.680 €

Contributo erogato

574.468 €

Fornitura ed installazione centrifuga fanghi depuratore Mancasale, Reggio Emilia (MTE11C_00000921)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - IREN ACQUA RE
CUP - H87J21000360001
Subambito di riferimento - ATO 3 - RE



Missione M2
Componente C1.1
Linea di investimento 1.1

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

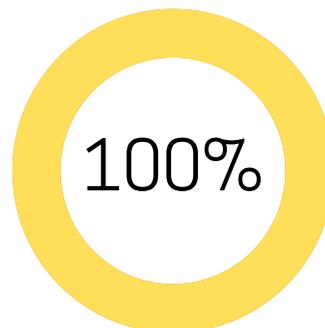

Importo complessivo del progetto

461.172 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

461.172 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

461.172 €

Risanamento scarichi 7-33 in località Alfero (DEP440000136)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - HERA S.P.A.
CUP - H82E22000130001
Subambito di riferimento - ATO 8 - FC




Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.4

STATO DEL PROGETTO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario



Importo complessivo del progetto

4.568.162 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

0 €



Totale contributo PNRR

4.568.162 €

Contributo erogato

1.370.448 €

Lavori di efficientamento del depuratore di Fidenza (PR) (DEP440000134)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - EMILIAMBIENTE
CUP - J59J21003970005
Subambito di riferimento - ATO 2 - PR




Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.4

STATO DEL PROGETTO

- AGGIUDICAZIONE
- STIPULA CONTRATTO
- ESECUZIONE LAVORI
- COLLAUDO
- INTERVENTO CONCLUSO

Percentuale di avanzamento economico finanziario

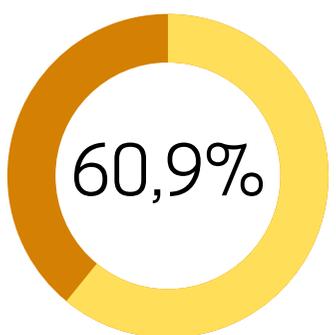

Importo complessivo del progetto

1.097.379 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

669.196 €



Totale contributo PNRR

1.097.379 €

Contributo erogato

329.213 €

Efficientamento tecnologico di 5 impianti di depurazione (DEP440000139)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - SORGEAQUA S.R.L.
CUP - I71D21000090001
Subambito di riferimento - ATO 4 - MO e ATO 5 - BO




Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.4

STATO DEL PROGETTO

- AGGIUDICAZIONE 
- STIPULA CONTRATTO 
- ESECUZIONE LAVORI 
- COLLAUDO 
- INTERVENTO CONCLUSO 

Percentuale di avanzamento
economico finanziario

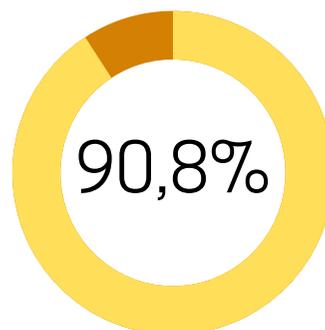

Importo complessivo del progetto

1.500.000 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

1.363.374 €



Totale contributo PNRR

1.500.000 €

Contributo erogato

450.000 €

Potenziamento depuratore Ravenna 1° stralcio (DEP440000135)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - HERA S.P.A.
CUP - H62E22000240001
Subambito di riferimento - ATO 7 - RA




Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.4

STATO DEL PROGETTO

- AGGIUDICAZIONE 
- STIPULA CONTRATTO 
- ESECUZIONE LAVORI 
- COLLAUDO 
- INTERVENTO CONCLUSO 

Percentuale di avanzamento
economico finanziario

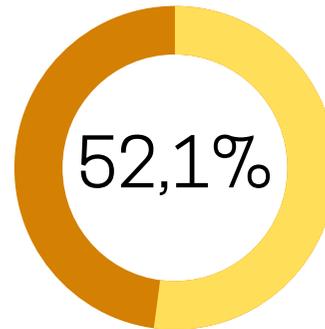

Importo complessivo del progetto

7.383.868 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

3.852.337 €



Totale contributo PNRR

7.383.868 €

Contributo erogato

2.215.160 €

Efficientamento insufflazione ossidazione depuratore Carpi (DEP440000130)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - AIMAG S.P.A.
CUP - G91D22000030006
Subambito di riferimento - ATO 4 - MO



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.4

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

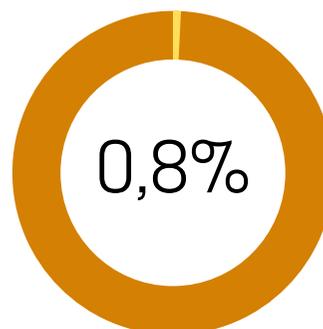

Importo complessivo del progetto

3.200.000 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

27.705 €



Totale contributo PNRR

3.200.000 €

Contributo erogato

960.000 €

Depuratore di Comacchio – Realizzazione quinta linea da 40.000 Abitanti Equivalenti (DEP440000131)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - CADF S.P.A.
CUP - J56H19000040005
Subambito di riferimento - ATO 6 - FE



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.4

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

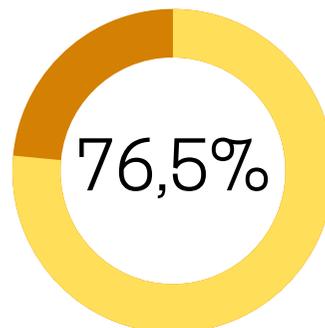

Importo complessivo del progetto

5.300.000 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

4.057.568 €



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

5.300.000 €

Contributo erogato

1.590.000 €

Realizzazione collettore fognario in Via Canalino, Cogruzzo (DEP440000138)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - IREN ACQUA RE
CUP - H85H18000280005
Subambito di riferimento - ATO 3 - RE



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.4

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

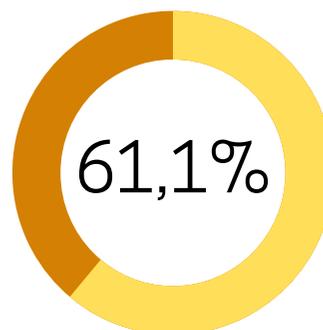

Importo complessivo del progetto

1.220.000 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

745.501 €



Totale contributo PNRR

1.220.000 €

Contributo erogato

366.000 €

Adeguamento parametri azoto depuratore di Fiorenzuola d'Arda (DEP440000137)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - IREN ACQUA PC
CUP - H15H19000080005
Subambito di riferimento - ATO 1 - PC



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.4

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

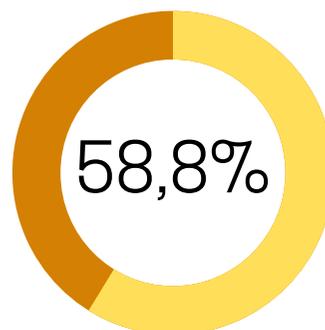

Importo complessivo del progetto

4.900.000 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

2.886.041 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

4.900.000 €

Contributo erogato

1.470.000 €

Ottimizzazione dello schema fognario-depurativo di Ravarino (DEP440000132)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - SORGEAQUA S.R.L.
CUP - I75H21000240001
Subambito di riferimento - ATO 4 - MO



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.4

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

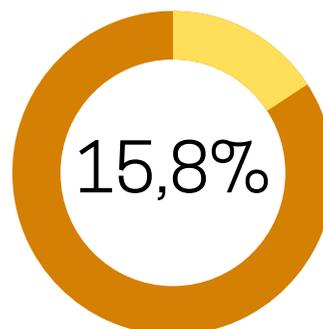

Importo complessivo del progetto

3.500.000 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

556.431 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

3.500.000 €

Contributo erogato

1.050.000 €

Collettamento reflui di Varano capoluogo al dep. di Rubbiano (DEP440000133)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - MONTAGNA 2000 S.P.A.
CUP - Jg1D22000040002
Subambito di riferimento - ATO 2 - PR




Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.4

STATO DEL PROGETTO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

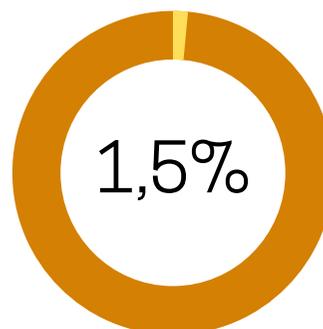

Importo complessivo del progetto

1.160.000 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

17.837 €



Totale contributo PNRR

1.160.000 €

Contributo erogato

348.000 €

Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione, il monitoraggio delle reti e la riabilitazione dei tratti di rete (M2C4-I4.2_219)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - IRETI S.P.A.
CUP - H22E22000030002
Subambito di riferimento - ATO 2 - PR



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.2

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

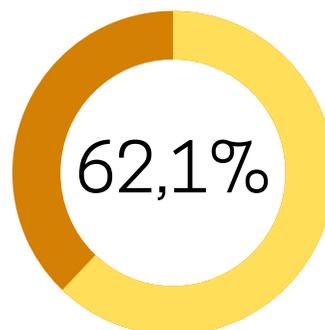

Importo complessivo del progetto

19.497.000 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

12.116.203 €



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



Totale contributo PNRR

10.687.000 €

Contributo erogato

3.206.100 €

Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO5 (M2C4-I4.2_105)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - HERA S.P.A.
CUP - H78B22000020006
Subambito di riferimento - ATO 5 - BO



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.2

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

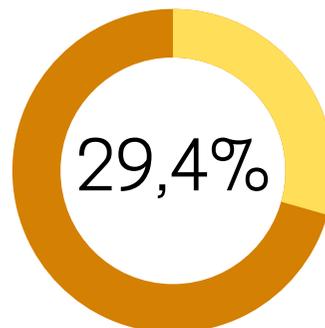

Importo complessivo del progetto

15.020.700 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

4.420.099 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Totale contributo PNRR

13.520.700 €

Contributo erogato

4.056.210 €

Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO4 (M2C4-I4.2_071)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - HERA S.P.A.
CUP - Hg8B22000010006
Subambito di riferimento - ATO 4 - MO



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.2

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

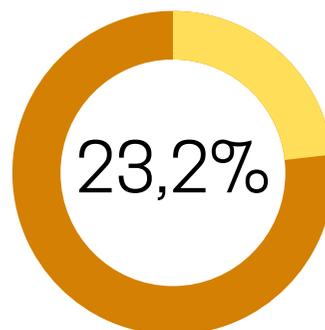

Importo complessivo del progetto

8.205.750 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

1.911.939 €



Totale contributo PNRR

6.245.000 €

Contributo erogato

1.873.500 €

Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO7 (M2C4-I4.2_106)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - HERA S.P.A.
CUP - Hg8B22000020006
Subambito di riferimento - ATO 7 - RA



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.2

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

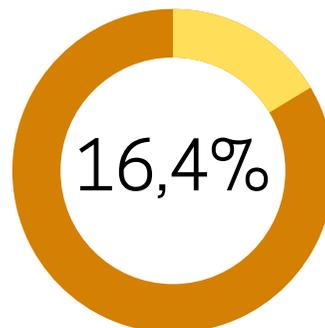

Importo complessivo del progetto

12.450.500 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

2.043.587 €



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



Totale contributo PNRR

9.260.500 €

Contributo erogato

2.778.150 €

Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO8 (M2C4-I4.2_100)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - HERA S.P.A.
CUP - H18B22000050006
Subambito di riferimento - ATO 8 - FC



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.2

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

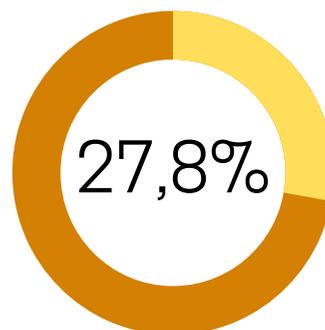

Importo complessivo del progetto

13.582.750 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

3.785.385 €



Totale contributo PNRR

10.002.750 €

Contributo erogato

3.000.825 €

Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATOg (M2C4-I4.2_098)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - HERA S.P.A.
CUP - H28B22000020006
Subambito di riferimento - ATO g - RN



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.2

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

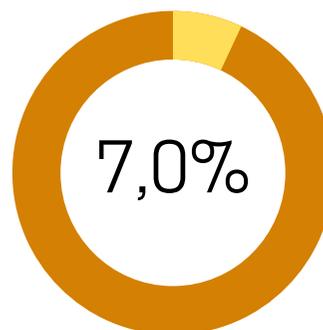

Importo complessivo del progetto

8.732.000 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

617.849 €



Totale contributo PNRR

6.832.000 €

Contributo erogato

2.049.600 €

Interventi straordinari sulla rete idrica di distribuzione funzionali al completamento della distrettualizzazione, al monitoraggio e alla riduzione delle perdite (M2C4-I4.2_094)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - AIMAG S.p.A.
CUP - G82E22000030002
Subambito di riferimento - ATO 4 - MO



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.2

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

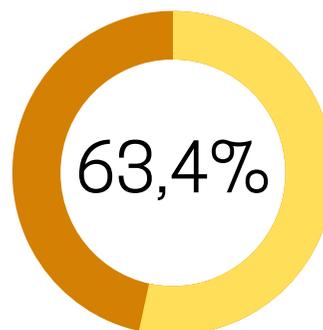

Importo complessivo del progetto

38.852.000 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

24.670.008 €



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



Totale contributo PNRR

22.246.000 €

Contributo erogato

6.673.800 €

Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO6 (M2C4-I4.2_095)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - HERA S.P.A.
CUP - H28B22000010006
Subambito di riferimento - ATO 6 - FE



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.2

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

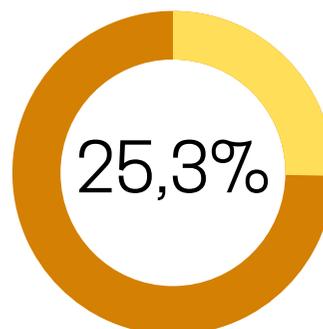

Importo complessivo del progetto

6.165.500 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

1.563.996 €



Totale contributo PNRR

5.365.500 €

Contributo erogato

1.609.650 €

Digitalizzazione, modellazione idraulica, monitoraggio e analisi della rete idrica di distribuzione sull'intero ambito territoriale gestito da SORGEAQUA S.R.L. (M2C4-I4.2_222)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - SORGEAQUA S.R.L.
CUP - I77J22000020006
Subambito di riferimento - ATO 4 - MO e ATO 5 - BO



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.2

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

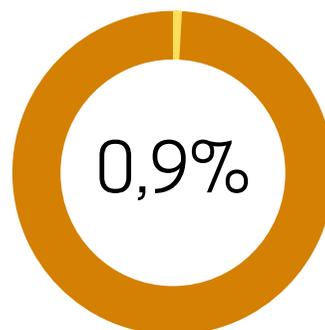

Importo complessivo del progetto

8.968.838 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

81.515 €



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



Totale contributo PNRR

6.008.838 €

Contributo erogato

1.802.651 €

Efficientamento del sistema idrico gestito da MONTAGNA 2000 mediante l'installazione di sistemi di misura e la distrettualizzazione delle reti idriche (M2C4-I4.2_220)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - MONTAGNA 2000 S.P.A.
CUP - J61D22000080002
Subambito di riferimento - ATO 2 - PR




Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.2

STATO DEL PROGETTO

- AGGIUDICAZIONE
- STIPULA CONTRATTO
- ESECUZIONE LAVORI
- COLLAUDO
- INTERVENTO CONCLUSO

Percentuale di avanzamento economico finanziario

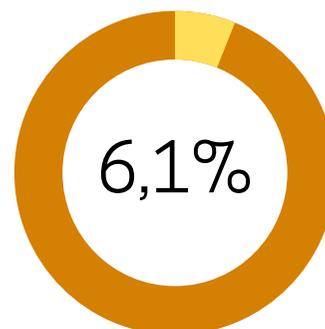

Importo complessivo del progetto

1.175.798 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

72.741 €



Totale contributo PNRR

1.055.798 €

Contributo erogato

316.739 €

Distrettualizzazione e riduzione delle perdite delle reti di distribuzione acqua per Toano capoluogo (M2C4-I4.2_107)

Soggetto beneficiario - ATERSIR
Soggetto attuatore - AZIENDA SPECIALE TOANO
CUP - E78B22000490005
Subambito di riferimento - ATO 3 - RE



Missione M2
Componente C4
Linea di investimento 4.2

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

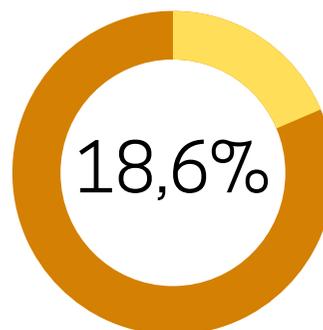

Importo complessivo del progetto

782.000 €

Avanzamento finanziario al 31/03/2025

145.469 €



Totale contributo PNRR

692.000 €

Contributo erogato

207.600 €
