

CLFC/2020/5 del 17 dicembre 2020

CONSIGLIO LOCALE di FORLI' - CESENA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2019 - Gestore HERA S.p.A.**

IL COORDINATORE

F.to Giuseppe Petetta

CLFC/2020/5

CONSIGLIO LOCALE di FORLÌ - CESENA

L'anno **2020** il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 9.00 si è riunito il Consiglio Locale di Forlì-Cesena convocato con lettera protocollo PG.AT/2020/0008709 del 03/12/2020, in seduta telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Giuseppe Petetta.

Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

Comune	Nome e Cognome	Qualifica	Presenti	Quote
Provincia di Forlì Cesena	Cristina Nicoletti	Assessore	sì	10,0000
Bagno di Romagna	Enrico Spighi	Assessore	sì	1,5724
Bertinoro	Gabriele Antonio Fratto	Sindaco	sì	2,5384
Borghi	Luigi Deluca	Vicesindaco	sì	0,8634
Castrocaro Terme Terra del Sole	William Sanzani	Vicesindaco	sì	1,6499
Cesena	Francesca Lucchi	Assessore	sì	20,1987
Cesenatico	Valentina Montalti	Assessore	sì	5,5679
Civitella di Romagna	Claudio Milandri	Sindaco	sì	1,0861
Dovadola				0,6443
Forlì	Petetta Giuseppe	Assessore	sì	24,4368
Forlimpopoli	Gian Matteo Peperoni	Assessore	sì	2,9912
Galeata				0,8216
Gambettola	Letizia Bisacchi	Sindaco	sì	2,4223
Gatteo	Gianluca Vincenzi	Sindaco	sì	2,1470
Longiano	Ermes Battistini	Sindaco	sì	1,7173
Meldola	Roberto Cavallucci	Sindaco	sì	2,3730
Mercato Saraceno	Ignazio Palazzi	Assessore	sì	1,7505
Modigliana				1,2797
Montiano				0,6526
Portico San Benedetto				0,4594
Predappio				1,6514
Premilcuore				0,4665
Rocca San Casciano				0,7146
Roncofreddo	Sara Bartolini	Sindaco	sì	1,0038
San Mauro Pascoli	Luciana Garbuglia	Sindaco	sì	2,5990
Santa Sofia				1,1692
Sarsina	Enrico Cangini	Sindaco	sì	1,0467
Savignano sul Rubicone	Natascia Bertozzi	Assessore	sì	3,9321
Sogliano al Rubicone	Andreucci Christian	Assessore	sì	0,9739
Tredozio	Nicola Rossi	Assessore	sì	0,5610
Verghereto				0,7092

Presenti n. 21 quote 91,4314

Assenti n. 10 quote 8,5686

Riconosciuta la validità della seduta il Dott. Giuseppe Petetta, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2019 - Gestore HERA S.p.A.**

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g);
- l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di approvazione dei piani d’ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 8 del 4 dicembre 2015 del Consiglio locale di Forlì – Cesena è stato approvato il programma degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2015-19 del gestore HERA S.p.A, proponendo al Consiglio d’ambito la conseguente integrazione del Piano di Ambito e la variazione del Piano economico-finanziario;
- con deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2016 il Consiglio d’Ambito ha approvato l’integrazione dei Piani di Ambito vigenti nel territorio della ex Provincia di Forlì - Cesena, conseguentemente all’approvazione del consuntivo degli interventi anno 2014 e all’approvazione del programma degli interventi 2015-2019 di cui alla schema regolatorio AEEGSII;
- con deliberazione n. 8 del 6 ottobre 2017 del Consiglio locale di Forlì – Cesena è stata approvata la revisione straordinaria del programma degli interventi 2016-2019, per le annualità 2017, 2018 e 2019, del gestore HERA S.p.A e la proposta di integrazione del Piano di Ambito;
- con deliberazione n. 50 del 28 giugno 2018 il Consiglio d’Ambito ha approvato l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria allora vigente (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione tariffaria per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, anche per il bacino di Forlì-Cesena. Con tale deliberazione, fra l’altro, si è dato atto che il PdI-cronoprogramma degli investimenti, redatto secondo lo schema previsto dall’Autorità di Regolazione, è stato predisposto modificando alcuni importi di interventi già esistenti e/o introducendo nuovi interventi al fine di rispettare gli adempimenti richiesti per l’adeguamento agli standard della RQTI

(deliberazione ARERA n. 917/2017/R/idr) e che pertanto l'approvazione dell'atto di ATERSIR ha costituito modifica e integrazione dei POI approvati dai Consigli Locali;

considerato altresì che:

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che il gestore HERA S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2019 attraverso il software ARSI;

dato atto altresì che la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato che dai dati presentati è emerso quanto segue (come da tabella 3 della relazione allegata):

- il Gestore non ha avviato n. 16 interventi che erano stati programmati;
- vi sono stati 5 interventi con avvio anticipato e 22 interventi per i quali è stato rendicontato un importo diverso da zero nonostante nella pianificazione fossero considerati conclusi;
- nella annualità 2019 non sono stati rilasciati dalla struttura tecnica di ATERSIR nulla osta ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017 relativi ad interventi del bacino di Forlì-Cesena;

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli **n.21**, quote **91,4314**, astenuti n.0, contrari n.0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2019**

**GESTORE: HERA S.P.A.
BACINO TARIFFARIO: FORLÌ CESENA**

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2019, del Programma operativo degli interventi (POI) del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 08 del 04 Dicembre 2015, modificato con delibera n.ro 08 del 06 Ottobre 2017, che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA %
GESTORE HERA	€ 7.888.000	€ 9.511.604	€ 1.623.604	21%
INVESTITORI TERZI	€ 3.441.000	€ 4.645.041	€ 1.204.041	35%
FONDO PERDUTO	€ 13.000	€ 0	-€ 13.000	-100%
TOTALE	€ 11.342.000	€ 14.156.645	€ 2.814.645	25%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, abbia effettuato nel corso del 2019 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa un +21 %, con riferimento a quelli direttamente finanziati, e per circa un 35% per quelli finanziati da altro soggetto investitore (Società degli assets), rispetto a quanto era stato preventivato.

Complessivamente lo scostamento è stato del +25%.

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato alla presente relazione.

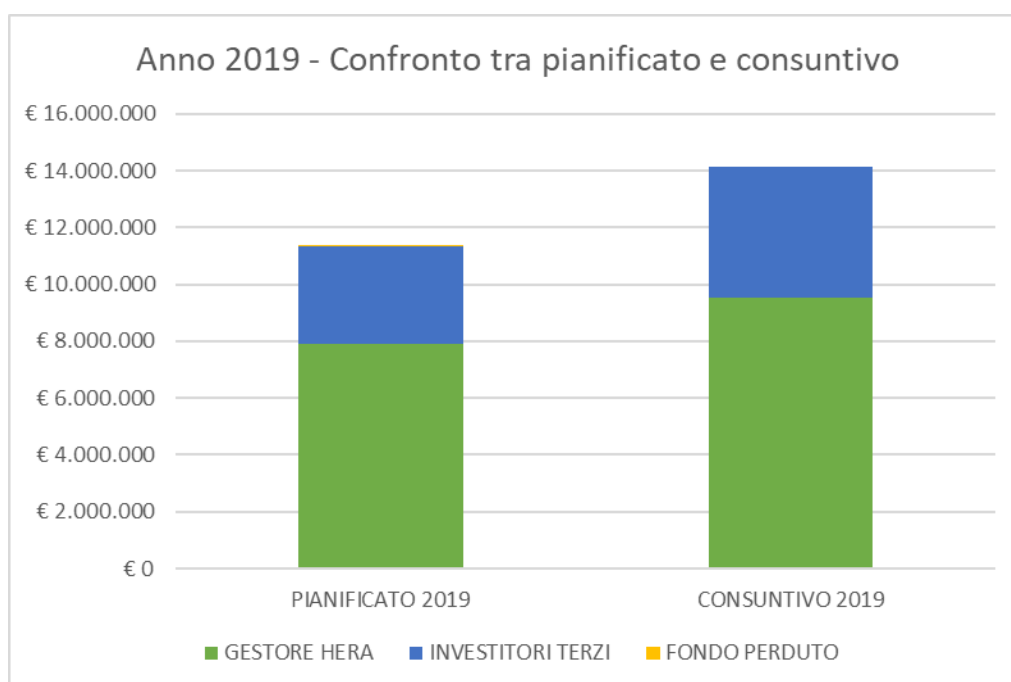


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019

ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio.

	PIANIFICATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA %
ACQUEDOTTO	€ 4.040.000	€ 6.861.475	€ 2.821.475	70%
DEPURAZIONE	€ 2.777.000	€ 2.601.494	-€ 175.506	-6%
FOGNATURA	€ 4.525.000	€ 4.693.676	€ 168.676	4%
TOTALE	€11.342.000	€14.156.645	€2.814.645	25%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

La tabella di seguito riportata sintetizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato.

COD	TIPOLOGIA	Numero	Importo Lordo Pianificato nel 2019 [€]	Importo Lordo a consuntivo nel 2019 [€]
1a	Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	14	€ 3.346.000	€ 0
1b	Interventi non avviati dalle scorse annualità (con importo pianificato pari a zero nel 2019)	2	€ 0	€ 0
2a	Interventi con avvio anticipato nel 2019 (già presenti nel POI o nel Piano d'Ambito)	5	€ 0	€ 400.063
2b	Chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	22	€ 0	€ 3.132.695
3	Interventi avviati nel 2019 che non erano contenuti nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0
4	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	25	€ 5.069.000	€ 7.665.636
5	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	7	€ 2.927.000	€ 2.958.251
	TOTALE	75	€11.342.000	€14.156.645

TAB.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta quanto segue:

- il gestore ha rendicontato nel 2019 n.ro 75 interventi, di cui 16 con importo a consuntivo pari a zero (interventi non avviati: 1a + 1b); di questi, 2 riportavano un importo pianificato pari a zero, ma sono stati comunque considerati perché presentavano importi pianificati per le precedenti annualità senza essere mai stati avviati (1b);

- vi sono n.ro 5 interventi con avvio anticipato rispetto a quanto pianificato (2a) e n.ro 22 interventi per i quali è stato rendicontato un importo diverso da zero nonostante nella pianificazione tali interventi fossero da considerare conclusi (2b);

Inoltre si può notare come rispetto ai 59 interventi che il gestore ha rendicontato con importo diverso da zero, circa il 42 % di questi (25 interventi) abbia avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno, con un aumento totale degli importi lordi relativi a questa categoria pari circa al 51% rispetto al pianificato.

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo degli interventi.

	PIANIFICATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA %
<500k	€ 977.000	€ 1.127.537	€ 150.537	15%
500k - 1.000k	€ 1.873.000	€ 2.141.916	€ 268.916	14%
1.000k - 2.000k	€ 280.000	€ 967.270	€ 687.270	245%
2.000k - 5.000k	€ 2.700.000	€ 1.449.931	-€ 1.250.069	-46%
> 5.000k	€ 0	€ 0	€ 0	0%
CONTI CUMULATIVI	€ 5.512.000	€ 8.469.991	€ 2.957.991	54%
TOTALE	€ 11.342.000	€ 14.156.645	€ 2.814.645	25%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

Si nota che non ci sono particolari differenze di scostamento tra le varie fasce di importo degli interventi e che il maggiore importo rendicontato sia di fatto riconducibile agli interventi manutentivi od assimilabili (conti cumulativi)

ALLEGATO

HERA SpA
Consuntivo investimenti annualità 2019 Bacino tariffario di Forlì Cesena

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	PIANO ATERSIR 2019				CONSUNTIVO HERA 2019						
						PIANO ATERSIR 2019 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2019 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2019 INV. DI TERZI	PIANO ATERSIR 2019 INV. GESTORE	CONS 2019 INV. LORDI	CONS 2019 CONTRIBUTI	CONS 2019 INV. DI TERZI	CONS 2019 INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDI	% SCOSTA MENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2019
2015FCHA0007	RISOLUZIONE INTERFERENZE CON SERVIZIO TECNICO DI BACINO	FOGNATURA	Gestore	Bagno di Romagna	850.000,00	150.000,00	0		150.000,00	63.198,97	0		63.198,97	-86.801,03	-57	GLI INTERVENTI ASSOCIATI A QUESTO ID SONO LEGATI ALLA RISOLUZIONE DI ALCUNE INTERFERENZE TRA I SERVIZI DI HERA E IL SERVIZIO TECNICO DI BACINO. LO SCOSTAMENTO 2019, COME PER GLI ANNI PRECEDENTI, E' LEGATO ALLA COMPLESSITA' DELLE ATTIVITA' DA REALIZZARE CHE NECESSITANO DI UNA CONDIVISIONE CON L'ENTE AL FINE DI PROCEDERE CON LE SCELTE PROGETTUALI/REALIZZATIVE VENGONO REGOLARMENTE SVOLTI INCONTRI CON I TECNICI DELL'ENTE CHE GARANTISCONO UNA CONDIVISIONE E COSTANETE ALLINEAMENTO SULLE TEMPSTICHE DI AVANZAMENTO DELLE OPERE
2017FCHA0002	RISANAMENTO SC. 6-41 - LOC.ACQUAPARTITA	FOGNATURA	Unica Reti	Bagno di Romagna	2.519.071,00	620.000,00	0	620.000,00		0	0		-620.000,00	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA NEL 2019. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL FATTO CHE L'ACCORDO ATTUATIVO NON E' ANCORA SOTTOSCRITTO, PERTANTO IL CONSUNTIVO RISULTA PARI A ZERO. I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO. TALE INTERVENTO INOLTRE E' STATO RIPIANIFICATO NEL POI 2020-24, DI RECENTE APPROVAZIONE, IN RELAZIONE ALL'ATTUALE STATO DI AVANZAMENTO	
2014FCHA0015	POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA DISMANO	ACQUEDOTTO	Romagna Acque	Bertinoro	68.000,00	0	0			2.473,03	0	2.473,03		2.473,03	100	INTERVENTO CONCLUSO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ESCLUSIVAMENTE AD ASPETTI CONTABILI (ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIARIE)
2017FCHA0003	POTENZIAMENTO RETE IDRICA LOCALITA' LA FRATTA	ACQUEDOTTO	Unica Reti	Bertinoro	693.802,00	247.000,00	0	247.000,00		296.533,99	0	296.533,99		49.533,99	20	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO NEL 2019. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL PARZIALE RECUPERO DEI COSTI SOSTENUTI NEGLI ANNI PRECEDENTI E RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2017FCHA0004	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA V.COLOMBARONE	FOGNATURA	Gestore	Bertinoro	150.000,00	0	0	0,00		13.692,41	0		13.692,41	13.692,41	100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE IN SEDE DI STESURA DEL PIANO ATERSIR 2020-2023 IL PRESENTE ID E' STATO ANNULLATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A RASDF. L'ID VIENE SOSTITUITO DAL 2019FCHA0009
2017FCHA0005	POTENZIAMENTO RETE V. CORNACCHIARA	ACQUEDOTTO	Romagna Acque	Borghì	602.000,00	0	0			385.086,13	0	385.086,13		385.086,13	100	INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO NEL 2019, LO SCOSTAMENTO E' DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI PREGRESSI SONO STATI RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO
2014FCHA0021	COLLETTAMENTO BORGHÌ-TRIBOLA A STRADONE	FOGNATURA	Romagna Acque	Borghì	1.417.000,00	0	0			942.017,57	0	942.017,57		942.017,57	100	INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO NEL 2019, LO SCOSTAMENTO E' DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI PREGRESSI SONO STATI RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO
2017FCHA0027	OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI CASTROCARO	FOGNATURA	Gestore	Castrocaro Terra Sole	25.000,00	0	0			7.886,81	0		7.886,81	7.886,81	100	COME GIA' INDICATO NEL 2018, SONO STATI ESEGUITI UNA SERIE DI SOPRALLUOGHI CONDIVISI ANCHE CON IL COMUNE DI CASTROCARO TERRA SOLE. SI E' CONVENUTO CHE IN QUESTA FASE GLI INTERVENTI IPOTIZZATI A PIANO NON SIANO NECESSARI E COMUNQUE NON ESAUSTIVI. PERTANTO AL MOMENTO LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SONO STATE SOSPESE
2014FCHA0025	POTENZIAMENTO RETE LOC.PIEVESISTINA	ACQUEDOTTO	Gestore	Cesena	271.000,00	0	0			56.759,17	0		56.759,17	56.759,17	100	INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO ALLA REALIZZAZIONE DEI TAPPETI
2014FCHA0026	POT RETE V.CERVESE LOC.PIOPPA CALABRINA	ACQUEDOTTO	Gestore	Cesena	296.000,00	0	0	0,00		2.577,28	0		2.577,28	2.577,28	100	INTERVENTO CONCLUSO NEL CORSO DEL 2018 COME DA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI. LO SCOSTAMENTO 2019 E' UNICAMENTE LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI
2014FCHA0028	LC.PIEVESISTINA-POTEN.RETE ACQUA CIVILE	ACQUEDOTTO	Romagna Acque	Cesena	680.000,00	0	0			51.689,76	0	51.689,76		51.689,76	100	INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL RECUPERO DI ATTIVITA' PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI, LE CUI MOTIVAZIONI SONO GIA' STATE ADOTTE NELLE ANNUALITA' DI COMPETENZA
2014FCHA0029	ADEGUAMENTO DEP CESENA - SEDIM SECOND- 2 STRALCIO	DEPURAZIONE	Gestore	Cesena	1.662.000,00	0	0		0,00	-91.300,90	0		-91.300,90	-91.300,90	-100	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. LO SCOSTAMENTO 2019 TRA IMPORTO PIANIFICATO E CONSUNTIVATO E' LEGATO ALLO STORNO DI ALCUNI COSTI ERRONEAMENTE IMPUTATI NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. CHIUSURA CONTABILE DELL'INTERVENTO PREVISTA NEL 2020
2014FCHA0031	RISANAMENTO LOCALITA' PIOPPA-CALABRINA	FOGNATURA	Romagna Acque	Cesena	2.128.000,00	131.000,00	0	131.000,00		308.081,20	0	308.081,20		177.081,20	135	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE, CON REGOLARE AVANZAMENTO IN TERMINE DI TEMPSTICHE REALIZZATIVE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEGUENZIALE ALL'AVANZAMENTO DEL CANTIERE. PREVISTA ULTIMAZIONE NEL 2020
2014FCHA0038	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FOGN.CESUOLA-CESENA	FOGNATURA	Gestore	Cesena	3.100.000,00	20.000,00	0		20.000,00	140.795,64	0		140.795,64	120.795,64	603	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, COERENTEMENTE A QUANTO PREVISTO NEL POI. LO SCOSTAMENTO E' UNICAMENTE DI NATURA ECONOMICA LEGATO AD UNA MAGGIORE RENDICONTAZIONE DEI COSTI DI PROGETTAZIONE RISPETTO A QUELLI PIANIFICATI A POI CHE ERANO COMUNQUE DI LARGA MASSIMA. NON SI SEGNALENO CRITICITA' IN QUANTO LA PROGETTAZIONE STA PROSEGUENDO REGOLARMENTE
2014FCHA0039	NUOVA FOGNA NERA E SOLLLOC.PIEVESISTINA	FOGNATURA	Romagna Acque	Cesena	3.633.000,00	0	0			494.119,30	0	494.119,30		494.119,30	100	INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL RECUPERO DI ATTIVITA' PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI, LE CUI MOTIVAZIONI SONO GIA' STATE ADOTTE NELLE ANNUALITA' DI COMPETENZA
2015FCHA0010	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO DISTRETTO CESENA	FOGNATURA	Gestore	Cesena	240.000,00	0	0			9.779,22	0	9.779,22		9.779,22	100	LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTABILIZZAZIONE. NEL COMPLESSO L'INTERVENTO E' IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE DI PIANO
2015FCHA0011	RISANAMENTO SCARICHI 190-191-192-193 RIO EREMO	FOGNATURA	Gestore	Cesena	1.053.000,00	18.000,00	0		18.000,00	19.331,85	0		19.331,85	1.331,85	7	
2017FCHA0025	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SOLLEVAMENTO GAL	FOGNATURA	Gestore	Cesena	300.000,00	20.000,00	0		20.000,00	32.921,27	0		32.921,27	12.921,27	64	(scostamento quantitativamente minore a +/- 20.000 euro rispetto al pianificato)
2019FCHA0012	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO IN V. TORRI - V. CASSIN	FOGNATURA	Gestore	Cesenatico	345.000,00	0	0			5.845,11	0		5.845,11	5.845,11	100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'ID E' STATO INSERITO IN SEDE DI APPROVAZIONE POI 2020-2024 E PERTANTO NON AVEVA PIANIFICAZIONE NEL POI 2015-19. NEL 2019 SONO STATE AVVIATE SOLO LE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE PRELIMINARI UTILI A DEFINIRE IL PERIMETRO DI INTERVENTO
2017FCHA0028	Estensione acquedotto località Zotto a Civitella	ACQUEDOTTO	Gestore	Civitella di Romagna	26.000,00	26.000,00	13.000,00		13.000,00	0	0		-26.000,00	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'ESTENSIONE RETE E' RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI PRIVATI CHE AVREBBERO DOVUTO CREARE IN LOCO UNA ATTIVITA' COMMERCIALE (AGRITURISMO) CHE PERO' NON E' ANCORA STATA AVVIATA. NEL NUOVO POI 2020-24 L'INTERVENTO E' STATO PIANIFICATO A FINE PIANO IN QUANTO AD OGGI NON SUSSISTONO ELEMENTI PER UNA VALUTAZIONE PIU' PRECISA DELL'AVVIO DELL'ATTIVITA'	
2017FCHA0007	RISANAMENTO SCARICHI 1-4-5-7-12, DOVADOLA, 2*ST	FOGNATURA	Unica Reti	Dovadola	451.719,00	0	0			41.000,00	0	41.000,00		41.000,00	100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA NEL 2019. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL FATTO CHE L'ACCORDO ATTUATIVO E' STATO SOTTOSCRITTO IL 23-12-2019 PERTANTO IL CONSUNTIVO 2019 REGISTRA I COSTI FINO AD OGGI SOSTENUTI. TALE INTERVENTO INOLTRE E' STATO RIPIANIFICATO NEL POI 2020-24, DI RECENTE APPROVAZIONE, IN RELAZIONE ALL'ATTUALE STATO DI AVANZAMENTO
2017FCHA0008	ADEGUAMENTO SISTEMA DI TRATTAMENTO CADITOIE DEPURAT	DEPURAZIONE	Gestore	Forlì	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	E' ANCORA IN CORSO DI VALUTAZIONE LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO DA EFFETTUARSI COME GIA' INDICATO NELLA NOTA DEL 2018 ANCHE IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI EFFETTUARE UNO STUDIO PRELIMINARE PER POTER VALUTARE LA SOLUZIONE PROGETTUALE ADEGUATA E UN REALISTICO COSTO DELL' INTERVENTO. L' IMPORTO AD OGGI INSERITO A POI E' ATTRIBUIBILE ALLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELL' INTERVENTO. SI EVIDENZIA INOLTRE CHE L' INTERVENTO NON HA UNA CRITICITA' COGENTE, PERTANTO IN OCCASIONE DEL PROSSIMO AGGIORNAMENTO DEL POI VERRA' FORNITA UNA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA E UNA TEMPSTICA DI REALIZZAZIONE DEFINITA
2017FCHA0009	INSTALLAZIONE CENTRIFUGA E SILOS FANGHI DEPURATORE DI FO	DEPURAZIONE	Unica Reti	Forlì	861.239,00	488.000,00	0	488.000,00		813.500,00	0	813.500,00		325.500,00	66	INTERVENTO CONCLUSO. ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO NEL 2019, LO SCOSTAMENTO E' DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI PREGRESSI SONO STATI RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO
2019FCHA0013	REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO FANGHI CON ULTRAS	DEPURAZIONE	Gestore	Forlì	200.000,00	0	0			157.247,20	0		157.247,20	157.247,20	100	NUOVO ID ISTITUITO NEL 2019 IN OCCASIONE DEL PIANO 2020-23 E CHE PERTANTO NON PRESENTA PIANIFICAZIONE 2019. INTERVENTO REALIZZATO NEL 2019 IN QUANTO RITENUTO STRATEGICO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
2014FCHA0059	SOLLEVAMENTO FOGNARIO VILLAFRANCA - VIA 13 NOVEMBRE	FOGNATURA	Gestore	Forlì	793.000,00	15.000,00	0		15.000,00	0	0		-15.000,00	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'ID E' STATO STRALCIATO, IN QUANTO SONO STATI FATTI STUDI PRELIMINARI E MISURAZIONI CHE HANNO PORTATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI GESTIONALI SUFFICIENTI A RISOLVERE IL PROBLEMA, ESCLUDENDO LA NECESSITA' DI UN INTERVENTO AD INVESTIMENTO COME INIZIALMENTE IPOTIZZATO MEDIANTE L'INSERIMENTO DI QUESTO ID NEL PIANO ATERSIR	
2014FCHA0066	REALIZZ.FOGNA NERA VSAVIO - FORLIMPOPOLI	FOGNATURA	Gestore	Forlimpopoli	100.000,00	70.000,00	0		70.000,00	5.451,46	0		5.451,46	-64.548,54	-92	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO IN QUANTO, COME GIA' INDICATO NELLE NOTE 2018, NON SONO PRESENTI CRITICITA' COGENTI E VINCOLI NORMATIVI/AMBIENTALI, NE' PRESCRIZIONI. AVVIATA LA PROGETTAZIONE NEL 2019. REALIZZAZIONE PREVISTA PER IL 2020

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	PIANO ATERSIR 2019				CONSUNTIVO HERA 2019					NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2019	
						PIANO ATERSIR 2019 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2019 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2019 INV. DI TERZI	PIANO ATERSIR 2019 INV. GESTORE	CONS 2019 INV. LORDI	CONS 2019 CONTRIBUTI	CONS 2019 INV. DI TERZI	CONS 2019 INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDI		% SCOSTA MENTO
2014FCHA0069	SCARICO 3 VIA DELLA VIOLE	FOGNATURA	Gestore	Gambettola	290.000,00	0	0	0	0	5.423,32	0	0	5.423,32	5.423,32	100	INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE AL RITARDO FATTO REGISTRARE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI E GIA' MOTIVATO
2014FCHA0070	SCARICO 12 VIA VERDI GAMBETTOLA	FOGNATURA	Gestore	Gambettola	739.000,00	400.000,00	0	0	400.000,00	157.592,67	0	0	157.592,67	-242.407,33	-60	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA RIPROGRAMMAZIONE DI QUOTA PARTE DELL' INTERVENTO PER NECESSITA' DI COORDINAMENTO CON INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DA PARTE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE
2017FCHA0013	ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO GAMBETTOLA	FOGNATURA	Gestore	Gambettola	630.000,00	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	0	0	-30.000,00	-100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE IN SEDE DI STESURA DEL PIANO ATERSIR 2020-2023, PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A RASDF, L'ID VIENE ANNULLATO E SOSTITUITO DAL 2019FCHA0017
2014FCHA0079	DISMISSIONE DEPURATORE BORGO STECCHI	DEPURAZIONE	Gestore	Mercato Saraceno	165.000,00	0	0	0	0	15.483,26	0	0	15.483,26	15.483,26	100	INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE ALLA RIPIANIFICAZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI, GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELLE CORRISPONDENTI ANNUALITA'
2014FCHA0083	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PRONTO INTERVENTO	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali	900.000,00	0	0	0	900.000,00	2.043.451,07	0	0	2.043.451,07	1.143.451,07	127	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEQUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO ACQUEDOTTO
2014FCHA0084	RINNOVO RETI PROGRAMMATO	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali	1.375.000,00	0	0	0	1.375.000,00	1.403.728,98	0	0	1.403.728,98	28.728,98	2	RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2014FCHA0085	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali	325.000,00	0	0	0	325.000,00	555.056,01	0	0	555.056,01	230.056,01	70	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2014FCHA0086	RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali	190.000,00	0	0	0	190.000,00	639.201,74	0	0	639.201,74	449.201,74	236	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTI CONCOMITANTE A MAGGIORI INTERVENTI DI RINNOVO RETI ACQUEDOTTISTICHE A SEGUITO DI PRONTO INTERVENTO ID 2014FCHA0083
2014FCHA0087	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali	100.000,00	0	0	0	100.000,00	59.258,51	0	0	59.258,51	-40.741,49	-40	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE COMPENSATO DA MAGGIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ID 2014FCHA0085
2014FCHA0088	POTENZIAMENTO RETE ACQ. BORGO DELLE ROSE-MOLINO DI SORIANO	ACQUEDOTTO	Romagna Acque	Opere Pluricomunali	545.000,00	0	0	0	0	83.765,85	0	0	83.765,85	83.765,85	100	INTERVENTO ATTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL RECUPERO, INIZIATO GIA' NEL 2018, DI ATTIVITA' PREVISTE NEL 2016-2017. LE MOTIVAZIONI DELLE RIPIANIFICAZIONI 2016-2017 SONO GIA' STATE ADDOTTE NELLE NOTE DELLE RISPETTIVE ANNUALITA'
2014FCHA0123	Sostituzione contatori pari calibro	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali	597.000,00	597.000,00	0	0	597.000,00	563.810,43	0	0	563.810,43	-33.189,57	-5	
2014FCHA0126	Verifiche ed adeguamenti sismici impianti	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali	20.000,00	0	0	0	20.000,00	44.287,79	0	0	44.287,79	24.287,79	121	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L'ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 8. GLI IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL'ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL CORSO DEL 2019 SONO ALLO STUDIO L'ADEGUAMENTO DEL SERBATOIO DI VILLA SELVA E DI GAMBETTOLA
2014FCHA0131	Automazione e telecontrollo impianti	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali	30.000,00	0	0	0	30.000,00	35.344,04	0	0	35.344,04	5.344,04	17	
2015FCHA0016	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	-10.000,00	-100	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITA'. NON MANIFESTATESI NECESSITA' NEL 2019
2015FCHA0017	RECUPERO AREE SERBATORI PENSILI DISMESSI	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali	0	0	0	0	0	217.651,21	0	0	217.651,21	217.651,21	100	ID CHE RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEI PENSILI. LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA PER SINGOLO ANNO INSERITA NEL PIANO E' DI LARGA MASSIMA; OGNI ANNO VENGONO ATTIVATE LE ATTIVITA' RITENUTE NECESSARIE DAL SERVIZIO, TENENDO CONTO DELLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA DI TALI INTERVENTI. NEL 2019 E' TERMINATO L'INTERVENTO RELATIVO ALL'AREA PENSILE SAN MARTINO A FORLI', E' CONTINUATA LA PROGETTAZIONE DELL' AREA PENSILE TORRE VECCHIA A GAMBETTOLA E AVVIATA QUELLA DELL'AREA RONCADELLO A FORLI'
2019FCHA0022	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - FC ATO 8	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali	0	0	0	0	0	134.133,08	0	0	134.133,08	134.133,08	100	NUOVO ID INSERITO IN SEDE DI APPROVAZIONE PIANO 2020-2023. INTERVENTO RICORSIVO E AVVIATO GIA' A PARTIRE DAL 2019 IN QUANTO DI ASSOLUTA PRIORITA' AVENDO LA FINALITA' DI CONTENERE LE PERDITE, MONITORARE LE RETE E OTTIMIZZARE IL REGIME DI PRESSIONI
2014FCHA0089	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Gestore	Opere Pluricomunali	700.000,00	0	0	0	700.000,00	1.297.786,45	0	0	1.297.786,45	597.786,45	85	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2014FCHA0090	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Gestore	Opere Pluricomunali	150.000,00	0	0	0	150.000,00	27.085,91	0	0	27.085,91	-122.914,09	-81	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE COMPENSATO DA MAGGIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ID 2014FCHA0089
2015FCHA0019	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Gestore	Opere Pluricomunali	15.000,00	0	0	0	15.000,00	34.192,33	0	0	34.192,33	19.192,33	127	(scostamento quantitativamente minore a +/- 20.000 euro rispetto al pianificato)
2014FCHA0092	RINNOVO RETI FOGNARIE PROGRAMMATO	FOGNATURA	Gestore	Opere Pluricomunali	330.000,00	0	0	0	330.000,00	588.763,29	0	0	588.763,29	258.763,29	78	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2014FCHA0093	RIPRISTINO ASFALTI FOGNATURA	FOGNATURA	Gestore	Opere Pluricomunali	85.000,00	0	0	0	85.000,00	185.550,13	0	0	185.550,13	100.550,13	118	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTI CONCOMITANTE A MAGGIORI INTERVENTI DI RINNOVO RETI FOGNARIE ID 2014FCHA0092
2014FCHA0094	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA	FOGNATURA	Gestore	Opere Pluricomunali	310.000,00	0	0	0	310.000,00	306.790,10	0	0	306.790,10	-3.209,90	-1	
2014FCHA0095	RILIEVO RETI FOGNARIE	FOGNATURA	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	-10.000,00	-100	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E PIANIFICATA IN MODO OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE ATTIVITA' ANNUALI SVOLTE SONO LEGATE ALLE ESIGENZE MANIFESTATESI NELL'ANNUALITA' STESSA. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL FATTO CHE NON SONO EMERSE ESIGENZE
2014FCHA0098	COLLETTAMENTO REFLUI AL DEP. DI BACCIO-RANCHIO BORELLO	FOGNATURA	Romagna Acque	Opere Pluricomunali	4.010.000,00	0	0	0	0	466.950,29	0	0	466.950,29	466.950,29	100	INTERVENTO IN FASE DI ULTIMAZIONE LAVORI. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL RECUPERO DI ATTIVITA' PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI, LE CUI MOTIVAZIONI SONO GIA' STATE ADDOTTE NELLE ANNUALITA' DI COMPETENZA
2014FCHA0132	Rinnovo reti e allacci da Pronto Intervento	FOGNATURA	Gestore	Opere Pluricomunali	350.000,00	0	0	0	350.000,00	332.711,39	0	0	332.711,39	-17.288,61	-4	
2015FCHA0020	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNATURA	FOGNATURA	Gestore	Opere Pluricomunali	15.000,00	0	0	0	15.000,00	1.188,21	0	0	1.188,21	-13.811,79	-92	(scostamento quantitativamente minore a +/- 20.000 euro rispetto al pianificato)
2015FCHA0021	POTENZIAMENTO DORSALE PORTICO-BOCCONI-S.BENEDETTO	ACQUEDOTTO	Gestore	Portico e San Benedetto	800.000,00	0	0	0	0	36.224,80	0	0	36.224,80	36.224,80	100	PROGETTAZIONE INIZIALMENTE PREVISTA NEL 2017. TALE ATTIVITA' HA RICHIESTO MAGGIORI TEMPI RISPETTO AL PIANIFICATO COME GIA' MOTIVATO NELLE NOTE
2017FCHA0015	ADEGUAMENTO RETE FOG V. S. MARIA IN GIRONE	FOGNATURA	Gestore	Portico e San Benedetto	100.000,00	80.000,00	0	0	80.000,00	3.376,14	0	0	3.376,14	-76.623,86	-95	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO ALL' OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE SU SS CHE HA RICHIESTO TEMPORARIE MAGGIORI RISPETTO A QUELLE PIANIFICATE. L' INTERVENTO SARA' TERMINATO ENTRO IL 2021
2015FCHA0022	DISMISSIONE IMHOFF PRED.A.BS 20 E COLEGAMENTO A FO	FOGNATURA	Gestore	Predappio	80.000,00	0	0	0	0	52.807,78	0	0	52.807,78	52.807,78	100	INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL RECUPERO DELLE ATTIVITA' PIANIFICATE NEGLI ANNI PRECEDENTI PER LE MOTIVAZIONI GIA' ESPOSTE NEGLI ANNI DI COMPETENZA
2015FCHA0023	REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO SCARICO 9 E 10	FOGNATURA	Gestore	Predappio	50.000,00	0	0	0	0	887,13	0	0	887,13	887,13	100	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2018. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE RESIDUALI ATTIVITA' CONTABILI
2017FCHA0016	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	FOGNATURA	Gestore	Predappio	100.000,00	50.000,00	0	0	50.000,00	0	0	0	0	-50.000,00	-100	LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE, COME GIA' INDICATO NELLE NOTE 2018, SONO STATE NECESSARIE VERIFICHE NON PREVISTE RELATIVE ALLO STATO DELLA RETE FOGNARIA COMPLESSA E DEI RELATIVI IMPIANTI AL FINE DI INDIVIDUARE LA SOLUZIONE PROGETTUALE OTTIMALE PER RISOLVERE I PROBLEMI DI CARICO DELLA RETE. L' INTERVENTO NON RISULTA COMUNQUE PRIORITARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO E NON SONO PRESENTI COGENITI PROBLEMATICHE. PERTANTO L' INTERVENTO, CHE RESTA COMUNQUE NECESSARIO, AL MOMENTO VIENE POSTICIPATO OLTRE AL 2024, COME GIA' RECEPITO NEL NUOVO POI 2020-24
2014FCHA0103	ADEG. SERBATOIO MONTE DELLE VACCHE	ACQUEDOTTO	Gestore	Roncofreddo	409.000,00	0	0	0	0	5.615,61	0	0	5.615,61	5.615,61	100	SCOSTAMENTO LEGATO ALLA NECESSITA' DI ANTICIPARE ALCUNI COSTI PER LE VALUTAZIONI PRELIMINARI RELATIVE ALL'INTERVENTO EFFETTIVAMENTE DA REALIZZARE IN QUANTO SONO POSSIBILI DIVERSE SOLUZIONI. NEL NUOVO PIANO 2020-23 E' STATO INSERITO UN IMPORTO ANCHE NEL 2020 PER COMPLETARE TALI ANALISI PRELIMINARI, MENTRE L'INTERVENTO ESECUTIVO E' STATO PIANIFICATO A FINE PERIODO
2015FCHA0026	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO II (COLLETTAMENTO)	FOGNATURA	Gestore	Roncofreddo	806.000,00	393.000,00	0	0	393.000,00	0	0	0	0	-393.000,00	-100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE COME DA NULLA OSTA ATERSIR. PEC DEL 17-12-2017. RICHIESTA HERA DEL 29-11-2017 PROT. 117728, VS PROT. AT/2017/7897
2017FCHA0019	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO III	FOGNATURA	Romagna Acque	Roncofreddo	276.000,00	256.000,00	0	256.000,00	0	0	0	0	0	-256.000,00	-100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE COME DA NULLA OSTA ATERSIR. PEC DEL 18-12-2017. RICHIESTA HERA DEL 29-11-2017 PROT. 117728, VS PROT. AT/2017/7897

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	PIANO ATERSIR 2019				CONSUNTIVO HERA 2019					NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2019	
						PIANO ATERSIR 2019 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2019 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2019 INV. DI TERZI	PIANO ATERSIR 2019 INV. GESTORE	CONS 2019 INV. LORDI	CONS 2019 CONTRIBUTI	CONS 2019 INV. DI TERZI	CONS 2019 INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDI		% SCOSTA MENTO
2018FCHA0001	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO II (COLLETTA)	FOGNATURA	Romagna Acque	Roncofreddo	2.371.000,00	125.000,00	0	125.000,00	0	0	0	0	0	-125.000,00	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA NEL 2019. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL FATTO CHE L'ACCORDO ATTUATIVO NON E' ANCORA SOTTOSCRITTO, PERTANTO IL CONSUNTIVO RISULTA PARI A ZERO. I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO. TALE INTERVENTO INOLTRE E' STATO RIPIANIFICATO NEL POI 2020-24, DI RECENTE APPROVAZIONE, IN RELAZIONE ALL'ATTUALE STATO DI AVANZAMENTO
2018FCHA0002	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO I (I LOTTO - C)	FOGNATURA	Romagna Acque	Roncofreddo	600.000,00	150.000,00	0	150.000,00	254.323,44	0	254.323,44	0	0	104.323,44	69	L'INTERVENTO RELATIVO AL I STRALCIO-I LOTTO RISULTA CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL FATTO CHE L'ACCORDO ATTUATIVO RELATIVO A QUESTO I LOTTO E' STATO SOTTOSCRITTO IL 30-12-2019, PERTANTO IL CONSUNTIVO 2019 REGISTRA I COSTI FINO AD OGGI SOSTENUTI. L'INTERVENTO RELATIVO AL I STRALCIO-II LOTTO RISULTA INVECE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. L'ACCORDO ATTUATIVO RELATIVO A QUESTO II LOTTO NON E' ANCORA STATO SOTTOSCRITTO PERTANTO I RELATIVI COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI SOLO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO
2018FCHA0003	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO III	FOGNATURA	Gestore	Roncofreddo	276.000,00	115.000,00	0	115.000,00	0	0	0	0	0	-115.000,00	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'ID E' STATO STRALCIATO IN QUANTO ACCORPATO ALL'ID ATERSIR 2018FCHA0001 FINANZIATA DALLA SOCIETA' DEGLI ASSET ROMAGNA ACQUE, IN QUANTO ALLA LUCE DELLE NUOVE TEMPSTICHE PREVISTE DALLA DGR 201/2016 RELATIVAMENTE AGLI ADEGUAMENTI DI PRIORITA' 1A, CHE RIDUCONO I TEMPI REALIZZATIVI DELL'ADEGUAMENTO RISPETTO A QUANTO IPOTIZZATO NEL PRECEDENTE PIANO ATERSIR, SI PREVEDE UNA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE UNITARIA DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI TRE STRALCI II-III-IV RISPETTIVAMENTE TRACCIATI CON ID 2018FCHA0001/2018FCHA0003/2018FCHA0004
2018FCHA0004	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO IV (RISANAM)	FOGNATURA	Gestore	Roncofreddo	1.060.000,00	262.000,00	0	262.000,00	0	0	0	0	0	-262.000,00	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'ID E' STATO STRALCIATO IN QUANTO ACCORPATO ALL'ID ATERSIR 2018FCHA0001 FINANZIATA DALLA SOCIETA' DEGLI ASSET ROMAGNA ACQUE, IN QUANTO ALLA LUCE DELLE NUOVE TEMPSTICHE PREVISTE DALLA DGR 201/2016 RELATIVAMENTE AGLI ADEGUAMENTI DI PRIORITA' 1A, CHE RIDUCONO I TEMPI REALIZZATIVI DELL'ADEGUAMENTO RISPETTO A QUANTO IPOTIZZATO NEL PRECEDENTE PIANO ATERSIR, SI PREVEDE UNA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE UNITARIA DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI TRE STRALCI II-III-IV RISPETTIVAMENTE TRACCIATI CON ID 2018FCHA0001/2018FCHA0003/2018FCHA0004
2017FCHA0020	SEPARAZIONE RETE S.SOFIA	FOGNATURA	Unica Reti	Santa Sofia	152.000,00	0	0	0	158.000,00	0	158.000,00	0	0	158.000,00	100	ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO NEL 2019, LO SCOSTAMENTO E' DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI PREGRESSI SONO STATI RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO. L'INTERVENTO E' IN FASE DI ULTIMAZIONE LAVORI
2015FCHA0031	NUOVO SERBATOIO IN LOC. CA' DI GIANNINI	ACQUEDOTTO	Gestore	Sarsina	92.000,00	0	0	0	13.867,86	0	13.867,86	0	0	13.867,86	100	LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEGUENZIALE A QUELLO DEL 2018. NEL 2019 E' STATA INDIVIDUATA LA SOLUZIONE E PROGETTUATA E PRESENTATO IL PROGETTO PER AUTORIZZAZIONE. ITER AUTORIZZATIVO PARTICOLARMENTE LUNGO, CONCLUSO NEL 2020 CON IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO
2017FCHA0021	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE IDRICA IN LOCALITA' FANAN	ACQUEDOTTO	Gestore	Sarsina	230.000,00	220.000,00	0	0	133.736,69	0	0	0	0	-86.263,31	-39	INTERVENTO CONCLUSO. MINORI ONERI IN FASE REALIZZATIVA
2017FCHA0026	POTENZIAMENTO DORSALE SP 138 SARSINA/QUARTO	ACQUEDOTTO	Gestore	Sarsina	1.000.000,00	0	0	0	97.221,61	0	0	0	0	97.221,61	100	SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO AL FATTO CHE SI E' VALUTATO DI REALIZZARE ANTICIPATAMENTE UN PRIMO STRALCIO DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA BONIFICA/POTENZIAMENTO DELLA RETE ESISTENTE E AVVIARE UNA RIVALUTAZIONE DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO COMPLESSIVO SARSINA/QUARTO PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE DEL II STRALCIO
2014FCHA0114	RISANAMENTO SCARICO 2: DEVIAZIONE RETE SCARICO 2	FOGNATURA	Gestore	Sarsina	110.000,00	0	0	0	49.697,70	0	0	0	0	49.697,70	100	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE, COME GIÀ INDICATO NELLE NOTE 2018, IL VERIFICARSI DI UN MOVIMENTO FRANOSO HA COMPORATO LA NECESSITA' DI VALUTARE NUOVE IPOTESI PROGETTUALI CHE HANNO DETERMINATO LO SLITTAMENTO DELL'AVVIO LAVORI AL 2019
2017FCHA0022	DEP.SAVIGNANO ADEG NTOT-COMP.OSS.+SC.IND	DEPURAZIONE	Unica Reti	Savignano sul Rubicone	4.369.141,00	1.424.000,00	0	1.424.000,00	0	0	0	0	0	-1.424.000,00	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA NEL 2019. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL FATTO CHE L'ACCORDO ATTUATIVO NON E' ANCORA SOTTOSCRITTO, PERTANTO IL CONSUNTIVO RISULTA PARI A ZERO. I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO. TALE INTERVENTO INOLTRE E' STATO RIPIANIFICATO NEL POI 2020-24, DI RECENTE APPROVAZIONE, IN RELAZIONE ALL'ATTUALE STATO DI AVANZAMENTO
2014FCHA0117	RIFACIMENTO FOGNATURA BIVIO MONTEGELLI	FOGNATURA	Gestore	Sogliano al Rubicone	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	RIPROGRAMMATO L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE PER RIDEFINIZIONE DELL'INTERVENTO LEGATA ALLA VERIFICA PUNTUALE DELLO STATO DI CONSISTENZA DELLE OPERE ESISTENTI. NON PERSISTONO AL MOMENTO CRITICITA'
2017FCHA0023	ADEGUAMENTO DEPURATORE TREDOZIO - DISINFEZIONE - REALI	DEPURAZIONE	Unica Reti	Tredozio	390.385,00	0	0	0	347.500,00	0	347.500,00	0	0	347.500,00	100	INTERVENTO CONCLUSO. ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO NEL 2019, LO SCOSTAMENTO E' DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI PREGRESSI SONO STATI RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO
2014FCHA0121	RISANAMENTO SCARICHI 7-33 - FRAZ. ALFERO	FOGNATURA	Gestore	Verghereto	3.843.000,00	380.000,00	0	0	380.000,00	39.984,98	0	0	39.984,98	-340.015,02	-89	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL PROLUNGAMENTO DELL'ITER PER L'ACQUISIZIONE AREE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
2015FCHA0035	RISANAMENTO SC.2-3 VERGHERETO	FOGNATURA	Gestore	Verghereto	257.000,00	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	0	0	-10.000,00	-100	AGGLOMERATO < 200 AE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE LA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO E' STATA POSTICIPATA IN RELAZIONE ALLE TEMPSTICHE DI ADEGUAMENTO DEFINITE DALLA DGR 201/2016 E DGR 569/2019. LA NUOVA PIANIFICAZIONE E' STATA RECEPITA NEL POI 2020-24
2017FCHA0024	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO COMUNE DI VERGHERETO	FOGNATURA	Gestore	Verghereto	150.000,00	130.000,00	0	0	130.000,00	5.508,30	0	0	5.508,30	-124.491,70	-95	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL FATTO CHE L'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE SU SP HA RICHIESTO TEMPSTICHE MAGGIORI RISPETTO A QUELLE PIANIFICATE. LA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO E' PREVISTA PER IL 2020 CON UNO SCOSTAMENTO COMPLESSIVO DI UN ANNO RISPETTO ALL'IPOTESI DI PIANO, CHE PER LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO NON DETERMINA ALCUNA CRITICITA'
Totale						11.342.000	13.000	3.441.000	7.888.000	14.156.645	0	4.645.041	9.511.604	2.814.645		

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Forlì - Cesena n. 5 del 17 dicembre 2020

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2019 - Gestore HERA S.p.A.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore
Responsabile ad interim
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 17 dicembre 2020

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Giuseppe Petetta

Il segretario verbalizzante
F.to Benedetta Casadei

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 6 maggio 2021
