

CLRA/2017/7 del 18 dicembre 2017

CONSIGLIO LOCALE DI RAVENNA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Revisione ordinaria del Programma Operativo degli interventi anno 2016 e presa d'atto del consuntivo 2016 - Gestore HERA S.p.A.**

IL COORDINATORE

F.to Antonio Bandini

CLRA/2017/7

CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA

L'anno duemiladiciassette il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 14.30 presso la sala del Consiglio della Provincia di Ravenna, si è riunito il Consiglio Locale di Ravenna convocato con lettera protocollo AT/2017/7896 del 6/12/2017.

Assume la presidenza il Coordinatore Antonio Bandini.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALFONSINE	VENTURI MAURO	SINDACO	SI	3,2301
BAGNACAVALLO	PRONI ELEONORA	SINDACO	SI	4,2542
BAGNARA DI ROMAGNA			NO	0,9101
BRISIGHELLA			NO	2,2465
CASOLA VALSENIO			NO	1,1623
CASTELBOLOGNESE	MELUZZI DANIELE	SINDACO	SI	2,4123
CERVIA	LUCCHI MICHELE	ASSESSORE	SI	6,5292
CONSELICE	ZAMBONI ROBERTO	ASSESSORE	SI	2,5543
COTIGNOLA	BALDINI PIERLUCA	ASSESSORE	SI	2,1009
FAENZA	BANDINI ANTONIO	ASSESSORE	SI	12,9909
FUSIGNANO	PASI NICOLA	SINDACO	SI	2,2502
LUGO			NO	7,8591
MASSA LOMBARDA	AVVEDUTI LAURA	ASSESSORE	SI	2,4835
RAVENNA	BARONCINI GIANANDREA	ASSESSORE	SI	31,8503
RIOLO TERME			NO	1,7425
RUSSI	CALISTI LINO	ASSESSORE	SI	2,9457
S.AGATA SUL SANTERNO	EMILIANI ENEA	SINDACO	SI	0,9962
SOLAROLO	BRICCOLANI STEFANO	ASSESSORE	SI	1,4817
PROVINCIA DI RAVENNA			NO	10,0000

Presenti n.13, quote 76,0795

Assenti n. 6, quote 23,9205

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g. Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Revisione ordinaria del Programma Operativo degli interventi anno 2016 e presa d'atto del consuntivo 2016 - Gestore HERA S.p.A.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresses forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.1 del 12 Febbraio 2016 il Consiglio locale di Ravenna ha approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. proponendo al Consiglio d'ambito la conseguente integrazione del Piano di Ambito e la variazione del Piano economico-finanziario;
- con deliberazione n. 41 del 26 luglio 2016 il Consiglio d'ambito ha approvato, per il bacino di Ravenna, la determinazione, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr.
- con deliberazione n.5 del 25 luglio 2017 del Consiglio locale di Ravenna è stata approvata la revisione, per gli anni 2017-2019 del programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito
- con deliberazione n. 12 del 27 febbraio 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare gli eventuali ritardi le cui cause

siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore HERA s.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2016 attraverso il software ARSI; con nota del 7 luglio 2017 HERA ha inoltre trasmesso una documentazione contenente, per ogni intervento compreso nella pianificazione, gli scostamenti tra i gli importi degli investimenti consuntivati nel 2016 ed i rispettivi valori di programmazione previsti nella medesima annualità.

considerato che:

- le linee guida di cui al punto precedente prevedono che nel corso dell'anno N, il Gestore, nel rispetto di condizioni ivi specificate, possa procedere alla realizzazione degli interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dal Programma degli interventi senza preventiva approvazione di una sua revisione solamente nei casi ivi contemplati.

rilevato che:

- dai dati presentati è emerso che
 - non sono stati eseguiti interventi aggiuntivi (nuovi ID) rispetto a quanto previsto dal programma operativo degli interventi 2015-19, approvato con deliberazione n. 1 del 12 febbraio 2016 del Consiglio locale di Ravenna.
 - sono stati anticipati due interventi previsti in annualità successive per un importo complessivo pari a 50.085,00 €
 - sono state effettuate chiusure di quattordici interventi già avviati per un importo complessivo di 251.816€
 - non sono stati avviati n. 18 interventi per un importo complessivo di 371.000€;
 - per 51 interventi si è rilevato uno scostamento superiore al + o – 20% del rendicontato rispetto al consuntivato: per tali interventi, rispetto ad un importo pianificato complessivo di 8.638.000€, l'importo complessivo consuntivato è stato di 6.479.050
 - per 22 interventi si è rilevato uno scostamento inferiore al + o – 20% del rendicontato rispetto al consuntivato: per tali interventi, rispetto ad un importo pianificato complessivo di 3.190.000€, l'importo complessivo consuntivato è stato di 3.410.082€.
- In conseguenza delle variazioni sopracitate, dai dati presentati si evince che il volume complessivo di investimenti realizzati nell'anno 2016 è stato pari al 83,5% del volume di investimenti programmato dal piano degli interventi 2015-2019 approvato;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che sulla base dell'istruttoria svolta, per n° 20 interventi, individuati nell'allegata TAB.2 con il relativo codice identificativo, la nota prodotta dal Gestore a giustificazione dei ritardi rilevati non é stata considerata esaustiva dalla struttura tecnica di ATERSIR: per i medesimi interventi si rende pertanto necessario avviare un supplemento di istruttoria finalizzato a valutare le eventuali azioni da intraprendere nei confronti del gestore ai sensi della vigente convenzione di regolazione del servizio;

ritenuto pertanto di prendere atto:

- delle modifiche apportate dal Gestore (anticipazione di n° 2 interventi) nel corso dell'anno 2016, modifiche che comportano una revisione del programma operativo degli interventi per l'anno 2016 e che non hanno comportato ritardi sugli altri interventi;
- del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per la versione integrale della discussione in sede di Consiglio locale si rimanda alla registrazione che viene acquisita agli atti;

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n.13, quote **76,0795**, astenuti n.0, contrari n.0;

DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche apportate dal Gestore (anticipazione dei due interventi di cui in premessa) nel corso dell'anno 2016, che comportano una revisione ordinaria del programma operativo degli interventi per l'anno 2016, e che non hanno comportato ritardi sugli altri interventi;
2. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di affidare alla struttura tecnica di ATERSIR l'incarico di svolgere un supplemento di istruttoria sui 20 interventi identificati dalla TAB.2 della relazione, allegato parte integrate della delibera, per i quali non sono state giudicate esaustive le motivazioni addotte dal gestore a giustificazione dei ritardi rilevati rispetto al cronoprogramma di pianificazione: l'approfondimento è finalizzato alla valutazione delle azioni da intraprendere nei confronti del gestore ai sensi della vigente convenzione di regolazione del Servizio Idrico.
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2016**

**GESTORE: HERA S.P.A.
SOTTOAMBITO: RAVENNA**

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2016, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Ravenna n. 01 del 12 Febbraio 2016, che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015

	PIANIFICATO 2016		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2016	
GESTORE HERA	Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 9,392,000	€ 152,833	€ 9,544,833	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
	Importo Contributo Pianificato [B]	€ 731,000	-€ 41,903	€ 689,097	Importo Contributo a Consuntivo [B]
	Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 8,661,000	€ 194,735	€ 8,855,735	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]
CONTO TERZI	Importo pianificato da soggetto investitore diverso da Hera	€ 2,807,000	-€ 2,160,059	€ 646,941	Importo a consuntivo da soggetto investitore diverso da Hera
TOTALE	Totale pianificato	€ 12,199,000	-€ 2,007,227	€ 10,191,773	Totale consuntivo


TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, considerando sia gli interventi da esso finanziati che quelli finanziati da terzi, abbia effettuato nel corso del 2016 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un 16 %, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato.

Per quanto riguarda invece la quota parte di interventi finanziati direttamente (importo netto A-B) il gestore HERA ha invece eseguito investimenti superiori per circa il 2 % rispetto al pianificato.

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato alla presente relazione.

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

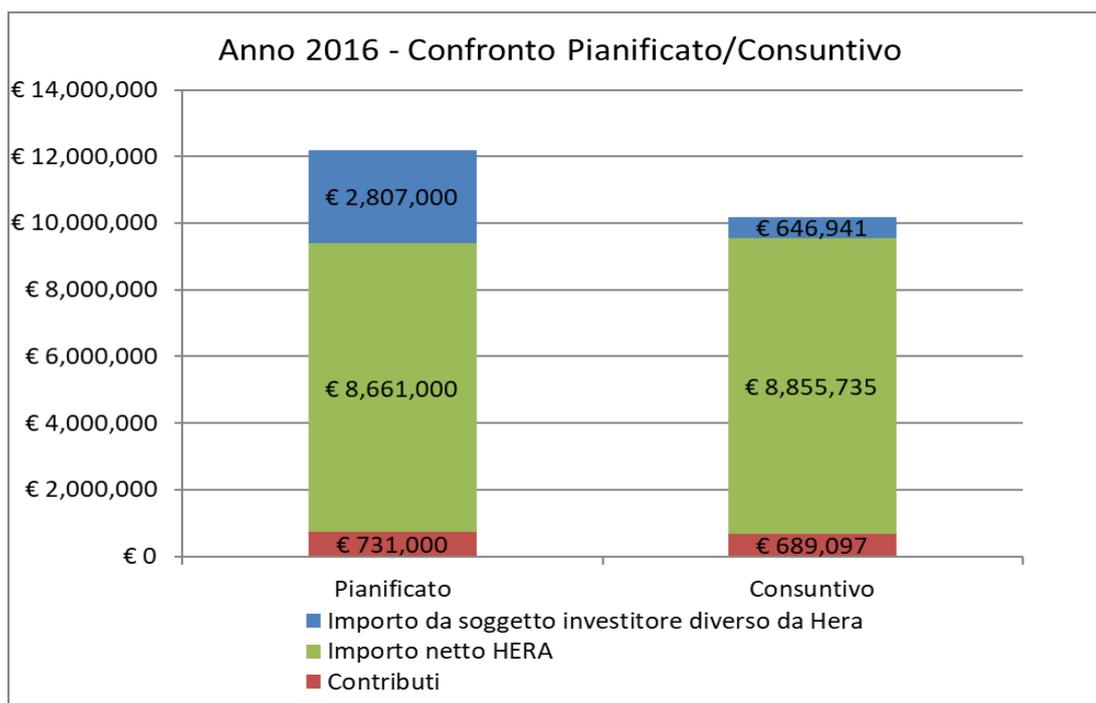

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo eventuale provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2016 (*interventi per i quali era programmato un importo diverso da zero nell'annualità 2016*): 91

Numero di interventi rendicontati nel 2016: 89

		Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2016	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2016	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR
1	Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	18	€ 0	€ 371,000	14	2015RAHA0033* 2014RAHA0063 2015RAHA0011 2014RAHA0072 2014RAHA0080 2015RAHA0013* 2015RAHA0015** 2015RAHA0022* 2015RAHA0023 2014RAHA0117 2014RAHA0130 2015RAHA0028** 2015RAHA0029*** 2014RAHA0167
2	Interventi con avvio anticipato nel 2015 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	16	€ 301,901	€ 0	0	
3	Interventi avviati nel 2016 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0	0	
4	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	51	€ 6,479,050	€ 8,638,000	6	2014RAHA0015 2014RAHA0014 2014RAHA0051 2014RAHA0052 2015RAHA0012 2014RAHA0137
5	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	22	€ 3,410,822	€ 3,190,000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA	

* Interventi per cui è stata proposta dal Gestore la rendicontazione "ad esercizio" e per i quali deve essere in tal caso prodotta la documentazione tecnica attestante l'effettivo avanzamento dell'attività

** Interventi con note giustificative che propongono modifiche unilaterali della programmazione e per i quali si richiede approfondimento. La programmazione potrà essere variata solo con delibera del C.L.


TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta quanto segue:

- il gestore non ha avviato nel 2016 n.ro 18 interventi che invece erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella 3);
- vi sono stati n.ro 16 interventi con avvio anticipato o chiusure di interventi già contenuti nel Programma operativo degli interventi; in particolare di questi solo 2 (ID 2014RAHA0031 e 2014RAHA0168) rappresentano interventi anticipati rispetto al POI per un importo totale di € 50.084,84;
- vi sono n.ro 20 interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non è stata ritenuta esaustiva e per le quali ATERSIR sta valutando quale provvedimento assumere.

Inoltre si può notare come rispetto agli 89 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 57 % di questi (51 interventi) ha avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno, con una riduzione degli importi lordi relativi a questa categoria pari al 25 % rispetto al pianificato.

Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

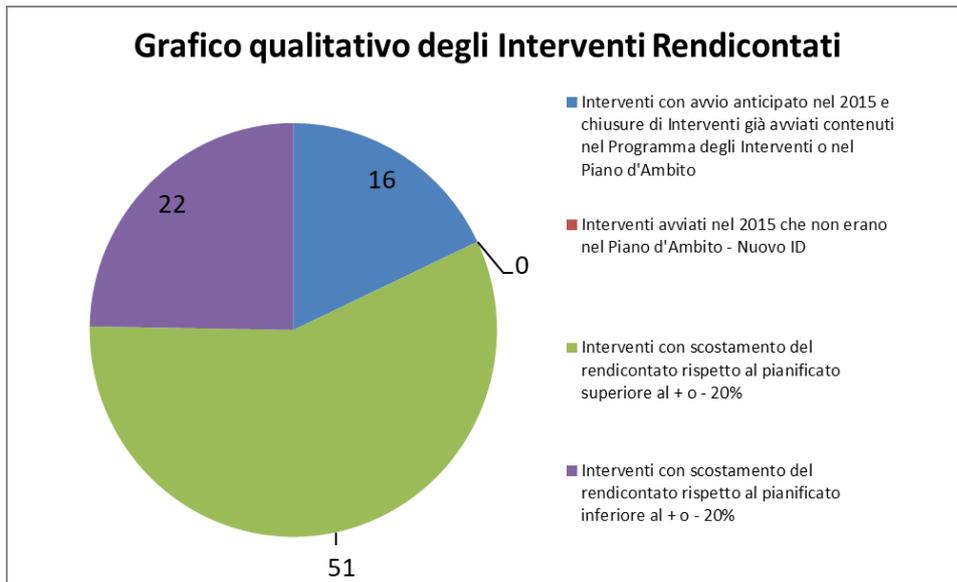

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	TIPO INVESTIMENTO . (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2016 INV. LORDI
2015RAHA0033	STUDIO PRELIMINARE FOGNATURA VIA MO	FOGNATURA	HERA	Brisighella	5,000
2014RAHA0101	SIST. APPROV. IDRICO CASTELBOLOGNESE-	ACQUEDOTTO	SOCIETA' ASSET	Castel Bolognese	150,000
2014RAHA0040	REALIZZ. COLL. F.N ZONA SUD CERVIA	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	Cervia	44,000
2014RAHA0063	COLLETT.DEP.QUART.V.DAL POZZO V.BIASC	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	Faenza	17,000
2015RAHA0011	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA S	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	Faenza	10,000
2014RAHA0072	REVAMP.DIGESTORI E GASOMETRO DEP.LUG	DEPURAZIONE	HERA	Lugo	10,000
2014RAHA0080	ADEG.RETE FOGN.S.BERNARDINO - LUGO	FOGNATURA	HERA	Lugo	10,000
2015RAHA0013	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO - LUG	FOGNATURA	HERA	Lugo	15,000
2015RAHA0015	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INT	FOGNATURA	HERA	Massa Lombarda	10,000
2015RAHA0022	MODELLAZIONE DEL SISTEMA ACQUEDOTTI	ACQUEDOTTO	HERA	Ravenna	10,000
2015RAHA0023	POTENZIAMENTO CENTRALE LIDO DI SAVIO	ACQUEDOTTO	HERA	Ravenna	5,000
2014RAHA0117	REAL.ADDUTTRICE "CORSO NORD"-3° STR.	ACQUEDOTTO	SOCIETA' ASSET	Ravenna	23,000
2014RAHA0130	ADEG. RETE FOGNARIA PONTE NUOVO	FOGNATURA	HERA	Ravenna	10,000
2014RAHA0131	COLLEGAMENTO A DEP. BORGO MONTONE	FOGNATURA	HERA	Ravenna	7,000
2015RAHA0028	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INT	FOGNATURA	HERA	Ravenna	5,000
2015RAHA0029	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INT	FOGNATURA	HERA	Ravenna	5,000
2014RAHA0167	COLL. ZA "MONALDINA NORD" - 1° STR.	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	Russi	10,000
2015RAHA0031	DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA DI SOL	ACQUEDOTTO	HERA	Solarolo	25,000
				Totale	371,000

TAB.3 Interventi previsti nel 2016 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO - (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico-Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2016			CONSUNTIVO HERA 2016					
							PIANO ATERSIR 2016 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2016 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2016 INV. NETTI	CONS 2016 INV. LORDI	CONS 2016 CONTRIBUTI	CONS 2016 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2016
2014RAHAD003	ADEG. SCOLMAT. V.ROMA E RICOST. PARATOIA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Alfonsine	190.000	0	190.000	34.098	0	34.098	-155.902	-82%	TRASCINAMENTO DI UNA PARTE DEL LAVORO AL 2017. RISPARMI IN FASE DI LAVORO
2014RAHAD015	ADEG.SCOLM-GRIGUA-SOLL.VFORMA BAGNACAV.	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Bagnacavallo	90.000	0	90.000	54.769	0	54.769	-35.231	-39%	TRASCINAMENTO DI UNA PARTE DEL LAVORO AL 2017.
2014RAHAD014	INSTALL.TLC.ADEG.PRESA-SOLL.CA'DEL VENTO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Bagnacavallo	65.000	0	65.000	18.339	0	18.339	-46.661	-72%	NEL 2015 SONO STATI NECESSARI APPROFONDIMENTI PER DEFINIRE LA REALE NECESSITÀ DELL'INTERVENTO E SUCCESSIVAMENTE ANCHE LA SOLUZIONE PROGETTUALE PIÙ ADEGUATA. PER TALE MOTIVO LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO È STATA POSTICIPATA AL 2016. CONSEGUENTE TRASCINAMENTO DI UNA PARTE DEL LAVORO AL 2017. RISPARMI IN FASE DI LAVORO
2014RAHAD011	RIF. FOGN. VIALE DANTE - VILLANOVA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Bagnacavallo	0	0	0	156	0	156	156		CODA CONTABILE
2014RAHAD020	MANUTENZIONE FOGNATURA IN V. EMILIANI	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Brisighella	94.000	0	94.000	39.051	0	39.051	-54.949	-58%	ESEGUITO SOLO IL PRIMO TRATTO DI BONIFICA. LA PARTE RESTANTE IN ACCORDO CON COMUNE E PROVINCIA È STATO INSERITO NELLA RIQUALIFICAZIONE MULTISERVIZI E RIPRISTINO ASFALTO PREVISTA NELL'ANNUALITÀ 2018.
2014RAHAD031	DEP.CERVIA: AUTOMAZ. ADEG. LIMITI AZOTO	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Cervia	0	0	0	44.257	0	44.257	44.257		INTERVENTO ANTICIPATO STANTE LA DISPONIBILITÀ ECONOMICA DETTATA DAI RITARDI DI ALCUNI INTERVENTI (CAUSA AUTORIZZAZIONI) O RISPARMI IN FASE DI ESECUZIONE
2014RAHAD035	COLLA DEP. DI MONTALETTO DI CERVIA1'E2'S	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Cervia	0	0	0	16.468	0	0	16.468		CODA INTERVENTO REALIZZATO
2014RAHAD051	ADEG. SCOLMATORE V.VIGNE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Cotignola	90.000	0	90.000	45.534	0	45.534	-44.466	-49%	INTERVENTO AVVIATO A FINE ANNO CON TRASCINAMENTO DI UNA PARTE DEL LAVORO AL 2017
2014RAHAD052	RINNOVO SOLLEVAMENTO V.GRILLI	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Cotignola	200.000	0	200.000	25.095	0	25.095	-174.905	-87%	TRASCINAMENTO DI UNA PARTE DEL LAVORO AL 2017. RISPARMI IN FASE DI LAVORO
2014RAHAD057	VERIFICA ADEG IMP EEE DIRI ATO7	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	0	0	0	25.335	0	25.335	25.335		COMPLETAMENTO ATTIVITÀ RESIDUA ANNO PRECEDENTE SULLA CABINA DI MEDIA CAUSA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE UN SEZIONATORE GENERALE.
2015RAHAD009	COLLEGAMENTO AL DEPURATORE DI FAENZA DELLE LOCALITÀ DI GRANAROLO FAENTINO E PIEVE CESATO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Faenza	0	0	0	16.107	0	16.107	16.107		MODIFICATO PROGETTO ORIGINARIO SOSPESO PER FALLENDO PIANO URBANISTICO "LE PERLE". INTERVENTO DI COLLEGAMENTO ESEGUITO DALLA GESTIONE PER GARANTIRE IL COLLETTAMENTO DI GRANAROLO FAENTINO A DEPURAZIONE
2014RAHAD068	RINNOVO RETE ACQUA V. MATTEOTTI	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Lugo	0	0	0	95.426	0	95.426	95.426		TRASCINAMENTO DAL 2015, MAGGIORI ONERI LEGATI ALLA POSA IN CENTRO STORICO
2015RAHAD012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA 2 DEL DEPURATORE DI LUGO	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Lugo	300.000	0	300.000	143.359	0	143.359	-156.641	-52%	PROBLEMI LEGATI ALLA DEFINIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI INTERVENTI SPECIFICI DA REALIZZARE.
2014RAHAD075	COMPLET. COLLEG. A DEP.NE DI VIALE DANTE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Lugo	50.000	0	50.000	20.062	0	20.062	-29.938	-60%	ECONOMIE DI SPESA
2014RAHAD112	RILIEVO RETI FOGNARIE - RA - ATO 7	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	50.000	0	50.000	5.807	0	5.807	-44.193	-88%	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. ATTIVITÀ RIDOTTA NEL 2016 MA ATTUALMENTE IN CORSO.
2014RAHAD135	ADEG. SCOLMATORI V.ROMEA SUD PONTE NUOVO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	100.000	0	100.000	5.279	0	5.279	-94.721	-95%	ANTIPIO PROGETTAZIONE NEL 2016. COMPLETAMENTO LAVORI PREVISTI NEL 2017
2014RAHAD137	IDROV. NORDCITTÀ-ADEGIMPELE X GEST POMPE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	140.000	0	140.000	22.791	0	22.791	-117.209	-84%	PROBLEMI LEGATI ALLA DEFINIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI INTERVENTI SPECIFICI DA REALIZZARE.
2014RAHAD168	COLLETTAMENTO DI UN TRATTO FOGNARIO DI S.P. 13 BASTIA ALLA DEPURAZIONE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	S. Agata sul Santeramo	0	0	0	5.828	0	5.828	5.828		ANTIPIO ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE.
2014RAHAD002	COLLEGAMENTO DEPURAZIONE BORGOCAVALLOTTI	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Alfonsine	0	-50.000	-50.000	0	-43.154	-43.154	0		
2014RAHAD004	REALIZZ. FOGNATURA VIA RASPOA ALFONSINE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Alfonsine	0	0	0	985	0	0	985		RESIDUO DI CHIUSURA CONTABILE PER ATTIVITÀ LEGATE AL TELECONTROLLO.
2014RAHAD009	POTENZ. RETE BONCELLINO -2' STRALCIO	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Bagnacavallo	215.000	0	0	16.055	0	0	-198.945	-93%	NECESSITÀ DI MODIFICARE IL PROGETTO PER RICHIESTA PROVINCIA DI ESECUZIONE POSA CON MODALITÀ NO-DIG
2014RAHAD010	DEP.BAGNACAVALLO-ADEG.POT.LIN.ACQUE	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Bagnacavallo	40.000	0	40.000	31.999	0	31.999	-8.001	-20%	RESIDUO DI CHIUSURA CONTABILE PER ATTIVITÀ LEGATE AL TELECONTROLLO.
2014RAHAD016	COLLEGAMENTO ALLA DEPURAZIONE DI MASIERA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Bagnacavallo	0	0	0	3.555	0	0	3.555		
2014RAHAD013	COLLETTAMENTO DEPURAZIONE TRAVERSARA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Bagnacavallo	0	-36.000	-36.000	0	-28.594	-28.594	0		
2014RAHAD021	ADEGU.RETE FOGNA V.FRIULI-BRISIGHELLA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Brisighella	100.000	0	0	26.975	0	0	-73.025	-73%	MODIFICATO PROGETTO CON TECNOLOGIA NO-DIG PER RIDURRE IMPATTO AMBIENTALE
2015RAHAD033	STUDIO PRELIMINARE FOGNATURA VIA MORONICO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Brisighella	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	-100%	ID DA STRALCIARE IN QUANTO TALE TIPO DI ATTIVITÀ VIENE RENDICONTATA AD ESERCIZIO. INOLTRE LA PROBLEMATICA È ASCRIBIBILE AD INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE METEO.
2014RAHAD022	AUTOMAZ. PARATAI BACINI RIO CESTINA	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Casola Valsenio	40.000	0	40.000	46.464	0	46.464	6.464	16%	
2015RAHAD004	REALIZZAZIONE COLLETTORE SCARICO POTABILIZZATORE DI CASOLA	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Casola Valsenio	20.000	0	20.000	2.856	0	2.856	-17.144	-86%	
2014RAHAD0101	SIST. APPROV. IDRICO CASTELBOLOGNESE-CONAMI	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Castel Bolognese	150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-100%	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO
2014RAHAD032	ADEG.LINEA ACQUE IMP ELET. DEP. CERVIA	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Cervia	150.000	0	150.000	63.468	0	63.468	-86.532	-58%	RALLENTAMENTO DEL CANTIERE DOVUTO AD ALCUNE CRITICITÀ CONNESSE ALLO STATO DEI CAVI DOTTI ELETTRICI ESISTENTI.
2014RAHAD037	BY-PASS FOGNATURA NORD CERVIA-2' LOTTO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Cervia	0	0	0	5.079	0	0	5.079		RESIDUO DI CHIUSURA CONTABILE
2014RAHAD041	BYPASS PRINCIPALE NORD CERVIA 3' LOTTO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Cervia	160.000	0	0	44.063	0	0	-115.937	-72%	SLITTAMENTO PER ALLUNGAMENTO ANOMALO TEMPI APPROVAZIONE COMUNE E PER RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DA ATERSIR
2015RAHAD007	MODERAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - CERVIA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Cervia	20.000	0	20.000	19.671	0	19.671	-329	-2%	
2014RAHAD040	REALIZZ. COLL. F.N ZONA SUD CERVIA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Cervia	44.000	0	0	0	0	0	-44.000	-100%	SLITTAMENTO AVVIO PROGETTAZIONE PER VERIFICARE L'IMPATTO DELL'INTERVENTO "BY-PASS FOGNARIO NORD".
2014RAHAD036	REALIZZ.IMP.SOLLEV.FOGN. TANT'ON-CERVIA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Cervia	134.000	0	0	9.923	0	0	-124.077	-93%	RITARDO AVVIO CANTIERE IMPUTABILI A TEMPI PARTICOLARMENTE LUNGI PER LA BONIFICA BELICA
2014RAHAD043	RICONFIG. ALIMENTAZIONE IDRICA LAVEZZOLA	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Conselice	140.000	0	140.000	33.055	0	33.055	-106.945	-76%	L'IMPORTO STANZIATO NEL PIANO ERA PENSATO PER ANTICIPARE UNA PARTE DEL LAVORO DI RICONFIGURAZIONE DEL SISTEMA IDRICO, IN PARTICOLARE LA DEMOLIZIONE DEL PENSOLE. LO SVILUPPO PROGETTUALE HA EVIDENZIATO LA NECESSITÀ DI GESTIRE IL TRANSITORIO IN TEMPI RISTRETTI PERTANTO NON È RISULTATO VANTAGGIOSO ANTICIPARE TALE INTERVENTO, CHE VERRÀ QUINDI REALIZZATO CONTESTUALMENTE ALLE ALTRE OPERE
2014RAHAD042	SISTE.EDILE STRUTTURALE POTAB. CONSELICE	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Conselice	116.000	0	116.000	135.125	0	135.125	19.125	16%	
2014RAHAD045	LAVEZZOLA-SEPARAZIONE FOGNE NERE ZONA FE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Conselice	225.000	0	225.000	526.533	0	526.533	301.533	134%	L'INCREMENTO DELL'IMPORTO È LEGATO ALL'AVANZAMENTO OPERATIVO DEL CANTIERE E ALLE VARIANTI IN FASE DI REALIZZAZIONE A CAUSA DELLE INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI INIZIALMENTE SEGNALATI IN POSIZIONE DIVERSA.
2014RAHAD053	NUOVA FOG.V.DEL RIO BARBIANO COTIGNOLA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Cotignola	100.000	0	100.000	110.284	0	110.284	10.284	10%	
2014RAHAD056	EST.RETE LOC. REDA - II LOTTO - CONAMI	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Faenza	0	0	0	65.951	0	0	65.951		ALCUNI LAVORI RESIDUI SONO STATI CONTABILIZZATI NEI PRIMI MESI DEL 2016, INOLTRE STIPULA DI SERVITU' DA CONTABILIZZARE AL 2016
2014RAHAD055	EST.RETE LOC. REDA - II LOTTO - HERA	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Faenza	100.000	-200.000	-100.000	136.291	-180.053	-43.762	36.291	36%	I MAGGIORI ONERI SONO RICONDUCEBILI A 2 PRINCIPALI FATTORI DI CUI UNO LEGATO AD UNA RIDUZIONE DELLE ADESIONI DA PARTE DELLE UTENZE PRIVATE INIZIALMENTE CONVOLUTE NELL'INIZIATIVA (QUOTA NON RAPPRESENTATA NEL PIANO ATERSIR IN QUANTO RELATIVA ALLA QUOTA PARTE A CARICO DELLE UTENZE PRIVATE), E MAGGIORI COSTI LEGATI ALLE STIPULE DELLE SERVITU' INIZIALMENTE NON PREVENTIVATI.
2014RAHAD063	COLLETT. DEP. QUART. V. DAL POZZO V. BIASOLA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Faenza	17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-100%	RIPROGRAMMATO L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE IN QUANTO SONO NECESSARIE VERIFICHE PRELIMINARI PROPEDEUTICHE ALLA SCELTA DELLE LINEE PROGETTUALI.
2014RAHAD062	MODELL. SISTEMA FOGNARIO FAENZA (IND. STUDIO DI FATTIBILITÀ PER CRITICITÀ VIA LAPI)	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Faenza	6.000	0	6.000	11.797	0	11.797	5.797	97%	
2015RAHAD011	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SOLLEVAMENTO BAMBOLE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Faenza	10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-100%	RIPLANIFICAZIONE AVVIO PROGETTAZIONE PER RIVALUTAZIONE PRIORITÀ
2014RAHAD072	REVAMP.DIGESTORI E GASOMETRO DEP.LUGO	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Lugo	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	RIPLANIFICAZIONE AVVIO PROGETTAZIONE PER RIVALUTAZIONE PRIORITÀ
2014RAHAD090	ADEG.RETE FOGN. S. BERNARDINO - LUGO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Lugo	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	RIPROGRAMMATO L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE IN QUANTO SONO NECESSARIE VERIFICHE PRELIMINARI PROPEDEUTICHE ALLA SCELTA DELLE LINEE PROGETTUALI.
2014RAHAD082	COLLA DEP.S.BERNARDINO E LIMIT. LUGO2'1S	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Lugo	15.000	0	0	14.439	0	0	-561	-4%	
2014RAHAD083	COLLA DEP.S.BERNARDINO E LIMIT. LUGO2'S	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Lugo	15.000	0	0	10.350	0	0	-4.650	-31%	
2014RAHAD079	COLLEG. A DEP. AREA OVEST - I' STR.	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Lugo	70.000	0	70.000	10.023	0	10.023	-59.977	-86%	RIPROGRAMMATO PER ALLUNGAMENTO ANOMALO TEMPI CONCESSIONE RFI
2014RAHAD085	COLLEG. A DEP.LA VIGOLA V.MONDANGA-LUGO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Lugo	16.000	0	0	84.203	0	0	68.203	426%	RITARDO LAVORI PREVISTI NEL 2015 ED ESEGUITI NEL 2016
2014RAHAD074	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI FRASCATA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Lugo	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-88.211	0	
2014RAHAD111	DISMIS.DEP.GIOVECCA E COLLETA CONSELICE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Lugo	67.000	0	67.000	37.927	0	37.927	-29.073	-43%	ECONOMIE CONSEGUITE
2015RAHAD013	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO - LUGO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Lugo	15.000	0	15.000	0	0	0	-15.000	-100%	ID DA STRALCIARE IN QUANTO L'ATTIVITÀ VIENE RENDICONTATA AD ESERCIZIO.

ID ATERSI	TIPOLO ID ATERSI	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO - (Gestore o Società Asse)	TIPO ID ATERSI (Specifico-Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSI 2016			CONSUNTIVO HERA 2016					
							PIANO ATERSI 2016 INV. LORDI	PIANO ATERSI 2016 CONTRIBUTI	PIANO ATERSI 2016 INV. NETTI	CONS 2016 INV. LORDI	CONS 2016 CONTRIBUTI	CONS 2016 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2016
2014RAHAD086	SIST.FOGNA MADONNA STUOIE-1'E2'STR	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Lugo	350.000	0	0	137.230	0	0	-212.770	-61%	AVVIO LAVORI RITARDATO PER PROBLEMI NELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CON IMPRESA
2015RAHAD015	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - MASSALOMBARDA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Massa Lombarda	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	L'IMPORTO PREVISTO PER IL 2016 ERA RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI MODELLAZIONE CHE VERRA' RENDICONTATA AD ESERCIZIO. L'INTERVENTO ESECUTIVO E' STATO PIANIFICATO IN COERENZA CON LE TEMPISTICHE DETTATE DALLA DGR 201/2016.
2014RAHAD092	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-RA-ATO7	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	120.000	0	120.000	159.354	0	159.354	39.354	33%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2015RAHAD016	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - RA - ATO 7	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	10.000	0	10.000	36.977	0	36.977	26.977	270%	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITA'. INTERVENTI IN CORSO.
2014RAHAD090	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RA - ATO7	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	450.000	0	450.000	446.479	0	446.479	-3.521	-1%	
2015RAHAD017	RECUPERO AREE SERBATOI PENSI DISMESSI RA-ATO7	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	100.000	0	100.000	7.646	0	7.646	-92.354	-92%	RIPROGRAMMAZIONE DEGLI IMPORTI NEGLI ANNI NECESSARIA PER TENER CONTO DEI TEMPI AUTORIZZATIVI DI OGNI SINGOLO INTERVENTO
2014RAHAD091	RINN. RETI ACQUA PROGRAMMATO - RA-ATO 7	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	1.250.000	0	1.250.000	1.348.777	0	1.348.777	98.777	8%	
2014RAHAD093	RINN. RETI/ALL. ACQUA DA PI - RA-ATO 7	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	1.100.000	0	1.100.000	872.334	0	872.334	-227.666	-21%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE. COMPENSAZIONE ID 2014RAHAD091.
2014RAHAD094	RIPRASFALTI RETE IDRICA - RA - ATO7	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	250.000	0	250.000	221.053	0	221.053	-28.947	-12%	
2014RAHAD173	SOST. CTR PARI CALIBRO - RA - ATO7	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	100.000	0	100.000	165.349	0	165.349	65.349	65%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI SOSTITUZIONE CONTATORI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RAHAD177	TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACQ.-RA-ATO7	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	20.000	0	20.000	37.796	0	37.796	17.796	89%	
2015RAHAD018	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - RA - ATO 7	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	90.000	0	90.000	65.033	0	65.033	-24.967	-28%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RAHAD102	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RA - ATO 7	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	1.275.000	0	1.275.000	1.844.257	0	1.844.257	569.257	45%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2015RAHAD019	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE - RA-ATO7	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	10.000	0	10.000	12.818	0	12.818	2.818	28%	
2014RAHAD105	MANUT. STRA. IMP. FOGNATURA - RA-ATO 7	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	370.000	0	370.000	710.772	0	710.772	340.772	92%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RAHAD106	RINN RETI. FOG. PROGRAMMATO-RA-ATO 7	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	500.000	0	500.000	773.763	-42.639	731.124	273.763	55%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RAHAD178	RINN. RETI/ALL. FOG. DA PI - RA-ATO 7	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	600.000	0	600.000	623.175	0	623.175	23.175	4%	
2014RAHAD107	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - RA-ATO 7	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	50.000	0	50.000	48.955	0	48.955	-1.045	-2%	
2015RAHAD020	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI - RA - ATO7	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	15.000	0	15.000	20.418	0	20.418	5.418	36%	
2015RAHAD022	MODELLAZIONE DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DI RAVENNA	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	ID DA STRALCIARE IN QUANTO L'ATTIVITA' VIENE RENDICONTATA AD ESERCIZIO.
2015RAHAD023	POTENZIAMENTO CENTRALE LIDO DI SAVIO	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	-100%	RIPROGRAMMATE LE ATTIVITA' RELATIVE ALL'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE NELL'ANNO SUCCESSIVO.
2014RAHAD118	REAL.ADDUTTRICE "CORSO NORD"-2' STRAL	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	153.000	0	0	19.478	0	0	-133.522	-87%	SLITTAMENTO PER ALLUNGAMENTO ANOMALO TEMPI APPROVAZIONE COMUNE
2014RAHAD117	REAL.ADDUTTRICE "CORSO NORD"-3' STR.	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-100%	POSTICIPATO PER RIDEFINIZIONE ORDINE PRIORITA' DEGLI INTERVENTI E RELATIVO AVVIO DELLA PROGETTAZIONE
2014RAHAD122	ADEG. DEPURAZIONE LIDO DI CLASSE	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	24.000	0	24.000	25.984	0	25.984	1.984	8%	
2014RAHAD125	DEP. RAVENNA: REAL. NUOVA LINEA ACQUE	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	50.000	0	50.000	13.374	0	13.374	-36.626	-73%	PARTITA L'ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE DELLO STATO DI FATTO, MA ATTIVITA' PROGETTUALE VERA E PROPRIA E RALLENTATA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN ATTESA DEL CONSOLIDAMENTO DEI DATI RELATIVI ALLE PREVISIONI URBANISTICHE DEL COMUNE DI RAVENNA AL FINE DI CALIBRARE CORRETTAMENTE L'INVESTIMENTO
2015RAHAD025	REALIZZAZIONE MODELLO DEPURATORE RAVENNA	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	30.000	0	30.000	28.279	0	28.279	-1.721	-6%	
2014RAHAD127	REVAMPING DEPURATORE DI RAVENNA 2'LOTTO (FANGHI E OSSIDAZIONE)	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	933.000	0	0	28.624	0	0	-904.376	-97%	RITARDI CAUSA ITER AUTORIZZATIVI PARTICOLARMENTE LUNGHI
2014RAHAD124	REVAMPING LINEA ACQUE DEP. RAVENNA	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	34.000	0	34.000	53.311	0	53.311	19.311	57%	
2014RAHAD132	ADEG. FOG. SANTERNO E PIANGIPANE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	0	-345.000	-345.000	-793	-306.447	-307.240	-793		INTERVENTO CONCLUSO, LO SCOSTAMENTO E' LEGATO AD UNA VARIAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO A FONDO PERDUTO
2014RAHAD130	ADEG. RETE FOGNARIA PONTE NUOVO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	AVVIO DELLA PROGETTAZIONE SHIFATA PER VERIFICHE PROPEDEUTICHE NECESSARIE ALLA SCELTA DELLE LINEE PROGETTUALI.
2015RAHAD032	TRATTO DI RETE DI FOGNATURA VIA BONIFICA - PORTO FUORI	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	90.000	0	90.000	89.720	0	89.720	-280	0%	
2014RAHAD149	COLLEG. A DEPURAZIONE DI ERBOSA-RAVENNA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	0	0	0	285	0	0	285		CODA CONTABILE
2014RAHAD148	COLLEG. A DEP. DI DURAZZANO-RAVENNA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	0	0	0	285	0	0	285		CODA CONTABILE
2014RAHAD156	COLLEG. A DEP. DI PORTO FUORI, RAVENNA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	0	0	0	9.156	0	0	9.156		RESIDUO DI CHIUSURA CONTABILE
2014RAHAD155	COLLEG. A DEP. DI VIA CANALAZZO, RAVENNA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	407.000	0	0	18.579	0	0	-388.421	-95%	SLITTAMENTO PER ALLUNGAMENTO ANOMALO INVIO CONVENZIONE RFI
2014RAHAD150	COLLEG. A DEP. DI MASSA CASTELLO, RAVENNA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	5.000	0	0	9.229	0	0	4.229	85%	
2014RAHAD154	COLLEG. A DEPURAZ. BOTTEGA LA GUARNERA,RAV	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	0	0	0	12.744	0	0	12.744		ULTIME ATTIVITA' LEGATE A COLLAUDI/TELECONTROLLO/SERVITU'
2014RAHAD151	COLLEG. A DEPURAZ.MENSA-MATELLICA,RAVENNA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	10.000	0	0	6.568	0	0	-3.432	-34%	
2014RAHAD144	COLLEG. A DEPURAZIONE BASTIA-B.PASNA,RAV.	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	5.000	0	0	10.899	0	0	5.899	118%	
2014RAHAD146	COLLEG. A DEPURAZIONE CONVITTELLO RAV	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	10.000	0	0	3.598	0	0	-6.402	-64%	
2014RAHAD147	COLLEG. A DEPURAZIONE DI DUCENTA,RAVENNA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	5.000	0	0	85.478	0	0	80.478	1610%	SLITTAMENTO TEMPORALE DEL LAVORO
2014RAHAD145	COLLEG. A DEPURAZIONE, B.PAPA'E-RAVENNA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	0	0	0	285	0	0	285		CODA CONTABILE
2014RAHAD131	COLLEGAMENTO A DEP. BORGIO MONTONE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	7.000	0	7.000	0	0	0	-7.000	-100%	ID CONCLUSO
2014RAHAD134	MANUT. STRAORDINARIA IDROVORA BIDENTE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	17.000	0	17.000	18.970	0	18.970	1.970	12%	
2014RAHAD138	MODELL. SISTEMA FOGNARIO RAVENNA (incl. STUDIO DI FATTIBILITA' PER INTERVENTI SU PRINCIPALI SCOLMATORI)	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	50.000	0	50.000	31.329	0	31.329	-18.671	-37%	
2015RAHAD028	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - LIDO DI CLASSE E LIDO DI SAVIO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	-100%	L'IMPORTO PREVISTO PER IL 2016 ERA RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI MODELLAZIONE CHE VERRA' RENDICONTATA AD ESERCIZIO. L'INTERVENTO ESECUTIVO E' STATO PIANIFICATO IN COERENZA CON LE TEMPISTICHE DETTATE DALLA DGR 201/2016.
2015RAHAD029	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - MARINA DI RAVENNA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	-100%	L'IMPORTO PREVISTO PER IL 2016 ERA RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI MODELLAZIONE CHE VERRA' RENDICONTATA AD ESERCIZIO. L'INTERVENTO ESECUTIVO E' STATO PIANIFICATO IN COERENZA CON LE TEMPISTICHE DETTATE DALLA DGR 201/2016.
2014RAHAD141	RIFAC. SOLL. GAMBELLARA-RAVENNA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	60.000	0	60.000	4.532	0	4.532	-55.468	-92%	RALLENTAMENTO PER NECESSITA' DI ACQUISIRE DATI DI INPUT E RICOSTRUIRE LO STATO DI FATTO DEL SISTEMA
2014RAHAD140	RIFAC. SOLL. RAGONE-RAVENNA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	59.000	0	59.000	12.521	0	12.521	-46.479	-79%	RALLENTAMENTO PER NECESSITA' DI ACQUISIRE DATI DI INPUT E RICOSTRUIRE LO STATO DI FATTO DEL SISTEMA
2014RAHAD164	ADEG.RETE FOGN.ARTIG. RUSSI-FIUMAZZOO2'ST.	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Russi	10.000	0	0	3.392	0	0	-6.608	-66%	
2014RAHAD165	ADEG.RETE FOGN.ZONA ARTIG. RUSSI 3'STR.	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Russi	10.000	0	0	3.064	0	0	-6.936	-69%	
2014RAHAD167	COLL. ZA "MONALDINA NORD" - 1' STR.	FOGNATURA	ATO 7 - RA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Russi	10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-100%	SHIFATO ALL'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE PER VERIFICHE/ATTIVITA' PROPEDEUTICHE PER LA SCELTA DELLE LINEE PROGETTUALI
2014RAHAD162	COMPL. FOGNA VIA GUCCI S.GIOV. 3' STR.	FOGNATURA	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Russi	88.000	0	88.000	105.821	0	105.821	17.821	20%	
2015RAHAD031	DISTRIBUZIONE RETE IDRICA DI SOLAROLO	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	HERA	SPECIFICO	Solarolo	25.000	0	25.000	0	0	0	-25.000	-100%	POSTICIPATO AL 2017 PER VINCOLI AUTORIZZATIVI
Totale							12.199.000	-731.000	8.661.000	10.191.773	-689.097	8.855.735	-2.007.227		

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 7 del 18 dicembre 2017

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Revisione del Programma Operativo degli interventi anno 2016 e presa d'atto del consuntivo 2016 - Gestore HERA S.p.A.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 18 dicembre 2017

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Antonio Bandini

Il segretario verbalizzante
F.to Stefano Santandrea

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna 11 gennaio 2018

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna
