

CLRA/2019/4 del 9 dicembre 2019

CONSIGLIO LOCALE DI RAVENNA

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2018 - Gestore HERA S.p.A.

IL COORDINATORE

F.to Antonio Bandini

CLRA/2019/4

CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA

L'anno **2019** il giorno 9 del mese di Dicembre alle ore 14.30 presso la sala del Consiglio della Provincia di Ravenna, si è riunito il Consiglio Locale di Ravenna convocato con lettera protocollo PG.AT/2019/0007617 del 27/11/2019.

Assume la presidenza il Coordinatore Antonio Bandini.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALFONSINE	RICCARDO GRAZIANI	SINDACO	SI	3,2301
BAGNACAVALLO	SIMONE VENIERI	ASSESSORE	SI	4,2542
BAGNARA DI ROMAGNA			NO	0,9101
BRISIGHELLA			NO	2,2465
CASOLA VALSENIO	ANTONIO BANDINI	ASSESSORE	SI*	1,1623
CASTELBOLOGNESE	GASPARE MINZONI	ASSESSORE	SI	2,4123
CERVIA	ENRICO MAZZOLANI	ASSESSORE	SI	6,5292
CONSELICE	PAOLA PULA	SINDACO	SI	2,5543
COTIGNOLA	PIERLUCA BALDINI	ASSESSORE	SI	2,1009
FAENZA	ANTONIO BANDINI	ASSESSORE	SI	12,9909
FUSIGNANO	NICOLA PASI	SINDACO	SI	2,2502
LUGO	MARIAPIA GALLETTI	ASSESSORE	SI	7,8591
MASSA LOMBARDA	LAURA AVVEDUTI	ASSESSORE	NO**	2,4835
RAVENNA	GIANANDREA BARONCINI	ASSESSORE	SI	31,8503
RIOLO TERME	GIAN MARCO LANZONI	ASSESSORE	SI	1,7425
RUSSI	MIRCO FREGA	ASSESSORE	SI	2,9457
S.AGATA SUL SANTERNO			NO	0,9962
SOLAROLO	STEFANO BRICCOLANI	SINDACO	SI	1,4817
PROVINCIA DI RAVENNA			NO	10,0000

(*) Il sindaco del Comune di Casola Valsenio ha delegato il coordinatore Antonio Bandini, assessore del Comune di Faenza.

(**) L'assessore del Comune di Massa Lombarda, Laura Avveduti, è stata presente fino alle ore 15,50, e non ha pertanto partecipato alle votazioni.

Presenti n.14, quote 83,36

Assenti n. 5, quote 16,64

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g. Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2018 - Gestore HERA S.p.A.**

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 1 del 12 febbraio 2016 il Consiglio locale di Ravenna ha approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. proponendo al Consiglio d'ambito la conseguente integrazione del Piano di Ambito e la variazione del Piano economico-finanziario;
- con deliberazione n. 41 del 26 luglio 2016 il Consiglio d'ambito ha approvato, per il bacino di Ravenna, la determinazione, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr;
- con deliberazione n. 5 del 25 luglio 2017 il Consiglio locale di Ravenna ha approvato la revisione, per gli anni 2017-2019, del programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che:

- il gestore HERA s.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2018 attraverso il software ARSI;

dato atto che la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato che dai dati presentati è emerso quanto segue:

- il gestore non ha avviato nel 2018 n. 27 interventi che invece erano stati programmati come da tabella 2 della relazione allegata;
- vi sono stati n. 18 interventi con avvio anticipato o chiusure di interventi già contenuti nel POI;
- vi sono n. 17 interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non è stata ritenuta esaustiva e per le quali ATERSIR sta valutando quale provvedimento assumere;

ritenuto pertanto di prendere atto:

- del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2018 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per la versione integrale della discussione in sede di Consiglio locale si rimanda alla registrazione che viene acquisita agli atti;

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli **n.14**, quote 83,36, astenuti n.0, contrari n.0;

DELIBERA

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2018 dal gestore HERA S.p.A. come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare alla struttura tecnica di ATERSIR l'incarico di svolgere un supplemento di istruttoria sui 17 interventi identificati nella TAB.2 della relazione di cui all'allegato 1, parte integrante della delibera, per i quali non sono state giudicate esaustive le motivazioni addotte dal gestore a giustificazione dei ritardi rilevati rispetto al cronoprogramma di pianificazione: l'approfondimento è finalizzato alla valutazione delle azioni da

intraprendere nei confronti del gestore ai sensi della vigente convenzione di regolazione del Servizio Idrico.

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2018**

**GESTORE: HERA S.P.A.
BACINO TARIFFARIO: RAVENNA**

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2018

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2018, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Ravenna n. 01 del 12 Febbraio 2016 e successivamente modificato nel corso del 2017 con delibera n.ro 05 del 25 Luglio 2017 e delibera n.ro 02 del 23 Aprile 2018, che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015

	PIANIFICATO 2018		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2018	
GESTORE HERA	Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 11.966.500	-€ 1.430.495	€ 10.536.005	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
	Importo Contributo Pianificato [B]	€ 40.000	€ 169.626	€ 209.626	Importo Contributo a Consuntivo [B]
	Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 11.926.500	-€ 1.600.121	€ 10.326.379	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]
CONTO TERZI	Importo pianificato da soggetto investitore diverso da Hera	€ 2.759.000	-€ 1.612.053	€ 1.146.947	Importo a consuntivo da soggetto investitore diverso da Hera
TOTALE	Totale pianificato	€ 14.725.500	-€ 3.042.548	€ 11.682.952	Totale consuntivo

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, considerando sia gli interventi da esso finanziati che quelli finanziati da terzi, abbia effettuato nel corso del 2018 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un 20,7 %, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato.

Per quanto riguarda invece la quota parte di interventi finanziati direttamente (importo netto A-B) il gestore HERA ha invece eseguito investimenti inferiori per circa il 13,4 % rispetto al pianificato.

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato alla presente relazione.

Anno 2018 - Confronto Pianificato/Consuntivo

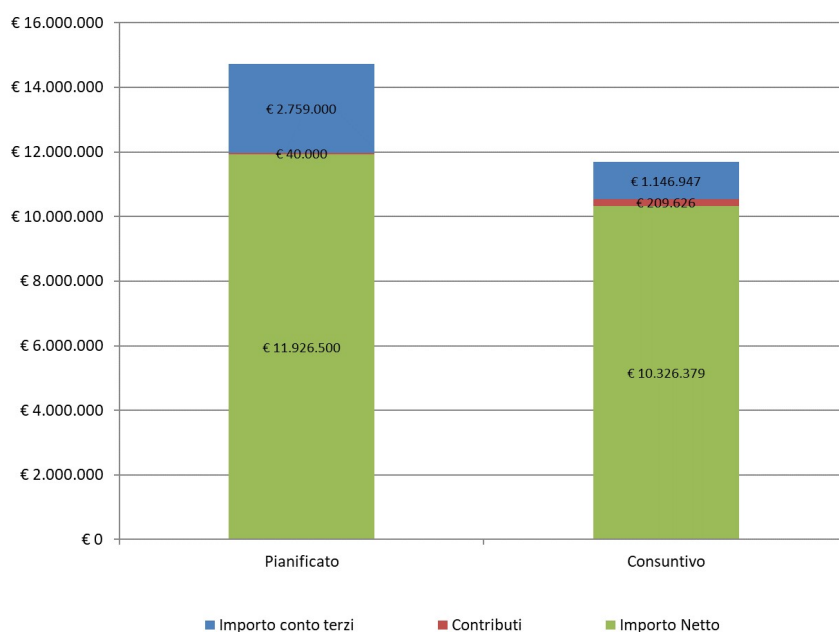


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo eventuale provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2018 (*interventi per i quali era programmato un importo diverso da zero nell'annualità 2018*): 75

Numero di interventi rendicontati nel 2018: 66

		Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2018	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2018	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR
1	Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	27	€ 0	€ 2.738.000	17	2018RAHA0006; 2015RAHA0010; 2015RAHA0011; 2015RAHA0014; 2014RAHA0080; 2017RAHA0004; 2017RAHA0005; 2018RAHA0007; 2017RAHA0007; 2014RAHA0143; 2015RAHA0027; 2017RAHA0009; 2014RAHA0163; 2014RAHA0119; 2014RAHA0159; 2015RAHA0030; 2015RAHA0002
2	Interventi con avvio anticipato nel 2018 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	18	€ 1.279.770	€ 0	0	
3	Interventi avviati nel 2018 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0	0	
4	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	37	€ 5.918.081	€ 7.384.000	0	
5	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	11	€ 4.485.101	€ 4.603.500		GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA


TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta quanto segue:

- il gestore non ha avviato nel 2018 n.ro 27 interventi che invece erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella 3);
- vi sono stati n.ro 18 interventi con avvio anticipato o chiusure di interventi già contenuti nel Programma operativo degli interventi; di questi solo n.ro 4 interventi (ID 2014RAHA0001, 2018RAHA0008, 2014RAHA0031, 2018RAHA0009) rappresentano degli anticipi di interventi programmati nelle annualità successive;
- vi sono 17 interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non è stata ritenuta esaustiva e per le quali ATERSIR sta valutando quale provvedimento assumere.
- Vi sono n.ro 8 interventi per i quali il gestore ha indicato come motivazione "ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO". Tale motivazione, pur essendo esaustiva del disallineamento da un punto di vista contabile, non fornisce indicazioni sul reale stato d'avanzamento dell'intervento (ID 2014RAHA0101, 2014RAHA0040, 2017RAHA0017, 2014RAHA0120, 2018RAHA0014, 2014RAHA0158, 2018RAHA0015, 2014RAHA0167)

Inoltre si può notare come rispetto ai 66 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 56 % di questi (37 interventi) ha avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno, con una riduzione degli importi lordi relativi a questa categoria pari al 20 % rispetto al pianificato.

Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

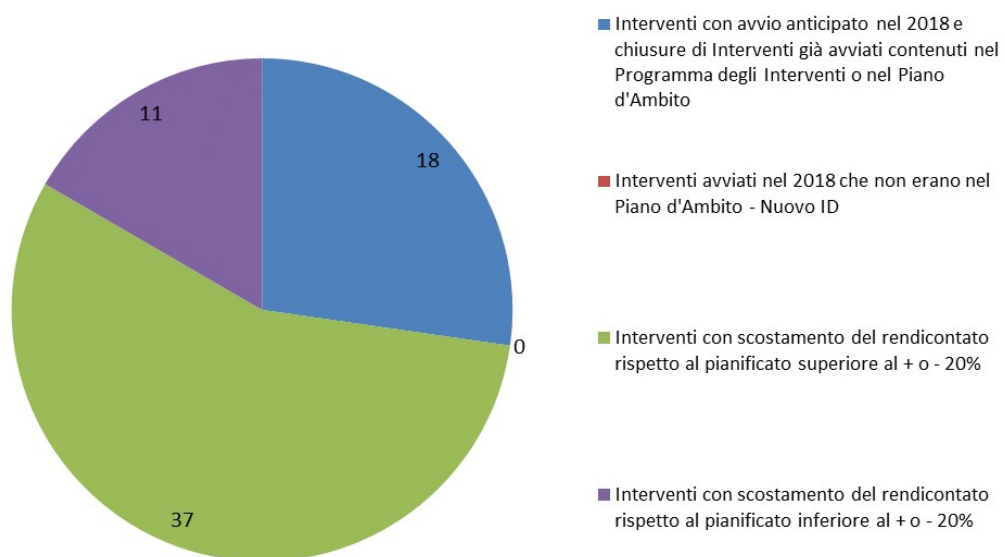

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO . (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico- Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2018 INV. LORDI
2015RAHA0002	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - BAGNACAVALLO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	SPECIFICO	Bagnacavallo	10.000,00
2014RAHA0101	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE -CONAMI	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	CONAMI	SPECIFICO	Castel Bolognese	355.000,00
2014RAHA0040	REALIZZ. COLL. F.N ZONA SUD CERVIA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Romagna Acque	SPECIFICO	Cervia	74.000,00
2017RAHA0017	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI LAVEZZOLA	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Gestore	SPECIFICO	Conselice	50.000,00
2018RAHA0006	LAVEZZOLA-SEPARAZIONE FOGNE NERE ZONA INDUSTRIALE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore		Conselice	10.000,00
2015RAHA0010	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORE VIA BOARIA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Romagna Acque		Faenza	10.000,00
2015RAHA0011	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SOLLEVAMENTO BAMBOLE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Romagna Acque	CUMULATIVO	Faenza	280.000,00
2015RAHA0014	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA DEPURATORE DI LUGO	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Romagna Acque	SPECIFICO	Lugo	10.000,00
2014RAHA0080	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SAN BERNARDINO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	SPECIFICO	Lugo	310.000,00
2017RAHA0004	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA CENNACHIARA	FOGNATURA		Gestore		Lugo	20.000,00
2017RAHA0005	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA PASTORELLA LOCALITA' VOLTANA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	CUMULATIVO	Lugo	20.000,00
2018RAHA0007	INTERVENTO INTEGRATIVO VIA LATO DI MEZZO-LUGO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	SPECIFICO	Lugo	10.000,00
2014RAHA0119	REALIZZAZIONE ADDUTTRICE ""CORSO NORD""- IV STRALCIO	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Romagna Acque	SPECIFICO	Ravenna	85.000,00
2014RAHA0120	COMPLCOND.IDRICARAVENNANORDCASALBORSETTI	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Romagna Acque	SPECIFICO	Ravenna	80.000,00
2014RAHA0123	Depuratore Ravenna - Adeguamento Linea Fanghi	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Gestore	SPECIFICO	Ravenna	50.000,00
2017RAHA0007	DEP. RAVENNA: FILTRAZIONE E DISINFEZIONE	DEPURAZIONE		Gestore		Ravenna	20.000,00
2018RAHA0014	DEPURATORE RAVENNA: REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ACQUE	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Romagna Acque	SPECIFICO	Ravenna	150.000,00
2014RAHA0143	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA PORTO FUORI	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	SPECIFICO	Ravenna	10.000,00
2014RAHA0158	REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO SN1 VIA CHERSO - DARSENA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Romagna Acque	SPECIFICO	Ravenna	693.000,00
2014RAHA0159	REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO SN3 ROTONDA BELGIO - DARSENA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Romagna Acque	SPECIFICO	Ravenna	290.000,00
2015RAHA0027	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - SOLLEVAMENTO NORD CITTA'	FOGNATURA		Romagna Acque		Ravenna	20.000,00
2017RAHA0009	COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLE RETI IN LOCALITA' CASALBORSETTI	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	SPECIFICO	Ravenna	10.000,00
2017RAHA0011	RICOSTRUZIONE PREMENTE PORTO CORSINI	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	SPECIFICO	Ravenna	20.000,00
2018RAHA0015	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN ZONA PORTO S.VITALE ZONA SAPIR	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Romagna Acque	SPECIFICO	Ravenna	30.000,00
2014RAHA0163	COLLEGAMENTO ZONA ARTIGIANALE MONALDINA NORD - II STRALCIO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	SPECIFICO	Russi	8.000,00
2014RAHA0167	COLLETTAMENTO ZA ""MONALDINA NORD"" - I STRALCIO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Romagna Acque	SPECIFICO	Russi	103.000,00
2015RAHA0030	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - RUSSI	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	SPECIFICO	Russi	10.000,00
						Totale	2.738.000

TAB.3 Interventi previsti nel 2018 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2018			CONSUNTIVO HERA 2018					
						PIANO ATERSIR 2018 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2018 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2018 INV. NETTI	CONS 2018 INV. LORDI	CONS 2018 CONTRIBUTI	CONS 2018 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	SCOSTAMENTO %	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2018
2014RAHA0001	DEPURATORE ALFONSINE:AUTOMAZIONE PER ADEG.LIM.AZOTO	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Gestore	Alfonsine	0	0	0	325,88	0	325,88	325,88	100	AVVIATE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NELL'OTTICA DI RISPETTARE I TEMPI FISSATI DALLA DGR 201/2016
2017RAHA0020	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA VIA BASSA - LONGASTRINO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Alfonsine	40.000,00	0	40.000,00	2.948,18	0	2.948,18	-37.051,82	-92	E' STATO EFFETTUATO INCONTRO CON IL COMUNE IL 18/6/18. IL SINDACO AVREBBE DOVUTO CONVOCARE UN INCONTRO CON IL CONSORZIO DI BONIFICA ENTRO LA PRIMA METÀ DI LUGLIO 2018 PER DEFINIRE I LIMITI DI PROGETTO. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON HA DATO SEGUITO A QUANTO CONCORDATO.
2014RAHA0009	Potenziamento Rete Boncellino - Il stralcio	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Romagna Acque	Bagnacavallo	0	0	0	53.496,22	0	0	53.496,22	100	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. PER LO SCOSTAMENTO 2018 SI RIMANDA ALLE MOTIVAZIONI ANNI PRECEDENTI.
2015RAHA0002	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - BAGNACAVALLO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Bagnacavallo	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	-10.000,00	-100	
2017RAHA0001	OTTIMIZZAZIONE SIST.FOG.SU SCOLO REDINO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Bagnacavallo	300.000,00	0	300.000,00	13.357,34	0	13.357,34	-286.642,66	-95	INIZIATA PROGETTAZIONE E AVVIATO ITER AUTORIZZATIVO. INVIATO PROGETTO A FERSERVIZI A INIZIO 2019.
2015RAHA0003	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE VILLA VEZZANO	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Gestore	Brisighella	20.000,00	0	20.000,00	30.026,61	0	30.026,61	10.026,61	50	
2014RAHA0020	MANUTENZIONE FOGNATURA IN V.EMILIANI	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Brisighella	0	0	0	36.069,61	0	36.069,61	36.069,61	100	LAVORO CONCLUSO NEL 2018 (LAVORI RESIDUI RISPETTO A QUELLI GIÀ ESEGUITI COME DA PRECEDENTI CONSUNTIVI). VEDI NOTE ANNO 2017
2014RAHA0021	ADEGUAMENTO RETE FOGNA V.FRIULI	FOGNATURA	ATO 7 - RA	CONAMI	Brisighella	185.000,00	0	0	1.895,22	0	0	-183.104,78	-98	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. PER LO SCOSTAMENTO 2018 SI RIMANDA ALLE MOTIVAZIONI ANNI PRECEDENTI.
2015RAHA0004	REALIZZAZIONE COLLETTORE SCARICO POTABILIZZATORE DI CASOLA	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Gestore	Casola Valsenio	0	0	0	25.685,44	0	25.685,44	25.685,44	100	SCOSTAMENTO LEGATO ALLA RIPIANIFICAZIONE GIÀ MOTIVATA NELL'ANNO PRECEDENTE.
2018RAHA0008	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN ACC LAGHI DEL CESTINA - FSC Scheda 25	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Gestore	Casola Valsenio	0	0	0	234,45	0	234,45	234,45	100	SCOSTAMENTO LEGATO ALL'AVVIO DI ATTIVITA' DI VALUTAZIONE PRELIMINARE
2015RAHA0005	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CASOLA VALSENIO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Casola Valsenio	40.000,00	0	40.000,00	426,89	0	426,89	-39.573,11	-98	LO SCOSTAMENTO È LEGATO UNICAMENTE ALL'ASPETTO DI REDICONTAZIONE ECONOMICA, IN QUANTO I LAVORI DEL COLLETTAMENTO DEI REFLUI SONO INIZIATI A FINE 2018 ED IN CONCLUSIONE NEI PRIMI MESI DEL 2019 (A LIVELLO DI RENDICONTAZIONE ECONOMICA SE NE HA EVIDENZA SOLO A PARTIRE DELLA CONTABILITÀ DEL 2019). LE OPERE DI COMPLETAMENTO (ADEGUAMENTO SCOLMATORE, DEMOLIZIONE VECCHI MANUFATTI, RICOSTRUZIONE CANALE SCOLO ETC.) SONO STATE RIPROGRAMMATE IN ACCORDO COL COMUNE DI CASOLA, PER ESSERE REALIZZATE CONTEMPORANEAMENTE A LORO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ.
2014RAHA0101	SISTEMA APPROVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE -CONAMI	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	CONAMI	Castel Bolognese	355.000,00	0	0	0	0	0	-355.000,00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2015RAHA0006	POTENZIAMENTO RETE IDRICA MILANO MARITTIMA	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Gestore	Cervia	280.000,00	0	280.000,00	37.252,45	0	37.252,45	-242.747,55	-86	BLOCCO ALL'AVVIO DEL CANTIERE PER CONTENZIOSO APERTO TRA IMPRESA ESECUTRICE E CONSORZIO AFFIDATARIO
2014RAHA0029	ADEGUAMENTO DEPURATORE DI CERVIA E NUOVA VASCA DI EGUALIZZAZIONE	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Gestore	Cervia	110.000,00	0	110.000,00	75.213,81	0	75.213,81	-34.786,19	-31	SCOSTAMENTO FIOLOGICO, L'AVANZAMENTO RISULTA IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE
2014RAHA0031	DEPURATORE CERVIA: AUTOMAZIONE ADEGUAMENTO LIMITI AZOTO	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Gestore	Cervia	0	0	0	125.586,27	0	125.586,27	125.586,27	100	COME MOTIVATO NELLE NOTE 2016 E 2017 L'INTERVENTO E' STATO ANTICIPATO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE, STANTE LA DISPONIBILITÀ ECONOMICA DETTATA DAI RITARDI DI ALCUNI INTERVENTI O RISPARMI IN FASE DI ESECUZIONE
2014RAHA0040	REALIZZ. COLL. F.N ZONA SUD CERVIA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Romagna Acque	Cervia	74.000,00	0	0	0	0	0	-74.000,00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2014RAHA0041	BYPASS PRINCIPALE NORD CERVIA III LOTTO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Romagna Acque	Cervia	394.000,00	0	0	429.562,29	0	0	35.562,29	9	
2017RAHA0002	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO CERVIA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Cervia	100.000,00	0	100.000,00	91.148,47	0	91.148,47	-8.851,53	-8	
2014RAHA0043	RICONFIGURAZIONE ALIMENTAZIONE IDRICA LAVEZZOLA	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Gestore	Conselice	0	0	0	49.496,08	0	49.496,08	49.496,08	100	INTERVENTO IN FASE GARA. LO SCOSTAMENTO 2018 E' CONSEQUENZIALE ALLA RIPIANIFICAZIONE DELLE ANNUALITÀ 2016-2017. LE MOTIVAZIONI DELLE RIPIANIFICAZIONI 2016-2017 SONO GIÀ STATE ADDOTTE NELLE NOTE DELLE RISPETTIVE ANNUALITÀ.
2018RAHA0009	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN PVC - FSC Scheda 26	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Gestore	Conselice	0	0	0	239,64	0	239,64	239,64	100	SCOSTAMENTO LEGATO ALL'AVVIO DI ATTIVITA' DI VALUTAZIONE PRELIMINARE
2017RAHA0017	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI LAVEZZOLA	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Gestore	Conselice	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	-50.000,00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2018RAHA0006	LAVEZZOLA-SEPARAZIONE FOGNE NERE ZONA INDUSTRIALE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Conselice	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	-10.000,00	-100	
2014RAHA0055	ESTENSIONE RETE LOC.REDA III LOTTO - HERA	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Gestore	Faenza	0	0	0	27.703,00	0	27.703,00	27.703,00	100	INTERVENTO TERMINATO. COSTI FINALI PER STIPULA SERVITU'
2014RAHA0056	ESTENSIONE RETE LOC.REDA III LOTTO - CONAMI	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	CONAMI	Faenza	0	0	0	4.089,54	0	0	4.089,54	100	SCOSTAMENTO LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLA ATTIVITA' DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETÀ DEGLI ASSET CHE HA FINANZIATO L'INTERVENTO. L'INTERVENTO E' STATO TECNICAMENTE CONCLUSO NEL 2016
2015RAHA0010	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORE VIA BOARIA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Romagna Acque	Faenza	10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00	-100	
2015RAHA0011	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SOLLEVAMENTO BAMBOLE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Romagna Acque	Faenza	280.000,00	0	0	0	0	0	-280.000,00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018. PROGETTAZIONE NON AVVIATA: INTERVENTO MENO COGENTE IN QUANTO NEL RECENTE PASSATO, ESSENDO DIMINuite LE PORTATE IN ARRIVO AL DEPURATORE, SONO MENO FREQUENTI LE ATTIVAZIONI DELLO SCOLMATORE IN TEMPO DI PIOGGIA. E' IN CORSO UNA RICOGNIZIONE DELL'INTERO SISTEMA FOGNARIO CITTADINO, PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE. SI È QUINDI RITENUTO NECESSARIO RIPIANIFICARE L'INIZIO DELLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO, ANCHE TENENDO CONTO DELLA PRIORITÀ 2018 DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DEGLI SCARICHI DGR 201/2016
2014RAHA0071	ADEGUAMENTO DEPURATORE LUGO:REALIZZAZIONE LINEA DI PIOGGIA	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Gestore	Lugo	65.000,00	0	65.000,00	66.299,52	0	66.299,52	1.299,52	1	

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2018			CONSUNTIVO HERA 2018					
						PIANO ATERSIR 2018 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2018 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2018 INV. NETTI	CONS 2018 INV. LORDI	CONS 2018 CONTRIBUTI	CONS 2018 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	SCOSTAMENTO %	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2018
2015RAHA0012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA 2 DEL DEPURATORE	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Gestore	Lugo	600.000,00	0	600.000,00	48.580,06	0	48.580,06	-551.419,94	-91	NEL CORSO DEL 2018 SI SONO REGISTRATI RITARDI NELL'AVVIO DEI LAVORI DOVUTI ALLE TEMPORANEE DI RILASCIO DA PARTE DEGLI ENTI (COMUNE DI LUGO) DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE A FINE 2018. L'INTERVENTO VERRA' CONCLUSO NEL CORSO DEL 2019, CON UNA PREVISIONE DI CONSUNTIVO FINALE IN LINEA CON L'IMPORTO PROGETTO DELIBERATO
2015RAHA0014	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA DEPURATORE DI LUGO	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Romagna Acque	Lugo	10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00	-100	
2014RAHA0079	COLLEGAMENTO A DEPURATORE AREA OVEST - I STRALCIO (Balzarina)	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Lugo	0	0	0	247.823,78	0	247.823,78	247.823,78	100	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2018 E' CONSEQUENZIALE AL RECUPERO DELLE REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE ANNUALITA' 2016-2017. LE MOTIVAZIONI DELLE RIPIANIFICAZIONI 2016-2017 SONO GIA' STATE ADDOTTE NELLE NOTE DELLE RISPETTIVE ANNUALITA'.
2014RAHA0080	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SAN BERNARDINO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Lugo	310.000,00	0	310.000,00	0	0	0	-310.000,00	-100	RIPROGRAMMATO L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE IN QUANTO SONO NECESSARIE VERIFICHE PRELIMINARI PROPEDEUTICHE ALLA SCELTA DELLE LINEE PROGETTUALI.
2014RAHA0082	COLLEGAMENTO A DEPURATORE S.BERNARDINO E LIMITROFI- LUGO I STRALCIO	FOGNATURA		Romagna Acque	Lugo	0	0	0	370.841,82	0	0	370.841,82	100	INTERVENTO TERMINATO. SCOSTAMENTO LEGATO AL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET FINANZIARIE. SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 EMESSO A NOVEMBRE 2018.
2014RAHA0086	Sistemazione Fogna Madonna Stuoie-1E II STRALCIO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Romagna Acque	Lugo	0	0	0	19.500,00	0	0	19.500,00	100	INTERVENTO TERMINATO NEL 2018. LO SCOSTAMENTO 2018 RISPETTO ALL'IMPORTO DI PIANO E' CONSEQUENZIALE ALLO SCOSTAMENTO DEL 2017, GIA' MOTIVATO.
2017RAHA0003	ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA BEDAZZO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Lugo	20.000,00	0	20.000,00	2.374,96	0	2.374,96	-17.625,04	-88	
2017RAHA0004	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA CENNACHIARA	FOGNATURA		Gestore	Lugo	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	-20.000,00	-100	
2017RAHA0005	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA PASTORELLA LOCALITA' VOLTANA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Lugo	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	-20.000,00	-100	
2018RAHA0007	INTERVENTO INTEGRATIVO VIA LATO DI MEZZO-LUGO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Lugo	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	-10.000,00	-100	
2014RAHA0089	ADEGUAMENTO DEPURATORE MASSA LOMBARDA LIMITI AZOTO	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Gestore	Massa Lombarda	52.000,00	0	52.000,00	35.908,34	0	35.908,34	-16.091,66	-30	
2018RAHA0011	CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE STRADALI	ACQUE BIANCHE	ATO 7 - RA	Gestore	Opere Pluricomunali	97.500,00	0	97.500,00	88.322,79	0	88.322,79	-9.177,21	-9	
2018RAHA0012	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA	ACQUE BIANCHE	ATO 7 - RA	Gestore	Opere Pluricomunali	90.000,00	0	90.000,00	41.951,18	0	41.951,18	-48.048,82	-53	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI SISTEMI DI ACQUE METEORICHE
2014RAHA0090	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - RA	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Gestore	Opere Pluricomunali	490.000,00	0	490.000,00	347.021,81	0	347.021,81	-142.978,19	-29	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE, COMPENSATO DA MAGGIORI INTERVENTI DI BONIFICA IN AMBITO RETI ID 2014RAHA0093.
2014RAHA0091	RINNOVO RETI ACQUA PROGRAMMATO - RA-ATO 7	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Gestore	Opere Pluricomunali	1.485.000,00	0	1.485.000,00	1.302.220,88	209.626,10	1.092.594,78	-182.779,12	-12	
2014RAHA0092	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO - RA	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Gestore	Opere Pluricomunali	150.000,00	0	150.000,00	129.866,73	0	129.866,73	-20.133,27	-13	
2014RAHA0093	RINNOVO RETI/ALLACCI ACQUA DA PI - RA-ATO 7	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Gestore	Opere Pluricomunali	1.050.000,00	0	1.050.000,00	1.325.773,69	0	1.325.773,69	275.773,69	26	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI RINNOVO A SEGUITO DI ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO
2014RAHA0094	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA RA	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Gestore	Opere Pluricomunali	200.000,00	0	200.000,00	311.958,60	0	311.958,60	111.958,60	55	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI RIPRISTINO ASFALTI CONCOMITANTE A MAGGIORI INTERVENTI DI RINNOVO RETI ID 2014RAHA0093.
2014RAHA0173	Sostituzione contatori di pari calibro - RA	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Gestore	Opere Pluricomunali	177.000,00	0	177.000,00	195.530,82	0	195.530,82	18.530,82	10	
2014RAHA0177	Telecontrollo e automazione impianti acquedotto	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Gestore	Opere Pluricomunali	20.000,00	0	20.000,00	50.717,47	0	50.717,47	30.717,47	153	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2015RAHA0016	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - RA	ACQUEDOTTO		Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0	10.000,00	813,98	0	813,98	-9.186,02	-91	
2015RAHA0017	RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Gestore	Opere Pluricomunali	267.000,00	0	267.000,00	22.747,12	0	22.747,12	-244.252,88	-91	ID CHE RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEI PENSILI. LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA PER SINGOLO ANNO INSERITA NEL PIANO E' DI LARGA MASSIMA; OGNI ANNO VENGONO AVVIATE LE ATTIVITA' RITENUTE NECESSARIE DAL SERVIZIO, TENENDO CONTO DELLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA DI TALI INTERVENTI. NEL 2018 SONO AVANZATE LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE AREA PENSILE SOLAROLO E BAGNARA
2015RAHA0024	VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI ACQUEDOTTO - RA	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Gestore	Opere Pluricomunali	30.000,00	0	30.000,00	310,27	0	310,27	-29.689,73	-98	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L'ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 7. GLI IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL'ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. POSTICIPATO L'AVVIO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN QUANTO AL MOMENTO NON RISULTANO DELLE COGENTI ESIGENZE LEGATE ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI. PREVISTO AVVIO DELLE PRIME VERIFICHE NEL 2018.
2018RAHA0016	Manutenzione straord. impianti acq. industriale	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0	10.000,00	30.091,45	0	30.091,45	20.091,45	200	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2018RAHA0017	Rinnovo reti acq. industriale	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Gestore	Opere Pluricomunali	40.000,00	0	40.000,00	184.052,82	0	184.052,82	144.052,82	360	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RAHA0102	MANUT. STRA. IMP. DEPURAZIONE - RA - ATO7	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Gestore	Opere Pluricomunali	1.315.000,00	0	1.315.000,00	1.298.669,20	0	1.298.669,20	-16.330,80	-1	
2015RAHA0018	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE RA	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Gestore	Opere Pluricomunali	90.000,00	0	90.000,00	237.930,04	0	237.930,04	147.930,04	164	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE FINALIZZATA ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2015RAHA0019	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0	10.000,00	25.893,25	0	25.893,25	15.893,25	158	
2014RAHA0105	MANUT.STRA. IMP.FOENATURA - RA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Opere Pluricomunali	370.000,00	0	370.000,00	682.810,79	0	682.810,79	312.810,79	84	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RAHA0106	RINNOVO RETI FOG. PROGRAMMATO - RA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Opere Pluricomunali	500.000,00	0	500.000,00	923.968,68	0	923.968,68	423.968,68	84	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2018			CONSUNTIVO HERA 2018					NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2018
						PIANO ATERSIR 2018 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2018 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2018 INV. NETTI	CONS 2018 INV. LORDI	CONS 2018 CONTRIBUTI	CONS 2018 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	SCOSTAMENTO %	
2014RAHA0107	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - RA	FOGNATURA		Gestore	Opere Pluricomunali	75.000,00	0	75.000,00	139.935,36	0	139.935,36	64.935,36	86	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RAHA0112	RILIEVO RETI FOGNARIE - RA - ATO 7	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Opere Pluricomunali	50.000,00	0	50.000,00	264.517,93	0	264.517,93	214.517,93	429	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E PIANIFICATO IN MODO OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE ATTIVITÀ ANNUALI SVOLTE SONO LEGATE ALLE ESIGENZE MANIFESTATESI NELL'ANNUALITA' STESSA.
2014RAHA0178	RINNOVO RETI/ALLACCI FOG. DA PI - RA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Opere Pluricomunali	600.000,00	0	600.000,00	635.068,43	0	635.068,43	35.068,43	5	
2015RAHA0020	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Opere Pluricomunali	17.000,00	0	17.000,00	66.682,86	0	66.682,86	49.682,86	292	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO
2014RAHA0119	REALIZZAZIONE ADDUTTRICE ""CORSO NORD"" - IV STRALCIO	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Romagna Acque	Ravenna	85.000,00	0	0	0	0	0	-85.000,00	-100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'ID DEVE ESSERE STRALCIATO IN QUANTO IL 4° STRALCIO VIENE PIANIFICATO E REALIZZATO INSIEME AL 3° STRALCIO E QUINDI ACCORPANDO GLI ID. VEDI ID 2014RAHA0117.
2014RAHA0120	COMPLCOND.IDRICARAVENNANORDCASALBORSETTI	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Romagna Acque	Ravenna	80.000,00	0	0	0	0	0	-80.000,00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2015RAHA0023	POTENZIAMENTO CENTRALE LIDO DI SAVIO	ACQUEDOTTO	ATO 7 - RA	Gestore	Ravenna	300.000,00	0	300.000,00	37.093,72	0	37.093,72	-262.906,28	-87	SCOSTAMENTO DOVUTO A QUANTO GIA' INDICATO NELLE MOTIVAZIONI DEL 2016 (RIPROGRAMMAZIONE DELL'ANNO DI AVVIO DELLA PROGETTAZIONE). PREVISTA L'ESECUZIONE TRA L'AUTUNNO 2019 E LA PRIMAVERA 2020
2014RAHA0122	ADEGUAM. DEP. LIDO DI CLASSE - I STRALCIO	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Gestore	Ravenna	200.000,00	0	200.000,00	232.178,49	0	232.178,49	32.178,49	16	
2014RAHA0123	Depuratore Ravenna - Adeguamento Linea Fanghi	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Gestore	Ravenna	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	-50.000,00	-100	INTERVENTO LEGATO AD ID 2014RAHA0124 (LINEA ACQUE), RIPROGRAMMATO L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE PER TENERE CONTO DELL'AGGIORNAMENTO DEI DATI DI INPUT
2014RAHA0124	REVAMPING LINEA ACQUE DEP. RAVENNA	DEPURAZIONE		Gestore	Ravenna	585.000,00	0	585.000,00	167.861,25	0	167.861,25	-417.138,75	-71	LAVORI IN CORSO, LO SCOSTAMENTO ANNUALE NON PREGIUDICA LA FINE LAVORI PREVISTA, CHE RISULTA COERENTE CON PIANICAZIONE ATERSIR
2014RAHA0127	REVAMPING DEPURATORE RAVENNA II LOTTO (FANGHI, OSS.)	DEPURAZIONE		Ravenna Holding	Ravenna	0	0	0	267.562,12	0	0	267.562,12	100	INTERVENTO IN CORSO. LO SCOSTAMENTO E' CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE 2016/2017 GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI.
2017RAHA0007	DEP. RAVENNA: FILTRAZIONE E DISINFEZIONE	DEPURAZIONE		Gestore	Ravenna	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	-20.000,00	-100	
2018RAHA0014	DEPURATORE RAVENNA: REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ACQUE	DEPURAZIONE	ATO 7 - RA	Romagna Acque	Ravenna	150.000,00	0	0	0	0	0	-150.000,00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2014RAHA0130	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA PONTE NUOVO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Ravenna	340.000,00	0	340.000,00	22.072,87	0	22.072,87	-317.927,13	-93	SCOSTAMENTO CONSEGUENTE ALLE TEMPISTICHE NECESSARIE ALL'OTTENIMENTO DEGLI ACCORDI BONARI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE. ACCORDI INIZIATI A MARZO 2018 E CONCLUSI A OTTOBRE 2018.
2014RAHA0131	COLLEGAMENTO A DEP. BORGIO MONTONE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Ravenna	0	0	0	3.716,46	0	3.716,46	3.716,46	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO RELATIVO AL PERFEZIONAMENTO DELLE SERVITÙ
2014RAHA0134	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDROVORA BIDENTE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Ravenna	433.000,00	0	433.000,00	71.618,96	0	71.618,96	-361.381,04	-83	INTERVENTO IN CORSO. LO SCOSTAMENTO E' CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE 2016/2017 GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI.
2014RAHA0137	IDROVORA NORDCITTA'-ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO X GEST.POMPE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Ravenna	0	0	0	1.327,60	0	1.327,60	1.327,60	100	INTERVENTO CONCLUSO. COMPLETATE ATTIVITA DI CONTABILIZZAZIONE NEL 2018
2014RAHA0140	RIFACIEMNTO SOLLEVAMENTO RAGONE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Ravenna	0	0	0	15.249,12	0	15.249,12	15.249,12	100	IN SEGUITO AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE SONO MIGLIORATE LE PRESTAZIONI DEL SOLLEVAMENTO RENDENDO MENO URGENTE L'INTERVENTO.
2014RAHA0141	RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO GAMBELLARA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Ravenna	0	0	0	30.822,89	0	30.822,89	30.822,89	100	SCOSTAMENTO LEGATO ALL'AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO DI INTERVENTO (REALIZZAZIONE ULTERIORE SOLLEVAMENTO) PER COLLEGARE NUOVE ZONE ALLA RETE FOGNARIA CHE VA AL DEPURATORE DI RUSSI. NECESSARI TEMPI MAGGIORI. INTERVENTO IN APPALTO.
2014RAHA0143	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA PORTO FUORI	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Ravenna	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	-10.000,00	-100	
2014RAHA0158	REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO SN1 VIA CHERSO - DARSENA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Romagna Acque	Ravenna	693.000,00	0	0	0	0	0	-693.000,00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2014RAHA0159	REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO SN3 ROTONDA BELGIO - DARSENA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Romagna Acque	Ravenna	290.000,00	0	0	0	0	0	-290.000,00	-100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID RISULTA DA STRALCIARE IN QUANTO L'INTERVENTO SULLA "DARSENA" VIENE PIANIFICATO E REALIZZATO ALL'INTERNO DELL' ID 2014RAHA0158-REAL. SOLL. SN1 VIA CHERSO - DARSENA
2015RAHA0027	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - SOLLEVAMENTO NORD CITTA'	FOGNATURA		Romagna Acque	Ravenna	20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00	-100	
2017RAHA0009	COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLE RETI IN LOCALITA' CASALBORSETTI	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Ravenna	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	-10.000,00	-100	
2017RAHA0010	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO RAVENNA	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Ravenna	100.000,00	0	100.000,00	158.123,13	0	158.123,13	58.123,13	58	INTERVENTO IN CORSO. ANTICIPATI LAVORI PREVISTI PER LE ANNUALITA' SUCCESSIVE.
2017RAHA0011	RICOSTRUZIONE PREMENTE PORTO CORSINI	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Ravenna	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	-20.000,00	-100	INTERVENTO RIPROGRAMMATO PERCHE' LEGATO ALLA REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO 2017RAHA0008.
2017RAHA0018	REALIZZAZIONE OPERE BACINI 1 E 2 ED ALTRI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Ravenna	40.000,00	40.000,00	0	438.566,80	0	438.566,80	398.566,80	996	TERMINATA PROGETTAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2018 E' LEGATO AL FATTO CHE L'IMPORTO IPOTIZZATO A PIANO PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ERA SOLO INDICATIVO DEL FATTO CHE DOVEVANO ESSERE AVVIATE TALI ATTIVITA', MA NON ERA STATO DIMENSIONATO NELL'ANNUALITA' IN MODO CONGRUO AL TIPO DI INTERVENTO DA PROGETTARE.
2018RAHA0002	POTENZIAMENTO COLLETTORE PORTO CORSINI-DEPURATORE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Ravenna	20.000,00	0	20.000,00	16.233,86	0	16.233,86	-3.766,14	-18	
2018RAHA0003	RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA-1" stralcio	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Ravenna	20.000,00	0	20.000,00	8.539,77	0	8.539,77	-11.460,23	-57	
2018RAHA0015	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN ZONA PORTO S.VITALE ZONA SAPIR	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Romagna Acque	Ravenna	30.000,00	0	0	0	0	0	-30.000,00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2014RAHA0163	COLLEGAMENTO ZONA ARTIGIANALE MONALDINA NORD - II STRALCIO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Russi	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0	-8.000,00	-100	
2014RAHA0167	COLLETTAMENTO ZA ""MONALDINA NORD"" - I STRALCIO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Romagna Acque	Russi	103.000,00	0	0	0	0	0	-103.000,00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2015RAHA0030	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - RUSSI	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Russi	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	-10.000,00	-100	

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO . (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2018			CONSUNTIVO HERA 2018					NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2018
						PIANO ATERSIR 2018 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2018 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2018 INV. NETTI	CONS 2018 INV. LORDI	CONS 2018 CONTRIBUTI	CONS 2018 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	SCOSTAMENTO %	
2017RAHA0014	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO RUSSI	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Russi	350.000,00	0	350.000,00	4.441,98	0	4.441,98	-345.558,02	-98	SLITTAMENTO TEMPORICHE A CAUSA DELLE DIFFICOLTÀ ALL' OTTENIMENTO DELLE SERVITÙ E ACQUISTO AREA CON I PRIVATI. ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA IN VIA DI CONCLUSIONE NEL CORSO DEL 2019
2017RAHA0015	ADEGUAMENTO FOGNATURA TRATTO MAZZARI SOLLEVAMENTO VIA GIARDINO	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Sant'Agata sul Santerno	220.000,00	0	220.000,00	677,48	0	677,48	-219.322,52	-99	SLITTAMENTO CAUSATO DALLA NECESSITÀ DI ATTENDERE GLI ACCORDI CON L'AZIENDA INTERESSATA AI LAVORI E LA FORMALIZZAZIONE DELLE SERVITÙ CON PRIVATI. NEL 2019 SI È AVVIATA LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA CON PREVISIONE DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA NEL BIENNIO 2019/2020
2017RAHA0016	RICOSTRUZIONE PREMENTE SOLLEVAMENTO MADONNA DELLA SALUTE	FOGNATURA	ATO 7 - RA	Gestore	Solarolo	30.000,00	0	30.000,00	103.923,64	0	103.923,64	73.923,64	246	L'ID PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI 2 STRALCI. IL 1° STRALCIO È STATO COMPLETATO NEL CORSO DEL 2018. L'IMPORTO PIANIFICATO PREVEDEVA LA REALIZZAZIONE ANCHE DEL SECONDO STRALCIO CHE È STATO POSTICIPATO AL FINE DI VALUTARE GLI EFFETTI INDOTTI DAL PRIMO INTERVENTO, PER MEGLIO DEFINIRE LA SOLUZIONE PROGETTUALE DEL 2° STRALCIO
Totale						14.725.500	40.000	11.926.500	11.682.952	209.626	10.326.379	-3.042.548		

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 4 del 9 dicembre 2019

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2018 - Gestore HERA S.p.A.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 9 dicembre 2019

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Antonio Bandini

Il segretario verbalizzante
F.to Stefano Santandrea

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 31 marzo 2020

il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna
