

CLRN/2020/7 del 18 dicembre 2020

CONSIGLIO LOCALE DI RIMINI

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2017 - Gestore HERA S.p.A.

IL COORDINATORE

F.to Rizio Santi

CLRN/2020/7

CONSIGLIO LOCALE di RIMINI

L'anno **2020** il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 11.30, si è riunito il Consiglio Locale di Rimini, convocato con lettera protocollo PG.AT/2020/0009026 del 14/12/2020, in seduta telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Riziero Santi.

Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI RIMINI	Santi Riziero	Presidente	sì	10,0000
BELLARIA IGEA MARINA	Ceccarelli Adele	Assessore	sì	5,0261
CASTELDELICI				0,4582
CATTOLICA	Gennari Mariano	Sindaco	sì	4,5123
CORIANO	Pazzaglia Anna	Assessore	sì	2,8705
GEMMANO	Santi Riziero	Sindaco	sì	0,6362
MAIOLO				0,5596
MISANO ADRIATICO	Piccioni Fabrizio	Sindaco	sì	3,4304
MONDAINO				0,7089
MONTEFIORE CONCA				0,8987
MONTEGRIDOLFO				0,6052
MONTESCUDO - MONTE COLOMBO				2,3552
MORCIANO DI ROMAGNA				2,0811
NOVAFELTRIA				2,1793
PENNABILLI				1,1056
POGGIO TORRIANA	Antonini Franco	Vicesindaco	sì	1,5948
RICCIONE	Galassi Gabriele	Assessore	sì	9,0400
RIMINI	Brasini Gianluca	Assessore	sì	35,4884
SALUDECIO				1,1084
SAN CLEMENTE	Cecchini Mirna	Sindaco	sì	1,6637
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	Gabellini Nicola	Assessore	sì	2,6050
SAN LEO				1,0938
SANT'AGATA FELTRIA				0,9201
SANTARCANGELO DI ROMAGNA	Garattoni Angela	Assessore	sì	5,5920
TALAMELLO				0,6130
VERUCCHIO				2,8534

Presenti n. 12, quote 82,4594

Assenti n. 14, quote 17,5406

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2017 - Gestore HERA S.p.A.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di approvazione dei piani d’ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 4 del 18 dicembre 2015 del Consiglio locale di Rimini è stato approvato il programma operativo degli interventi 2015-19 del servizio idrico integrato (POI), proponendo al Consiglio d’ambito la conseguente revisione del programma degli interventi di cui al Piano d’Ambito approvato con deliberazione n. 47 del 29 settembre 2015 del Consiglio d’ambito;
- con deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2016 del Consiglio d’ambito è stata approvata l’integrazione dei Piani di Ambito vigenti nei territori delle ex Province di Modena, Forlì-Cesena, Ferrara e Rimini conseguentemente all’ approvazione del consuntivo degli interventi anno 2014 e all’approvazione del programma degli interventi 2015-2019 di cui alla schema regolatorio AEEGSII;
- Con deliberazione n. 5 del 1 febbraio 2017 del Consiglio Locale di Rimini è stata approvata una revisione straordinaria del Programma degli interventi 2016-2019, mantenendo invariate le previsioni di pianificazione dell’annualità 2016 ed introducendo per il triennio 2017-2019 alcune variazioni proposte dal gestore e condivise con le amministrazioni comunali variazioni;
- con deliberazione del Consiglio Locale n. 2 del 15 giugno 2018 il Consiglio Locale di Rimini ha approvato la revisione straordinaria del Programma Operativo degli Interventi 2016-19 per il territorio della provincia di Rimini relativamente alle annualità 2018 e 2019, e contestualmente è stata integrata ed aggiornata la pianificazione d’Ambito per il periodo 2016-2039;
- con deliberazione n. 50 del 28 giugno 2018 il Consiglio d’Ambito ha approvato l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria allora vigente (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione tariffaria per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, anche per il bacino di Rimini. Con tale deliberazione, fra l’altro, si è dato atto che il PdI-cronoprogramma degli investimenti,

redatto secondo lo schema previsto dall'Autorità di Regolazione, era stato predisposto modificando alcuni importi di interventi già esistenti e/o introducendo nuovi interventi al fine di rispettare gli adempimenti richiesti per l'adeguamento agli standard della RQTI (deliberazione ARERA n. 917/2017/R/idr) e che pertanto l'approvazione dell'atto di ATERSIR ha costituito modifica e integrazione dei POI approvati dai Consigli Locali;

- con deliberazione di Consiglio d'ambito n. 76 del 10/12/2018 è stato approvato l'aggiornamento complessivo del Piano d'ambito, compresa la parte B –Programma degli Interventi, documento ricompreso nella documentazione di gara per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo;

considerato altresì che:

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che il gestore HERA s.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2017 attraverso il software ARSI;

dato atto altresì che la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato che dai dati presentati è emerso quanto segue:

- il gestore non ha avviato n. 30 interventi che invece erano stati programmati come da tabella 2 della relazione allegata;
- vi è stato 1 intervento con avvio anticipato o chiusura di interventi già avviati contenuti nel POI;
- vi sono stati 4 interventi oggetto di nulla osta della struttura tecnica di ATERSIR rilasciato nella annualità 2017 ai sensi della deliberazione C.A.M.B. n.75/2017, identificati con i seguenti ID: 2017RNHA0031 (nulla osta PG.AT/2017/0004397 del 20/07/2017); 2018RNHA0001, 2018RNHA0002; 2018RNHA0003 (nulla osta PG.AT/2017/0008162 del 18/12/2017);

ritenuto pertanto di prendere atto:

- delle modifiche al programma degli interventi che non necessitano di approvazione preventiva ai sensi della deliberazione C.A.M.B. n.75/2017 per l'annualità 2017;

- del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli **n.11**, quote **73,4194**, astenuti n.0, contrari n.1 (Comune di Riccione), quote 9,0400;

DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche al programma degli interventi che non necessitano di approvazione preventiva ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017 per l'annualità 2017;
2. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 dal gestore HERA S.p.A. come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2017**

**GESTORE: HERA S.P.A.
SOTTOAMBITO: RIMINI**

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2017

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2017, del Programma operativo degli interventi (POI) e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Rimini n. 05 del 01 Febbraio 2017, successivamente modificato con la delibera n.ro 2 del 15 giugno 2018, che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015

		PIANIFICATO 2017	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2017		
GESTORE HERA	Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 28.770.000	-€ 6.406.590	€ 22.363.410	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	
	Importo Contributo Pianificato [B]	€ 16.763.000	-€ 11.880.491	€ 4.882.509	Importo Contributo a Consuntivo [B]	
	Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 12.007.000	€ 5.473.901	€ 17.480.901	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]	
CONTO TERZI	Importo pianificato da soggetto investitore diverso da Hera	€ 4.636.568	€ 307.121	€ 4.943.689	Importo a consuntivo da soggetto investitore diverso da Hera	
TOTALE	Totale pianificato	€ 33.406.568	-€ 6.099.469	€ 27.307.099	Totale consuntivato	

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, considerando sia gli interventi da esso finanziati che quelli finanziati da terzi, abbia effettuato nel corso del 2017 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un 18 %, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato.

Per quanto riguarda invece la quota parte di interventi finanziati direttamente (importo netto A-B) il gestore HERA ha invece eseguito investimenti superiori per circa il 45 % rispetto al pianificato.

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato alla presente relazione.

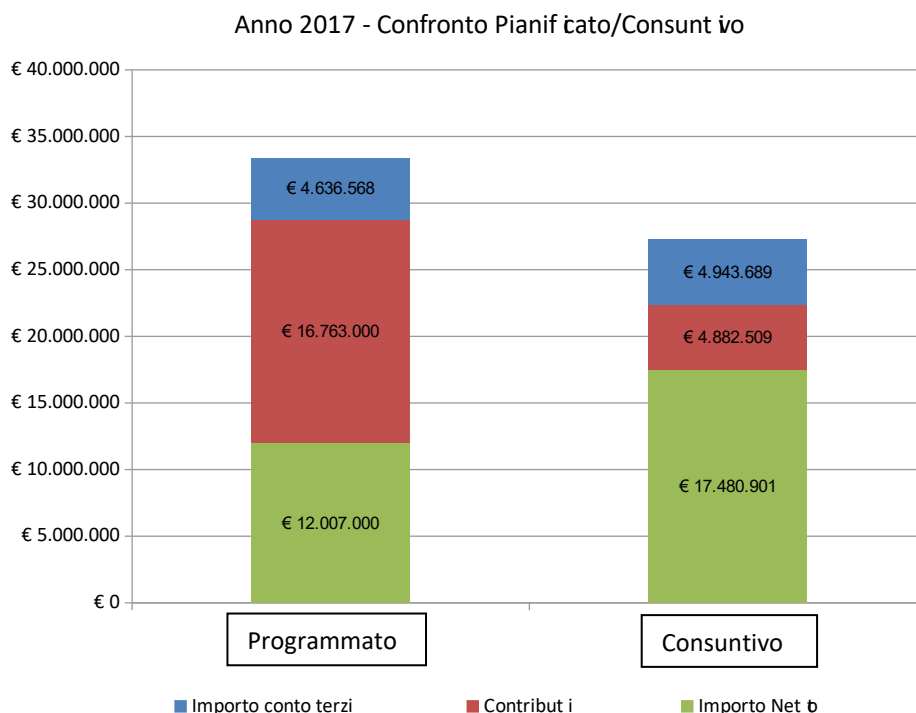


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo eventuale provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2017 (*interventi per i quali era programmato un importo diverso da zero nell'annualità 2017*): 89

Numero di interventi rendicontati nel 2017: 59

		Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2017	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2017	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR
1	Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	30	€ 0	€ 1.485.461	0	
2	Interventi con avvio anticipato nel 2017 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	1	€ 17.919	€ 0	0	
3	Interventi avviati nel 2017 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0	0	
4	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	43	€ 19.633.715	€ 24.011.599	0	
5	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato	15	€ 7.655.465	€ 7.879.508	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA	

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta quanto segue:

- il gestore non ha avviato nel 2017 n.ro 31 interventi che invece erano stati programmati;
- vi è stato un solo intervento con avvio anticipato rispetto a quanto contenuto nel Programma operativo degli interventi

Inoltre si può notare come rispetto ai 89 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 48 % di questi (43 interventi) ha avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno, con una riduzione degli importi lordi relativi a questa categoria pari al 18 % rispetto al pianificato.

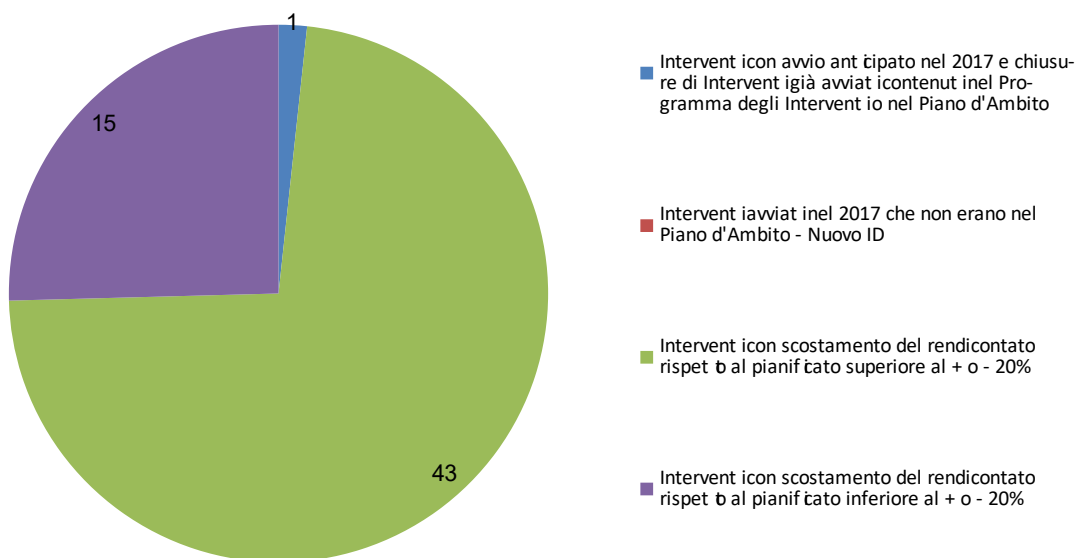


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ALLEGATO

HERA SpA
Consuntivo investimenti annualità 2017 Bacino Ex-ATO 9 Rimini

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico- Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2017			CONSUNTIVO HERA 2017					NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2017
							PIANO ATERSIR 2017 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2017 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2017 INV. NETTI	CONS 2017 INV. LORDI	CONS 2017 CONTRIBUTI	CONS 2017 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTA MENTO	
2015RNHA0020	COLLETTAMENTO VIA MELITO, SIRTORI, TEANO	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Annullato	Bellaria Igea Marina	5,000.00	0	5,000.00	0	0	0	-5,000.00	-100	CONVENZIONE NON ANCORA SOTTOSCRITTA NEL 2017, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO
2017RNHA0001	COLLETTAMENTO VIA MELITO, SIRTORI, TEANO	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Annullato	Bellaria Igea Marina	10,000.00	0		0	0	0	-10,000.00	-100	ATTUATIVO.
2014RNHA0002	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOG. CATTOLICA	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Cattolica	575,000.00	0	575,000.00	526,828.16	0	526,828.16	-48,171.84	-8	
2014RNHA0003	REALIZZ. FOGNATURA COMPARTO VENTENA	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Cattolica	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0	-10,000.00	-100	NEL 2017 SONO STATI NECESSARI APPROFONDIMENTI TECNICI PROPEDEUTICI ALLA STESURA DEL PROGETTO. L'INTERVENTO INOLTRE NON RISULTA PRIORITARIO PER IL SERVIZIO, E LA PROGETTAZIONE È PREVISTA PER LE PROSSIME ANNUALITÀ.
2017RNHA0004	INTERVENTI SULLE CONDOTTE DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO "VIENNA"	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Aperto	Cattolica	50,000.00	0		0	0	0	-50,000.00	-100	CONVENZIONE NON ANCORA SOTTOSCRITTA NEL 2017, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO
2014RNHA0004	SEPAR. FOG. ALCUNE VIE (VIA DI VITTORIO)	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Aperto	Coriano	123,000.00	0		101,678.22	0		-21,321.78	-17	
2014RNHA0005	COSTR. DI FOGNATURA LUNGO VIA MULAZZANO	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Coriano	832,000.00	0	832,000.00	533,651.48	0	533,651.48	-298,348.52	-35	RITARDO NELL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DELLA SOLUZIONE IN VARIANTE (PER CAUSA DI FRANA) E PER DEFINIZIONE NUOVI ACCORDI CON IMPRESA ESECUTRICE
2017RNHA0005	COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA LIMITROFA A VIA DI VITTORIO - II STRALCIO	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Coriano	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0	-10,000.00	-100	RITARDO NELL' AVVIO DELLA PROGETTAZIONE PER EVITARE SOVRAPPOSIZIONI CON IL 1° STRALCIO
2017RNHA0006	NUOVA RETE FOGNARIA IN LOCALITA' PASSANO TRA VIA FLAMINIA CONCA E VIA STRACCIARINO	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Coriano	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0	-10,000.00	-100	L' ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE È STATA POSTICIPATA IN QUANTO SONO STATI EFFETTUATI INCONTRI PRESSO LA SEDE DEL COMUNE ALLA PRESENZA DI VICESINDACO E ASSESSORE, A VALLE DEI QUALI L'AMMINISTRAZIONE SONDAVA LA POSSIBILITÀ CON I PRIVATI DI FINANZIARE IL 50% DELLE OPERE.
2017RNHA0008	REVAMPING DEPURATORE DI MISANO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SU LINEA ACQUE	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Misano Adriatico	20,000.00	0	20,000.00	26,177.00	0	26,177.00	6,177.00	30	
2017RNHA0010	OTTIMIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO V.ALBERELLO	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Misano Adriatico	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0	-100,000.00	-100	L'INTERVENTO RISULTA MAGGIORMENTE COMPLESSO RISPETTO ALLE IPOTESI INIZIALI. E' STATO NECESSARIO RICHIEDERE DELL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI RFI (13-03-2018)/SISMICA (23/05/2018). INIZIO LAVORI PREVISTO A SETTEMBRE 2018
2015RNHA0010	ADEGUAMENTO SC.3 LOC.S.MARCO-MONTE COLOMBO	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Monte Colombo	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0	-10,000.00	-100	SI CONFERMA UNA SITUAZIONE INVARIATA RISPETTO A QUANTO GIA' RIPORTATO NELLE NOTE 2016. INTERVENTO POSTICIPATO IN QUANTO NON VI ERANO I PRESUPPOSTI PER LO SVILUPPO URBANISTICO INIZIALMENTE IPOTIZZATO; LO SCARICO 3 SARA' ADEGUATO CON UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN LOCO DI CIRCA 80 AE, RIMANDANDO SE NECESSARIO L'EVENTUALE COLLETTAMENTO IN FUNZIONE DELL'ESITO DELLO SVILUPPO URBANISTICO. QUESTA NUOVA SCELTA PROGETTUALE E' STATA GIA' CONDIVISA CON ATERSIR.
2014RNHA0010	ADEGUAMENTO SCARICHI N.4-5-6-7-13 MONTESCUDO	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Montescudo	318,000.00	0	318,000.00	235,571.57	0	235,571.57	-82,428.43	-25	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. SCOSTAMENTO CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI E PER CONSOLIDAMENTO RIBASSO DI GARA
2015RNHA0011	MONTESCUDO ADEG SCARICO N.RO 2	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Montescudo	25,000.00	0	25,000.00	0	0	0	-25,000.00	-100	LAVORO SOSPESO IN ATTESA DI VALUTAZIONI SE È POSSIBILE ESEGUIRLO CON I TEMPI DETTATI DALLA DGR 201 CONSIDERATO L'AGGLOMERATO <200 AE
2014RNHA0044	COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA ABBAZIA-MORCIANO	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Aperto	Morciano di Romagna	145,000.00	0		3,563.31	0		-141,436.69	-97	TEMPI DI PROGETTAZIONE DILATATI PER L'INSERIMENTO ANCHE DEL REVAMPING DELL'IMPIANTO
2014RNHA0011	COMPLETAMENTO RETE FOG. AL COLL. NOVADELTRIA	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Novafeltria	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0	-10,000.00	-100	NEL 2017 SONO STATI NECESSARI APPROFONDIMENTI TECNICI PROPEDEUTICI ALLA STESURA DEL PROGETTO. SONO NECESSARIE COMUNQUE ULTERIORI VALUTAZIONI PRIMA DELLA STESURA DEL PROGETTO PER DIFFICOLTÀ A REPERIRE LE SERVITÙ.
2014RNHA0012	PERF.E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Novafeltria	208,000.00	0	208,000.00	25,233.70	0	25,233.70	-182,766.30	-87	RITARDO DOVUTO ALL' EFFETTO DEL LUNGO ITER AUTORIZZATIVO (VEDI NOTE ANNI PRECEDENTI) A CUI SI E' AGGIUNTA LA NECESSITA' DI AVVIARE ITER ESPROPRIATIVO: 11-05-2015 HERA ATERSIR X APPROVAZIONE PROGETTO; 04-11-2015 HERA ATERSIR X AREE SALVAGUARDIA E PSC; 09-11-2015 HERA ATERSIR X CHIARIMENTI; 23-06-2016 HERA COMUNE X VALIDA. ELAB. VARIANTE PRG; 15-06-2016 HERA COMUNE X INTEGR. E VALID. ELAB. VARIANTE PRG; 24-09-2016 COMUNE HERA X VALIDAZIONE ELABORATI VARIANTE; 20-10-2016 ATERSIR HERA X TRASMISSIONE VERBALE 1 SEDUTA; 02-11-2016 REGIONE BURERT N.327; 08-05-2017 ATERSIR HERA X TRASMISSIONE VERBALE 2 SEDUTA; 26-06-2018 HERA ATERSIR X RICHIESTA CHIARIMENTI PARERI ENTI; 31-07-2017 HERA ATERSIR X ELABORATO RICHIESTO; 04-08-2017 ATERSIR ENTI X RICHIESTA CHIARIMENTI. SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE COME DA NULLA OSTA ATERSIR. PEC DEL 18-12-2017. RICHIESTA HERA DEL 29-11-2017 PROT. 115133, VS PROT. AT/2017/7726. VEDI ID 2018RNHA0002
2014RNHA0013	DISMISSIONE DEP.PONTE S.M.MADDALENA E COLL.FOGNARIO	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Terminato	Opere Pluricomunali	330,000.00	0	330,000.00	27,828.49	0	27,828.49	-302,171.51	-91	
2014RNHA0014	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	1,365,000.00	0	1,365,000.00	1,402,218.59	0	1,402,218.59	37,218.59	2	
2014RNHA0015	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	1,250,000.00	0	1,250,000.00	878,618.05	0	878,618.05	-371,381.95	-29	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A SEGNALEGGI DI PRONTO INTERVENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2014RNHA0016	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	450,000.00	0	450,000.00	482,955.84	0	482,955.84	32,955.84	7	
2014RNHA0017	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	200,000.00	0	200,000.00	200,632.34	0	200,632.34	632.34	0	
2014RNHA0018	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-RN-ATO9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	100,000.00	0	100,000.00	164,614.13	0	164,614.13	64,614.13	64	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTI PER LA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2014RNHA0019	DISTRETT. RETI ACQUA - RN ATO 9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	15,000.00	0	15,000.00	12,115.43	0	12,115.43	-2,884.57	-19	
2014RNHA0020	ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - RN	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	100,000.00	0	100,000.00	4,297.88	0	4,297.88	-95,702.12	-95	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RNHA0021	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	1,000,000.00	0	1,000,000.00	1,224,653.77	0	1,224,653.77	224,653.77	22	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RNHA0022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL.FOGNATURA - RN	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	675,000.00	0	675,000.00	1,242,256.29	0	1,242,256.29	567,256.29	84	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico- Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2017			CONSUNTIVO HERA 2017					
							PIANO ATERSIR 2017 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2017 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2017 INV. NETTI	CONS 2017 INV. LORDI	CONS 2017 CONTRIBUTI	CONS 2017 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTA MENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2017
2014RNHA0023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.FOGNATURA - RN	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	465,000.00	0	465,000.00	513,995.46	0	513,995.46	48,995.46	10	
2014RNHA0024	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - RN	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	75,000.00	0	75,000.00	111,946.56	0	111,946.56	36,946.56	49	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RNHA0025	RILIEVO RETI FOGNARIE - RN - ATO 9	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	50,000.00	0	50,000.00	1,869.62	0	1,869.62	-48,130.38	-96	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E PIANIFICATO IN MODO OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE ATTIVITÀ ANNUALI SVOLTE SONO LEGATE ALLE ESIGENZE MANIFESTATESI NELL'ANNUALITÀ STESSA.
2014RNHA0081	Sostituzione contatori pari calibro	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	107,000.00	0	107,000.00	91,359.88	0	91,359.88	-15,640.12	-14	
2014RNHA0083	Adeguamenti attraversamenti ferroviari	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Terminato	Opere Pluricomunali	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0	-10,000.00	-100	INTERVENTO CON PIANIFICAZIONE RICORSIVA IN ARCO PIANO. AL MOMENTO NON EMERGONO ULTERIORI ESIGENZE DI MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITÀ. L'ID RISULTA PERTANTO CONCLUSO.
2014RNHA0084	Telecontrollo e automazione impianti acquedotto	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	90,000.00	0	90,000.00	76,386.87	0	76,386.87	-13,613.13	-15	
2014RNHA0085	RINNOVO RETI/ALL. FOGNATURA DA PI	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	450,000.00	0	450,000.00	473,958.05	0	473,958.05	23,958.05	5	
2015RNHA0001	Riordino dello schema idrico del Conca	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Romagna Acque	Aperto	Opere Pluricomunali	349,177.00	0		0	0	0	-349,177.00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2017, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2015RNHA0004	RAZIONALIZZAZIONE SIST. ACQ.SENATELLO	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	100,000.00	0	100,000.00	100,502.10	0	100,502.10	502.10	0	
2015RNHA0009	Telecontrollo e automazione impianti fog. RN	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	50,000.00	0	50,000.00	71,747.86	0	71,747.86	21,747.86	43	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2015RNHA0013	ATTIVAZIONE COLLETTORE MONDAINO-SALUDECIO-MONTEGRIDOLFO (SALUDECIO SC. N. 1,2,6,7,8,9,11,12,19; MONTEGRIDOLFO SC. N. 1,2,3,4,5,6,7,8; MONDAINO SCARICHI 1,4,6,7)	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	20,000.00	0	20,000.00	40,082.09	0	40,082.09	20,082.09	100	IL CONSUNTIVO 2017 È RELATIVO SOLO AI LAVORI PER LO SCARICO 6 MONDAINO. TALI LAVORI SONO STATI CONCLUSI E L'ID CHIUSO. L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI NUMERO 1-4 MONEGRIDOLFO RIGUARDANO AGGLOMERATI DI CONSISTENZA MINORE DI 200 A.E (OVVERO ZONE FUORI PERIMETRO DELL'AGGLOMERATO), PERTANTO IN OTTEMPERANZA ALLA DGR 201/2016 I TEMPI DI ADEGUAMENTO PREVEDONO DI TERMINARE LA FASE DI PROGETTAZIONE ENTRO IL 2024.
2015RNHA0023	Telecontrollo e automazione imp. dep. RN	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	10,000.00	0	10,000.00	56,555.10	0	56,555.10	46,555.10	465	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2015RNHA0024	RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI RN ATO9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	120,000.00	0	120,000.00	31,723.43	0	31,723.43	-88,276.57	-73	QUESTO ID RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PENSILI. LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA PER SINGOLO ANNO INSERITA NEL PIANO E' DI LARGA MASSIMA; OGNI ANNO VENGONO AVVIATE LE ATTIVITÀ RITENUTE NECESSARIE DAL SERVIZIO, TENENDO CONTO DELLA COMPLESSITÀ REALIZZATIVA DI TALI INTERVENTI. NEL 2017 E' STATA AVVIATA LA PROGETTAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE AREA PENSILE MIRAMARE
2015RNHA0025	VERIFICA E ADEGUAMENTI SISMICI IMP. ACQ. RN ATO9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0	-20,000.00	-100	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L'ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 9. GLI IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL'ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. POSTICIPATO L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PREVISTE NEL 2017 IN QUANTO AL MOMENTO NON RISULTANO DELLE COGENTE ESIGENZE LEGATE ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI. PREVISTO AVVIO DELLE PRIME VERIFICHE NEL 2018.
2018RNHA0002	Dismissione dep.Ponte S.M.Maddalena e coll.fognario	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Aperto	Opere Pluricomunali	65,244.00	0		0	0	0	-65,244.00	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE SI TRATTA DI UN NUOVO ID GENERATO NEL 2017 IN QUANTO L'INTERVENTO 2014RNHA0013 E' STATO STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE COME DA NULLA OSTA ATERSIR. PEC DEL 18-12-2017.
2015RNHA0014	SOANNE RISANAMENTO SCARICO N. 5	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Pennabilli	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0	-40,000.00	-100	RICHIESTA HERA DEL 29-11-2017 PROT. 115133, VS PROT. AT/2017/7726
2017RNHA0030	ADEGUAMENTO DEPURATORE PENNABILLI LOCALITÀ PONTE MESSA	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Pennabilli	0	0	0	17,918.58	0	17,918.58	17,918.58	100	NEL 2017 ANTICIPATO PRIMO STRALCIO IN QUANTO RISULTA NECESSARIO INTERVENIRE SULL'IMPIANTO IN TEMPI PIU' RAPIDI RISPETTO ALLA TEMPISTICA IPOTIZZATA A PIANO.
2015RNHA0015	ADEGUAMENTO SCARICO V.FONTANE(N.3)-CA'MAGRINO(N.9)	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Poggio Torriana	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0	-20,000.00	-100	SI CONFERMA UNA SITUAZIONE INVARIATA RISPETTO A QUANTO GIÀ RIPORTATO NELLE NOTE 2016. NECESSARI APPROFONDIMENTI LEGATI ALLA PERIMETRAZIONE DEGLI AGGLOMERATI. IN PARTICOLARE SULLO SCARICO DI CA' MAGRINO LE TEMPISTICHE SONO LEGATE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTENZIOSO TRA PRIVATI.
2014RNHA0047	REAL. VASCA TESTA IMPIANTO DEP RICCIONE - I STRALCIO	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Riccione	1,240,000.00	0	1,240,000.00	1,253,998.02	0	1,253,998.02	13,998.02	1	
2014RNHA0048	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOG. RICCIONE	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Riccione	300,000.00	0	300,000.00	108,519.37	0	108,519.37	-191,480.63	-63	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. L'INTERVENTO RISULTA DAL PUNTO DI VISTA REALIZZATIVO COMPLESSO IN QUANTO È ARTICOLATO IN UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI CHE INTERESSANO L'INTERO SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO DI RICCIONE, PER CUI IN DEFINITIVA SI REGISTRANO DEI RITARDI OPERATIVI. INOLTRE UNA PARTE DELLE ATTIVITÀ È STRETTAMENTE LEGATA ALL'EMISSIONE DELLE ORDINANZE DA PARTE DEL COMUNE/RISPOSTE DEI CITTADINI LE CUI TEMPISTICHE DILATANO ULTERIORMENTE I TEMPI DI ESECUZIONE.
2015RNHA0005	STUDIO E PRIMI INTERVENTI RISAN. RIO DELL'ASSE	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Riccione	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0	-30,000.00	-100	IN ATTESA DI DEFINIZIONE DI ACCORDI TRA COMUNE ED AEROPORTO DI RIMINI PER RISANAMENTO RIO NEL TRATTO INTERNO ALLA PROPRIETÀ AEROPORTUALE
2015RNHA0008	REAL. VASCA TESTA IMPIANTO DEP. RICCIONE - II STRALCIO	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Riccione	17,000.00	0	17,000.00	0	0	0	-17,000.00	-100	RIPIANIFICAZIONE AVVIO PROGETTAZIONE INTERVENTO PER AVERE EVIDENZA DEGLI EFFETTI DEL PRIMO STRALCIO SU UN PERIODO SIGNIFICATIVO DI FUNZIONAMENTO E CONTESUALE ATTESA DEGLI EFFETTI DEGLI INTERVENTI SULLA RETE (IN PARTICOLARE EFFETTI ORDINANZE VERSO I PRIVATI).
2016RNHA0001	SISTEMA DI AUTOMAZIONE E GESTIONE DEL CICLO AZOTO DEL DEPURATORE DI RICCIONE LINEA 2	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Riccione	200,000.00	0	200,000.00	319,027.50	0	319,027.50	119,027.50	59	INTERVENTO CONCLUSO. IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI SONO STATE APPORTATE ALCUNE MIGLIORIE ALLE VASCHE DI OSSIDAZIONE (SDOPPIAMENTO LINEA ARIA, INSTALLAZIONE DI NUOVE PIASTRE DI DIFFUSIONE) CHE HANNO COMPORTATO MAGGIORI ONERI
2017RNHA0017	ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA NERA (PONTE DI VIALE VENEZIA)	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Riccione	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0	-20,000.00	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA NECESSARIA RIVALUTAZIONE DELL'IPOTESI PROGETTUALE INIZIALE PRIMA DI PROCEDERE ALLA PROGETTAZIONE. SI IPOTIZZA DI DEFINIRE LA SOLUZIONE PROGETTUALE DEFINITIVA E IL CONSEGUENTE INIZIO LAVORI ENTRO IL 2018/INIZIO 2019

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico- Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2017			CONSUNTIVO HERA 2017					
							PIANO ATERSIR 2017 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2017 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2017 INV. NETTI	CONS 2017 INV. LORDI	CONS 2017 CONTRIBUTI	CONS 2017 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTA MENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2017
2014RNHA0049	RETE DI COLLEGAMENTO SERBATOIO COVIGNANO	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Romagna Acque	Aperto	Rimini	740,000.00	0		60,161.29	0		-679,838.71	-91	AVAZAMENTO DELL'INTERVENTO IN SOSTANZIALE ALLINEAMENTO CON I TEMPI PREVISTI CON LA REALIZZAZIONE COMPLESSIVA. LO SCOSTAMENTO 2017 E' LEGATO ALLE TEMPISTICHE DI GARA GIA' AVVIATA NEL CORSO DEL 2017. AVVIAMENTO REALIZZAZIONE LAVORI NEL 2018.
2014RNHA0052	PSB - RADDOPPIO DEPURATORE DI S. GIUSTINA	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Romagna Acque	Aperto	Rimini	320,599.00	0		1,208,714.15	0		888,115.15	277	CONSUNTIVO 2017 MAGGIORE RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO IN RELAZIONE ALL'AVANZAMENTO TECNICO DELLE OPERE E AL FLUSSO DI FATTURAZIONE VERSO LA SOCIETA' DEGLI ASSET.
2014RNHA0055	PSB-CONDOTTA SOTTOMARINA AUSA	FOGNATURA	ATO9 - RN	Romagna Acque	Aperto	Rimini	324,000.00	0		1,895,313.59	0		1,571,313.59	484	INTERVENTO IN CORSO DI ESECUZIONE, LA COMBINAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA FORNITURA DELLE POMPE DI SCARICO A MARE (APPALTO VASCHE MA DI COMPETENZA ECONOMICA DEL PRESENTE ID), DEI COSTI RELATIVI ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E ALLA BONIFICA BELLICA A MARE E DEI COSTI RELATIVI ALL'AVVIO EFFETTIVO DEL CANTIERE "CONDOTTE" HA PROVOCATO MAGGIOR CONSUNTIVAZIONE RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO.
2014RNHA0056	PSB - REALIZZAZIONE DORSALE NORD	FOGNATURA	ATO9 - RN	Romagna Acque	Terminato	Rimini	84,223.00	0		0	0	0	-84,223.00	-100	INTERVENTO CONCLUSO. IL CONSUNTIVO E' CONGRUENTE IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI COMPETENZA HERA. (LA DIVERSA MODALITA' DI PIANIFICAZIONE/CONSUNTIVAZIONE GIUSTIFICA I DISALLINEAMENTI SUI COSTI).
2014RNHA0057	PSB-REAL. VASCA COLONNELLA I	FOGNATURA	ATO9 - RN	Romagna Acque	Aperto	Rimini	146,000.00	0		0	0	0	-146,000.00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2017, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO. INOLTRE: SOTTOPOSTA AL COMUNE NEL 2016 UNA PROPOSTA DI REVISIONE DEL SISTEMA "VASCHE SUD" RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL PSBO APPROVATO, AGGIORNATO NEL 2017 PER TENER CONTO NON SOLO DEL PROBLEMA BALNEAZIONE MA ANCHE DELLA SALVAGUARDIA IDRAULICA: IN ATTESA DI DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER POTER POI AVVIARE LA PROGETTAZIONE
2014RNHA0058	PSB-REALIZZAZIONE VASCA RODELLA	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Rimini	80,000.00	0	80,000.00	0	0	0	-80,000.00	-100	SOTTOPOSTA AL COMUNE NEL 2016 UNA PROPOSTA DI REVISIONE DEL SISTEMA "VASCHE SUD" RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL PSBO APPROVATO, AGGIORNATO NEL 2017 PER TENER CONTO NON SOLO DEL PROBLEMA BALNEAZIONE MA ANCHE DELLA SALVAGUARDIA IDRAULICA: IN ATTESA DI DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER POTER POI AVVIARE LA PROGETTAZIONE
2014RNHA0059	PSB - REALIZZAZIONE DORSALE SUD RN - PREMENTE	FOGNATURA	ATO9 - RN	Romagna Acque	Aperto	Rimini	35,000.00	0		211,667.15	0		176,667.15	504	NEL 2017 COMPLETATA PROGETTAZIONE E PREVISTO PER IL 2018 L'AFFIDAMENTO IN GARA. ANTICIPO DI UN TRATTO DI POSA PER SOVRAPPPOSIZIONE CON CANTIERE COMUNE DI RIMINI
2014RNHA0061	PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN - I Stralcio - II Lotto	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Rimini	1,200,000.00	0	1,200,000.00	790,491.09	0	790,491.09	-409,508.91	-34	LO SCOSTAMENTO E' LEGATO A 2 ASPETTI: ECONOMIE EMERSE IN FASE REALIZZATIVA PER CIRCA 200 KEURO E UN TRASCINAMENTO DI CIRCA 200KEURO AL 2018, LEGATO ALL'AVANZAMENTO TECNICO DEI LAVORI. NEL 2018 E' PREVISTA LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.
2014RNHA0062	PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN - I Stralcio - I Lotto	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Rimini	189,000.00	0	189,000.00	164,082.46	0	164,082.46	-24,917.54	-13	
2014RNHA0063	PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN - II Stralcio	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Rimini	370,000.00	0	370,000.00	387,696.35	0	387,696.35	17,696.35	4	
2014RNHA0064	PSB-REALIZ. VASCA LAMINAZIONE OSPEDALE	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Rimini	0	-1,571,000.00	-1,571,000.00	0	-1,191,652.48	-1,191,652.48	0.00	24	
2014RNHA0065	PSB-REALIZ. DORSALE SUD RN I STRALCIO	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Rimini	0	-1,886,000.00	-1,886,000.00	0	0	0	0.00	-100	
2014RNHA0066	PSB-COMPL. SEP. RETI RONCASSO E PRADELLA	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Rimini	300,000.00	0	300,000.00	25,003.06	0	25,003.06	-274,996.94	-91	RITARDO PER NECESSITA' DI EFFETTUARE RILIEVO DI DETTAGLIO DI DIVERSI PUNTI DELLA RETA FOGNARIA ESISTENTE
2014RNHA0067	PSB-REAL. VASCA AUSA I STRALCIO (Piazzale Kennedy)	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Rimini	12,031,000.00	-12,210,000.00	-179,000.00	8,921,704.86	-2,756,441.31	6,165,263.55	-3,109,295.14	-25	EFFETTO DEL RITARDO 2016 (RALLENTAMENTI DELLA PRODUZIONE DEI DIAFRAMMI CAUSATI DALL'IMPREVEDIBILE RITROVAMENTO DI STRUTTURE E TIRANTI LUNGO IL VECCHIO CORSO DEL CANALE, INTERFERENTI CON LE LAVORAZIONI, CHE HANNO RICHIESTO INTERVENTI DI DEMOLIZIONE SPECIALISTICI E CHE HANNO RALLENTATO IL PROGRAMMA DEI LAVORI) + RALLENTAMENTO DOVUTO AL MALTEMPO (LE FREQUENTI PIOGGE HANNO PROVOCATO INTERRUZIONI FREQUENTI DELLE LAVORAZIONI E ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SVUOTAMENTO DALL'ACQUA DI PIOGGIA E PULIZIA PER RIAVVIARE IL CANTIERE)
2014RNHA0068	PSB-REAL. VASCA COLONNELLA II	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Rimini	350,000.00	0	350,000.00	23,406.00	0	23,406.00	-326,594.00	-93	SOTTOPOSTA AL COMUNE NEL 2016 UNA PROPOSTA DI REVISIONE DEL SISTEMA "VASCHE SUD" RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL PSBO APPROVATO, AGGIORNATO NEL 2017 PER TENER CONTO NON SOLO DEL PROBLEMA BALNEAZIONE MA ANCHE DELLA SALVAGUARDIA IDRAULICA: IN ATTESA DI DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER POTER POI AVVIARE LA PROGETTAZIONE
2014RNHA0069	NUOVO SCOLMATORE MAVONE V.COVIGNANO RN	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Rimini	100,000.00	0	100,000.00	20,860.00	0	20,860.00	-79,140.00	-79	COMPLETATA PROGETTAZIONE. LO SCOSTAMENTO E' LEGATO ALLA RIPIANIFICAZIONE 2016 GIA' MOTIVATA NELL' ANNUALITA' PRECEDENTE E PER VINCOLO CONSORZIO BONIFICA CHE IMPONE DI ESEGUIRE I LAVORI SOLO NELLA STAGIONE ESTIVA.
2014RNHA0070	ADEG RETE FOG V.S.CHIARA-VICOLO CIMA RN	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Rimini	50,000.00	0	50,000.00	9,916.17	0	9,916.17	-40,083.83	-80	CONVENZIONE CON COMUNE RIMINI NON ANCORA SOTTOSCRITTA
2014RNHA0071	SEPARAZ. RETE IN VIA ARNO - PORTA SUD	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Rimini	5,000.00	0	5,000.00	7,941.60	0	7,941.60	2,941.60	58	
2014RNHA0072	PSB-REALIZ. DORSALE SUD RN II STRALCIO	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Rimini	767,000.00	-1,096,000.00	-329,000.00	888,126.15	-934,415.24	-46,289.09	121,126.15	15	
2014RNHA0073	PSB-REAL.VASCA AUSA II STRALCIO (Dorsale Ausa)	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Rimini	80,000.00	0	80,000.00	1,960.82	0	1,960.82	-78,039.18	-97	IN ATTESA DI ACCORDI CON IL COMUNE PER SOSTITUZIONE DELL'INTERVENTO
2014RNHA0074	DEVIAZ. RETE FOG V.GIOVE RIMINI	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Terminato	Rimini	85,000.00	0	85,000.00	0	0	0	-85,000.00	-100	
2015RNHA0002	PSB - RICONVERSIONE DEP. MARECCHIESE	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Romagna Acque	Aperto	Rimini	1,846,508.00	0		1,455,053.51	0		-391,454.49	-21	INTERVENTO IN CORSO DI ESECUZIONE. SCOSTAMENTO LEGATO ALL'AVANZAMENTO TECNICO DEL CANTIERE E AI RITARDI 2016 GIA' MOTIVATI.
2015RNHA0006	RICOSTR. PREMENTE DN700 V. FLAMINIA V. FADA	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Nullato	Rimini	70,000.00	0	70,000.00	0	0	0	-70,000.00	-100	
2015RNHA0016	SCARICO N.94 LOCALITA' GROTTA ROSSA - RIMINI	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Rimini	20,000.00	0	20,000.00	8,385.32	0	8,385.32	-11,614.68	-58	NEL 2017 SONO STATI NECESSARI APPROFONDIMENTI TECNICI PROPEDEUTICI ALLA STESURA DEL PROGETTO PER DIFFICOLTÀ A REPERIRE LE SERVITÙ. LE SERVITÙ SONO STATE REPERITE A GIUGNO 2018.
2015RNHA0017	SCARICO N. 97 GHETTO TAMAGNINO - RIMINI	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Rimini	55,000.00	0	55,000.00	0	0	0	-55,000.00	-100	

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico- Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2017			CONSUNTIVO HERA 2017					
							PIANO ATERSIR 2017 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2017 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2017 INV. NETTI	CONS 2017 INV. LORDI	CONS 2017 CONTRIBUTI	CONS 2017 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTA MENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2017
2017RNHA0020	ADEGUAMENTO CENTRALE ACQUEDOTTO CA BEZZI	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Rimini	10,000.00	0	10,000.00	23,830.52	0	23,830.52	13,830.52	138	
2017RNHA0022	COLLEG. PREMENTE DEL SOLL. 2C CON DORSALE SUD (EX INTERVENTO RICOSTR. PREMENTE DN 700 V.FLAMINIA-V.FADA)	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Aperto	Rimini	50,000.00	0		0	0	0	-50,000.00	-100	CONVENZIONE NON ANCORA SOTTOSCRITTA NEL 2017, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2017RNHA0024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTO 1B	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Annullato	Rimini	30,000.00	0		0	0	0	-30,000.00	-100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE COME DA NULLA OSTA ATERSIR. PEC DEL 18-12-2017. RICHIESTA HERA DEL 29-11-2017 PROT. 115133, VS PROT. AT/2017/7726
2018RNHA0003	Manutenzione straordinaria Sollevamento 1B	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Rimini	26,000.00	0	26,000.00	0	0	0	-26,000.00	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE SI TRATTA DI UN NUOVO ID GENERATO NEL 2017 IN QUANTO L'INTERVENTO 2017RNHA0024 E' STATO STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE COME DA NULLA OSTA ATERSIR. PEC DEL 18-12-2017. RICHIESTA HERA DEL 29-11-2017 PROT. 115133, VS PROT. AT/2017/7726
2014RNHA0045	COMPLETAMENTO COLLETTAMENTO SCARICO 18 CON NUOVO DEPURATORE A SANT'ANSOVINO - STRALCIO FOGNATURA	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Aperto	Saludecio	205,000.00	0		5,851.33	0		-199,148.67	-97	RITARDI DOVUTI A FORTE ALLUNGAMENTO TEMPI AUTORIZZATIVI (COMUNE): RICHIESTA DI APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 15/2013 DEL 25/05/2017 PROT. 52164, APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 25 DEL 12/03/2018
2015RNHA0019	ADEG. SCARICO(4,18) - STRALCIO ACQUEDOTTO V.MONTE DEL PRETE BASSO	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	AMIR	Aperto	Saludecio	35,000.00	0		1,686.16	0		-33,313.84	-95	RITARDI DOVUTI A FORTE ALLUNGAMENTO TEMPI AUTORIZZATIVI (COMUNE), GIA' EVIDENZIATI NELLE NOTE DEL 2016.
2017RNHA0031	Prolungamento condotta di scarico del Depuratore San Leo	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	San Leo	100,000.00	0	100,000.00	108,511.76	0	108,511.76	8,511.76	8	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2017, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2014RNHA0075	POTENZIAMENTO RETE IDRICA DI SANTARCANGELO COSTRUZIONE RETI DI FOGNATURA (vie Saturno, Marte, della Pace, Palazzina; vie Righi Frankling, Flaming, da Vinci; via Balduccia S. Ermete e strade Capoluogo)	FOGNATURA	ATO9 - RN	Romagna Acque	Aperto	Santarcangelo di Romag	34,117.00	0		0	0	0	-34,117.00	-100	REALIZZAZIONE INTERVENTO. SCOSTAMENTO CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE
2014RNHA0076	ADEG. RETI FOGNA S.ARCANGELO Z.STAZIONE	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Santarcangelo di Romag	15,000.00	0	15,000.00	3,485.28	0	3,485.28	-11,514.72	-76	2016, GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELL' ANNUALITA' 2016
2014RNHA0078	ADEG. RETI FOGNA S.ARCANGELO Z.STAZIONE	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Santarcangelo di Romag	1,375,000.00	0	1,375,000.00	674,300.44	0	674,300.44	-700,699.56	-50	ESEGUITA PROGETTAZIONE NEL 2017, LA CUI RENDICONTAZIONE ECONOMICA VERRA' EFFETTUATA NEL 2018. E' STATO TRASMESSO IL PROGETTO AL COMUNE PER APPROVAZIONE IL 14/05/2018 PROT. 46392. IPOTESI AVVIO LAVORI SETTEMBRE 2018 MINORI ONERI IN FASE REALIZZATIVA RISPETTO AL PIANIFICATO PER L'INTERVENTO
2017RNHA0027	ADEGUAMENTO VIE RIGHI,DA VINCI,FRANKLIN,FLAMING	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Santarcangelo di Romag	50,000.00	0	50,000.00	3,316.29	0	3,316.29	-46,683.71	-93	DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V.BALDUCCIA
2017RNHA0028	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO S.ARCANGELO	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Aperto	Santarcangelo di Romag	70,000.00	0	70,000.00	31,816.36	0	31,816.36	-38,183.64	-54	INTERVENTI CONCLUSI SULLO SCARICO 10 E 11. LO SCARICO 9 E' STATO STRALCIATO DA QUESTO ID STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE COME DA NULLA OSTA ATERSIR. PEC DEL 18-12-2017. RICHIESTA HERA DEL 29-11-2017 PROT. 115133, VS PROT. AT/2017/7726. VEDI ID 2018RNHA0001
2014RNHA0043	RISANAMENTO SCARICHI 9, 10 E 11 VERUCCHIO	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Terminato	Verucchio	320,000.00	0	320,000.00	11,332.24	0	11,332.24	-308,667.76	-96	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE SI TRATTA DI UN NUOVO ID GENERATO NEL 2017 IN QUANTO L'INTERVENTO 2014RNHA0043 E' STATO STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE COME DA NULLA OSTA ATERSIR. PEC DEL 18-12-2017. RICHIESTA HERA DEL 29-11-2017 PROT. 115133, VS PROT. AT/2017/7726
2018RNHA0001	Risanamento Scarico 9 Monte Ugone Verucchio	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Aperto	Verucchio	43,700.00	0		0	0	0	-43,700.00	-100	
							33,406,568	-16,763,000	12,007,000	27,307,099	-4,882,509	17,480,901	-6,099,469		

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 7 del 18 dicembre 2020

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2017 - Gestore HERA S.p.A.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore
Responsabile ad interim
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 18 dicembre 2020

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Riziero Santi

Il Segretario verbalizzante
F.to Benedetta Casadei

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 6 maggio 2021

il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna
