

PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione M2 - Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica

Infografiche Progetti ATERSIR



Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è lo strumento italiano per accedere al Next Generation EU (NGEU), il Fondo, conosciuto come “Recovery Fund” o “Recovery Plan”, che è stato approvato dal Consiglio Europeo a sostegno degli Stati membri colpiti dalla pandemia causata dal virus COVID-19 (Regolamento UE 2021/241).

ATERSIR, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti, è Soggetto Beneficiario del contributo PNRR e Soggetto Attuatore di primo livello per alcuni progetti relativi alla Missione 2 del PNRR, presentati nelle seguenti infografiche.

La seconda Missione del PNRR, denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, si occupa dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento, al fine di migliorare la sostenibilità del sistema economico e assicura una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero.

I dati elaborati nelle seguenti infografiche sono tratti da ReGiS.

ReGiS è il sistema gestionale unico che racchiude, in un unico strumento, le funzionalità che servono a gestire e monitorare le diverse fasi in cui si articolano le Misure ed i Progetti del PNRR. Al sistema informativo ReGiS hanno accesso le Unità di Missione istituite presso le Amministrazioni centrali titolari delle Misure, gli uffici e le strutture coinvolte nell'attuazione del Piano e i Soggetti Attuatori.

Realizzazione Centro del Riuso Comunale (MTE11A_00002943)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Comune di San Lazzaro
CUP - E67H20001450006
Localizzazione - San Lazzaro di Savena



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

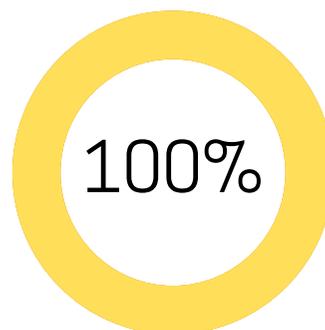

Importo complessivo del progetto

905.713,36 €

Avanzamento finanziario al 01/04/2025

902.116,08 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

246.586,47 €

Acquisto Ecostations Informatizzate (MTE11A_00000426)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - San Donnino
CUP - I51E21000010008
Localizzazione - Fidenza



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

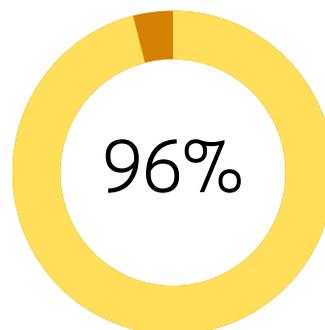

Importo complessivo del progetto

139.200,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

133.520,64 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

139.200,00 €

Contenitori Smarty Rind (MTE11A_00003685)

Soggetto attuatore - ATERSIR

Soggetto realizzatore - Hera

CUP - H71E22000230001

Localizzazione - Cervia, Faenza, Ravenna, Russi, Casola Valsenio,
Brisighella, Castel Bolognese



Missione M2
Componente C1

Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

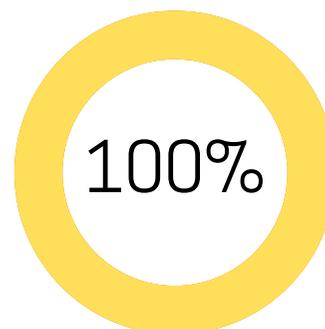

Importo complessivo del progetto

809.464,08 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

809.464,08 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

762.399,00 €

Raccolta Tracciata del Rifiuto Indifferenziato e Tarip (MTE11A_00000574)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Soelia
CUP - B91E22000210001
Localizzazione - Argenta



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

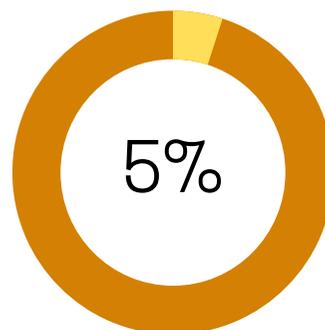

Importo complessivo del progetto
1.180.665,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

59.122,91 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

1.000.000,00 €

Adeguamento Centro di Raccolta (MTE11A_00002310)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - San Donnino
CUP - I55I22000610001
Localizzazione - Fidenza



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO

SOSPESO

AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

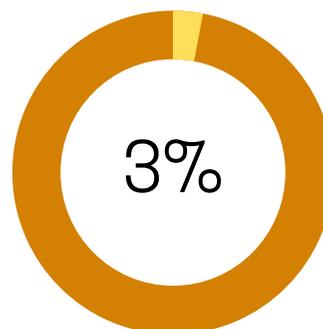

Importo complessivo del progetto

808.286,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

25.064,00 €



Totale contributo PNRR

114.497,06 €

Progetto per la Realizzazione di Stazioni di Flessibilizzazione Informatizzate per il Conferimento Occasionale di Alcune Tipologie di Rifiuti (MTE11A_00002980)



Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Clara
CUP - D31E23000140006
Localizzazione - Vari Comuni


Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

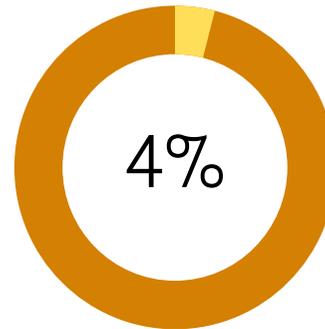

Importo complessivo del progetto

763.200,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

29.767,59 €



Totale contributo PNRR

763.200,00 €

Progetto Congiunto di Geolocalizzazione Mezzi e Sistema di Lettura Mastelli a Bordo Macchina per Applicazione Tari Misurata - Gestionale per Ottimizzazione Logistica e Pianificazione (MTE11A_00001468)



Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Clara
CUP - D31E23000130006
Localizzazione - Vari Comuni

Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

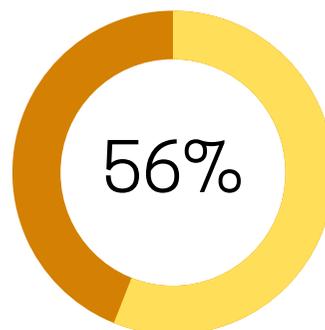

Importo complessivo del progetto

991.100,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

559.169,00 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

991.100,00 €

Sistema Duale - Evoluzioni (MTE11A_00001875)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H12F22001210001
Localizzazione - Vari Comuni



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

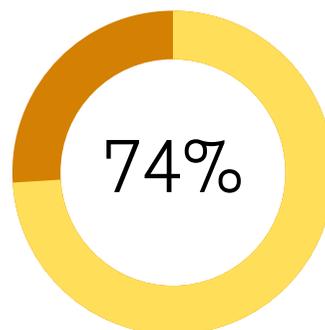

Importo complessivo del progetto

460.000,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

341.339,09 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

460.000,00 €

Sistema Software e Hardware Arco40Evo per Lettura Dati per Tarip (MTE11A_00002221)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - San Donnino
CUP - I51E20000390001
Localizzazione - Fidenza



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

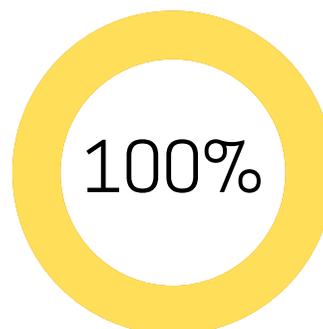

Importo complessivo del progetto

42.899,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

42.898,38 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

42.899,00 €

1) Ecostation Presscontainer (MTE11A_00004058)

Soggetto attuatore - ATERSIR

Soggetto realizzatore - Geovest

CUP - C81E22000030002

Localizzazione - Argelato, Castel Maggiore, Sala Bolognese



Missione M2

Componente C1

Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

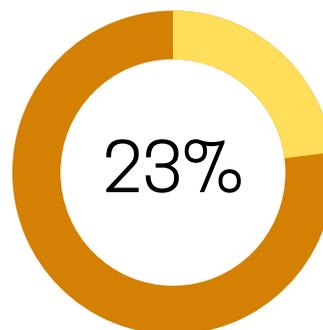

Importo complessivo del progetto

995.000,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

231.724,20 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

995.000,00 €

2) Ecostation Presscontainer (MTE11A_00004228)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Geovest
CUP - C91E22000050002
Localizzazione - Calderara di Reno, Crevalcore



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

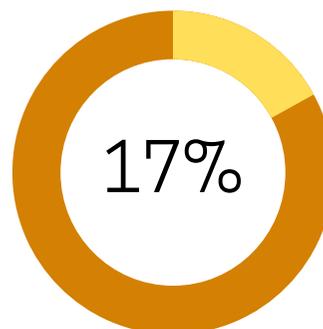

Importo complessivo del progetto
1.263.313,89 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

214.100,84 €



Totale contributo PNRR

848.000,00 €

3) Ecostation Presscontainer (MTE11A_00004134)

Soggetto attuatore - ATERSIR

Soggetto realizzatore - Geovest

CUP - C61E22000060002

Localizzazione - Finale Emilia, Sant'Agata Bolognese



Missione M2
Componente C1

Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

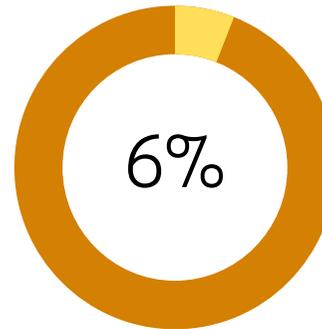

Importo complessivo del progetto

1.490.302,10 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

84.982,58 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

985.000,00 €

4) Ecostation Presscontainer (MTE11A_00004168)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Geovest
CUP - C51E22000060002
Localizzazione - San Giovanni in Persiceto




Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1
Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO

- AGGIUDICAZIONE
- STIPULA CONTRATTO
- ESECUZIONE LAVORI
- COLLAUDO
- INTERVENTO CONCLUSO

Percentuale di avanzamento economico finanziario

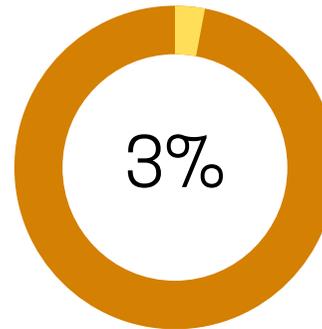

Importo complessivo del progetto
1.484.373,40 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

48.350,93 €



Totale contributo PNRR
1.000.000,00 €

5) Ecostation Presscontainer (MTE11A_00004202)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Geovest
CUP - C41E22000080002
Localizzazione - Anzola dell'Emilia, Nonantola, Ravarino



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

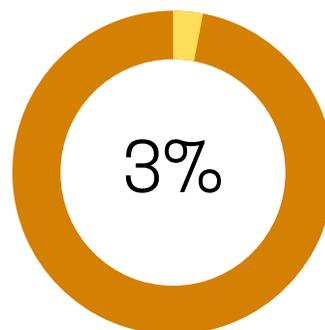

Importo complessivo del progetto
1.405.600,95 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

47.848,28 €



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

966.000,00 €

Fototrappole (MTE11A_00001158)

Soggetto attuatore - ATERSIR

Soggetto realizzatore - Hera

CUP - H61E22000160006

Localizzazione - Provincia Ravenna e Forlì Cesena



Missione M2
Componente C1

Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO

SOSPESO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

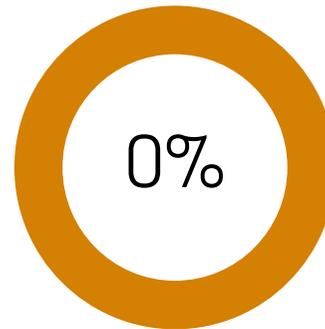

Importo complessivo del progetto

750.000,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

0 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

750.000,00 €

Cassonetti Intelligenti per Ottimizzazione delle Raccolte ed Accesso Controllato dei Conferitori (MTE11A_00005107)



Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Marche Multiservizi
CUP - D71E23000080006
Localizzazione - Montecopiolo

Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO

SOSPESO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

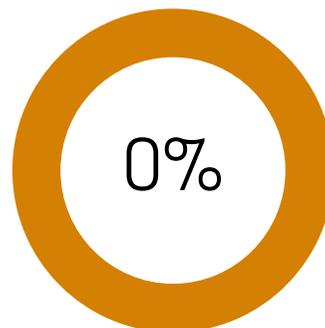

Importo complessivo del progetto

354.900,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

0 €



Totale contributo PNRR

354.900,00 €

Centro Riuso (MTE11A_00001578)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Alea
CUP - D62F22001110002
Localizzazione - Forlì




Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

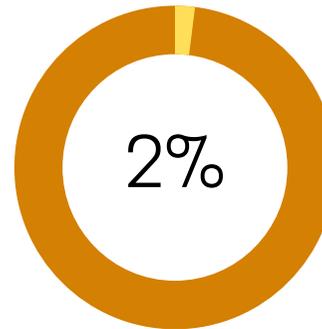

Importo complessivo del progetto

5.144.266,61 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

120.883,66 €



Totale contributo PNRR

1.000.000,00 €

Contenitori Eco Smarty (MTE11A_00001153)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H71E22000220001
Localizzazione - Provincia Ravenna



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

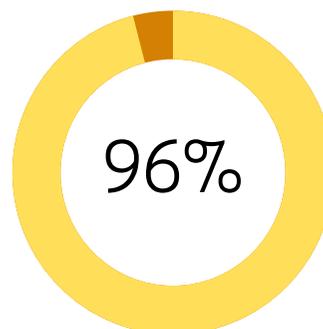

Importo complessivo del progetto

660.000,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

636.322,38 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

660.000,00 €

Cdr Nuovo Centro Di Raccolta (MTE11A_00002085)

Soggetto attuatore - ATERSIR

Soggetto realizzatore - Hera

CUP - H92F22000840006

Localizzazione - Modena - Via Gabriele D'annunzio



Missione M2

Componente C1

Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

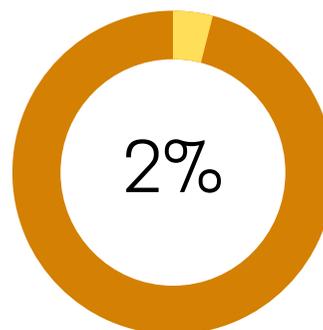

Importo complessivo del progetto

1.000.000,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

7.336,67 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

833.333,33 €

Realizzazione centro di raccolta rifiuti intercomunale (MTE11A_00001451)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Alea
CUP - D62F22001100002
Localizzazione - Forlì



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

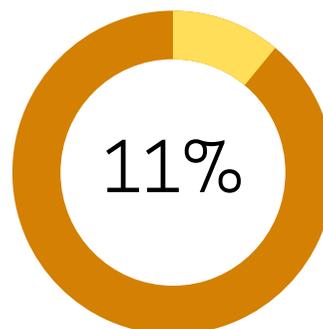

Importo complessivo del progetto

4.575.733,42 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

481.881,65 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

1.000.000,00 €

Progetto di Rimodulazione ed Implementazione del Sistema di Raccolta Differenziata Delle Aree Litoranee e Realizzazione di N. 2 Stazioni Stagionali di Raccolta dei Rifiuti Differenziati (MTE11A_00002343)



Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Clara
CUP - D51E23000190006
Localizzazione - Comacchio

Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

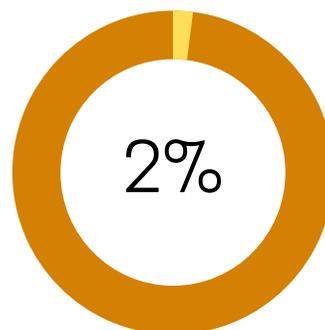

Importo complessivo del progetto

977.320,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

21.980,00 €



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

977.320,00 €

Contenitori Smarty Rind (MTE11A_00001357)

Soggetto attuatore - ATERSIR

Soggetto realizzatore - Hera

CUP - H31E22000230001

Localizzazione - Riolunato, Sassuolo, Serramazzoni, Savignano sul Panaro

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani



Missione M2

Componente C1

Linea di investimento 1.1

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

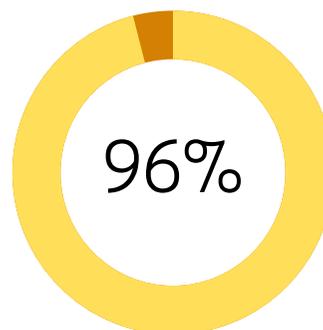

Importo complessivo del progetto

1.260.227,53 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

1.215.222,81 €



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

960.669,00 €

Riqualificazione e Ampliamento Centro di Raccolta (MTE11A_00002626)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Comune di Bedonia
CUP - J39D23000020005
Localizzazione - Bedonia




Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1
Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO

- AGGIUDICAZIONE
- STIPULA CONTRATTO
- ESECUZIONE LAVORI
- COLLAUDO
- INTERVENTO CONCLUSO

Percentuale di avanzamento economico finanziario

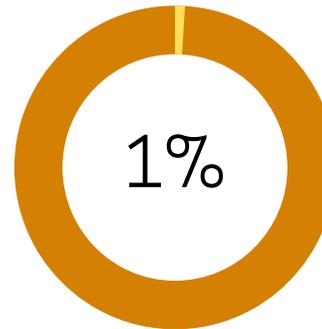

Importo complessivo del progetto

265.999,99 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

3.889,15 €



Totale contributo PNRR

239.285,70 €

Cdr Nuovo Centro Di Raccolta (MTE11A_00001552)

Soggetto attuatore - ATERSIR

Soggetto realizzatore - Hera

CUP - H62F22000560006

Localizzazione - Ravenna - Via Secondo Bini



Missione M2
Componente C1

Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

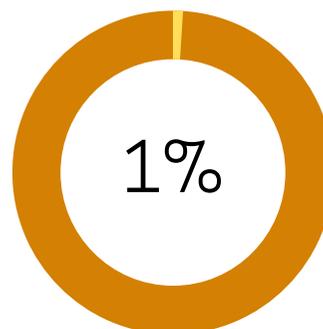

Importo complessivo del progetto

1.000.000,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

0 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

833.333,33 €

Cdr Adeguamento e Revamping Centro Di Raccolta (MTE11A_00001808)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H95I22000250006
Localizzazione - Modena - Via Mattarella



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

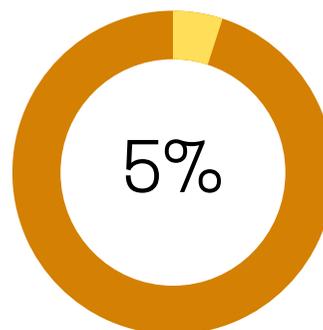

Importo complessivo del progetto

631.876,24 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

32.122,86 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

262.500,00 €

Cdr Adeguamento e Revamping Centro Di Raccolta (MTE11A_00001810)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H95I22000240006
Localizzazione - Modena - Via Nobili



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

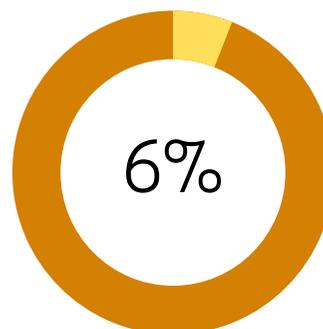

Importo complessivo del progetto

571.251,85 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

32.820,21 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

250.000,00 €

Cdr Adeguamento e Revamping Centro Di Raccolta (MTE11A_00001886)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H85I22000280006
Localizzazione - Pievepelago



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

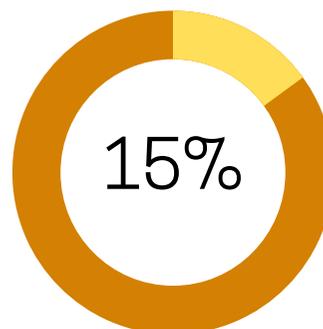

Importo complessivo del progetto

105.000,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

16.388,98 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

87.500,00 €

Cdr Adeguamento e Revamping Centro Di Raccolta (MTE11A_00001994)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H65I22000280006
Localizzazione - Ravenna - Via Steiner



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

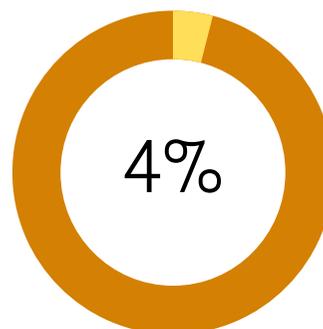

Importo complessivo del progetto

557.110,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

20.106,00 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

258.333,33 €

Cdr Adeguamento e Revamping Centro Di Raccolta (MTE11A_00002448)

Soggetto attuatore - ATERSIR

Soggetto realizzatore - Hera

CUP - H65I22000270006

Localizzazione - Lido di Classe - Via Canale Pergami



Missione M2

Componente C1

Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

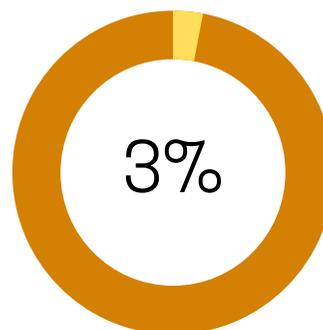

Importo complessivo del progetto

541.977,22 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

17.756,00 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

233.333,33 €

Cdr Adeguamento e Revamping Centro Di Raccolta (MTE11A_00002090)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H65I22000330006
Localizzazione - Mezzano - Via Campo Sportivo



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

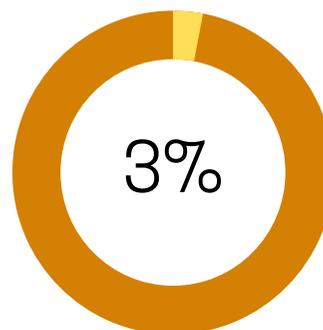

Importo complessivo del progetto

581.922,42 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

19.189,66 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

333.333,33 €

Installazione di Stazioni di Conferimento Automatizzate Presso Luoghi Avocazione Turistica (MTE11A_00004617)

Soggetto attuatore - ATERSIR

Soggetto realizzatore - Alea

CUP - D31E22000410006

Localizzazione - Bertinoro, Castrocara, Civitella, Portico, Forlì



Missione M2

Componente C1


Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

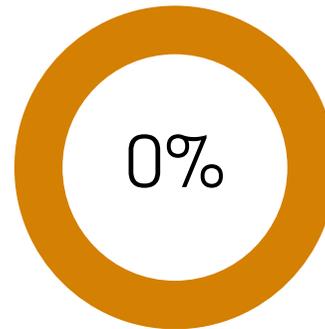

Importo complessivo del progetto

289.000,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

0 €



Totale contributo PNRR

288.541,67 €

Cassonetti Intelligenti per Ottimizzazione delle Raccolte ed Accesso Controllato dei Conferitori (MTE11A_00005018)



Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Marche Multiservizi
CUP - D81E23000430006
Localizzazione - Sassofeltrio

Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO

SOSPESO

AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario



Importo complessivo del progetto

285.600,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

0 €



Totale contributo PNRR

285.600,00 €

Cdr Adeguamento e Revamping Centro Di Raccolta (MTE11A_00002137)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H65I22000340006
Localizzazione - Roncalceci - Via dello Stagnino



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

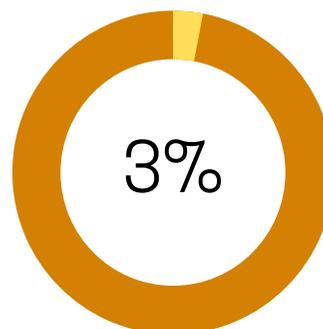

Importo complessivo del progetto

558.448,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

17.634,28 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

291.666,67 €

Cdr Adeguamento e Revamping Centro Di Raccolta (MTE11A_00002450)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H65I22000290006
Localizzazione - Ravenna - Via Don Carlo Sala



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

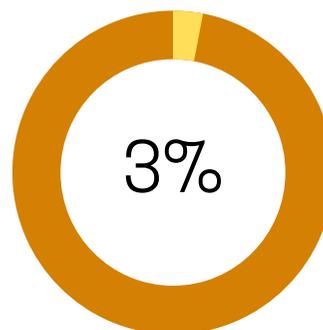

Importo complessivo del progetto

550.837,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

20.306,00 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

241.666,67 €

Cdr Adeguamento e Revamping Centro Di Raccolta (MTE11A_00002461)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H65I22000320006
Localizzazione - Lido Adriano - Via Bonifica



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

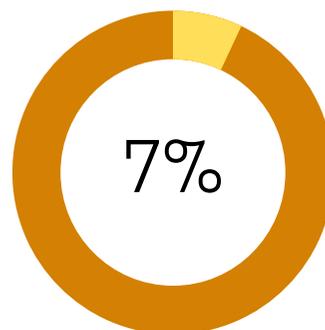

Importo complessivo del progetto

361.378,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

25.839,44 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

150.000,00 €

Cdr Adeguamento e Revamping Centro Di Raccolta (MTE11A_00002467)

Soggetto attuatore - ATERSIR

Soggetto realizzatore - Hera

CUP - H65I22000310006

Localizzazione - Marina di Ravenna - Via dei Mille



Missione M2

Componente C1

Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento economico finanziario

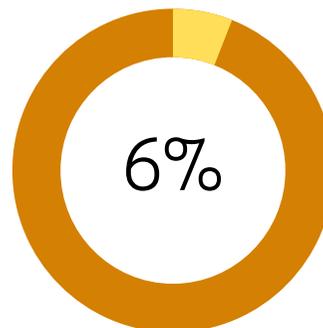

Importo complessivo del progetto

419.182,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

26.251,20 €



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

166.666,67 €

Cdr Adeguamento e Revamping Centro Di Raccolta (MTE11A_00002482)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H65I22000300006
Localizzazione - Marina Romea - Via dei Salici



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

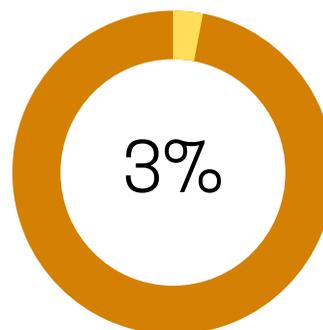

Importo complessivo del progetto

312.192,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

10.175,26 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

141.666,67 €

Cdr Adeguamento e Revamping Centro Di Raccolta (MTE11A_00002604)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H65I22000350006
Localizzazione - S.Alberto - Via del Lavoro



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

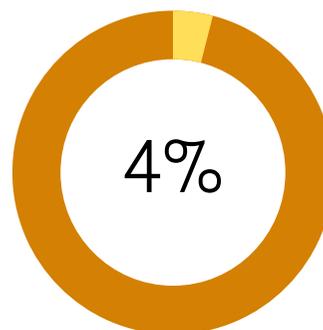

Importo complessivo del progetto

543.972,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

21.274,26 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

291.666,67 €

Centro del Riuso (MTE11A_00001571)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Soelia
CUP - B91E22000220001
Localizzazione - Argenta



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

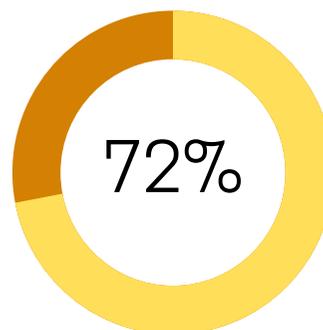

Importo complessivo del progetto

81.730,98 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

58.898,18 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

50.518,40 €

Realizzazione centro di raccolta rifiuti intercomunale (MTE11A_00005241)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Alea
CUP - D42F22001060002
Localizzazione - Meldola



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

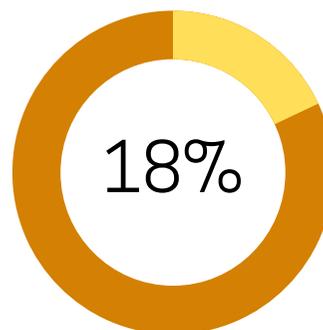

Importo complessivo del progetto

842.414,03 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

150.430,89 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

695.833,33 €

Dotazioni Hardware, Software per Applicazioni Iot, Geolocalizzazione, Trasmissione Dati Raccolta (MTE11A_00001786)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Alea
CUP - D76G22000530002
Localizzazione - Vari comuni



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

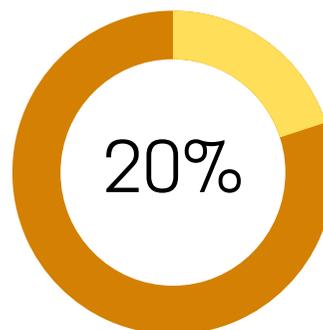

Importo complessivo del progetto
1.294.265,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

257.367,30 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

1.000.000,00 €

DContenitori Eco Smarty (MTE11A_00001171)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H41E22000170001
Localizzazione - Cervia e Ravenna



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

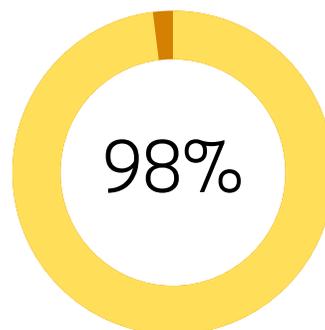

Importo complessivo del progetto

990.000,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

974.337,06 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

990.000,00 €

Isole Interrate (MTE11A_00003726)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H21E22000260006
Localizzazione - Faenza




Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1
Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO

- AGGIUDICAZIONE**
- STIPULA CONTRATTO**
- ESECUZIONE LAVORI**
- COLLAUDO**
- INTERVENTO CONCLUSO**

Percentuale di avanzamento economico finanziario

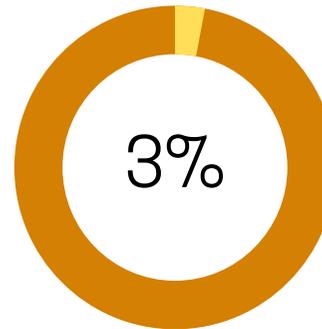

Importo complessivo del progetto

300.000,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

0 €



Totale contributo PNRR

250.000,00 €

Isole Interrate (MTE11A_00001261)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H81E22000130006
Localizzazione - Cervia




Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO

- AGGIUDICAZIONE**
- STIPULA CONTRATTO**
- ESECUZIONE LAVORI**
- COLLAUDO**
- INTERVENTO CONCLUSO**

Percentuale di avanzamento
economico finanziario

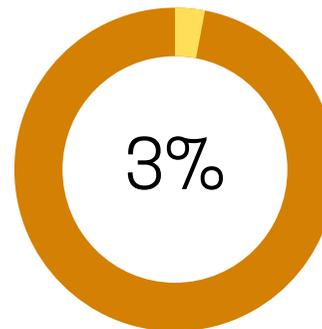

Importo complessivo del progetto

300.000,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

2.756,60 €



Totale contributo PNRR

250.000,00 €

Cdr Nuovo Centro Di Raccolta (MTE11A_00001616)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H32F22000490006
Localizzazione - Montese



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

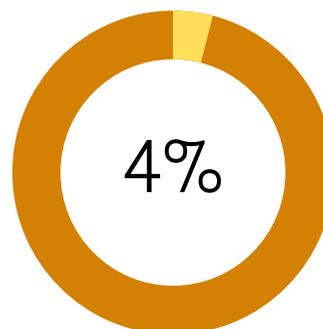

Importo complessivo del progetto

550.000,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

22.673,38 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

458.333,33 €

Cdr Nuovo Centro Di Raccolta (MTE11A_00001644)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H92F22000850006
Localizzazione - Polinago



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

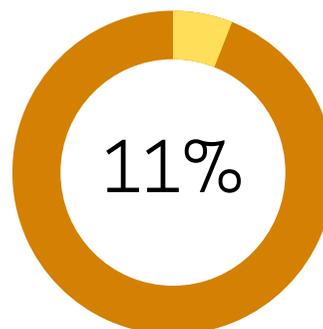

Importo complessivo del progetto

250.000,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

28.521,17 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

208.333,33 €

Cdr Nuovo Centro Di Raccolta (MTE11A_00003675)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H62F22000550006
Localizzazione - San Lazzaro di Savena



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

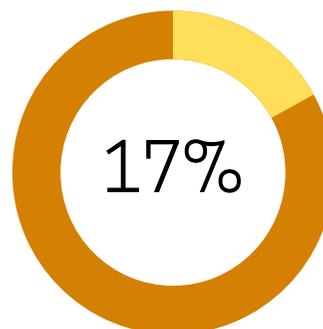

Importo complessivo del progetto

1.000.000,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

177.386,20 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

833.333,33 €

Cdr Nuovo Centro Di Raccolta (MTE11A_00003692)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H62F22000580006
Localizzazione - Palagano



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO

SOSPESO

AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

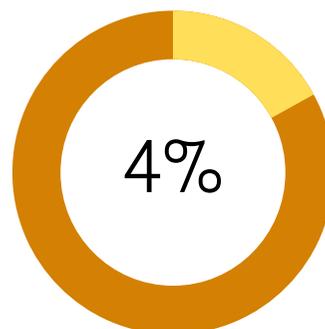

Importo complessivo del progetto

550.000,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

19.459,76 €



Totale contributo PNRR

458.333,33 €

Cdr Adeguamento E Revamping Centro Di Raccolta (MTE11A_00003010)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H72F22000590006
Localizzazione - Castel Bolognese



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

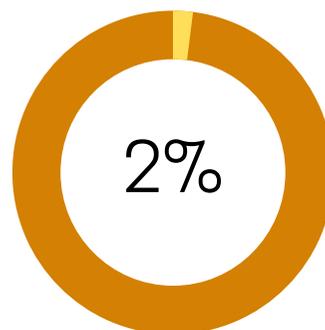

Importo complessivo del progetto

200.000,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

4.300,00 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

166.666,67 €

Realizzazione Del Nuovo Centro Di Raccolta (MTE11A_00005172)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - Hg2F22000860006
Localizzazione - Savignano sul Panaro



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

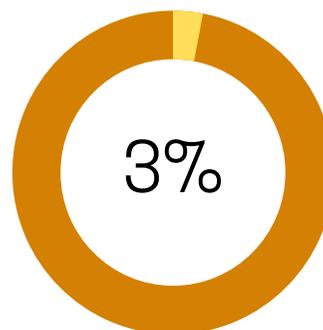

Importo complessivo del progetto

850.000,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

26.922,02 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

708.333,33 €

Cdr Adeguamento E Revamping Centro Di Raccolta (MTE11A_00001890)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H25I22000230006
Localizzazione - Faenza



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

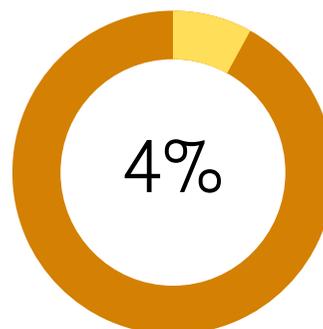

Importo complessivo del progetto

440.000,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

17.299,21 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

366.666,67 €

Cdr Adeguamento E Revamping Centro Di Raccolta (MTE11A_00001770)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H15I22000600006
Localizzazione - Formigine



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

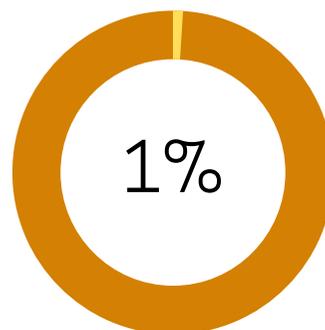

Importo complessivo del progetto

175.266,01 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

1.820,00 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

104.166,67 €

Cdr Adeguamento E Revamping Centro Di Raccolta (MTE11A_000016g6)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H15I23000030006
Localizzazione - Formigine



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

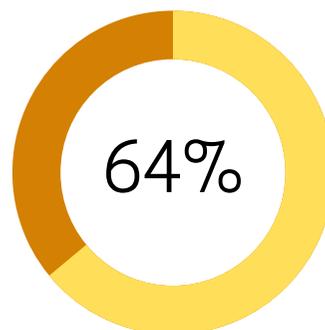

Importo complessivo del progetto

523.674,85 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

340.110,03 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

183.333,33 €

Contenitori Smarty Rind (MTE11A_00001361)

Soggetto attuatore - ATERSIR

Soggetto realizzatore - Hera

CUP - H71E22000240001

Localizzazione - Pavullo nel Frignano, Pievepelago,

Polinago, Prignano sulla Secchia



Missione M2
Componente C1

Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

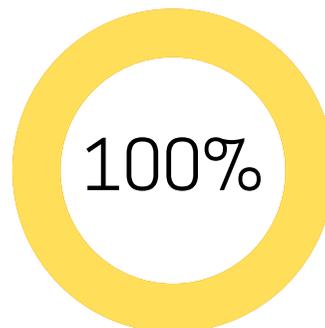

Importo complessivo del progetto

1.199.922,49 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

1.199.922,49 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

931.053,00 €

Cdr Adeguamento E Revamping Centro Di Raccolta (MTE11A_00001727)

Soggetto attuatore - ATERSIR

Soggetto realizzatore - Hera

CUP - F37H21005610004

Localizzazione - Castelvetro di Modena



Missione M2

Componente C1

Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

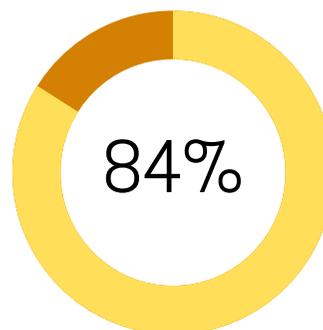

Importo complessivo del progetto

181.521,58 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

153.595,27 €



Totale contributo PNRR

125.000,00 €

Cassonetti intelligenti tipo "smarty" RIND_Smarty12 MO (MTE11A_00001320)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - Hg1E22000320001
Localizzazione - Modena



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

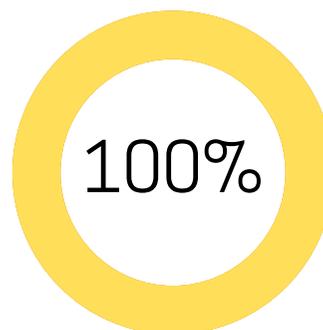

Importo complessivo del progetto
1.170.345,20 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

1.170.345,20 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

888.480,00 €

Cassonetti intelligenti tipo "smarty" RIND_Smarty13 MO (MTE11A_00001315)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - Hg1E22000330001
Localizzazione - Modena



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

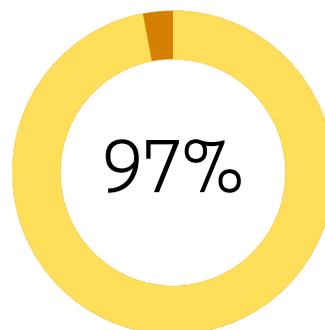

Importo complessivo del progetto

1.064.325,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

1.036.723,03 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

1.000.000,00 €

Cassonetti intelligenti tipo "smarty" RIND_Smarty14 MO (MTE11A_00001326)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - Hg1E22000340001
Localizzazione - Modena



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI



COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario



Importo complessivo del progetto
1.113.244,12 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

1.113.244,12 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

1.000.000,00 €

Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta_CDR40 (MTE11A_00002131)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - Hera
CUP - H15I20000090004
Localizzazione - Serramazzoni



Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1

Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

STATO DEL PROGETTO



AGGIUDICAZIONE



STIPULA CONTRATTO



ESECUZIONE LAVORI




COLLAUDO



INTERVENTO CONCLUSO



Percentuale di avanzamento
economico finanziario

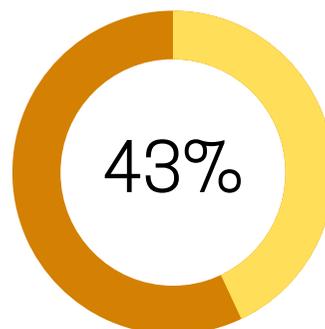

Importo complessivo del progetto

150.000,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

64.012,40 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Totale contributo PNRR

125.000,00 €

GIRU-ER: Gestione Integrata Rifiuti Urbani in Emilia-Romagna (MTE11B_00000708)

Soggetto attuatore - ATERSIR
Soggetto realizzatore - SABAR
CUP - D32F22001580009
Localizzazione - Novellara




Missione M2
Componente C1
Linea di investimento 1.1
Linea B - Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento

STATO DEL PROGETTO

- AGGIUDICAZIONE**
- STIPULA CONTRATTO**
- ESECUZIONE LAVORI**
- COLLAUDO**
- INTERVENTO CONCLUSO**

Percentuale di avanzamento
economico finanziario

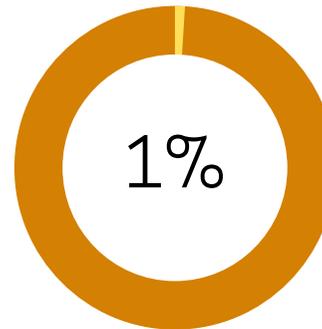

Importo complessivo del progetto

12.394.521,00 €

Avanzamento finanziario al 28/02/2025

85.835,09 €



Totale contributo PNRR

12.394.521,00 €

Contributo erogato

1.239.452,10 €
