

CLRE/2022/25 del 21 novembre 2022

**CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA**

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.a. - Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021.**

IL COORDINATORE

F.to Nico Giberti

CLRE/2022/25

### CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA

L'anno **2022** il giorno **21** del mese di **novembre** alle ore **14:30** si è riunito il Consiglio Locale di Reggio Emilia convocato con lettera prot. PG.AT/2022/0011530 del 16/11/2022.

La seduta si è svolta in modalità telematica.

Assume la presidenza il Coordinatore Nico Giberti

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBINEA	Giberti Nico	Sindaco	SI	1,5684
BAGNOLO IN PIANO			NO	1,6866
BAISO	Corti Fabrizio	Sindaco	SI	0,7102
BIBBIANO	Bellelli Loretta	Assessore	SI	1,7833
BORETTO	Benassi Matteo	Sindaco	SI	1,0190
BRESCELLO	Benassi Elena	Sindaco	SI	1,0832
CADELBOSCO DI SOPRA	Bellaria Luigi	Sindaco	SI	1,8570
CAMPAGNOLA EMILIA	Santachiara Alessandro	Sindaco	SI	1,0609
CAMPEGINE	Spanò Alessandro	Sindaco	SI	1,0351
CANOSSA			NO	0,7856
CARPINETI	Borghi Tiziano	Sindaco	SI	0,8115
CASALGRANDE	Benassi Daniele	Assessore	SI	3,1255
CASINA			NO	0,9092
CASTELLARANO	Zanni Giorgio	Sindaco	SI	2,5794
CASTELNOVO DI SOTTO	Francesco Monica	Sindaco	SI	1,5117
CASTELNOVO NE' MONTI	Borghi Chiara	Assessore	SI	1,8060
CAVRIAGO	Franzoni Matteo	Vicesindaco	SI	1,7312
CORREGGIO	Carlo Cabrini	Commissario	SI	4,0834
FABBRICO	Ferrari Roberto	Sindaco	SI	1,2326

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
GATTATICO	Ronzoni Luca	Sindaco	SI	1,0938
GUALTIERI	Bergamini Renzo	Sindaco	SI	1,1828
GUASTALLA	Verona Camilla	Sindaco	SI	2,4785
LUZZARA			NO	1,5103
MONTECCHIO EMILIA			NO	1,8182
NOVELLARA	Carletti Elena	Sindaco	SI	2,2758
POVIGLIO	Ferraroni Cristina	Sindaco	SI	1,3055
QUATTRO CASTELLA	Olmi Alberto	Sindaco	SI	2,2353
REGGIO EMILIA	De Franco Lanfranco	Sindaco	SI	26,3332
REGGIOLO	Angeli Roberto	Sindaco	SI	1,6200
RIO SALICETO	Malavasi Lucio	Sindaco	SI	1,1377
ROLO	Nasi Luca	Sindaco	SI	0,8373
RUBIERA			NO	2,4975
SAN MARTINO IN RIO	Fuccio Paolo	Sindaco	SI	1,4789
SAN POLO D'ENZA			NO	1,1646
SANT'ILARIO D'ENZA	Perucchetti Carlo	Sindaco	SI	1,9422
SCANDIANO	Nasciuti Matteo	Sindaco	SI	4,1863
TOANO	Volpi Vincenzo	Sindaco	SI	0,8488
VENTASSO			NO	0,8251
VETTO			NO	0,4889
VEZZANO SUL CROSTOLO			NO	0,8777
VIANO	Borghetti Nello	Sindaco	SI	0,7301
VILLAMINOZZO			NO	0,7517
PROVINCIA di REGGIO EMILIA	Zanni Giorgio	Presidente	SI	10,0000

**Presenti n. 31 quote 84,8787 Assenti n. 12 quote 15,1213**



Il Coordinatore Nico Giberti, invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.a. - Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021.**

**Vista** la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato** che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

**considerato** che:

- con Deliberazione n° 5 del 30 novembre 2018 del Consiglio Locale di Reggio Emilia è stato approvato il Programma Operativo degli Interventi per gli anni 2019-2022 con revisione straordinaria annualità 2019, per il Gestore Ireti S.p.a.;
- con deliberazione n.57 del Consiglio d'Ambito 11 dicembre 2020 sono state approvate le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Parma, Piacenza e Reggio Emilia gestiti da IRETI S.p.A. e dalla partecipata IRETI S.p.A.;
- con deliberazione n. del 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, il Consiglio d'Ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per la redazione e l'aggiornamento del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato": modifiche ed integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017";
- la deliberazione n. 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, inoltre dispone che:

- entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
- il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
- il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

**dato atto che:**

- il gestore Ireti S.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2021 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata a tutti i comuni del bacino provinciale di Reggio Emilia, in allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale;

**rilevato** che i dati presentati relativi all'annualità 2021 sono stati analizzati e sintetizzati nell'Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:

- interventi non avviati;
- interventi anticipati/conclusi;
- interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 2020 - 2023 vigente - annualità 2021, autorizzati con nulla osta ai sensi della CAMB 75/2017 modificata ed integrata dalla CAMB 64/2022;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al +/- 20%;

**rilevato** inoltre che:

- gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 approvato per l'annualità 2021;
- è stata effettuata un'analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;

- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva

**ritenuto** pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**dato atto** che il verbale della seduta è depositato agli atti.

**a voti unanimi e palesi,**

#### **DELIBERA**

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 per il gestore Irete S.p.a. per il bacino tariffario ad esso afferente, come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

\*\*\*\*\*



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 25 del 21 novembre 2022

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.a. - Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

La Dirigente  
Area Servizio idrico Integrato  
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 21 novembre 2022

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO  
2021**

**GESTORE: IRETI S.p.a.  
BACINO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA**



## 1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2021, del Programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 5 del 30/11/2018, integrato con Delibera n. 9 del 22/10/2021, che il gestore IRETI ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
<b>GESTORE</b>	23.080.425,00	35.711.050,12	+12.630.625,12	155%
<b>SOCIETÀTERZE</b>	//	//	//	//
<b>FINANZIAMENTI PUBBLICI</b>	720.060,00	1.172.367,71	+452.307,71	163%
<b>TOTALE</b>	<b>23.800.485,00</b>	<b>36.883.417,83</b>	<b>+13.082.932,83</b>	<b>155%</b>

TAB.1 – Tabella di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2021 (esclusi gli investimenti di struttura)

Gli investimenti di struttura per l'anno 2021 ammontano ad €. 2.025.970,27. Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IRETI, abbia effettuato nel corso del 2021 investimenti superiori rispetto al pianificato e pari al 155% con riferimento a quelli direttamente finanziati. Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo perduto il totale consuntivato è superiore di quello pianificato e pari al 163%. Complessivamente la percentuale degli investimenti realizzati rispetto a quelli pianificati è pari al 155%.

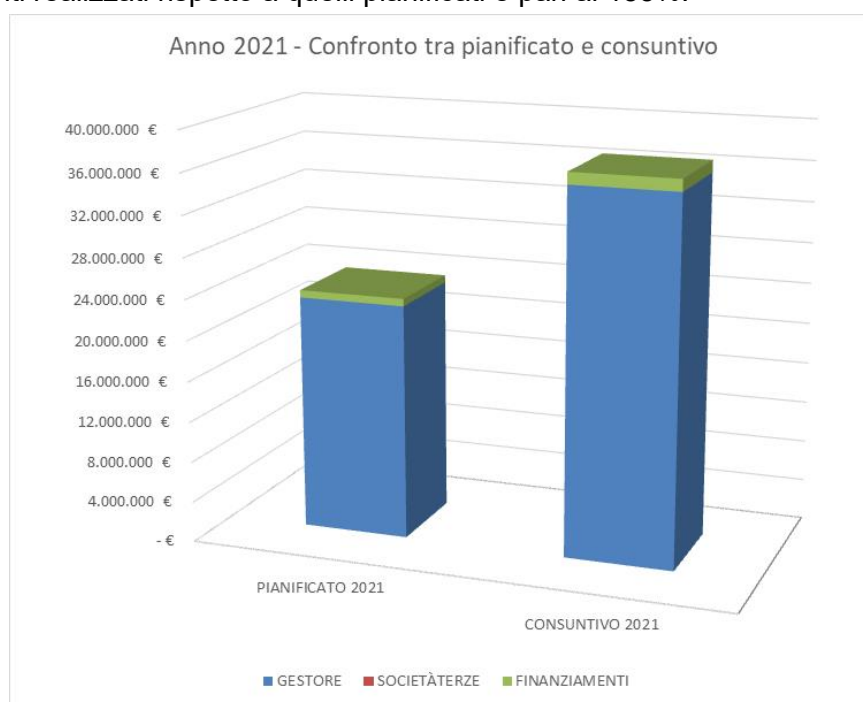


FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021

I maggiori contributi incassati sono riferiti alla compartecipazione relativamente agli estendimenti di rete richiesti da soggetti privati ed ai nuovi allacci, di seguito elencati.

<b>Codice</b>	<b>Titolo</b>	<b>Comuni</b>	<b>Maggiori Contributi incassati</b>
2014REIA0091	5.2.2. - 5.2.4. - 5.2.5. - 5.2.6. - 5.2.9. - 5.2.9. - 5.2.11. - 5.2.12. - 5.2.13 - Manutenzioni straordinarie acqua	Opere pluricomunali	+3.848,92
2016REIA0145	Estendimento reti a carico di privati	Opere pluricomunali	+167.380,00
2018REIA0170	Alluvione Lentigione - Brescello 11/12/2017 - Ripristino danni rete fognaria	Brescello	+16.734,70
2018REIA0256	Estendimenti acqua in zone non servite	Opere pluricomunali	+188.205,00
2018REIA0258	Nuovi Allacci	Opere pluricomunali	+76.139,09
<i>TAB.2 – Interventi con maggiori contributi incassati</i>			<b>TOTALE</b>
			<b>452.307,71</b>

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

## 1. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio.

	<b>PIANIFICATO 2021</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>DIFF. %</b>
<b>ACQUEDOTTO</b>	14.347.125,00	20.324.183,21	5.977.058,21	142%
<b>DEPURAZIONE</b>	5.150.000,00	8.595.615,51	3.445.615,51	167%
<b>FOGNATURA</b>	3.373.360,00	6.928.482,76	3.555.122,76	205%
<b>ACQUE METEORICHE</b>	600.000,00	550.485,85	-49.514,15	92%
<b>TUTTI</b>	330.000,00	484.650,50	154.650,50	147%
<b>TOTALE</b>	<b>23.800.485,00</b>	<b>36.883.417,83</b>	<b>13.082.932,83</b>	<b>155%</b>

*TAB.3 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio*

Gli investimenti pianificati e quelli realizzati nell'annualità 2021 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

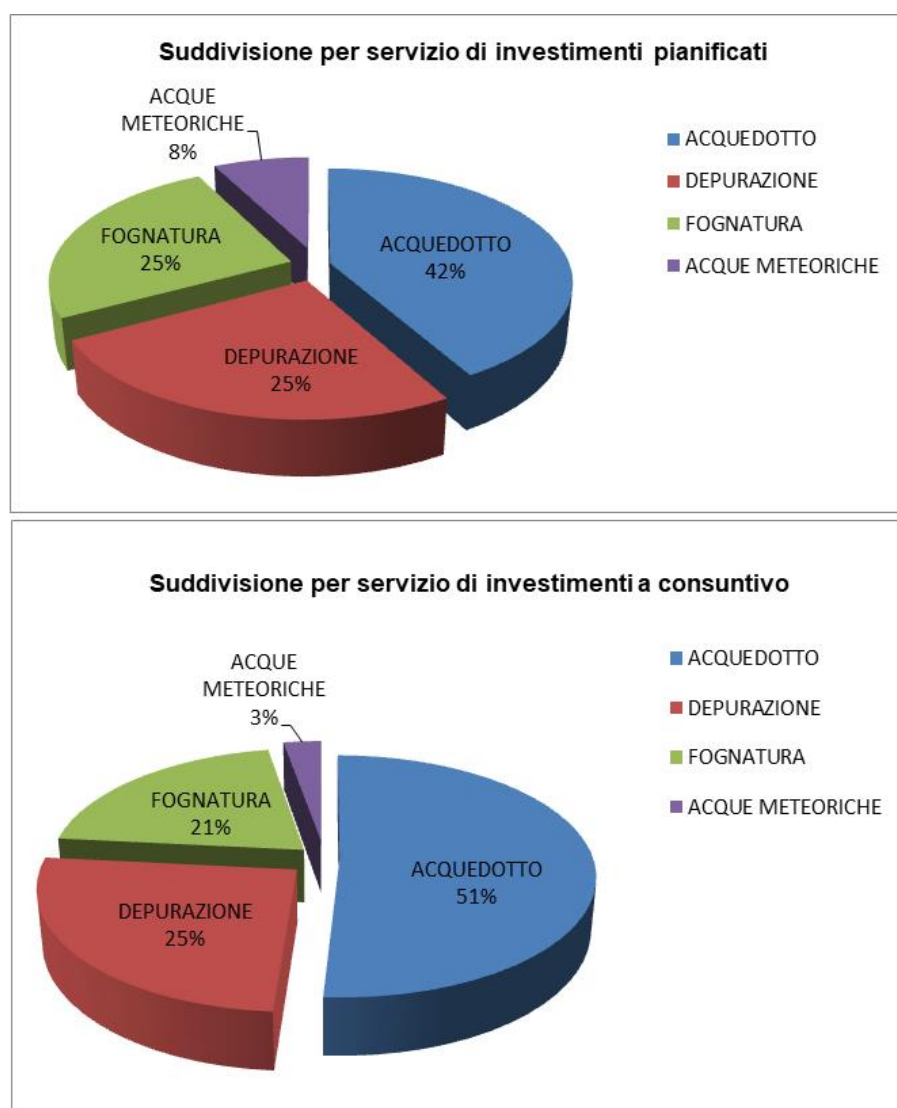


FIG.2 –Suddivisione investimenti 2021 per servizio

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

	<b>PIANIFICATO 2021</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>DIFF %</b>
<b>ACQUEDOTTO</b>	3.300.000,00	10.062.061,74	6.762.061,74	305%
<b>DEPURAZIONE</b>	2.000.000	5.044.304,67	3.044.304,67	252%
<b>FOGNATURA</b>	2.000.000	4.064.615,80	2.064.615,80	203%
<b>ACQUE METEORICHE</b>	600.000	550.485,85	-49.514,15	92%
<b>TOTALE</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>19.721.468,06</b>	<b>11.821.468,06</b>	<b>250%</b>

TAB.4 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi puntuali che si rendono necessari durante l'anno.

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale degli interventi.

	<b>N.</b>	<b>PIANIFICATO 2021</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>DIFF. %</b>
Fino a 500.000 €	161	3.923.360,00	6.037.263,85	2.113.903,85	154%
500.001-1.000.000 €	26	2.700.000,00	1.326.274,06	-1.373.725,94	49%
1.000.001-2.000.000 €	12	2.130.000,00	2.686.514,64	556.514,64	126%
2.000.001-5.000.000 €	7	3.150.000,00	3.367.654,20	217.654,20	107%
Oltre 5.000.000 €	0	//	//	///	//
Manutenzioni e titoli cumulativi	28	11.897.125,00	23.465.711,08	11.568.586,08	197%
<b>TOTALE</b>	<b>234</b>	<b>23.800.485,00</b>	<b>36.883.417,83</b>	<b>13.082.932,83</b>	<b>155%</b>

*TAB.5 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi*

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono riconducibili principalmente ai seguenti fattori:

- Ritardo dovuto alla necessità di acquisire aree o servitù, per le quali è necessario avviare il procedimento espropriativo;
- Interventi che devono essere realizzati in progressione temporale successiva rispetto ad altri già avviati;
- Necessità di revisione delle progettazioni per modifiche normative o in seguito al confronto con le amministrazioni comunali.

Per quanto concerne i numerosi interventi per i quali vi sono difficoltà legate all'acquisizione di aree e/o servitù, Atersir ha chiesto al Gestore di fornire un elenco dei procedimenti, al fine di poter calendarizzare le attività ed avviare le Conferenze dei servizi ai sensi dell'art. 158 bis del D.lgs 152/2006.

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o meno, esclusi gli investimenti di struttura.

Numero di interventi programmati nel 2021 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 41

Numero di interventi rendicontati (importo lordo consuntivo diverso da zero) nel 2021: 105.

	<b>NUMERO INTERVENTI</b>	<b>IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2021</b>	<b>IMPORTO LORDO CONSUNTIVO 2021</b>
Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%)	17	4.573.360	0
Interventi con avvio anticipato nel 2021 e chiusure di interventi già avviati contenuti nel programma degli interventi o nel piano d'ambito (+100%)	81	0	8.365.112,18
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%	18	14.583.500	23.654.763,44
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%	6	6.604.028	6.889.512,48

*TAB.6 – Scostamenti tra il rendicontato e il preventivato dal gestore*

Si può notare come il Gestore abbia anticipato diversi interventi rispetto alla pianificazione ed abbia rendicontato alcuni importi relativi a lavori ultimati nelle annualità precedenti. Per quegli interventi che presentano importi rendicontati con uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al + o - 20 % sono state fornite le note giustificative dal Gestore sugli scostamenti, rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

## 2. INTERVENTI NON AVVIATI

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021
1	2014REIA0087	5.2.25 - Estendimenti acqua in zone non servite. zone contaminate da arsenico Comuni di Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto	A	Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto	Gestore	200.000,00	50.000,00
2	2014REIA0088	5.4.11 - Estensione fogne nere o miste	F	Opere pluricomunali	Gestore	369.044,00	100.000,00
3	2016REIA0111	Nuova vasca di stoccaggio Caprara (2000 mc)	A	Campegine	Gestore	1.500.000,00	500.000,00
4	2018REIA0177	Piano Fognario - Sistemazione scolmatore di piena in zona sportiva Via XXV Aprile	F	Albinea	Gestore	65.846,00	65.846,00
5	2018REIA0202	Piano Fognario - Potenziamento rete fognaria nella zona di Via Arduini - Via della Conciliazione e parte di Via della Repubblica	F	Cavriago	Gestore	150.000,00	150.000,00
6	2018REIA0206	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario nella zona tra XXV Aprile e Via A. Moro	F	Fabbrico	Gestore	80.529,00	80.529,00
7	2018REIA0211	Piano Fognario - Potenziamento della linea fognaria in Via Viazzolo Lungo	F	Guastalla	Gestore	226.985,00	226.985,00

	<b>Codice</b>	<b>Titolo</b>	<b>Servizio</b>	<b>Comuni</b>	<b>Tipo Investimento</b>	<b>Importo progettuale</b>	<b>Importo lordo pianificato 2021</b>
8	2018REIA0212	Realizzazione nuovo impianto filtrazione GAC centrale idrica di Aiola	A	Montecchio	Gestore	200.000,00	200.000,00
9	2018REIA0218	Sostituzione rete acqua adduttrice Via Fermi - Via Zappellazzo	A	Poviglio	Gestore	650.000,00	350.000,00
10	2018REIA0230	Potenziamento rete fognaria in F.lli Rosselli	F	Reggio Emilia	Gestore	300.000,00	300.000,00
11	2018REIA0231	Depuratore di Mancasale: adeguamento linea di digestione anaerobica	D	Reggio Emilia	Gestore	1.800.000,00	1.000.000,00
12	2018REIA0236	Potenziamento impianto chimico-fisico depuratore di Mancasale	D	Reggio Emilia	Gestore	600.000,00	300.000,00
13	2018REIA0241	Sostituzione rete acqua adduttrice in loc. San Faustino	A	Rubiera	Gestore	400.000,00	400.000,00
14	2018REIA0243	Piano Fognario - Rifacimento collettore fognario in Via Primo Maggio	F	Sant'Ilario d'Enza	Gestore	150.000,00	150.000,00

	<b>Codice</b>	<b>Titolo</b>	<b>Ser- vizio</b>	<b>Comuni</b>	<b>Tipo In- vesti- mento</b>	<b>Importo pro- gettuale</b>	<b>Importo lordo piani- ficato 2021</b>
15	2018REIA0245	Depuratore di Bosco	D	Scandiano	Gestore	450.000,00	250.000,00
16	2018REIA0246	Piano Fognario - Realizzazione colletto- re fognario in Via del Serraglio	F	Scandiano	Gestore	300.000,00	300.000,00
17	2018REIA0248	Unificazione scarichi loc. Acquabona	D	Ventasso	Gestore	150.000,00	150.000,00



Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Reggio Emilia

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
1	2014REIA0001	5.8.Uspf.90 - Potenziamento fognature Via Chierici e collegamento fognario e adeguamento Rio delle Muratte loc. Borzano	F	Albinea	185.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2014REIA0004	5.8.Uspf.91 - Realizzazione rete in loc. Casale	F	Baiso	150.000,00	-	-	-	63.400,00	-	63.400,00	63.400,00	100	Cantiere in fase di ultimazione: coda di intervento pianificato in precedenti annualità.
3	2014REIA0006	5.10.D15.1 - 5.10.D15.21 - 5.8.Uspf.111 - Agglomerato Boretto: potenziamento depuratore a 7500 AE	D	Boretto	1.317.024,00	-	-	-	438,13	-	438,13	438,13	100	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
4	2014REIA0007	5.10.D15.12 - 5.10.D15.26 - Adeguamento della potenzialità del depuratore capoluogo (completamento 1° linea)	D	Brescello	2.151.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	2014REIA0008	5.10.D15.41 - Potenziamento impianto depurazione	D	Cadelbosco di Sopra	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	2014REIA0010	5.8.Uspf.113 - Risanamento fognature capoluogo 1° stralcio	F	Campegine	95.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	2014REIA0012	5.8.Uspf.129 b - Razionalizzazione e risanamento rete fognaria in località Casettlo di Canossa	F	Canossa	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	2014REIA0018	5.8.Uspf.94 - Ristrutturazione rete fognaria capoluogo 3° stralcio	F	Casalgrande	278.527,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	2014REIA0019	Realizzazione di terzo pozzo S.Donnino	A	Casalgrande	200.000,00	-	-	-	6.254,01	-	6.254,01	6.254,01	100	Cantiere ultimato, pozzo in esercizio. Manca impianto di telecontrollo che verrà realizzato nel 2022
10	2014REIA0021	5.3.36 - M.RE Barazzone 6 km DN 300 (gabellina)	A	Casina	1.020.000,00	-	-	-	100.041,71	-	100.041,71	100.041,71	100	Cantiere in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per difficoltà di ottenimento servitù di passaggio
11	2014REIA0023	5.8.Uspf.116 - Realizzazione di Nuova fossa imhoff Montebabbio (100AE)	D	Castellarano	150.000,00	-	-	-	30.420,88	-	30.420,88	30.420,88	100	Fossa Imhoff e collettore fognario ultimati. Mancano lavori di sistemazione della strada di accesso
12	2014REIA0025	5.10.D15.23 - Adeguamento impianto di depurazione Rio Dorgola (2° linea acqua trattamento nutrienti ed adeguamento linea fanghi 1° stralcio)	D	Castelnovo Monti	700.000,00	-	-	-	7.835,86	-	7.835,86	7.835,86	100	Progettazione definitiva conclusa. In corso di affidamento con Appalto Integrato

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
13	2014REIA0026	5.10.D15.5 - Potenziamento Costa de Grassi: 2° linea	D	Castelnovo Monti	250.000,00	-	-	-	61.041,14	-	61.041,14	61.041,14	100	Cantiere sospeso. In ritardo rispetto alla pianificazione per problemi geologici dovuti alla limitrofa frana quiescente che sembra essersi riattivata. Su richiesta del geologo è stato realizzato un piezometro per rilevare eventuali movimenti profondi. in attesa dell'esito del monitoraggio
14	2014REIA0028	5.10.D15.17 - Castelnovo ne' Monti - Rio Spirola secondario - Realizzazione nitri+filtr.+sist.esistente	D	Castelnovo Monti	300.000,00	-	-	-	5.049,27	-	5.049,27	5.049,27	100	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
15	2014REIA0030	5.10.D15.7 5.10.D15.14 - Meletole: Impianto di depurazione 1° e 2° Linea	D	Castelnovo di Sotto	3.810.000,00	-	-	-	54.151,17	-	54.151,17	54.151,17	100	Cantiere in corso: aggiunti - 700.000 rispetto agli iniziali 3.110.000 per ristrutturazione vecchia linea
16	2014REIA0031	5.8.Uspf.96 - Estendimento fognario in Via Alberici, Meletole	F	Castelnovo di Sotto	154.710,00	-	-	-	23.568,95	-	23.568,95	23.568,95	100	Progettazione in corso di intervento sospeso in annualità precedenti per necessità di concordare la soluzione progettuale con il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale
17	2014REIA0032	5.8.Uspf.117 - Estendimento fognario Via Peschiera	F	Castelnovo di Sotto	150.000,00	-	-	-	105,60	-	105,60	105,60	100	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
18	2014REIA0033	5.8.Uspf.131 - Risanamento fognature capoluogo con interventi vari via Rivasi, via Marzabotto, via 1° Maggio, via Arduini, via Costituzione, via Spaggiari, via Grandi, Sottopasso Pianella, Via Girondola, via Guerra	F	Cavriago	250.357,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	2014REIA0034	5.10.D15.24 - Cerreto Alpi: 400 AE biodischi	D	Collagna	535.000,00	-	-	-	28.582,57	-	28.582,57	28.582,57	100	Progettazione definitiva conclusa, in corso iter autorizzativo
20	2014REIA0036	5.8.Uspf.96 - Interventi pregressi Dinazzano Lemizzone 1° lotto	F	Correggio	200.000,00	-	-	-	152,48	-	152,48	152,48	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
21	2014REIA0039	5.8.Uspf.98 - Potenziamento rete fognaria capoluogo. 1° stralcio	F	Gualtieri	140.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	2014REIA0041	5.10.D15.19 - Impianto di depurazione Guastalla Nord: nitri-denitri	D	Guastalla	300.000,00	-	-	-	60.857,92	-	60.857,92	60.857,92	100	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in precedenti annualità. Realizzati ultimi lavori di sistemazione dell'area
23	2014REIA0042	5.7.D11.3 - Madonna del Ficchetto: risoluzione criticità di deflusso	F	Guastalla	485.566,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	2014REIA0043	5.8.Uspf.99 - Collegamento fognario loc. San Giacomo alla rete depurata	F	Guastalla	165.000,00	-	-	-	17.353,92	-	17.353,92	17.353,92	100	Cantiere ultimato: eseguiti ripristini definitivi (tappeto d'usura) su intervento realizzato in precedenti annualità

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
25	2014REIA0044	5.8.Uspf.134 - Sistemazione fognature Giarola Campo	F	Ligonchio	137.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	2014REIA0045	5.3.7 - Nuovo serbatoio Luzzara mc 2000	A	Luzzara	1.800.000,00	-	-	-	10.738,10	-	10.738,10	10.738,10	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
27	2014REIA0049	5.3.8 - Completamento centrale idrica	A	Novellara	300.000,00	-	-	-	435,75	-	435,75	435,75	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità. Spese per completamento pratica edilizia. Collaudo statico ed agibilità
28	2014REIA0050	5.11.1.13 - San Bernardino: nuovo impianto biodischi 450 AE	D	Novellara	660.000,00	-	-	-	1.283,58	-	1.283,58	1.283,58	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
29	2014REIA0051	5.7.D11.4 - Potenziamento reticolo fognario in Via Caravaggio (ex via Curie)	F	Novellara	155.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	2014REIA0052	5.8.Uspf.81 - Risanamento fognatura Via Nazario Sauro	F	Novellara	150.000,00	-	-	-	220.793,57	-	220.793,57	220.793,57	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità. Maggiori costi sostenuti per l'allontanamento di acqua di falda che ha reso più onerose le opere di scavo e reinterro per l'impianto di sollevamento.
31	2014REIA0055	5.8.Uspf.102 - Potenziamento fognario Via Piave	F	Quattro Castella	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	2014REIA0056	5.8.Uspf.83 - 5.8.Uspf.121 - Realizzazione collettore fognario in loc. Miscoso	F	Ramiseto	103.644,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	2014REIA0057	5.3.38 - Interconnessione acquedotti Reggio-Roncocesi: attraversamento Crostolo	A	Reggio Emilia	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	2014REIA0058	5.9.D13.1 - Riuso reflui Mancasale - Opere di completamento	D	Reggio Emilia	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	2014REIA0061	Depuratore di Roncocesi - sistemazione e adeguamento digestori	D	Reggio Emilia	550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	2014REIA0063	U.s.p.f. - Estendimento della rete fognaria in via Beethoven da via Zamenhof a via Sidoli, nella frazione di Massenzatico	F	Reggio Emilia	400.000,00	-	-	-	35.992,23	-	35.992,23	35.992,23	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità. Spese per completamento impianto elettrico

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
37	2014REIA0064	5.8.Uspf.123 + 5.5.D04.7 - Agglomerato Rame - Connessione dell'agglomerato al sistema depurato di Reggiolo	F	Reggiolo	1.470.000,00	-	-	-	995.827,22	-	995.827,22	995.827,22	100	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti. Maggiori costi sostenuti in corso d'opera per ulteriori tratte di collettore che si è ritenuto opportuno realizzare con tecnologia microtunneling anziché con scavi profondi a cielo aperto in prossimità di ferrovia e strada provinciale.
38	2014REIA0065	5.10.D15.10 - Rio Saliceto: potenziamento impianto 6000 adeguamenti diversi - sedimentatore secondario	D	Rio Saliceto	150.000,00	-	-	-	63.239,54	-	63.239,54	63.239,54	100	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti. Maggiori costi sostenuti per opere elettromeccaniche aggiuntive per ottimizzare la gestione dell'impianto nonché lavori di sistemazione finale dell'area
39	2014REIA0066	5.8.Uspf.85 - Potenziamento scaricatore di piena fognature del capoluogo.	F	Rio Saliceto	258.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	2014REIA0071	5.8.Uspf.125a - Realizzazione rete fognaria Via Roma Capoluogo Zona sportiva 1° stralcio	F	San Martino in Rio	170.000,00	-	-	-	137.964,82	-	137.964,82	137.964,82	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità.
41	2014REIA0072	5.8.Uspf.125b - Realizzazione rete fognaria Capoluogo Zona sportiva 2° stralcio	F	San Martino in Rio	130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	2014REIA0073	5.8.Uspf.139 - Realizzazione rete fognaria Capoluogo Zona sportiva 3° stralcio	F	San Martino in Rio	182.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	2014REIA0076	5.8.Uspf.105 - Estendimento fognario in loc. Chiozza	F	Scandiano	320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	2014REIA0079	5.10.D15.29 - Potenziamento impianto 5000 AE N+D+sedimentatore II + ispessimento	D	Viano	900.000,00	850.000,00	-	850.000,00	12.332,43	-	12.332,43	- 837.667,57	-98	Progetto di fattibilità concluso con importo ~ 1.430.000. Da ripianificare
45	2014REIA0080	5.10.D15.9 - Potenziamento impianto San Giovanni di Querciola	D	Viano	243.000,00	-	-	-	177.023,55	-	177.023,55	177.023,55	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità. Maggiori costi sostenuti per scavi e reinterri nonché apparecchiature elettromeccaniche aggiuntive rese necessarie in corso d'opera
46	2014REIA0081	5.8.Uspf.108 - Realizzazione collettore fognario in loc. Predale	F	Viano	181.829,00	-	-	-	55.392,79	-	55.392,79	55.392,79	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
47	2014REIA0082	Costruzione di depuratore al servizio della frazione di Gazzano	D	Villaminuzzo	370.000,00	-	-	-	241.832,58	-	241.832,58	241.832,58	100	Impianto di depurazione completato: coda di intervento pianificato in precedenti annualità. Mancano lavori di sistemazione dell'area

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
48	2014REIA0083	Costruzione reti di collettamento e depuratore al servizio della frazione di Carniana	F	Villaminazzo	700.000,00	-	-	-	4.740,43	-	4.740,43	4.740,43	100	Progettazione in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per ottenimento servitù di passaggio. In corso verifiche geotecniche
49	2014REIA0085	5.4.7 - Adeguamento depuratori al D.gls 152/06 e delibere regionali - Trattamenti appropriati	D	Opere pluricomunali	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	2014REIA0086	5.4.8 - Piano fognario	F	Opere pluricomunali	1.200.000,00	300.000,00	-	300.000,00	117.001,43	-	117.001,43	- 182.998,57	-60	Rendicontati qui alcuni interventi richiesti dai Comuni che non avevano un ID dedicato (Via Boiardo, Reggio Emilia; Via Bassa, Canossa..)
51	2014REIA0087	5.2.25 - Estendimenti acqua in zone non servite. zone contaminate da arsenico Comuni di Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto	A	Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto	200.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	- 50.000,00	-100	Nessuna richiesta di estendimento pervenuta per pozzi privati contaminati da arsenico
52	2014REIA0088	5.4.11 - Estensione fogne nere o miste	F	Opere pluricomunali	369.044,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	- 100.000,00	-100	Non sono pervenute richieste di intervento da parte dei Comuni o dai privati. Capitolo che prevede il cofinanziamento al 50% da parte dei privati
53	2014REIA0091	5.2.2. - 5.2.4. - 5.2.5. - 5.2.6. - 5.2.9. - 5.2.9. - 5.2.11. - 5.2.12. - 5.2.13 - Manutenzioni straordinarie acqua	A	Opere pluricomunali	13.200.000,00	3.300.000,00	-	3.300.000,00	10.062.061,74	3.848,92	10.058.212,82	6.762.061,74	204	Nel corso del 2021, sono principalmente aumentate le attività di rifacimento prese che, in caso di rottura, permettono di rinnovare completamente la derivazione dell'utente con nuova tubazione in triplo strato, operazione da preferire rispetto alla semplice riparazione. Solo questa voce satura il 30% dell'intero importo delle manutenzioni straordinarie. Ricompresi in questo capitolo anche sono quota parte degli interventi di rinnovamento delle reti ai fini della riduzione delle perdite (per €279.085,60) o per concomitanza ad interventi di riqualificazione da parte dei Comuni (rifacimento pavimentazioni pregiate di piazze, marciapiedi, piste ciclabili). Si osserva che l'intera somma permette poi di intervenire in manutenzione straordinaria anche su tutta l'impiantistica elettromeccanica installata, sulle parti idrauliche e civili dei serbatoi, ma anche su tutta l'infrastruttura degli oltre 400 distretti di rete al fine di mantenerli sempre in corretto funzionamento
54	2014REIA0095	5.2.1 - Cartografia numerica acqua/fognature	TUTTI	Opere pluricomunali	1.588.814,00	330.000,00	-	330.000,00	278.878,79	-	278.878,79	- 51.121,21	-15	

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivi 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
55	2015REIA0103	Risanamento fognario NASSETA/ACQUABONA	F	Collagna		-	-	-	-	-	-	-	-	
56	2016REIA0057	Interconnessione acquedotti Reggio-Roncosesi: realizzazione condotta DN 800	A	Reggio Emilia	2.850.000,00	1.250.000,00	-	1.250.000,00	2.751.400,77	-	2.751.400,77	1.501.400,77	120	Cantiere in corso: ultimata la posa della condotta. Da realizzare punti di impatto e camerette di collegamento. Maggiori costi dovuti ad elevata incidenza delle opere di scavo e reinterro per la risoluzione di interferenze con canali di bonifica, sondaggi archeologici e compensazione per aumento prezzi delle tubazioni in acciaio DN 800
57	2016REIA0058	Riuso reflui Mancasale	D	Reggio Emilia	2.540.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	2016REIA0070	Rifacimento fognatura per acque nere in Via Luxemburg (ex via delle Valli, via Togliatti)	F	Rubiera	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	2016REIA0105	Estendimento rete fognaria in loc. Pieve Rossa, strada Provinciale Nord	F	Bagnolo in Piano	130.166,00	-	-	-	172.027,06	-	172.027,06	172.027,06	100	Cantiere ultimato: mancano collegamenti elettrici
60	2016REIA0106	Criticità deflusso porzione urbana defluente sulla Fossetta II° lotto	F	Bagnolo in Piano	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	2016REIA0107	Ristrutturazione rete fognaria in Via Don P. Borghi e limitrofe	F	Bibbiano	141.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	2016REIA0108	Razionalizzazione sistema fognario in Via Marchesi	F	Boretto	120.144,00	-	-	-	4.352,63	-	4.352,63	4.352,63	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
63	2016REIA0109	Agglomerato Busana: potenziamento impianto di depurazione	D	Ventasso	325.000,00	-	-	-	2.163,33	-	2.163,33	2.163,33	100	Progettazione in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per problematiche legate all'ottenimento di autorizzazione da parte di proprietà private limitrofe all'impianto esistente. Coinvolto il Comune per raggiungere accordo bonario con i proprietari.
64	2016REIA0110	Razionalizzazione sistema fognario in Via Zurco, Via Gabella, Via Torquato Tasso	F	Cadelbosco di Sopra	100.000,00	-	-	-	301,11	-	301,11	301,11	100	Si tratta di 3 interventi distinti. In Via Torquato Tasso il problema è stato risolto con interventi di manutenzione straordinaria del collettore misto esistente. In corso di approfondimento gli altri 2
65	2016REIA0111	Nuova vasca di stoccaggio Caprara (2000 mc)	A	Campegine	1.500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-100	Progetto di fattibilità in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per la necessità di approfondimento di aspetti geotecnici visto il livello molto superficiale della falda

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
66	2016REIA0112	Potenziamento collettore Caprara-Meletole l°lotto	F	Campegine	1.000.000,00	300.000,00	-	300.000,00	402.619,39	-	402.619,39	102.619,39	34	Cantiere in corso di ultimazione: si prevede il completamento nella primavera 2022
67	2016REIA0113	Depuratore di Valestra: realizzazione 2ª linea	D	Carpinetti	1.100.000,00	-	-	-	330.565,41	-	330.565,41	330.565,41	100	Cantiere in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per sospensione dei lavori causa COVID e difficoltà di approvvigionamento materiali
68	2016REIA0114	Risoluzione criticità idraulica collettore di Salvaterra, loc. Villaggio Macina Dinazzano	F	Casalgrande	500.000,00	-	-	-	35.370,73	-	35.370,73	35.370,73	100	Progettazione esecutiva in corso: in ritardo per problematiche nell'individuazione di un'area per la realizzazione di una vasca di laminazione
69	2016REIA0115	Acquedotto di Salvaterra: potenziamento adduttrice tratto terminale DN 200	A	Casalgrande	180.000,00	-	-	-	37.451,32	-	37.451,32	37.451,32	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità. Eseguiti ripristini definitivi
70	2016REIA0116	Agglomerato Salvaterra: adeguamento potenzialità impianto a 27.000 - Realizzazione 4° sedimentatore e progettazione dell'adeguamento del parametro Azoto Totale ai limiti di Tabella 2, allegato 5 D.Lgs 152/06	D	Casalgrande	150.000,00	-	-	-	445.724,20	-	445.724,20	445.724,20	100	Impianto di depurazione completato: coda di intervento pianificato in precedenti annualità. Mancano lavori di sistemazione dell'area. Maggiori costi dovuti alla necessità di rinnovamento del piping di collegamento fra le vasche emersa in fase di esecuzione e l'installazione di apparecchiature elettromeccaniche aggiuntive per ottimizzare la gestione dell'impianto
71	2016REIA0117	Potenziamento impianto di depurazione Casina 2	D	Casina	500.000,00	-	-	-	11.070,44	-	11.070,44	11.070,44	100	Progettazione esecutiva conclusa: si prevede l'inizio dei lavori nella primavera 2022
72	2016REIA0118	Studio razionalizzazione rete fognaria in loc. diverse del comune di Casina	F	Casina	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
73	2016REIA0120	Rifacimento collettore fognario in Via De Gasperi, Via Fontanesi e Via Risorgimento in loc. Felina	F	Castelnovo Monti	165.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
74	2016REIA0121	Acquedotto Gabellina: adeguamento scarico acque controlavaggio Collagna	A	Collagna	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	2016REIA0122	Potenziamento reticolo fognario in Via del Falegname	F	Correggio	700.000,00	-	-	-	2.644,91	-	2.644,91	2.644,91	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
76	2016REIA0125	Razionalizzazione sistema fognario in strada Barilla e limitrofe	F	Montecchio	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
77	2016REIA0126	Sostituzione adduttrice Novellara-Bettolino	A	Novellara	600.000,00	-	-	-	187.342,33	-	187.342,33	187.342,33	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
78	2016REIA0127	Eliminazione criticità di drenaggio area nord-est: Area Ex-Reggiane	F	Reggio Emilia	750.000,00	-	-	-	211.887,43	-	211.887,43	211.887,43	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità. Maggiori costi sostenuti per ricerca ordigni bellici e per maggiori lavorazioni in corrispondenza della nuova rotonda in corso di realizzazione da parte del Comune di Reggio Emilia
79	2016REIA0128	Depuratore di Roncocesi - sistemazione e adeguamento impiantistica	D	Reggio Emilia	1.200.000,00	-	-	-	816.414,18	-	816.414,18	816.414,18	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità. In ritardo rispetto alla pianificazione per fallimento dell'impresa esecutrice, si è reso necessario procedere con un nuovo affidamento.
80	2016REIA0129	Depuratore di Mancasale - adeguamenti tecnologici	D	Reggio Emilia	300.000,00	-	-	-	796.942,98	-	796.942,98	796.942,98	100	Cantiere in corso: Intervento da considerare unitamente al codice 2018REIA0231 - Adeguamento linea digestione anaerobica. E' stato realizzato un unico progetto da €. 2.200.000
81	2016REIA0130	Depuratore di Mancasale - adeguamenti tecnologici	D	Reggio Emilia	640.000,00	-	-	-	82.427,41	-	82.427,41	82.427,41	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
82	2016REIA0131	Ristrutturazione collettore fognario in Via Lungocrostolo	F	Reggio Emilia	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	



						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
83	2016REIA0132	Potenziamento collettore Villaggio Crostolo	F	Reggio Emilia	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
84	2016REIA0133	Risoluzione criticità idraulica rete fognaria in loc. Pieve, Parco Buda	F	Reggio Emilia	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
85	2016REIA0134	Nuovo serbatoio Rubiera mc 2000	A	Rubiera	2.890.000,00	1.300.000,00	-	1.300.000,00	11.616,41	-	11.616,41	-1.288.383,59	-99	Progettazione conclusa, rilasciato Permesso di costruire. In corso la revisione del progetto delle opere di fondazione per problemi legati al livello della falda rilevato in campo
86	2016REIA0135	Depuratore di Rubiera: sistemazione e potenziamento linea fanghi	D	Rubiera	180.000,00	-	-	-	1.391,40	-	1.391,40	1.391,40	100	Progetto di fattibilità tecnico economica ultimato: l'importo necessario per l'adeguamento dell'impianto risulta pari a €. 1.330.000. Da ripianificare
87	2016REIA0136	Depuratore di San Martino: potenziamento linea fanghi e progettazione dell'adeguamento del parametro Azoto Totale ai limiti di Tabella 2, allegato 5 D.Lgs 152/06	D	San Martino in Rio	635.000,00	-	-	-	3.468,95	-	3.468,95	3.468,95	100	Progettazione esecutiva conclusa: si prevede l'inizio dei lavori nella primavera 2022
88	2016REIA0137	Rifacimento collettore di Arceto a monte dello scolmatore	F	Scandiano	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
89	2016REIA0138	Depuratore di Bosco: sistema di aerazione seconda linea	D	Scandiano	180.000,00	-	-	-	12.411,47	-	12.411,47	12.411,47	100	Da considerare unitamente all'ID 2018REIA0245. E' stato redatto un unico progetto esecutivo. In corso l'ottenimento delle autorizzazioni. Si prevede la realizzazione nel 2022
90	2016REIA0139	Risanamento fognature in loc. Sedrio 2° lotto	F	Vezzano sul Crostolo	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
91	2016REIA0140	Trattamenti Appropriati agglomerato <200 AE: realizzazione fossa imhoff a servizio della frazione di Pineto	D	Vetto d'enza	250.000,00	-	-	-	32,54	-	32,54	32,54	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
92	2016REIA0141	Sostituzione reti idriche da serb. Faggiola a serb. M.Te Cerlino. 1° e 2° stralcio	F	Viano	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
93	2016REIA0142	Trattamenti Appropriati: realizzazione depuratore a servizio della frazione di Sologno	D	Villaminozzo	250.000,00	-	-	-	3.068,67	-	3.068,67	3.068,67	100	Progettazione esecutiva conclusa: da fare bonifica ordigni bellici
94	2016REIA0144	Completamento rete fognaria in loc. Minozzo	F	Villaminozzo	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
95	2016REIA0145	Estendimento reti a carico di privati	TUTTI	Opere pluricomunali		-	-	-	205.771,71	167.380,00	38.391,71	205.771,71	100	Consuntivo dei lavori realizzati nel corso del 2021. Da aggiungere a questo importo €. 134,668,02 per lavori erroneamente attribuiti all' ID 2018REIA0256 - Estendimenti in zone non servite.
96	2017REIA0149	Potenziamento con spostamento dell'impianto di sollevamento fognario in Via G. di Vittorio	F	San Polo d'Enza	50.000,00	-	-	-	3.201,77	-	3.201,77	3.201,77	100	Progettazione conclusa: in fase di avvio dei lavori emersi problemi con le autorizzazioni di privati ora risolti, ridefiniti accordi bonari. Si realizzerà nel 2022
97	2017REIA0150	Rifacimento collettore fognario in Via Colletta, villaggio artigianale Crostolo	F	Reggio Emilia	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	2017REIA0151	Realizzazione collettore fognario a servizio zona industriale "Dugara"	F	Brescello	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
99	2017REIA0153	Razionalizzazione sistema fognario in Via Bologna	F	Guastalla	145.179,00	-	-	-	14.005,53	-	14.005,53	14.005,53	100	Progettazione esecutiva conclusa: in attesa concessione attraversamento FER. Da verificare finanziamento per importo di progetto superiore al pianificato

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
100	2017REIA0154	Estendimento rete acqua a servizio frazione di Fontana (utenze ex - AIMAG)	A	Rubiera	600.000,00	-	-	-	21.290,28	-	21.290,28	21.290,28	100	Progettazione in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione per difficoltà di individuazione del percorso della rete esistente AIMAG da dismettere. Effettuati sopralluoghi con i tecnici AIMAG per individuare tutte le utenze da ricollegare. Si potrà passare alla fase esecutiva dei lavori solo quando AIMAG avrà completato il collegamento del serbatoio pensile di Carpi e dismesso l'alimentazione esistente.
101	2017REIA0155	Studio razionalizzazione rete fognaria in loc. diverse del comune di Baiso	F	Baiso	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	2017REIA0156	Realizzazione collettore fognario zona industriale APEA	F	Boretto	550.000,00	-	-	-	4.482,03	-	4.482,03	4.482,03	100	Progettazione definitiva conclusa. L'importo delle opere ammonta a €. 900.000. Da definire cofinanziamento con Comune e privati
103	2017REIA0157	Acquedotto di Caprara:nuova adduttrice DN 300 da Autostrada A1 a Via Marconi	A	Campegine	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	2017REIA0158	Realizzazione nuovo collettore fognario in Via De Amicis	F	Fabbrico	340.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	2017REIA0159	Rifacimento fognature in concomitanza riqualificazione asse viario Corso Garibaldi-Viale Uberto I°	F	Reggio Emilia	200.000,00	-	-	-	419.267,81	-	419.267,81	419.267,81	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità. Mancano ripristini definitivi. Maggiori costi sostenuti per la necessità, emersa in corso d'opera, di sostituire ulteriori tratte di condotte fognarie salvaguardando il contesto storico di pregio e le alberature secolari
106	2017REIA0160	Realizzazione collettore fognario e impianto di sollevamento area Protezione Civile	F	Sant'Ilario d'Enza	150.000,00	-	-	-	518,43	-	518,43	518,43	100	Progettazione esecutiva conclusa: si prevede l'inizio dei lavori nella primavera 2022
107	2017REIA0161	Sostituzione rete idrica in Via della Canalina 1° stralcio	A	Reggio Emilia	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
108	2017REIA0162	Sostituzione rete idrica in Via Venturi	A	Bibbiano	250.000,00	-	-	-	297.298,97	-	297.298,97	297.298,97	100	Cantiere concluso. Mancano i ripristini definitivi che in accordo con il Comune di Bibbiano verranno realizzati entro giugno 2022
109	2017REIA0163	Realizzazione collegamento fognario per la dismissione Imhoff Cimitero	F	Ventasso	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
110	2017REIA0164	Realizzazione impianto di depurazione in loc. Cereggio	D	Ventasso	220.000,00	-	-	-	17.635,49	-	17.635,49	17.635,49	100	Progettazione definitiva conclusa. Acquisita area per realizzazione fossa Imhoff, manca una servitù per la quale non si è riusciti a raggiungere un accordo bonario con la proprietà. D'accordo con il Comune si dovrà procedere con una servitù coattiva
111	2017REIA0165	Potenziamento impianto di depurazione di Canolo a 3.000 AE	D	Correggio	600.000,00	-	-	-	691,98	-	691,98	691,98	100	E' stata svolta un'analisi costi/benefici per confrontare l'intervento di potenziamento dell'impianto con la possibilità di collettare i reflui al depuratore di Reggiolo, ciò comporta un importo di progetto molto più elevato di quanto previsto a piano. Da ripianificare
112	2017REIA0166	Sostituzione rete idrica in Strada Macchione	A	Novellara	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
113	2017REIA0167	Razionalizzazione sistema fognario in loc. Fellegara	F	Scandiano	200.000,00	-	-	-	11.605,68	-	11.605,68	11.605,68	100	Progettazione esecutiva conclusa: in attesa di spostamento cavi MT Enel
114	2017REIA0168	Realizzazione reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche	A	Opere pluricomunali	8.800.000,00	2.200.000,00	-	2.200.000,00	2.319.369,02	-	2.319.369,02	119.369,02	5	
115	2018REIA0169	alluvione lentigione - brescello 11/12/2017 - ripristino danni depuratore	D	Brescello	85.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	2018REIA0170	Alluvione Lentigione - Brescello 11/12/2017 - Ripristino danni rete fognaria	F	Brescello	40.000,00	-	-	-	-	16.734,70	-	-	-	

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
117	2018REIA0171	"Contributi Progetto sperimentale Smart meter - comune Reggio di Emilia (rif. 2014REIA0091)"	A	Reggio Emilia		-	-	-	-	-	-	-	-	
118	2018REIA0172	"Contributi Progetto Smart meter - comune di Scandiano (rif. 2014REIA0091)"	A	Scandiano		-	-	-	-	-	-	-	-	
119	2018REIA0173	"Contributi Realizzazione collettore fognario e sistemazione scarico nel Rio Moreno in Comune di Quattro Castella"	F	Quattro Castella		-	-	-	-	-	-	-	-	
120	2018REIA0174	Sostituzione contatori adempimento D.M. 93/2017	A	Opere pluricomunali	14.641.200,00	1.783.500,00	-	1.783.500,00	930.098,24	-	930.098,24	- 853.401,76	-47	Avanzamento lavori di sostituzione contatori rallentato a causa emergenza sanitaria COVID-19 e per difficoltà di approvvigionamento materiali
121	2018REIA0175	Sostituzione rete adduttrice Cà di Scatola-Canova	A	Ventasso	370.000,00	-	-	-	310.110,76	-	310.110,76	310.110,76	100	Cantiere concluso: rimangono da eseguire alcune opere di completamento
122	2018REIA0176	Sostituzione rete acquedotto in Viale Resistenza	A	Rubiera	400.000,00	-	-	-	568.811,69	-	568.811,69	568.811,69	100	Cantiere concluso
123	2018REIA0177	Piano Fognario - Sistemazione scolmatore di piena in zona sportiva Via XXV Aprile	F	Albinea	65.846,00	65.846,00	-	65.846,00	-	-	-	- 65.846,00	-100	Progettazione esecutiva in corso: in ritardo per aggiornamento vecchio progetto rimasto in sospenso per servitù di passaggio in area con proprietà in fallimento. Il problema è ora risolto ma occorre aggiornare il progetto.
124	2018REIA0178	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario tra via Malaguti - Via dei Gonzaga e Via Guido da Bagnolo-Via Gandhi	F	Bagnolo in Piano	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
125	2018REIA0179	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario area industriale Via Panizzi-Via Galvani	F	Bagnolo in Piano	180.514,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
126	2018REIA0180	Realizzazione nuova rete adduttrice Corniano-Malamassata	A	Bibbiano	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
127	2018REIA0181	Estendimento rete acqua in Via Marchesi	A	Boretto	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
128	2018REIA0182	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Tre Ponti tra Via Carrara e la linea ferroviaria in frangio all'abitato di Via Ghizzardi	F	Boretto	120.000,00	-	-	-	114,36	-	114,36	114,36	100	Progettazione in corso: individuata soluzione progettuale
129	2018REIA0183	Sostituzione rete acqua adduttrice Boretto-Poviglio	A	Boretto	600.000,00	300.000,00	-	300.000,00	324.832,80	-	324.832,80	24.832,80	8	
130	2018REIA0184	Estendimento rete acquedotto nella frazione di Lentigione nelle vie: Molino-Caselle, Del Porto, Viazza, Imperiale inferiore, Via Bernieri	A	Brescello	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
131	2018REIA0185	Depuratore di Villa Seta: riordino e revamping del comparto biologico	D	Cadelbosco di Sopra	400.000,00	-	-	-	2.355,84	-	2.355,84	2.355,84	100	Anticipo spese di progettazione per intervento pianificato nel 2022
132	2018REIA0186	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario misto in area industriale Madonnina	F	Cadelbosco di Sopra	133.673,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
133	2018REIA0188	Rifacimento impianto di sollevamento in loc. Ponte Testa	F	Campagnola	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
134	2018REIA0189	Acquedotto Gabellina: sostituzione rete DN 300-350 in loc. La Svolta - Cà Pietro	A	Carpineti, Casina	325.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
135	2018REIA0190	Rifacimento tratto di rete fognaria in via Matteotti	F	Carpineti	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
136	2018REIA0191	Depuratore di Cigarello: potenziamento accumulato pretrattamento rifiuti liquidi (comma 3)	D	Carpineti	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
137	2018REIA0192	Piano Fognario - Intervento di messa in sicurezza fognatura in Via san Prospero	F	Carpineti	76.745,00	-	-	-	139.698,69	-	139.698,69	139.698,69	100	Cantiere in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per problematiche autorizzative (scarico nel Rio san prospero demaniale)
138	2018REIA0193	Sostituzione rete idrica in Via Statutaria	A	Casalgrande	250.000,00	-	-	-	39.093,54	-	39.093,54	39.093,54	100	Cantiere concluso. Realizzati i ripristini definitivi di intervento eseguito nell'annualità precedente.
139	2018REIA0194	Sostituzione rete idrica in Via Case Secchia	A	Casalgrande	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
140	2018REIA0195	Potenziamento impianto di San Valentino "Le Ville" e dismissione impianto san Valentino "Castello"	D	Casalgrande	400.000,00	-	-	-	2.876,20	-	2.876,20	2.876,20	100	Anticipo spese di progettazione per intervento pianificato nel 2022
141	2018REIA0196	Acquedotto Gabellina: sostituzione rete DN 150 in loc. Cortogno - La Stella	A	Casina	270.000,00	270.000,00	-	270.000,00	5.929,34	-	5.929,34	- 264.070,66	-97	Progettazione conclusa. In corso l'ottenimento delle servitù di passaggio
142	2018REIA0197	Piano Fognario - Rifacimento condotta fognaria in Via Marconi	F	Casina	37.820,00	-	-	-	65.950,97	-	65.950,97	65.950,97	100	Cantiere in corso di ultimazione: si prevede il completamento nella primavera 2022
143	2018REIA0198	Piano Fognario - Risoluzione problematiche connesse alla presenza di acque parassite provenienti da canali di bonifica in Via Canalino	F	Castelnovo di Sotto	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
144	2018REIA0199	Sostituzione rete idrica DN 500 in loc. Costarella, Croce	A	Castelnovo Monti	480.000,00	-	-	-	7.781,83	-	7.781,83	7.781,83	100	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in annualità precedenti
145	2018REIA0200	Rifacimento tratto di rete fognaria in Via Matilde di Canossa	F	Castelnovo Monti	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
146	2018REIA0201	Piano Fognario - Potenziamento rete fognaria nella zona di Via Rivasi Ovest	F	Cavriago	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
147	2018REIA0202	Piano Fognario - Potenziamento rete fognaria nella zona di Via Arduini - Via della Conciliazione e parte di Via della Repubblica	F	Cavriago	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-100	Progetto di fattibilità in corso: in corso di definizione con il Comune le priorità di intervento
148	2018REIA0203	Sostituzione rete idrica in Via Marzabotto	A	Correggio	150.000,00	-	-	-	114,36	-	114,36	114,36	100	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in annualità precedenti
149	2018REIA0204	Sostituzione rete idrica in Via Gilberto	A	Correggio	150.000,00	-	-	-	322,10	-	322,10	322,10	100	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in annualità precedenti
150	2018REIA0205	Piano Fognario - potenziamento sistema scolante dell'area compresa tra Via Mandriolo Superiore, Via Campagnola e Piazzale I Agosto	F	Correggio	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
151	2018REIA0206	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario nella zona tra XXV Aprile e Via A. Moro	F	Fabbrico	80.529,00	80.529,00	-	80.529,00	-	-	-	80.529,00	-100	In corso verifiche preliminari per individuare correttamente l'area di intervento oggetto di allagamenti a seguito di eventi meteorici intensi
152	2018REIA0207	Sostituzione rete acqua adduttrice in loc. Praticello	A	Gattatico	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00	104.800,79	-	104.800,79	145.199,21	-58	Cantiere in corso



						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
153	2018REIA0208	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Fattori nel tratto tra Via Codisotto a sera e Via Allende	F	Gualtieri	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
154	2018REIA0209	Depuratore di Guastalla Sud: Potenziamento quadro elettrico e rifacimento ricircoli	D	Guastalla	200.000,00	-	-	-	4.763,92	-	4.763,92	4.763,92	100	Anticipo spese di progettazione per intervento pianificato nel 2022
155	2018REIA0210	Depuratore di Guastalla Nord: nuovo sedimentatore secondario	D	Guastalla	200.000,00	-	-	-	30.198,32	-	30.198,32	30.198,32	100	Anticipo spese di progettazione per intervento pianificato nel 2022
156	2018REIA0211	Piano Fognario - Potenziamento della linea fognaria in Via Viazzolo Lungo	F	Guastalla	226.985,00	226.985,00	-	226.985,00	-	-	-	226.985,00	-100	Problematica risolta con alcuni interventi di manutenzione straordinaria sulle soglie degli scolmatori. Intervento non più necessario. Le risorse potranno essere destinate all'intervento ID 2017REIA0153 - Razionalizzazione sistema fognario in Via Bologna la cui progettazione esecutiva ha portato ad un incremento dell'importo previsto
157	2018REIA0212	Realizzazione nuovo impianto filtrazione GAC centrale idrica di Aiola	A	Montecchio	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-100	A seguito del monitoraggio effettuato sui valori di solventi presenti in falda, risultati non significativi, il progetto risulta al momento sospeso
158	2018REIA0213	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Galilei e Via Parri	F	Montecchio	150.000,00	-	-	-	2.871,90	-	2.871,90	2.871,90	100	Completato studio di fattibilità per individuare le tratte (Via Valle) e le utenze interessate. Progettazione definitiva in corso
159	2018REIA0214	Piano Fognario - adeguamento condotta fognaria in Via Montegrappa	F	Montecchio	118.298,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	2018REIA0215	Sostituzione adduttrice in Via Levata	A	Novellara	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00	148.440,71	-	148.440,71	101.559,29	-40	Cantiere in corso: in leggero ritardo rispetto al pianificato per tempistiche di ottenimento servitù di passaggio

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
161	2018REIA0216	Realizzazione collegamento adduttrice Via Levata - Centrale idrica Via Sturlona	A	Novellara	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
162	2018REIA0217	Sostituzione rete acqua adduttrice in loc. San Bernardino - 1° stralcio	A	Novellara	250.000,00	-	-	-	145.364,90	-	145.364,90	145.364,90	100	Da rendicontare qui solo - 1.039,66 per spese di progettazione. Per errore di codice ARSI - 144.325,24 da attribuire all'ID 2018REIA0218 - Sostituzione rete adduttrice Via Fermi
163	2018REIA0218	Sostituzione rete acqua adduttrice Via Fermi - Via Zappellazzo	A	Poviglio	650.000,00	350.000,00	-	350.000,00	-	-	-	- 350.000,00	-100	Cantiere in corso: da rendicontare qui - 144.325,24 erroneamente attribuite all'ID 2018REIA0217 - Sostituzione rete in loc. san Bernardino
164	2018REIA0219	Potenziamento adduttrice a monte centrale idrica di Volpara	A	Quattro Castella	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
165	2018REIA0220	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via del Casalino	F	Quattro Castella	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
166	2018REIA0221	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Don Milani	F	Quattro Castella	127.609,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
167	2018REIA0222	Sostituzione rete acqua adduttrice DN 600 in Sesso-Mancasale	A	Reggio Emilia	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
168	2018REIA0223	Progettazione nuova rete acqua adduttrice in via Gorizia	A	Reggio Emilia	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
169	2018REIA0224	Raddoppio collettore fognario in Viale Isonzo	F	Reggio Emilia	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
170	2018REIA0225	Sostituzione rete idrica in Via della Canalina 2° stralcio	A	Reggio Emilia	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00	12.492,45	-	12.492,45	- 237.507,55	-95	Cantiere in corso di ultimazione. Mancano ripristini definitivi
171	2018REIA0226	Sostituzione rete idrica in Via F.lli Rosselli	A	Reggio Emilia	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	11.838,45	-	11.838,45	- 188.161,55	-94	Progettazione completata: in accordo con il Comune di Reggio Emilia si potrà realizzare solo a giugno 2022 dopo la chiusura delle scuole per evitare problemi alla viabilità

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
172	2018REIA0227	Realizzazione nuovo pozzo centrale idrica di Roncocesi	A	Reggio Emilia	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
173	2018REIA0228	Potenziamento impianto di pompaggio centrale idrica di Roncocesi	A	Reggio Emilia	300.000,00	-	-	-	22.990,10	-	22.990,10	22.990,10	100	Progetto di fattibilità concluso: si rende necessaria la costruzione di un nuovo fabbricato per l'alloggiamento dell'impianto. L'importo risulta alluvione lentigione - brescello 11/12/2017 - ripristino danni depuratore €. 1.400.000. Da ripianificare
174	2018REIA0229	Razionalizzazione rete fognaria in Via del Partigiano	F	Reggio Emilia	100.000,00	-	-	-	7.736,93	-	7.736,93	7.736,93	100	Progettazione in corso: occorre individuare una soluzione tecnica che consenta di realizzare gli interventi minimizzando l'impatto sulla viabilità in una zona di elevato traffico
175	2018REIA0230	Potenziamento rete fognaria in F.lli Rosselli	F	Reggio Emilia	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-100	Intervento al momento sospeso. Il Comune ha realizzato una nuova rotatoria a servizio del Polo scolastico e riasfaltato la viabilità. Al momento non è opportuno intervenire
176	2018REIA0231	Depuratore di Mancasale: adeguamento linea di digestione anaerobica	D	Reggio Emilia	1.800.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-100	Progettazione esecutiva completata. Da considerare unitamente al codice 2016REIA0129: Adeguamenti tecnologici e rifacimento digestori; su cui vengono rendicontati i costi. E' stato realizzato un unico progetto da ~ 2.200.000,00. Lavori affidati, in attesa di arrivo delle forniture (digestori in acciaio vetrificato)
177	2018REIA0232	Depuratore di Roncocesi: adeguamenti impiantistici diversi	D	Reggio Emilia	1.000.000,00	200.000,00	-	200.000,00	22.284,59	-	22.284,59	177.715,41	-88	Progetto di fattibilità concluso. Comprende vari interventi segnalati da Operation: 1) Realizzazione sistema di asportazione ed allontanamento schiume da vasche nitrificazione 2) Potenziamento ispessimento dinamico con trattamento odori 3) Rinnovo comparto disidratazione fanghi con installazione di seconda centrifuga, sostituzione sistema stoccaggio fanghi e relativo caricamento, realizzazione sistema trattamento aria del comparto 4) Revamping comparto sollevamento iniziale. L'importo totale è €. 3.650.000. Interventi realizzabili anche singolarmente: in corso di valutazione le priorità di intervento in relazione alle somme disponibili

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
178	2018REIA0233	Copertura vasca di equalizzazione e post ispessitori depuratore di Mancasale	D	Reggio Emilia	130.000,00	-	-	-	176.283,65	-	176.283,65	176.283,65	100	Cantiere in corso: in ritardo per la necessità, emersa in fase esecutiva, di effettuare il risanamento del calcestruzzo delle vasche prima di procedere alla posa delle coperture
179	2018REIA0234	Trattamento bottini e copertura caricamento fanghi	D	Reggio Emilia	1.670.000,00	-	-	-	36.609,67	-	36.609,67	36.609,67	100	Progetto di fattibilità concluso: si rende necessaria la costruzione di un nuovo fabbricato per l'alloggiamento dell'impianto di trattamento bottini. L'importo risulta €. 6.400.000. Da ripianificare, candidabile per PNRR
180	2018REIA0235	Adeguamento impianto di condizionamento fanghi e stoccaggio depuratore di Mancasale	D	Reggio Emilia	1.000.000,00	400.000,00	-	400.000,00	7.527,09	-	7.527,09	- 392.472,91	-98	Progetto di fattibilità concluso: esaminate diverse soluzioni con le tecnologie disponibili. L'importo della soluzione individuata risulta pari a ~ 4.000.000. Da ripianificare
181	2018REIA0236	Potenziamento impianto chimico-fisico depuratore di Mancasale	D	Reggio Emilia	600.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	- 300.000,00	-100	Progettazione in ritardo rispetto alla pianificazione: in corso valutazioni sull'opportunità di realizzare l'impianto presso un depuratore più baricentrico
182	2018REIA0237	Raddoppio collettore fognario attraversamento canale Fiuma - tratto sollevamento Ponte testa - depuratore di Reggiolo	F	Reggiolo	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
183	2018REIA0238	Depuratore di Reggiolo nuovo: adeguamento, ripristino e collaudo linea fanghi	D	Reggiolo	150.000,00	-	-	-	76,24	-	76,24	76,24	100	Progetto di fattibilità concluso. La prima ipotesi progettuale prevedeva di riutilizzare le strutture esistenti per ottenere la riduzione dei fanghi attraverso una stabilizzazione aerobica che però non è risultata adeguata in termini di costi benefici. Si è optato per una soluzione tecnologicamente più avanzata che consente utilizzando la pirolisi una riduzione dei fanghi dell'85%. L'importo di progetto sale però a €. 850.000. Da ripianificare nel 2022
184	2018REIA0239	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario Area Sud centro urbano per problemi di insufficienza idraulica	F	Rio Saliceto	53.422,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
185	2018REIA0240	Piano Fognario - Estendimento rete fognaria nera in via Crocetta	F	Rolo	123.255,00	-	-	-	5.204,03	-	5.204,03	5.204,03	100	Progettazione esecutiva conclusa: si prevede l'inizio dei lavori nella primavera 2022
186	2018REIA0241	Sostituzione rete acqua adduttrice in loc. San Faustino	A	Rubiera	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-100	Progetto di fattibilità in corso: il progetto prevede la sostituzione della condotta adduttrice in fibrocemento per una lunghezza di circa 3 km, dalla centrale idrica di Rubiera al pensile di San Faustino. L'importo previsto non è sufficiente. In corso di valutazione se opportuno realizzare un primo stralcio.
187	2018REIA0243	Piano Fognario - Rifacimento collettore fognario in Via Primo Maggio	F	Sant'Ilario d'Enza	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-100	Progetto di fattibilità in corso: effettuati sopralluoghi per individuare correttamente le utenze interessate, da pianificare videoispezione per la verifica del reticolo esistente non corrispondente a quanto presente in cartografia
188	2018REIA0244	Rifacimento condotto scolmatore in Via delle Scuole	F	Scandiano	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
189	2018REIA0245	Depuratore di Bosco	D	Scandiano	450.000,00	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-	250.000,00	-100	Da considerare unitamente all'ID 2016REIA0138. E' stato redatto un unico progetto esecutivo. In corso l'ottenimento delle autorizzazioni. Si prevede la realizzazione nel 2022. I costi vengono rendicontati sull'ID 2016REIA0138
190	2018REIA0246	Piano Fognario - Realizzazione collettore fognario in Via del Serraglio	F	Scandiano	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-100	Progetto di fattibilità in corso: estensione di rete fognaria parzialmente fuori agglomerato. Da verificare presenza di scarichi neri in canale di bonifica
191	2018REIA0247	Delocalizzazione impianto di depurazione Valbona	D	Ventasso	200.000,00	-	-	-	238,25	-	238,25	238,25	100	Anticipo spese di progettazione per intervento pianificato nel 2022
192	2018REIA0248	Unificazione scarichi loc. Acquabona	D	Ventasso	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-100	Progetto di fattibilità in corso: difficoltà di individuazione di un tracciato stabile per la realizzazione dei collettori in una zona di dissesto idrogeologico

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
193	2018REIA0249	Rifacimento tratto di rete fognaria in Via Manenti e Via Fontanaccio	F	Vetto d'enza	845.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
194	2018REIA0250	Piano Fognario - Lavori di potenziamento, adeguamento e messa in sicurezza della rete fognaria in loc. Vetto Capoluogo	F	Vetto d'enza	156.650,00	-	-	-	238.197,98	-	238.197,98	238.197,98	100	Cantiere in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per le complessità riscontrate in fase di progettazione
195	2018REIA0251	Collettamento loc. Bedogno/Case Zobbi su impianto Villaminozzo	D	Villaminozzo	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
196	2018REIA0252	Acquedotto Villa Minozzo: costruzione nuovo serbatoio in loc. Mulino di Tromba	A	Villaminozzo	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00	304.452,29	-	304.452,29	124.452,29	69	Cantiere in corso: maggiori spese dovute alla necessità emersa in corso d'opera di sostituire le condotte esistenti in acciaio, rivelatesi ammalorate, nonché la realizzazione della strada di accesso al nuovo serbatoio
197	2018REIA0253	Manutenzione straordinaria impianti di depurazione	D	Opere pluricomunali	8.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	5.044.304,67	-	5.044.304,67	3.044.304,67	152	Maggiori necessità di interventi di manutenzione straordinaria dovuti a guasti e rotture su macchine e apparecchiature. Sono inoltre stati implementati sistemi di controllo avanzato dei comparti biologici su alcuni impianti di depurazione allo scopo di aumentare le performance sull'abbattimento dei nutrienti e sono state ristrutturate tutte le stazioni di disinfezione dei reflui in uscita impianto nell'eventualità che l'evoluzione della pandemia ne renda necessaria l'attivazione

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
198	2018REIA0254	Manutenzione straordinaria fognature	F	Opere pluricomunali	5.600.000,00	1.400.000,00	-	1.400.000,00	3.514.129,95	-	3.514.129,95	2.114.129,95	151	Maggiori necessità di interventi di manutenzione straordinaria per: maggior numero di interventi a seguito di rotture causate da molti fenomeni temporaleschi di forte intensità; maggiori interventi di manutenzione straordinaria su rotture riscontrate a seguito di nuove ispezioni/ricerche programmate, realizzate con sistemi satellitari ;maggiori sostituzioni di reti ammalorate in concomitanza di lavori di riqualificazione strade/piazze da parte delle Amministrazioni comunali. Maggiori interventi di manutenzione straordinaria su impianti di sollevamento esistenti
199	2018REIA0255	Manutenzione straordinaria acque meteoriche	F	Opere pluricomunali	2.400.000,00	600.000,00	-	600.000,00	550.485,85	-	550.485,85	49.514,15	-8	
200	2018REIA0256	Estendimenti acqua in zone non servite	A	Opere pluricomunali	400.000,00	100.000,00	-	100.000,00	191.432,70	188.205,00	3.227,70	91.432,70	91	Rendicontati qui per errore €. 134.668,02 da attribuire all'ID 2016REIA0145 - Estendimento reti a carico di privati. Correttamente rendicontati €. 56.764,68 (Estendimento loc. Boschi di Cortogno in Comune di Casina, Via Francalanza in Comune di Gattatico, Via Montegrappa in Comune di Quattro Castella)
201	2018REIA0257	Investimenti di Struttura	STRUTTURA	Opere pluricomunali	6.881.209,00	1.960.403,00	-	1.960.403,00	2.025.970,27	-	2.025.970,27	65.567,27	3	
202	2018REIA0258	Nuovi Allacci	A	Opere pluricomunali		1.213.625,00	720.060,00	493.565,00	1.389.975,75	796.199,09	593.776,66	176.350,75	14	
203	2021REIA0259	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0156 - Febbio (AE 157)	D	Villaminozzo		-	-	-	-	-	-	-	-	
204	2021REIA0260	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0108 - Santonio (AE 153)	D	Villaminozzo		-	-	-	-	-	-	-	-	
205	2021REIA0261	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0259 - Cortogno (AE 141)	D	Casina		-	-	-	-	-	-	-	-	

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
206	2021REIA0262	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0115 - Maro (AE 90)	D	Castelnovo Monti		-	-	-	-	-	-	-	-	
207	2021REIA0263	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0141 - Cerrè Sologno-Via Bertini (AE 90)	D	Villaminozzo		-	-	-	-	-	-	-	-	
208	2021REIA0264	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0203 - Garfagnolo (AE 87)	D	Castelnovo Monti		-	-	-	-	-	-	-	-	
209	2021REIA0265	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0113 - Morsiano (AE 82)	D	Villaminozzo		-	-	-	-	-	-	-	-	
210	2021REIA0266	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0146 - Melca (AE 81)	D	Guastalla		-	-	-	-	-	-	-	-	
211	2021REIA0267	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0130 - Cà del Cavo (AE 80)	D	Castelnovo Monti		-	-	-	-	-	-	-	-	
212	2021REIA0268	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0123 - Primaore (AE 67)	D	Villaminozzo		-	-	-	-	-	-	-	-	
213	2021REIA0269	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0187 - Strada (AE 67)	D	Vetto d'enza		-	-	-	-	-	-	-	-	
214	2021REIA0270	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0747 - Roncopò (AE 61)	D	Castelnovo Monti		-	-	-	-	-	-	-	-	
215	2021REIA0271	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0240 - Cerredolo dei Coppi-Chiesa (AE 54)	D	Canossa		-	-	-	-	-	-	-	-	
216	2021REIA0272	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0169 - Quarqua (AE 52)	D	Castelnovo Monti		-	-	-	-	-	-	-	-	
217	2021REIA0273	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0250 - Pulpiano (AE 52)	D	Viano		-	-	-	-	-	-	-	-	



						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
218	2021REIA0274	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0256 - Serra (AE 51)	D	Viano		-	-	-	-	-	-	-	-	
219	2021REIA0275	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0279 - Noce (AE 50)	D	Castelnovo Monti		-	-	-	-	-	-	-	-	
220	2021REIA0276	PNRR - Alleggerimento portate miste scolmate al nodo "La Nave"	F	Reggio Emilia	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
221	2021REIA0277	Realizzazione collegamento fognario tra Corso Prampa e Via della Vittoria	F	Villaminozzo	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
222	2021REIA0278	Potenziamento reticolo fognario in Via Dante Alighieri, Via della Pace	F	Castellarano	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
223	2021REIA0279	Collettamento Agglomerato Cà Guidetti (ARE0856)	F	Casalgrande	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
224	2021REIA0280	Adeguamento collettore fognario in Via Crispi	F	Poviglio	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
225	2021REIA0281	Adeguamento reticolo fognario in Via Papa Giovanni XXIII	F	Ventasso	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
226	2021REIA0282	Adeguamento reticolo fognario in Via Costa	F	Novellara	125.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
227	2021REIA0283	Adeguamento reticolo fognario in Via Caduti delle Reggiane	F	Reggio Emilia	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
228	2021REIA0284	Potenziamento collettore fognario in Via Pellizzi	F	Reggio Emilia	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
229	2021REIA0285	Realizzazione collegamento fognario in Via Cavallotti	F	Reggio Emilia	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di REGGIO EMILIA N. n. 5 del 30 novembre 2018 ed integrato con la n. 9 del 22/10/2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
230	2021REIA0286	Realizzazione collegamento fognario in Via Boschi	F	Castelnovo Monti	280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
231	2021REIA0287	Rifacimento condotto scolmatore in Via Roma	F	Castelnovo Monti	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
232	2021REIA0288	Realizzazione collegamento fognario in Via Bacchi	F	Brescello	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
233	2021REIA0289	Spostamento condotta adduttrice per frana in loc. Monte Staffola	A	Canossa	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
234	2021REIA0290	Sostituzione rete di di distribuzione acqua in Via Gorganza e Via dell'Industria	A	Cavriago	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
235	2021REIA0291	Ristrutturazione edile e adeguamento sismico Centrale idrica Via Gorizia	A	Reggio Emilia	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
						<b>Importo lordo pianificato 2021</b>	<b>Contributi pianificati 2021</b>	<b>Importo netto pianificato 2021</b>	<b>Importo lordo consuntivo 2021</b>	<b>Contributi consuntivo 2021</b>	<b>Investimento gestore consuntivo 2021</b>	<b>PERCENTUALE INVESTIMENTI REALIZZATI esclusi investimenti di struttura</b>		
<b>Importo Totale</b>						<b>25.760.888 €</b>	<b>720.060 €</b>	<b>25.040.828 €</b>	<b>38.909.388,10 €</b>	<b>1.172.367,71 €</b>	<b>37.737.020,39 €</b>	<b>155%</b>		
<b>Importo Totale - Esclusi gli Investimenti di Struttura</b>						<b>23.800.485 €</b>	<b>720.060 €</b>	<b>23.080.425 €</b>	<b>36.883.417,83 €</b>	<b>1.172.367,71 €</b>	<b>35.711.050,12 €</b>			

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Reggio Emilia  
F.to Nico Giberti

Il segretario verbalizzante  
F.to Sara Melone

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 24 maggio 2023

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna
