



CLBO/2017/6 del 9 ottobre 2017

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2016.**

IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO LOCALE
F.to Michele Giovannini

CLBO/2017/6

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

L'anno duemiladiciassette il giorno 9 del mese di ottobre alle ore 9.30 presso la sede del Comune di Casalecchio di Reno si è riunito il Consiglio Locale di Bologna convocato con lettera protocollo AT/2017/5996 del 2/10/2017

Risultano presenti all'appello:

Enti	Nome e Cognome	Qualifica	Presenti	Quote
Alto Reno Terme	Elena Gaggioli	Vice-sindaco	P	0,8777
Anzola dell'Emilia	Giampiero Veronesi	Sindaco	P	1,1266
Argelato				0,9462
Baricella				0,7084
Bentivoglio				0,5929
Bologna	Davide Conte	Assessore	P	30,6729
Borgo Tossignano				0,4239
Budrio	Maurizio Mazzanti	Assessore	P	1,6326
Calderara di Reno	Lora Buratti	Assessore	P	1,2332
Camugnano				0,3169
Casalecchio di Reno	Barbara Negroni	Assessore	P	3,0434
Casalfiumanese				0,4370
Castel d'Aiano	Salvatore Argentieri	Sindaco	P	0,3129
Castel del Rio				0,2536
Castel di Casio				0,4385
Castel Guelfo di Bologna				0,5041
Castel Maggiore				1,5915
Castel San Pietro Terme	Stefano Trazzi	Consigliere	P	1,8348
Castello d'Argile	Michele Giovannini	Sindaco	P	0,6833
Castenaso				1,3321
Castiglione dei Pepoli	Maurizio Fabbri	Sindaco	P	0,6350
Crevalcore	Marco Martelli	Assessore	P	1,2643
Dozza				0,6818
Firenzuola				0,5494
Fontanelice				0,3109
Gaggio Montano				0,5689
Galliera	Rosalba Giofrè	Assessore	P	0,6015
Granarolo dell'Emilia				1,0374
Grizzana Morandi				0,4798
Imola	Davide Tronconi	Assessore	P	5,7326

Lizzano in Belvedere	Giancarlo Biagi	Assessore	P	0,3423
Loiano				0,5170
Malalbergo				0,8734
Marradi				0,4202
Marzabotto	Romano Franchi	Sindaco	P	0,7019
Medicina				1,5108
Minerbio				0,8655
Molinella				1,4389
Monghidoro				0,4654
Monte San Pietro	Stefano Rizzoli	Sindaco	P	1,0418
Monterenzio				0,6336
Monzuno	Mauro Mastacchi	Sindaco	P	0,6566
Mordano				0,5342
Ozzano dell'Emilia				1,2103
Palazzuolo sul Senio				0,2502
Pianoro				1,5407
Pieve di Cento	Luca Borsari	Vice Sindaco	P	0,7192
Sala Bolognese	Alessandro Fuochi	Assessore	P	0,8302
San Benedetto Val di Sambro	Alessandro Santoni	Sindaco	P	0,5136
San Giorgio di Piano	Valerio Gualandi	Assessore	P	0,8266
San Giovanni in Persiceto				2,3710
San Lazzaro di Savena				2,7079
San Pietro in Casale	Enrico Fregna	Assessore	P	1,1171
Sant'Agata Bolognese				0,7394
Sasso Marconi	Stefano Mazzetti	Sindaco	P	1,3480
Valsamoggia	Fabio Dardi	Assessore	P	2,5712
Vergato	Giovanni Zavorri	Assessore	P	0,7806
Zola Predosa	Stefano Fiorini	Sindaco	P	1,6478
Città Metropolitana				10,0000

Presenti n. 26 pari a quote 62,7480

Assenti n. 33 pari a quote 37,2520

Riconosciuta la validità della seduta Michele Giovannini, in qualità di Coordinatore del Consiglio locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2016.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.4 del 30 marzo 2016 del Consiglio locale di Bologna è stato approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 41 del 26 luglio 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Bologna, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr
- con deliberazione n. 12 del 27 febbraio 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare gli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore HERA s.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2016 attraverso il software ARSI;

rilevato che:

- durante il 2015 non è stato proposto alcun intervento che necessiti di ratifica da parte del Consiglio locale ai sensi della delibera di Consiglio d'ambito n.70/2014;
- dai dati presentati si evince che il gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di investimenti realizzati inferiore di 3.283.985 euro rispetto a quanto previsto dal Programma degli interventi 2015-2019 approvato;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal gestore del servizio;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto pertanto:

- di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti.

con voti a favore n. 26 (quote 62,7480), astenuti n.0., contrari n. 0;

resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 per il gestore HERA s.p.a. per il bacino tariffario di Bologna come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2016
Gestore: HERA s.p.a.
Sottoambito: Bologna**

28 settembre 2017

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2016, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Bologna n.4 del 30 Marzo 2016, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI.

		PIANIFICATO 2016		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2016	
HERA	Importo Lordo Pianificato dal soggetto investitore HERA esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 27.923.243		-€ 3.571.628	€ 24.351.615	Importo Lordo a Consuntivo del soggetto investitore HERA esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
	Importo Contributo a fondo perduto Pianificato [B]	€ 1.439.000		-€ 950.760	€ 488.240	Importo Contributo a Consuntivo [B]
	Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 26.484.243		-€ 2.620.868	€ 23.863.375	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]
CONTO TERZI	Importo Lordo Pianificato da soggetto investitore diverso da HERA [C]	€ 858.000		-€ 663.117	€ 194.883	Importo Lordo a Consuntivo da soggetto investitore diverso da HERA
TOTALE	Totale netto pianificato	€ 27.342.243		-€ 3.283.985	€ 24.058.258	Totale netto consuntivato

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2016 meno investimenti, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato; nel caso specifico, a contribuire a questo fatto ha inciso sicuramente il fatto che il gestore nel 2016 non ha avviato o ha chiuso la contabilità all'anno precedente per 46 interventi sul totale di 207 che erano stati invece programmati (cfr.Tab 2).

Oltre agli interventi non avviati ha contribuito anche il fatto che per 111 interventi programmati il gestore ha rendicontato un importo che si discosta del + o - 20% rispetto il programmato (cfr.Tab 2) e che inoltre ha rendicontato meno lavori "conto terzi" rispetto il programmato.

Alcuni interventi infatti (importo complessivo pari a 858.000 euro) hanno un soggetto finanziatore che non è il gestore HERA, il quale si incarica solo dell'esecuzione dell'opera, ma CONAMI e tali interventi vengono considerati come un vero e proprio lavoro "conto terzi".

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

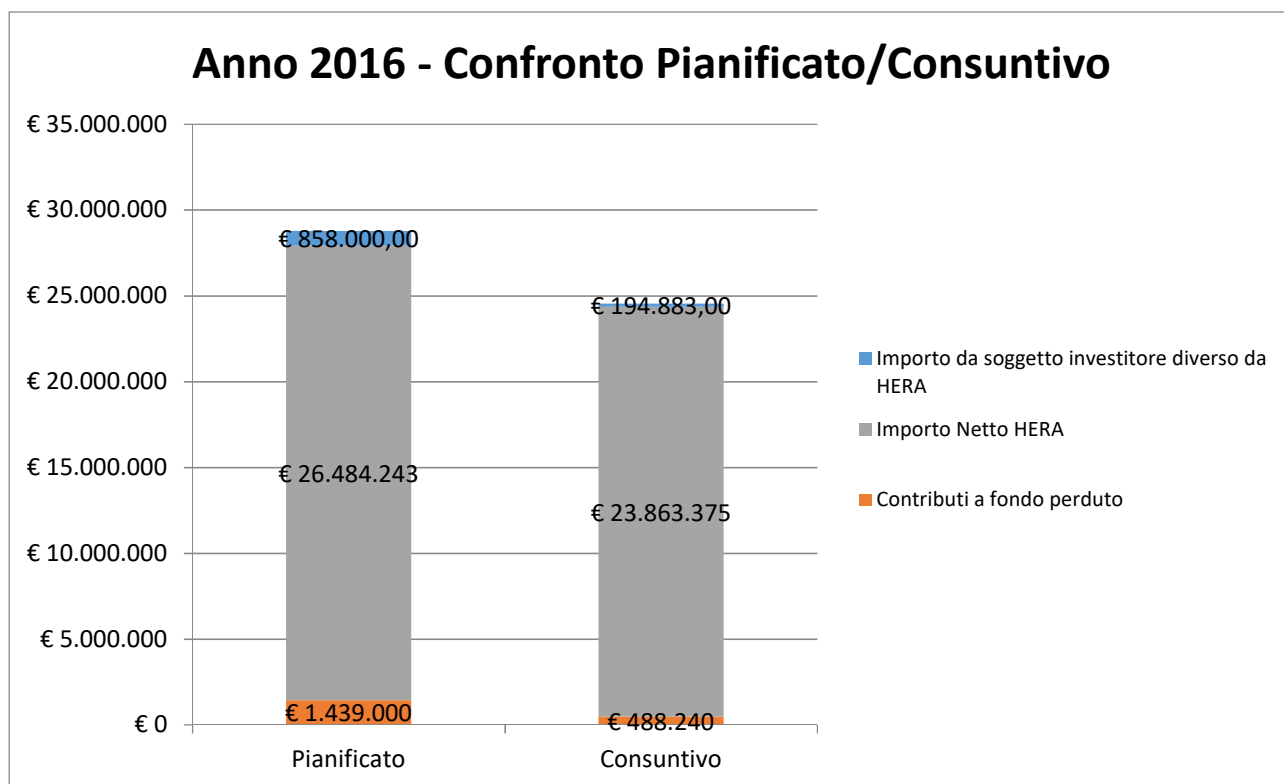


Fig.1 – Istogramma di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2016

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata ritenuta esaustiva.

Numero di voci nel programma approvato per il 2016: 207

Numero di voci rendicontate nel 2016: 174

	Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2016	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2016	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati o conclusi contabilmente nell'anno 2015 (% di scostamento pari al -100%)	46	-€ 52.894	€ 1.682.743	0		
Interventi con avvio anticipato nel 2016 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	13	€ 339.546	€ 0	0		
Interventi avviati nel 2016 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0	0		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	111	€ 12.515.341	€ 14.846.000	0		
<i>di cui interventi con scostamento inferiore al limite di franchigia (€ 20.000) come riportato nella Delibera del Consiglio d'Ambito n. 12/2017</i>	35	€ 621.550	€ 586.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	50	€ 11.744.506	€ 12.252.500	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Sebbene il gestore abbia rendicontato un importo inferiore con quello preventivato (cfr. Tab 1) e non abbia del tutto avviato una parte dei 46 interventi (per l'elenco si veda la Tabella 3) dei 207 programmati, le verifiche effettuate sulle giustificazioni addotte dal gestore hanno ritenuto esaustive le motivazioni su questi 46 interventi.

Per 111 interventi gli importi previsti dalla programmazione hanno registrato uno scostamento oltre il $\pm 20\%$, tutti con giustificazione ritenuta esaustiva e per 35 di essi la giustificazione non è stata necessaria in quanto lo scostamento era al di sotto della franchigia di 20.000 euro fissata dalla Delibera del Consiglio d'Ambito n.17/2017.

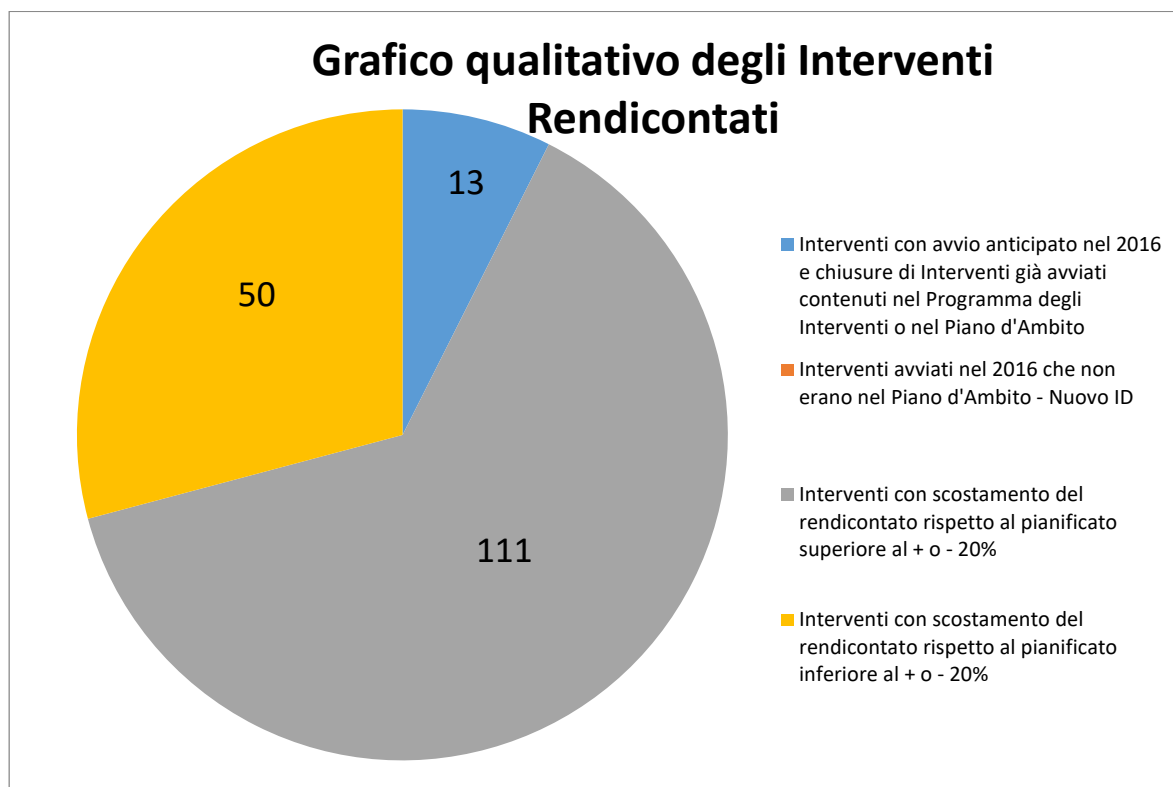


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2016 da Piano approvato
2014BOHA0025	INT PER DISINQUINAMENTO DEL T.RAVONE	FOGNATURA	Bologna	10.000
2014BOHA0038	IDAR: REAL. POST-COMBUST. COGENARAZIONE	DEPURAZIONE	Bologna	280.000
2014BOHA0045	COMPL. SEPAR.RETI FOSSANO LOC. CENTO	FOGNATURA	Budrio	16.000
2015BOHA0013	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO BUDRIO	FOGNATURA	Budrio	11.000
2015BOHA0018	STUDIO DI FATTIBILITA' ADEGUAMENTO AZOTO TOT BUDRIO	DEPURAZIONE	Budrio	5.000
2014BOHA0055	SPOST.RETE-AMPL.AREA SERVIZIO CANTAGALLO	ACQUEDOTTO	Casalecchio	55.000
2014BOHA0059	BON. RETE S. CRISTOFORO - POVOLO	ACQUEDOTTO	Castel d'Aiano	80.000
2015BOHA0023	STUDIO DI FATTIBILITA' PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI BADI	FOGNATURA	Castel di Casio	10.000
2014BOHA0071	RINN. E POTEN. RETE O.GRANDE-VARIGNANA	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro	16.000
2015BOHA0026	POTENZIAMENTO RETE DISTRIBUTTRICE PRINCIPALE C.SAN PIETRO-V.MADONNINA	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro	140.000
2015BOHA0027	STUDIO DI FATTIBILITA' ADEGUAMENTO AZOTO TOT CASTEL SAN PIETRO TERME	DEPURAZIONE	Castel San Pietro	5.000
2014BOHA0077	RIFAC. COLLET. FOG. V.MATTEI	FOGNATURA	Castello d'Argile	15.000
2014BOHA0078	COLLEG. FRAZIONE S. BERNARDINO ALLA RETE	FOGNATURA	Castello d'Argile	5.000
2014BOHA0088	POT.DEP.S.GIACOMO E COL.LIQUAMI (AUT. J)	DEPURAZIONE	Castiglione dei Pepoli	10.000
2014BOHA0093	ADEG. ACQUEDOTTO CASE BADINI	ACQUEDOTTO	Firenze	8.000
2014BOHA0095	REALIZZAZIONE DEPURATORE DI CORNACCHIAIA	DEPURAZIONE	Firenze	5.000
2015BOHA0034	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO TORRENTE SILLA (PROPEDEUTICO DISM. DEP GAGGIO)	FOGNATURA	Gaggio Montano	20.000
2014BOHA0125	ADEG. DEPURATORE SANTERNO - TRATT. AZOTO	DEPURAZIONE	Imola	18.000

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2016 da Piano approvato
2015BOHA0039	INST.FILTRI SABBIA+CARB. LINEA INDUST. - REALIZZAZIONE	ACQUEDOTTO	Imola	300.000
2015BOHA0040	COLLEGAMENTO SELVA RETE FOGNARIA IMOLA	FOGNATURA	Imola	20.000
2015BOHA0041	POTENZIAMENTO ALIMENTAZIONE IDRICA ZONA RIVAZZA IMOLA	ACQUEDOTTO	Imola	11.000
2015BOHA0044	NUOVO SISTEMA DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO DEPURATORE SANTERNO	DEPURAZIONE	Imola	50.000
2015BOHA0045	SOSTITUZIONE SISTEMA DI AERAZIONE E NUOVO LOCALE COMPRESSORI LINEA 3 DEPURATORE SANTERNO	DEPURAZIONE	Imola	20.000
2015BOHA0046	BONIFICA DIGESTORI DEPURATORE DI SANTERNO	DEPURAZIONE	Imola	150.000
2015BOHA0047	RINN RETE V.GAMBELLARA DA MOLINOROSSO A LASIE	ACQUEDOTTO	Imola	10.000
2015BOHA0051	COLLEGAMENTO RETE ACQUEDOTTO LOCALITA' MOLINO DI VALBURA	ACQUEDOTTO	Marradi	12.000
2014BOHA0143	EST. RETE LOC. VAGLIE - FONTANÈ - ASSE3	ACQUEDOTTO	Marzabotto	8.000
2014BOHA0148	COLLETTORE GARDELLETTA ALTA	FOGNATURA	Marzabotto	7.000
2014BOHA0355	COLLETTORE ZP FOSSATONE - LOTTO 2	FOGNATURA	Medicina	184.743
2015BOHA0052	STUDIO DI FATTIBILITA' ADEGUAMENTO AZOTO TOT MEDICINA	DEPURAZIONE	Medicina	5.000
2015BOHA0006	ADEGUAMENTO FOSSA IMHOFF LOCALITÀ MOLINO BACCI	DEPURAZIONE	Monghidoro	15.000
2015BOHA0057	RINNOVO RETE IDRICA VIA BORGIO GENERAL VITALI	ACQUEDOTTO	Mordano	90.000
2014BOHA0219	NUOVA ADDUZ. CASTIGLIONE-RONCOBILACCIO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	8.000
2015BOHA0060	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE-IM-ATO5	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	10.000
2015BOHA0065	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - IF - ATO5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	10.000

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2016 da Piano approvato
2015BOHA0070	INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE-FERRARESE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	20.000
2015BOHA0072	INTEGRAZIONE DEL MODELLO IDAR CON IL RETICOLO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	9.000
2015BOHA0073	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE-CONAMI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	10.000
2015BOHA0076	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO PIANORO	FOGNATURA	Pianoro	5.000
2014BOHA0320	COLLET.LOCALITA PALAZZO ROSSI- S.MARCONI	FOGNATURA	Sasso Marconi	6.000
2014BOHA0339	EST. RETE ALLA LOC. CÀ DEI PRIORI-ASSE3	ACQUEDOTTO	Savigno	9.000
2014BOHA0345	POTENZ.COLLET. TRA V.ALBERGATI-THEODOLI	FOGNATURA	Zola Predosa	4.000
			TOTALE	1.682.743

TAB.3 Interventi previsti nel 2016 e non realizzati o terminati contabilmente nell'anno 2015 (Percentuale di scostamento pari a -100%)

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2015BOHA0023	STUDIO DI FATTIBILITA' PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI BADI	FOGNATURA	Castel di Casio	Gestore HERA		10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	L'IMPORTO PREVISTO PER IL 2016 NON E' STATO UTILIZZATO IN QUANTO SONO IN CORSO DEGLI APPROFONDIMENTI AVVIATI CON IL COMUNE DI CASTEL DI CASIO FINALIZZATI A CONDIVIDERE ED APPROFONDIRE LA NECESSITA' O MENO DI INTERVENTI ADDIZIONALI RISPETTO A QUELLI CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DICHIARA DI AVER ESEGUITO IN PASSATO. L'ESITO DI TALI APPROFONDIMENTI PORTERA' ALLA DEFINIZIONE PIU' PUNTUALE DEGLI EVENTUALI INTERVENTI RESIDUI NECESSARI.
2015BOHA0024	POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDR. SALAROLA	FOGNATURA	Castel Guelfo	Gestore HERA		0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0068	SOSTI.MACCHINA OZONO POTAB.BELFIORE	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro	Gestore HERA	45.000	45.000	0	45.000	3.732	0	3.732	-92%	L'INTERVENTO HA RICHIESTO APPROFONDIMENTI TECNICI NON PREVISTI CHE HANNO ALLUNGATO I TEMPI DI PROGETTAZIONE E DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI PER LA GARA D'APPALTO. NEL 2016 È STATA SVILUPPATA SOLO LA FASE PROGETTUALE E LA GARA D'APPALTO, MENTRE L'ESECUZIONE È PREVISTA PER IL 2017. L'INTERVENTO È ATTUALMENTE IN CORSO
2014BOHA0069	RECUPERO AREA SERB. PENSILE C.S.PIETRO	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro	Gestore HERA	80.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0070	NUOVO POZZO AL POTABILIZZATORE POGGIO	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro	Gestore HERA	128.000	105.000	0	105.000	160.853	0	160.853	53%	MAGGIORI ONERI PER RICHIESTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER PERFORAZIONE DI PROVA IN 2 DIVERSE ZONE E NECESSITÀ DI TOMBAMENTO DEL POZZO DA SOSTITUIRE (INTERVENTI INIZIALMENTE NON PREVISTI).
2014BOHA0071	RINN. E POTEN. RETE O.GRANDE-VARIGNANA	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro	Gestore HERA	80.000	16.000	0	16.000	0	0	0	-100%	RIPROGRAMMATO L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE PER RIPARAMETRAZIONE DEL LIVELLO DI PRIORITÀ DELL'INTERVENTO
2014BOHA0072	NUOVO COLLE.FOGNARIO V.S. GIORGIO LOC.OS	FOGNATURA	Castel San Pietro	Gestore HERA	55.000	100.000	0	100.000	59.913	0	59.913	-40%	LAVORI CONCLUSI A INIZIO 2017
2014BOHA0073	POTENZIAMENTO RETE FOGNA OSTERIA GRANDE	FOGNATURA	Castel San Pietro	Gestore HERA	105.000	118.000	0	118.000	228.766	0	228.766	94%	MAGGIORI ONERI PER INTERFERENZE NON PREVISTE E CONSEGUENTE NECESSITÀ DI FAR SPOSTARE UNA LINEA ENEL
2014BOHA0074	ADEG SOLLEV E GRIGL. DEP CASTEL S.PIETRO	DEPURAZIONE	Castel San Pietro	Gestore HERA	521.000	360.000	0	360.000	307.249	0	307.249	-15%	
2014BOHA0075	ADEGUAMENTO SISTEMA DI TRATTAMENTO IN LOCO A MOLINO NUOVO	DEPURAZIONE	Castel San Pietro	SOCIETA' ASSET		20.000	0	20.000	14.448	0	14.448	-28%	
2014BOHA0257	ADEG.SCOLMATORI OSTERIA GRANDE	FOGNATURA	Castel San Pietro	Gestore HERA	79.000	0	0	0	0	0	0		
2015BOHA0025	POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA V. S.GIOVANNI (SICILIA-PILASTRINO)	FOGNATURA	Castel San Pietro	Gestore HERA		0	0	0	0	0	0		
2015BOHA0026	POTENZIAMENTO RETE DISTRIBUTRICE PRINCIPALE C.SAN PIETRO-V.MADONNINA	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro	Gestore HERA		140.000	0	140.000	0	0	0	-100%	NEL 2016 EFFETTUATO SOLO VALUTAZIONI DI FATTIBILITÀ PER VALUTARE MEGLIO LA SOLUZIONE: REALIZZAZIONE INTERVENTO NEL 2017
2015BOHA0027	STUDIO DI FATTIBILITA' ADEGUAMENTO AZOTO TOT CASTEL SAN PIETRO TERME	DEPURAZIONE	Castel San Pietro	Gestore HERA		5.000	0	5.000	0	0	0	-100%	ATTIVITA' DI STUDIO PRELIMINARE POSTICIPATE ALLE ANNUALITA' SUCCESSIVE, NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DETTATE DALLA DGR 201/2016.
2014BOHA0076	RINN.RETE - V.PROV.SUD CASTELLO D'ARGILE	ACQUEDOTTO	Castello d'Argile	Gestore HERA	108.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0077	RIFAC. COLLET. FOG. V.MATTEI	FOGNATURA	Castello d'Argile	Gestore HERA	506.000	15.000	0	15.000	0	0	0	-100%	SLITTAMENTO PROGETTAZIONE IN ATTESA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI CON IL COMUNE E ATERSIR (SOLUZIONE PROGETTUALE CON VASCA DI LAMINAZIONE)
2014BOHA0078	COLLEG. FRAZIONE S. BERNARDINO ALLA RETE	FOGNATURA	Castello d'Argile	Gestore HERA	-	5.000	0	5.000	0	0	0	-100%	SLITTAMENTO PROGETTAZIONE IN ATTESA DI RILIEVI DEI PRIVATI E DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO (COMUNE E PRIVATI)
2014BOHA0324	BON. RETE V. CASTELLO	ACQUEDOTTO	Castello di Serravalle	Gestore HERA	90.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0325	BON. V. CAMPADIO 3187 - ASSE3	ACQUEDOTTO	Castello di Serravalle	Gestore HERA	84.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0326	POTENZIAMENTO RETE LOC. MERCATELLO	ACQUEDOTTO	Castello di Serravalle	Gestore HERA	249.000	438.000	0	438.000	287.200	0	287.200	-34%	RITARDI NELLA FORNITURA DELLE OPERE ELETTROMECCANICHE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.
2014BOHA0327	RINN.RETE V. MAIOLA-M.MAURO C.SERRAVALLE	ACQUEDOTTO	Castello di Serravalle	Gestore HERA	63.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0328	RINN.RETE VALLE SAMOGGIA CAS.SERRAVALLE	ACQUEDOTTO	Castello di Serravalle	Gestore HERA	5.000	190.000	0	190.000	43.410	0	43.410	-77%	CONCLUSO NEL 2017 RITARDI PER SERVITU'
2014BOHA0329	COLLETT. LOC. TINTORIA AL DEP. SAVIGNO	FOGNATURA	Castello di Serravalle	Gestore HERA	300.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0330	REAL. DEP. LOCALITÀ RIO CÀ DE FABBRI	DEPURAZIONE	Castello di Serravalle	Gestore HERA	418.000	298.000	0	298.000	269.395	0	269.395	-10%	
2014BOHA0079	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI CASTELMAGGIORE-CORTICELLA	ACQUEDOTTO	Castelmaggiore	Gestore HERA	260.000	90.000	0	90.000	131.954	0	131.954	47%	ANTICIPO INTERVENTI
2014BOHA0080	RIN RETE V.ROSSELLI C.MAGGIORE II STRA.	ACQUEDOTTO	Castelmaggiore	Gestore HERA	50.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0081	RINN. RETE V.BUOZZI C.MAGGIORE	ACQUEDOTTO	Castelmaggiore	Gestore HERA	45.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0082	RINN RETE V.MARABINI C.MAGGIORE	ACQUEDOTTO	Castelmaggiore	Gestore HERA	45.000	0	0	0	0	0	0		
2015BOHA0028	NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD - POT.CASTELMAGGIORE	ACQUEDOTTO	Castelmaggiore	Gestore HERA		0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0085	ADEG. SCARICHI VIA MARCONI	FOGNATURA	Castenaso	Gestore HERA	361.000	177.000	0	177.000	32.779	0	32.779	-81%	SLITTAMENTO INIZIO LAVORI PER ATTESA DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO.
2015BOHA0029	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO CASTENASO	FOGNATURA	Castenaso	Gestore HERA		5.000	0	5.000	897	0	897	-82%	

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2015BOHA0049	STUDIO DI FATTIBILITA' PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' DI LIZZANO IN BELVEDERE	FOGNATURA	Lizzano in Belvedere	Gestore HERA		0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0131	INT.TUB.VOLANTE ACQ V.LAVORO-LOIANO	ACQUEDOTTO	Loiano	Gestore HERA	185.000	90.000	0	90.000	70.533	0	70.533	-22%	
2014BOHA0132	INT.TUBAZ.VOLANTE FOG V. LAVORO LOIANO	FOGNATURA	Loiano	Gestore HERA	158.000	63.000	0	63.000	71.306	0	71.306	13%	
2014BOHA0133	COLLET.SCARICO SABBIONI A DEP(2*STR)	DEPURAZIONE	Loiano	Gestore HERA	178.000	87.000	0	87.000	198.566	0	198.566	128%	MAGGIORI ONERI EMERSI IN FASE ESECUTIVA: IN PARTICOLARE ALLA NECESSITA' DI PREVEDERE DELLE OPERE RELATIVE AL CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE OVE È COLLOCATO UN SOLLEVAMENTO FOGNARIO CHE E' OGGETTO DI UN MOVIMENTO FRANOSO.
2014BOHA0134	DEP.SABBIONI EST-SUD CA BEL MIINGHINO	DEPURAZIONE	Loiano	Gestore HERA	901.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0135	BONIF. CONDOTTA VIA CASTELLINA-ALTEDO	ACQUEDOTTO	Malalbergo	Gestore HERA	80.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0136	COLLETT. VARIANTE VIA CASTELLINA-ALTEDO	FOGNATURA	Malalbergo	Gestore HERA	549.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0137	REALIZ. COLLETTORE PEGOLA - ALTEDO	FOGNATURA	Malalbergo	Gestore HERA	435.000	5.000	0	5.000	21.898	0	21.898	338%	
2014BOHA0138	COLL.ZONA ARTIG. MALALBERGO AL DEP	FOGNATURA	Malalbergo	Gestore HERA	451.000	193.000	0	193.000	246.666	0	246.666	28%	AUMENTO PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA
2014BOHA0139	COLLET. V.BENTINI DISM.SOLL. C.SPORTIVO	FOGNATURA	Malalbergo	Gestore HERA	350.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0140	ADEG. DEP. MALALBERGO CAPOL.	DEPURAZIONE	Malalbergo	Gestore HERA	1.091.000	500.000	0	500.000	349.745	0	349.745	-30%	RALLENTAMENTI DEL CANTIERE DOVUTI A EVENTO IMPREVEDIBILE (ROTTURA DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE AL DEPURATORE DI ACQUE REFLUE DI MALALBERGO, NEL TRATTO IN CUI QUESTA RISULTA COLLEGATA E SORRETTA DA UNA PASSERELLA METALLICA SULLO "SCOLO BOTTE") CHE HA RICHIESTO UN CIMENTO IN TERMINI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E SUCCESSIVO INTERVENTO RISOLUTIVO.
2015BOHA0050	COLLEGAMENTO DELLA ZONA NORD DI PEGOLA AL SISTEMA PEGOLA - ALTEDO	FOGNATURA	Malalbergo	Gestore HERA		0	0	0	0	0	0		
2015BOHA0051	COLLEGAMENTO RETE ACQUEDOTTO LOCALITA' MOLINO DI VALBURA	ACQUEDOTTO	Marradi	SOCIETA' ASSET		12.000	0	12.000	0	0	0	-100%	ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO NELL'ANNO 2017, QUINDI I CONSUNTIVI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI AL 2017
2014BOHA0141	BON.ATTR.RENO LOC.BARLEDA-ANTICIPAZIONE	ACQUEDOTTO	Marzabotto	Gestore HERA	75.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0142	EST. RETE LOC. CERPIANE - CA DI GERMINO	ACQUEDOTTO	Marzabotto	Gestore HERA	140.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0143	EST. RETE LOC. VAGLIE - FONTANÈ - ASSE3	ACQUEDOTTO	Marzabotto	Gestore HERA	172.000	8.000	0	8.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO CONCLUSO. IMPORTO IPOTIZZATO NON UTILIZZATO
2014BOHA0144	RINN. RETE V.GARDELLETTA MARZABOTTO	ACQUEDOTTO	Marzabotto	Gestore HERA	105.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0145	EST. RETE FOG LOC. LA QUERCIA MARZABOTTO	FOGNATURA	Marzabotto	Gestore HERA	125.000	91.000	0	91.000	16.744	0	16.744	-82%	RITARDO NELL'ITER AUTORIZZATIVO DA PARTE DI AUTOSTRADAL PER L'ITALIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA IMHOFF NELL'AREA DELL'IMPALCATO DELL'AUTOSTRADA.
2014BOHA0146	SPERTICANO (AUT. S)	FOGNATURA	Marzabotto	Gestore HERA	401.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0147	COLLET. FOGNATURA LOC. ALLOCCO	FOGNATURA	Marzabotto	Gestore HERA	-	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0148	COLLETTORE GARDELLETTA ALTA	FOGNATURA	Marzabotto	Gestore HERA	123.000	7.000	0	7.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO CONCLUSO ANTE 2016
2014BOHA0149	AMPL. E FINISSAGGIO DEP.LOC.LAMA DI RENO	DEPURAZIONE	Marzabotto	Gestore HERA	620.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0150	RIFACIMENTO RETE AC V.GUAZZALOCA-ASSE3	ACQUEDOTTO	Medicina	Gestore HERA	34.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0151	ADEG.FOG/DEP PORTONOVOS.ANTONIO-RETE	FOGNATURA	Medicina	Gestore HERA	470.000	20.000	0	20.000	22.181	0	22.181	11%	
2014BOHA0152	ADEG. SCARICHI V.LAVORO E V.ALBERGA	FOGNATURA	Medicina	Gestore HERA	387.000	148.000	0	148.000	99.457	0	99.457	-33%	SLITTAMENTO FINE LAVORI PER ATTESA AUTORIZZAZIONE SISMICA
2014BOHA0153	COLL.FOGNARIO ZONA INDUST. FOSSATONE	FOGNATURA	Medicina	Gestore HERA	216.000	198.000	0	198.000	13.743	0	13.743	-93%	INTERVENTO LEGATO AGLI ALTRI 2 ID ATERSIR 2014BOHA0355 - 2014BOHA0155 PER I QUALI LE TEMPISTICHE ERANO VINCOLATE ALLA TEMATICA SULLO SBLOCCO DEL FINANZIAMENTO APQ.
2014BOHA0154	ADEG.FOG/DEP PORTONOVO E S.ANTONIO - IMP	DEPURAZIONE	Medicina	Gestore HERA	532.000	80.000	0	80.000	4.853	0	4.853	-94%	RITARDO CAUSA ITER AUTORIZZATIVO PARTICOLARMENTE LUNGO .
2014BOHA0155	COLLETTORE ZP FOSSATONE - LOTTO 2	FOGNATURA	Medicina	SOCIETA' ASSET	-	30.000	0	30.000	204	0	204	-99%	INTERVENTO CHE HA SUBITO RITARDI LEGATI ALLA TEMATICA DELLO SBLOCCO DEL FINANZIAMENTO APQ
2014BOHA0348	RINN. RETE V. MEDESANO - ASSE3	ACQUEDOTTO	Medicina	Gestore HERA		0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0355	COLLETTORE ZP FOSSATONE - LOTTO 2	FOGNATURA	Medicina	Gestore HERA		184.743	-195.000	-10.257	0	0	0	-100%	INTERVENTO CHE HA SUBITO RITARDI LEGATI ALLA TEMATICA DELLO SBLOCCO DEL FINANZIAMENTO APQ
2014BOHA0366	ADEG.SC 07FO4004 RETE GANZANIGO	FOGNATURA	Medicina	Gestore HERA		0	0	0	0	0	0		
2015BOHA0052	STUDIO DI FATTIBILITA' ADEGUAMENTO AZOTO TOT MEDICINA	DEPURAZIONE	Medicina	Gestore HERA		5.000	0	5.000	0	0	0	-100%	ATTIVITA' DI STUDIO PRELIMINARE POSTICIPATE ALLE ANNUALITA' SUCCESSIVE, NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DETTATE DALLA DGR 201/2016.

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016					Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento		
2015BOHA0072	INTEGRAZIONE DEL MODELLO IDAR CON IL RETICOLO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore HERA		9.000	0	9.000	0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE IN QUANTO L'ATTIVITA' VIENE RENDICONTATA AD ESERCIZIO.	
2015BOHA0073	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE-CONAMI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	SOCIETA' ASSET		10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.	
2015BOHA0074	MAGLIATURA RETE ACQUEDOTTISTICA V. FLOSA E V. RONDONE IN COMUNI DI MEDICINA E CASTEL GUELFO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore HERA		0	0	0	0	0	0			
2014BOHA0260	POT.IDRICO OZZANO: ADEG. SOLL. MIRANDOLA	ACQUEDOTTO	Ozzano Emilia	Gestore HERA	158.000	0	0	0	0	0	0			
2014BOHA0261	BON.VIA ARDEANO CIV.9999_MONTERENZIO	ACQUEDOTTO	Ozzano Emilia	Gestore HERA	55.000	0	0	0	0	0	0			
2014BOHA0262	BON.VIA OLMATELLO-VALLETTA DI SOPRA_OZZA	ACQUEDOTTO	Ozzano Emilia	Gestore HERA	70.000	70.000	0	70.000	26.409	0	26.409	-62%	MAGGIORI APPROFONDIMENTI HANNO PORTATO AD UNA RIDEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI INIZIALMENTE PREVISTI CHE HA PORTATO A DEI "SAVING" IN TERMINI DI MINOR COSTO.	
2014BOHA0263	BON. RETE FOG. NERA RIO MARZANO OZZANO	FOGNATURA	Ozzano Emilia	Gestore HERA	31.000	0	0	0	-9.170	0	-9.170	100%	INTERVENTO CONCLUSO. COMPLETAMENTO ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE ECONOMICA.	
2014BOHA0264	POT. FOGNATURA MISTA QUADERNA I STRALCIO	FOGNATURA	Ozzano Emilia	Gestore HERA	601.000	22.000	0	22.000	2.707	0	2.707	-88%		
2014BOHA0265	REAL.RETE FOG.PAL. BIANCHETTI-OZZANO	FOGNATURA	Ozzano Emilia	Gestore HERA	175.000	210.000	0	210.000	25.424	0	25.424	-88%	SLITTAMENTO LAVORI IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE SISMICA	
2014BOHA0266	FILTRAZIONE A MEMBRANE DEP. P.TE RIZZOLI	DEPURAZIONE	Ozzano Emilia	Gestore HERA	2.195.000	91.000	-287.000	-196.000	101.388	-178.694	-77.306	11%		
2014BOHA0267	AMPL. DEP. LOC. PONTE RIZZOLI	DEPURAZIONE	Ozzano Emilia	Gestore HERA	2.956.000	184.000	0	184.000	164.917	0	164.917	-10%		
2014BOHA0268	BON.VIA NAZIONALE 152_PIANORO	ACQUEDOTTO	Pianoro	Gestore HERA	50.000	0	0	0	0	0	0			
2014BOHA0269	REALIZZAZIONE POMPAGGIO V. GARGANELLI	FOGNATURA	Pianoro	Gestore HERA	51.000	105.000	0	105.000	1.970	0	1.970	-98%	INTERVENTO IN STAND BY PER OTTENIMENTO DEI PERMESSI COMUNALI.	
2015BOHA0075	POTENZIAMENTO RETE MISTA V. DEL SAVENA	FOGNATURA	Pianoro	Gestore HERA		0	0	0	0	0	0			
2015BOHA0076	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO PIANORO	FOGNATURA	Pianoro	Gestore HERA		5.000	0	5.000	0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE IN QUANTO L'ATTIVITA' VIENE RENDICONTATA AD ESERCIZIO.	
2014BOHA0270	COLLEG.ADD.S.M.DECIMA A P.DICENTO DN400	ACQUEDOTTO	Pieve di Cento	Gestore HERA	870.000	0	0	0	0	0	0			
2014BOHA0271	ADEG. RETE FOGNARIA PIEVE DI CENTO	FOGNATURA	Pieve di Cento	Gestore HERA	850.000	0	0	0	0	0	0			
2014BOHA0272	COLL. VIE GIOTTO, PUCCINI E S. NICOLÒ	FOGNATURA	Pieve di Cento	Gestore HERA	377.000	5.000	0	5.000	22.646	0	22.646	353%		
2014BOHA0273	SCOLMATORE E COLLETTORE VIA LANZONI	FOGNATURA	Pieve di Cento	Gestore HERA	143.000	0	0	0	0	0	0			
2014BOHA0274	BON. LOC. SELVA FRAZ. CAPUGNANO	ACQUEDOTTO	Porretta Terme	Gestore HERA	65.000	0	0	0	0	0	0			
2014BOHA0275	SISTEM. TRATT. ACQUE CONTROLAVAG.PENNOLA	ACQUEDOTTO	Porretta Terme	Gestore HERA	80.000	15.000	0	15.000	14.810	0	14.810	-1%		
2014BOHA0276	RINN. V. MANSERVISI FRAZ. CASTELLUCCIO	FOGNATURA	Porretta Terme	Gestore HERA	24.000	0	0	0	0	0	0			
2014BOHA0277	MANUT. FOSSO A VALLE SCOLM. V.MATTEOTTI	FOGNATURA	Sala Bolognese	Gestore HERA	51.000	0	0	0	0	0	0			
2014BOHA0278	COLL.DA BONCONVENTO A DEP.CASTELCAMPEGGI	FOGNATURA	Sala Bolognese	Gestore HERA	712.000	125.000	0	125.000	16.103	0	16.103	-87%	SLITTAMENTO LAVORI PER RITARDI DI CONSEGNA DEL PROFESSIONISTA, ATTESA GARA INSIEME AL DEPURATORE	
2014BOHA0279	BON. DA LOC. MACCHIARELLI A S. MARTINO	ACQUEDOTTO	San Benedetto Val di Sambro	Gestore HERA	40.000	0	0	0	0	0	0			
2014BOHA0280	EST. LOC. MONTE ACUTO VALLESE - RIPOLI	ACQUEDOTTO	San Benedetto Val di Sambro	Gestore HERA	94.000	85.000	0	85.000	63.690	0	63.690	-25%	MINORI COSTI PER EFFETTO DI ALCUNI INTERVENTI EFFETTUATI IN REGIME DI PI	
2014BOHA0281	EST. LOC. GOLFANARA-ASSE3	ACQUEDOTTO	San Benedetto Val di Sambro	Gestore HERA	154.000	0	0	0	0	0	0			
2014BOHA0282	NUOVO POZZO CASTEL DELL'ALPI E CONDOTTA	ACQUEDOTTO	San Benedetto Val di Sambro	Gestore HERA	126.000	87.000	0	87.000	12.347	0	12.347	-86%	ITER AUTORIZZATIVO PARTICOLARMENTE LUNGO	
2014BOHA0283	INTERVENTI DI RETE MONTEFREDEnte	ACQUEDOTTO	San Benedetto Val di Sambro	Gestore HERA	27.000	0	0	0	0	0	0			
2014BOHA0284	INCREM. APPROV.O DA SORGENTI CANALI COLLET. S.ANDREA - DEP. S.BENEDETTO VAL	ACQUEDOTTO	San Benedetto Val di Sambro	Gestore HERA	47.000	20.000	0	20.000	335	0	335	-98%		
2014BOHA0285	EST.RETE FOGN.LOC.CAST.D.ALPI-S.BEN.VDS	FOGNATURA	San Benedetto Val di Sambro	Gestore HERA	352.000	10.000	0	10.000	35.180	0	35.180	252%	ANTICIPI IN FASE REALIZZATIVA	
2014BOHA0286	REAL. DEP. CASTEL DELL'ALPI	DEPURAZIONE	San Benedetto Val di Sambro	Gestore HERA	601.000	31.000	0	31.000	18.406	0	18.406	-41%	RITARDI NELL'ITER AUTORIZZATIVO	

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014BOHA0312	BON. V. VIII MARZO E S. LORENZO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore HERA	55.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0313	SPOST.RETE LOC. LA LEONA I STRALCIO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore HERA	120.000	6.000	0	6.000	6.533	0	6.533	9%	
2014BOHA0314	SPOST.LOC.CENTRALE POTAB. II STRALCIO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore HERA	201.000	9.000	0	9.000	4.908	0	4.908	-45%	
2014BOHA0315	SPOST.LOC.LA CAPRINA III STRALCIO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore HERA	251.000	0	0	0	134	0	134	100%	CONSUNTIVI NON SIGNIFICATIVI - PRIME ATTIVITA' RELATIVE A REPERIMENTO DATI
2014BOHA0316	SPOST.LOC.CINQUE CERRI IV STRALCIO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore HERA	382.000	0	0	0	112	0	112	100%	CONSUNTIVI NON SIGNIFICATIVI - PRIME ATTIVITA' RELATIVE A REPERIMENTO DATI
2014BOHA0317	SPOST. RETE RIO MOLINAZZO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore HERA	181.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0318	EST. VILLAGGIO SERRABELLA	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore HERA	155.000	10.000	0	10.000	5.091	0	5.091	-49%	
2014BOHA0319	RINN.RETE VS.LORENZO-OROLOGIO-S.MARCONI	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore HERA	60.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0320	COLLET.LOCALITA PALAZZO ROSSI-S.MARCONI	FOGNATURA	Sasso Marconi	Gestore HERA	464.000	6.000	0	6.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO CONCLUSO, CONTABILIZZAZIONE CONCLUSA ANTE 2016
2014BOHA0321	IMP. DI DEP. DEL CAPOLUOGO: REAL. SECOND	DEPURAZIONE	Sasso Marconi	Gestore HERA	1.533.000	42.000	0	42.000	62.823	0	62.823	50%	MAGGIORI ONERI DI PROGETTAZIONE (RELATIVA A MAGGIOR IMPORTO DELLE OPERE E MAGGIORI ONERI PER FAR FRONTE ALLE PRESCRIZIONI DEGLI ENTI)
2014BOHA0356	COLLET. VALLE OLIVETTA (VIA MONGARDINO)	FOGNATURA	Sasso Marconi	Gestore HERA		0	0	0	0	0	0		
2015BOHA0082	REVAMPING LINEA OZONO CENTRALE ACQUEDOTTISTICA VALDISETTA	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore HERA		240.000	0	240.000	278.773	0	278.773	16%	
2014BOHA0337	POT. RETE COSTE RODIANO/STRADELLO-ASSE3	ACQUEDOTTO	Savigno	Gestore HERA	102.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0338	COLL.RETE LOC.VEDEGHETO-CÀ NOBILI-ASSE3	ACQUEDOTTO	Savigno	Gestore HERA	133.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0339	EST. RETE ALLA LOC. CÀ DEI PRIORI-ASSE3	ACQUEDOTTO	Savigno	Gestore HERA	89.000	9.000	0	9.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO CONCLUSO, CONTABILIZZAZIONE CONCLUSA ANTE 2016
2015BOHA0083	NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CAPOLUOGO SAVIGNO	DEPURAZIONE	Savigno	Gestore HERA		0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0341	EST. LOC. SANGUINEDA-ASSE3	ACQUEDOTTO	Vergato	Gestore HERA	216.000	0	-84.000	-84.000	0	0	0	-100%	Il contributo non verrà mai incassato a causa di un contenzioso tra il comune e gli abitanti della zona interessata dall'estensione, che ha fatto scadere le tempistiche per il suo ottenimento
2014BOHA0342	ADEG. SCARICHI LOC. CAVACCHIO 1526	FOGNATURA	Vergato	Gestore HERA	102.000	72.000	0	72.000	36.012	0	36.012	-50%	RITARDO NELL'ITER AUTORIZZATIVO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEL COMUNE DI VERGATO.
2014BOHA0343	AMPL. DEPURATORE LOC. TOLÈ	DEPURAZIONE	Vergato	Gestore HERA	1.015.000	36.000	0	36.000	35.960	0	35.960	0%	
2015BOHA0084	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO VERGATO	ACQUEDOTTO	Vergato	Gestore HERA		0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0173	COLLET. PONTE RIVABELLA	FOGNATURA	Zola Predosa	Gestore HERA	250.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0344	RINN. IMPIANTO DI SOLL. BELVEDERE	ACQUEDOTTO	Zola Predosa	Gestore HERA	417.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0345	POTENZ.COLLET. TRA V.ALBEGATI-THEODOLI	FOGNATURA	Zola Predosa	Gestore HERA	771.000	4.000	0	4.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO CONCLUSO, CONTABILIZZAZIONE CONCLUSA ANTE 2016
2015BOHA0085	ADEGUAMENTO SCOLMATORE COMPARTO C13 RIALE I STRALCIO	FOGNATURA	Zola Predosa	Gestore HERA		10.000	0	10.000	14.800	0	14.800	48%	
						28.781.243	-1.439.000	27.342.243	24.546.498	-488.240	24.058.258		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Bologna n. 6 del 9 ottobre 2017

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2016.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il direttore
F. to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 9 ottobre 2017



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Bologna

F.to Michele Giovannini

Il segretario verbalizzante

F.to Marco Grana Castagnetti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 6 novembre 2017
