



CLFE/2017/5 del 14 giugno 2017.

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. presa d'atto del consuntivo 2015.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LOCALE
F.to Caterina Ferri**

CLFE/2017/5

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

L'anno duemiladiciassette il giorno 14 del mese di giugno alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Ferrara si è riunito il Consiglio Locale di Ferrara convocato con lettera protocollo AT/2017/3403 del 06/06/2017

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
Argenta	Antonio Fiorentini	Sindaco	No	5,4468
Berra			No	1,5574
Bondeno			No	3,8388
Cento	Simone Maccaferri	Vice sindaco	Si	8,3318
Codigoro			No	3,2139
Comacchio			No	5,5648
Copparo			No	4,2744
Ferrara	Caterina Ferri	Assessore	Si	30,7476
Fiscaglia			No	2,5563
Formignana			No	1,0173
Goro			No	1,2675
Jolanda di Savoia			No	1,0631
Lagosanto			No	1,5097
Masi Torello			No	0,9176
Mesola			No	2,0111
Ostellato	Andrea Marchi	Sindaco	Si	1,8537

Poggio Renatico	Daniele Garuti	Sindaco	Si	2,5918
Portomaggiore	Nicola Minarelli	Sindaco	Si	3,1672
Ro			No	1,1422
Terre del Reno			No	3,1723
Tresigallo			No	1,4202
Vigarano Mainarda	Alessandro Berselli	Assessore	Si	2,0778
Voghiera	Chiara Cavicchi	Sindaco	Si	1,2565
PROVINCIA di FERRARA	Tiziano Tagliani	Presidente	Sì	10,0000

Presenti n. 8 pari a quote 60,0264

Assenti n. 16 pari a quote 39,9736

Riconosciuta la validità della seduta Caterina Ferri, in qualità di delegata del Comune di Ferrara, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. presa d'atto del consuntivo 2015.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.6 del 16 dicembre 2015 del Consiglio locale di Ferrara è stato approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 41 del 26 luglio 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Ferrara, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr
- con deliberazione n. 12 del 27 febbraio 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare gli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore HERA s.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2015 attraverso il software ARSI;

rilevato che:

- durante il 2015 non è stato proposto alcun intervento che necessiti di ratifica da parte del Consiglio locale;
- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati sono sostanzialmente in linea con quanto previsto dal Programma degli interventi 2015-2019 approvato;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto pertanto:

- di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2015 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti.

con voti a favore n. 8 (quote 60,0264), astenuti n.0, contrari n.0;

resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2015 per il gestore HERA s.p.a. per il bacino tariffario di Ferrara come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare la struttura tecnica di ATERSIR di verificare con il gestore gli interventi per i quali non sono stati adeguatamente motivati gli scostamenti rilevati nel consuntivo 2015 oggetto della presente deliberazione;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2015
Gestore: HERA s.p.a.
Sottoambito: Ferrara**

9 febbraio 2017

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2015

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2015, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Ferrara n. 6 del 16 Dicembre 2015, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI.

		PIANIFICATO 2015		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2015	
HERA	Importo Lordo Pianificato dal soggetto investitore HERA esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 6.921.000		-€ 159.039	€ 6.761.961	Importo Lordo a Consuntivo del soggetto investitore HERA esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
	Importo Contributo a fondo perduto Pianificato [B]	€ 143.000		€ 111	€ 143.111	Importo Contributo a Consuntivo [B]
	Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 6.778.000		-€ 159.150	€ 6.618.850	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]
CONTO TERZI	Importo Lordo Pianificato da soggetto investitore diverso da HERA [C]	€ 241.000		-€ 111.408	€ 129.592	Importo Lordo a Consuntivo da soggetto investitore diverso da HERA
TOTALE	Totale netto pianificato	€ 7.019.000		-€ 270.558	€ 6.748.442	Totale netto consuntivato

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2015

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2015 investimenti quasi in linea, in termini economici e in proporzione all'ammontare complessivo, rispetto a quanto era stato preventivato; nel caso specifico, a contribuire a ciò vi è stato sicuramente il fatto che il gestore ha avviato nel 2015 tutti gli interventi già pianificati tranne in soli quattro casi (cfr. Tab 2) e comunque per un importo lordo pianificato pari a 21.000 euro e quindi molto esiguo.

Vi sono inoltre anche alcuni interventi (importo complessivo pari a circa 241.000 euro) il cui soggetto finanziatore non è il gestore HERA, il quale si incarica solo dell'esecuzione dell'opera, ma ACOSEA Impianti e tali interventi vengono considerati come un vero e proprio lavoro "conto terzi".

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

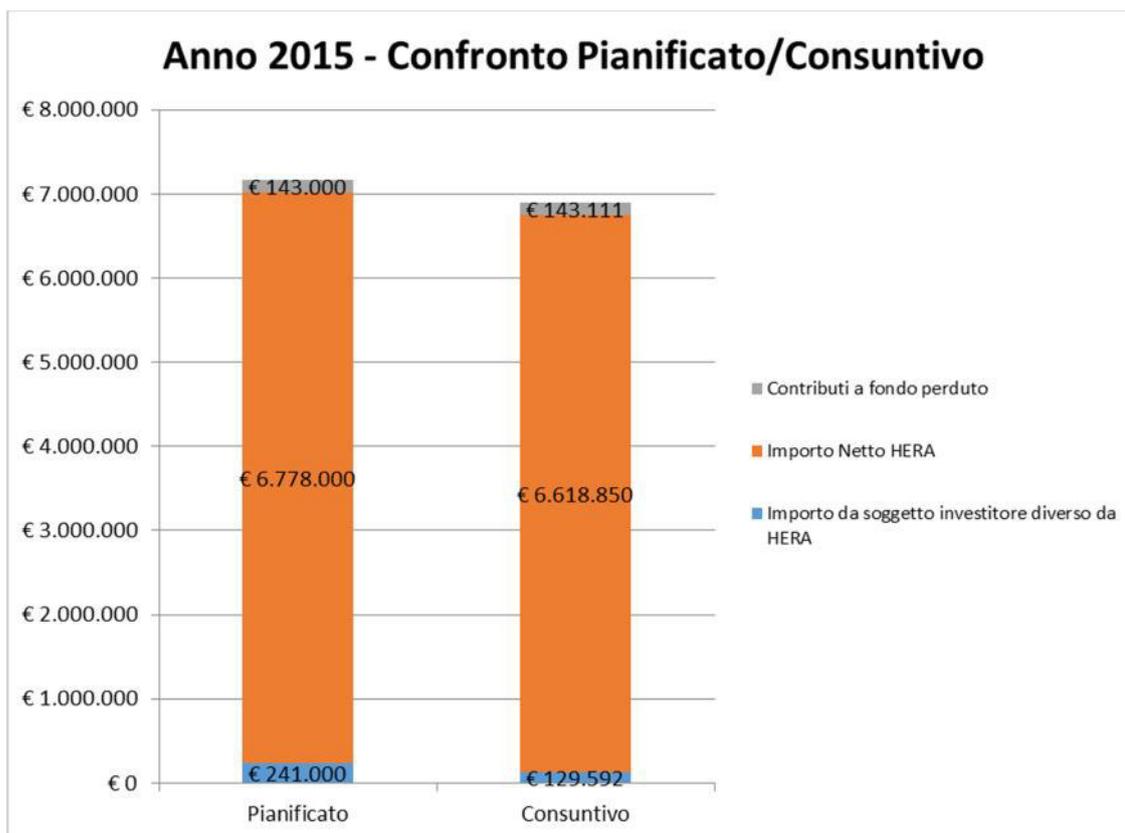


Fig.1 – Istogramma di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2015

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva.

Numero di voci nel programma approvato per il 2015: 66

Numero di voci rendicontate nel 2015: 65

	Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2015	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2015	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	4	€ 0	€ 21.000	1	2014FEHA0010	
Interventi con avvio anticipato nel 2015 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	3	€ 14.513	€ 0	0		
Interventi avviati nel 2015 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0	0		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	34	€ 5.166.118	€ 5.364.000	3	2014FEHA0022; 2014FEHA0033; 2014FEHA0049	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	28	€ 1.710.922	€ 1.777.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Sebbene il gestore abbia nel complesso rendicontato un importo in linea con quello preventivato (cfr. Tab 1) e non abbia del tutto avviato soli 4 interventi (per l'elenco si veda la Tabella 3) dei 66 programmati, le verifiche effettuate sulle giustificazioni addotte dal gestore non hanno ritenuto esaustive le motivazioni di 4 interventi il cui codice ATERSIR è riportato in Tabella 2.

Per la metà circa delle voci previste in programma (34) gli importi previsti hanno registrato uno scostamento oltre il +-20%, mentre per 28 interventi gli importi previsti dalla programmazione sono stati in linea di massima rispettati.

Il gestore ha inoltre avviato anticipatamente rispetto a quanto programmato 3 interventi previsti nella pianificazione d'ambito e nei programmi dell'ex ATO 6.

Grafico qualitativo degli Interventi Rendicontati

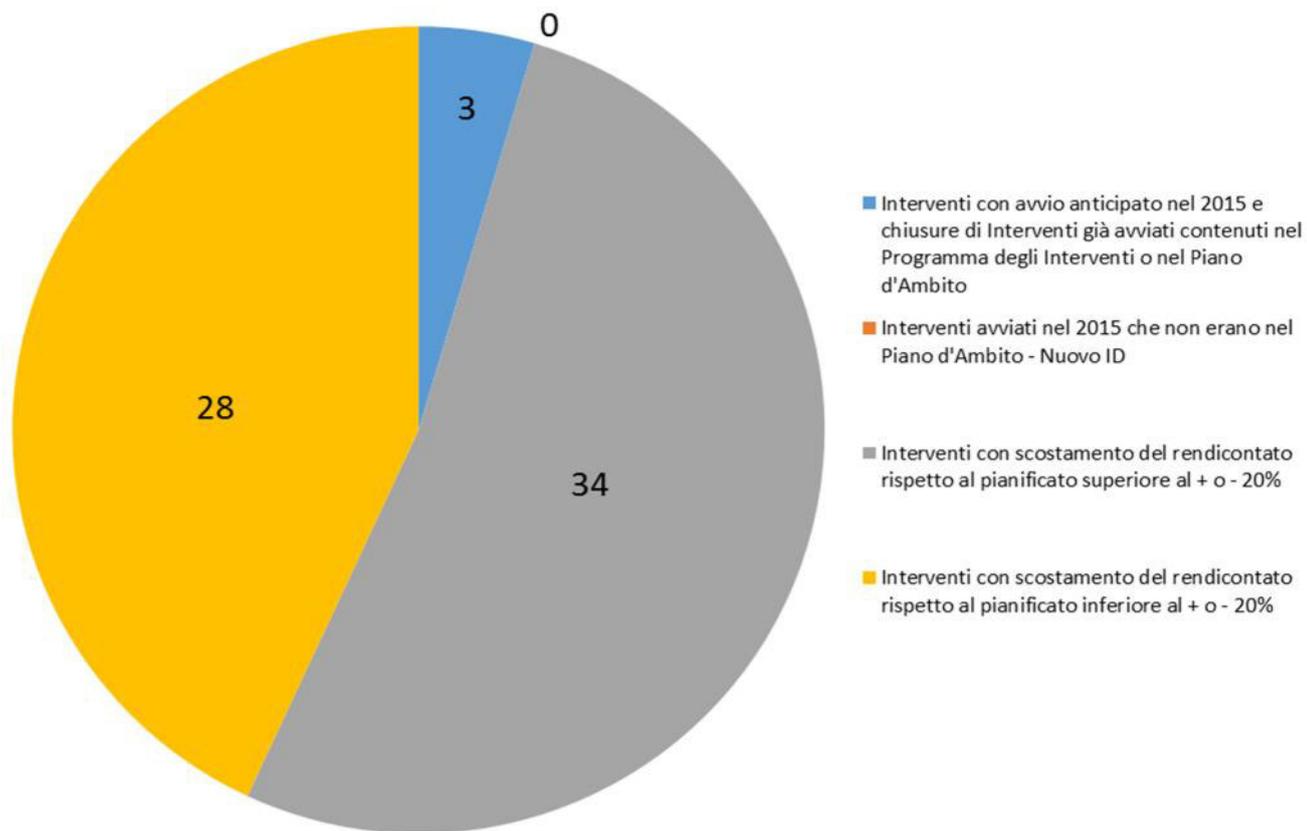


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2015 da Piano approvato
2014FEHA0010	DISM.IMP.CONSANDOLO-COLLETT.DEP.ARGENTA	FOGNATURA	Argenta	10.000
2014FEHA0023	COLL. FOG DI VIA GAZZINELLA A CASUMARO	FOGNATURA	Cento	1.000
2014FEHA0046	SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA AEROPORTO	FOGNATURA	Ferrara	7.000
2014FEHA0079	POTENZIAMENTO A VIGARANO PIEVE-ASSE3	ACQUEDOTTO	Vigarano Mainarda	3.000
			TOTALE	21.000

TAB.3 Interventi previsti nel 2015 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento		
2014FEHA0006	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI LONGASTRINO	DEPURAZIONE	Argenta;	Gestore		0		0						
2015FEHA0003	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZIONE BANDO	FOGNATURA	Argenta;	Gestore		10.000		10.000	4.450		4.450	-56%	RITARDI NELLA DEFINIZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE DA ADOTTARE DOVUTI A NECESSITA' DI CONDIVISIONE COL CONSORZIO DI BONIFICA	
2014FEHA0003	POTENZIAMENTO IN VIA ROSSINI-ASSE3	ACQUEDOTTO	Argenta;	Gestore		0		0						
2014FEHA0007	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI FILO	DEPURAZIONE	Argenta;	Gestore		0		0						
2015FEHA0002	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA S.MARIA CODIFIUME	FOGNATURA	Argenta;	Gestore		5.000		5.000	3.340		3.340	-33%	AVVIATA PROGETTAZIONE INTERVENTO COME DA PIANIFICAZIONE.	
2014FEHA0001	RIFAC. TRATTO RETE ARGENTA-FILO-MENATE 3	ACQUEDOTTO	Argenta;	Gestore		15.000		15.000	16.005		16.005	7%		
2014FEHA0010	DISM.IMP.CONсандоло- COLLETT.DEP.ARGENTA	FOGNATURA	Argenta;	Gestore		10.000		10.000				-100%	RIPROGRAMMAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE	
2014FEHA0002	BONIFICA VIA ANIME A SAN NICOL?-ASSE3	ACQUEDOTTO	Argenta;	Gestore		0		0						
2014FEHA0005	POT. ACQ FRAZIONE S.M. CODIFIUME - 1ø STR	ACQUEDOTTO	Argenta;	Gestore		0		0						

					STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				
ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014FEHA0012	NUOVI POZZI E INCREMENTO CONCESSIONE CENTRALE STELLATA	ACQUEDOTTO	Bondeno;	Gestore					6.639		6.639		ANTICIPATE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE
2014FEHA0022	COLL. FOG DI VIA ROSSINI AD ALBERONE	FOGNATURA	Cento;	Gestore		80.000		80.000	48.993		48.993	-39%	INTERVENTO AVVIATO NEL 2015, CONCLUSIONE LAVORI PREVISTA NEL 2016.
2014FEHA0021	COLLEGAMENTO DI RENO C. A NUOVO DEPURATORE DI CASUMARO	FOGNATURA	Cento;	Gestore		14.000		14.000	20.540		20.540	47%	ATTIVITA' 2015 IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE
2015FEHA0006	RISANAMENTO AMBIENTALE SCOLO CANALAZZO	FOGNATURA	Cento;	Gestore									
2014FEHA0018	SOLLEVAMENTO PIAZZALE BONZAGNI	FOGNATURA	Cento;	Gestore									
2014FEHA0023	COLL. FOG DI VIA GAZZINELLA A CASUMARO	FOGNATURA	Cento;	Gestore		1.000		1.000				-100%	NEL 2015 ERA PREVISTO UNICAMENTE L'AVVIO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. PROGETTAZIONE NEL 2016 CONFERMATA IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE
2014FEHA0015	REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE BUONACOMPRA	DEPURAZIONE	Cento;	Gestore		20.000		20.000	19.968		19.968	0%	
2014FEHA0016	SISTEMA CASUMARO (Amplimento del depuratore di Casumaro-nuovo impianto)	DEPURAZIONE	Cento;	Gestore		20.000		20.000	20.925		20.925	5%	
2014FEHA0017	SOLLEVAMENTO VIA XX SETTEMBRE	FOGNATURA	Cento;	Gestore		0		0					

					STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				
ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014FEHA0019	COLLETTAMENTO ALBERONE A DEPURATORE BUONACOMPRA	FOGNATURA	Cento;	Gestore		21.000		21.000	19.075		19.075	-9%	
2014FEHA0020	COLLETTAMENTO M. ALBERGATI-PILASTRELLO A BUONACOMPRA	FOGNATURA	Cento;	Gestore		11.000		11.000	4.508		4.508	-59%	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN CORSO IN COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE
2015FEHA0012	COLLEGAMENTO V.CIPRESSINA E PANIGALLI-DENORE	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore									
2015FEHA0009	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MONESTIROLO	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore									
2014FEHA0033	RINN.DN160 VIA PALMIRANO-FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore		3.000		3.000	451		451	-85%	AVVIATA PROGETTAZIONE INTERVENTO COME DA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0038	ELIMINAZIONE DEPURATORE DI FOCOMORTO E COLLEGAMENTI	DEPURAZIONE	Ferrara;	Gestore		3.000		3.000	2.637		2.637	-12%	
2014FEHA0032	MAGLIATURA RETE - VIA LADINO-VIA FONDO RENO	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore		12.000		12.000	12.430		12.430	4%	
2014FEHA0048	COLLEGAMENTO A POGGIO E ELIMINAZIONE IMP. DI MONTALBANO	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore		15.000		15.000	18.677		18.677	25%	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN CORSO IN COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE
2014FEHA0047	MANUT IMP DI SOLL IN VIA COMACCHIO (S6)	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore		27.000		27.000	26.558		26.558	-2%	

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014FEHA0024	MANUT.GIUNTI BACINILAGUNAGGIO E DRENAGGI	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore		20.000		20.000	22.215		22.215	11%	
2014FEHA0027	SUBURBANA - INTERFERENZE RETE IDRICA	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore		6.000		6.000	719		719	-88%	REVISIONE DEL PROGETTO DELLA SUB-URBANA DA PARTE DI FER.
2015FEHA0008	REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA VIA PENAVARA - SAN MARTINO	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore		20.000		20.000	24.167		24.167	21%	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN CORSO IN COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE
2014FEHA0043	COLLEGAMENTO BAURA A IMP.CONTRAPO'- ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore		0		0					
2014FEHA0028	DEMOLIZIONE PENSILE S.MARTINO, FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore		100.000		100.000	54.850		54.850	-45%	INTERVENTO CONCLUSO. MINORI ONERI IN FASE DI REALIZZAZIONE.
2014FEHA0088	POTENZIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO S10 VIA FABBRI-VIA EVA E ADAMO	FOGNATURA	Ferrara;	ACOSEA Impianti									
2014FEHA0050	ADEGUAMENTO SIST FOG IN VIA POLLINA	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore		60.000		60.000	66.891		66.891	11%	
2014FEHA0036	POTENZIAMENTO RETE ACQ. VIA ERCOLE DE ROBERTI	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore		65.000		65.000	60.028		60.028	-8%	
2014FEHA0053	RINNOVO RETE VIA VOLANO	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore		0		0					

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento		
2014FEHA0051	SUBURBANA-POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIA AEROPORTO	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore		0			0					
2015FEHA0011	NUOVA ADDUTTRICE SUD - FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore										
2014FEHA0054	POT. RETE FOGN. VIA ERCOLE DE ROBERTI	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore		80.000			80.000	91.956		91.956	15%	
2015FEHA0010	DISCONNESSIONE COLLETTORE FOGNARIO V. BOLOGNA E SCOLO MAMBRO	FOGNATURA	Ferrara;	ACOSEA Impianti		10.000			10.000	10.109		10.109	1%	
2014FEHA0025	RIFACIMENTO RETE IDRICA VIA LAVEZZOLA	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore		0			0					
2014FEHA0037	ADEG E POTENZ DEP DI GAIBANELLA	DEPURAZIONE	Ferrara;	Gestore		0	143.000		-143.000	0	143.111		-143.111	0%
2014FEHA0034	RINN.RETE DN400 E DN250 VVIVALDI FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore		60.000			60.000	59.002		59.002	-2%	
2014FEHA0026	IMPLEMENTAZIONE AUTOMAZIONE PONTELAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara;	Gestore		95.000			95.000	92.039		92.039	-3%	
2014FEHA0052	COLLEGAMENTO ZONA STAZIONE-CONA	FOGNATURA	Ferrara;	Gestore		6.000			6.000	9.442		9.442	57%	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN CORSO IN COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2015FEHA0015	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.FOGNARI-FE-ATO6	FOGNATURA	Opere Pluricomuna	Gestore		42.000		42.000	53.408		53.408	27%	CONTO CUMULATIVO - REALIZZATI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU TELECONTROLLO SOLLEVAMENTI FOGNARI, ORIGINARIAMENTE PREVISTI SU DEPURATORI. COMPENSAZIONE SU ID 2015FEHA0014.
2015FEHA0014	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.DEPURAZIONE-FE-ATO6	DEPURAZIONE	Opere Pluricomuna	Gestore		27.000		27.000	15.762		15.762	-42%	CONTO CUMULATIVO - REALIZZATI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU TELECONTROLLO SOLLEVAMENTI FOGNARI, ORIGINARIAMENTE PREVISTI SU DEPURATORI. COMPENSAZIONE SU ID 2015FEHA0015.
2014FEHA0070	MODELLAZIONE FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomuna	Gestore									
2015FEHA0016	RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI FE-ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomuna	Gestore									
2014FEHA0069	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomuna	Gestore		50.000		50.000	38.444		38.444	-23%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0086	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PRONTO INTERVENTO	FOGNATURA	Opere Pluricomuna	Gestore		250.000		250.000	362.911		362.911	45%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0064	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomuna	Gestore		10.000		10.000	8.133		8.133	-19%	
2014FEHA0067	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALLACCI FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomuna	Gestore		400.000		400.000	365.297		365.297	-9%	
2014FEHA0065	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Opere Pluricomuna	Gestore		658.000		658.000	574.903		574.903	-13%	

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014FEHA0082	SOSTITUZIONE CONTATORI PARI CALIBRO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomuna	Gestore		105.000		105.000	101.310		101.310	-4%	
2014FEHA0059	RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomuna	Gestore		170.000		170.000	166.509		166.509	-2%	
2014FEHA0061	RINNOVO RETI PROGRAMMATO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomuna	Gestore		1.098.000		1.098.000	1.042.951		1.042.951	-5%	
2014FEHA0057	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PRONTO INTERVENTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomuna	Gestore		1.105.000		1.105.000	1.008.612		1.008.612	-9%	
2014FEHA0062	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomuna	Gestore		65.000		65.000	31.494		31.494	-52%	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITÀ. INTERVENTI IN CORSO COME DA PROGRAMMAZIONE.
2014FEHA0068	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomuna	Gestore		94.000		94.000	135.056		135.056	44%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE. COMPENSAZIONE ID 2014FEHA0066
2014FEHA0058	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomuna	Gestore		720.000		720.000	762.799		762.799	6%	
2014FEHA0066	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Opere Pluricomuna	Gestore		145.000		145.000	87.361		87.361	-40%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE. COMPENSAZIONE ID 2014FEHA0068
2014FEHA0063	VERIFICHE SISMICHE IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomuna	Gestore		120.000		120.000	94.038		94.038	-22%	INTERVENTI IN CORSO E IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE.

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014FEHA0071	RILIEVO RETI FOGNARIE	FOGNATURA	Opere Pluricomuna	Gestore		20.000		20.000	11.899		11.899	-41%	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. INTERVENTI IN CORSO COME DA PROGRAMMAZIONE.
2014FEHA0087	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomuna	Gestore		50.000		50.000	39.760		39.760	-20%	
2014FEHA0060	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomuna	Gestore		60.000		60.000	64.075		64.075	7%	
2014FEHA0072	POTENZIAMENTO IN VIA PONTE ROSSO-ASSE3	ACQUEDOTTO	Poggio Renatico;	Gestore		0		0					
2014FEHA0073	COLLEGAMENTO SCARICHI NON DEPURATI DI QUARTIERE	FOGNATURA	Portomaggiore;	Gestore		0		0					
2014FEHA0074	SCARICHI NON DEPURATI DI RUNCO E COLLEGAMENTO A GAMBU	FOGNATURA	Portomaggiore;	Gestore		0		0					
2015FEHA0017	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA VIA MAZZINI-PONTE TUBO CER	FOGNATURA	Sant'Agostino;	Gestore					3.187		3.187		NECESSITA' DI RILIEVI STRAORDINARI NON PIANIFICATI SUL SISTEMA FOGNARIO
2014FEHA0075	RIN.RETE IDRICA V.MATTEOTTI-S.AGOSTINO	ACQUEDOTTO	Sant'Agostino;	Gestore		0		0					
2014FEHA0076	COLLEGAMENTO VIA MONTECASSINO E LIMITROFI A DOSSO	FOGNATURA	Sant'Agostino;	Gestore		37.000		37.000	28.007		28.007	-24%	ATTIVITÀ IN CORSO, COERENTEMENTE CON LA PIANIFICAZIONE

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014FEHA0084	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO SAN CARLO	FOGNATURA	Sant'Agostino;	Gestore		5.000		5.000	4.905		4.905	-2%	
2014FEHA0089	POTENZIAMENTO RETE IDRICA S.AGOSTINO	ACQUEDOTTO	Sant'Agostino;	ACOSEA Impianti									
2014FEHA0080	COLLETTORE VIGARANO PIEVE AL DEPURATORE FERRARA I STRALCIO	FOGNATURA	Vigarano Mainarda	Gestore		250.000		250.000	258.117		258.117	3%	
2014FEHA0081	COLLETTORE VIGARANO PIEVE AL DEPURATORE FERRARA II STRALCIO	FOGNATURA	Vigarano Mainarda	Gestore		25.000		25.000	30.425		30.425	22%	ATTIVITA' 2015 IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE
2014FEHA0077	ESTENSIONE IN VIA MANTOVA-ASSE3	ACQUEDOTTO	Vigarano Mainarda	Gestore		0		0					
2014FEHA0079	POTENZIAMENTO A VIGARANO PIEVE-ASSE3	ACQUEDOTTO	Vigarano Mainarda	Gestore		3.000		3.000				-100%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2014. NESSUN ULTERIORE ONERE CONTABILE NEL 2015.
2014FEHA0078	POTENZIAMENTO RETE VIA RONDONA-ASSE3	ACQUEDOTTO	Vigarano Mainarda	Gestore		0		0					
2015FEHA0018	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO GUALDO	FOGNATURA	Voghiera;	Gestore		6.000		6.000	4.932		4.932	-18%	
						7.162.000	143.000	7.019.000	6.891.553	143.111	6.748.442		

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 5 del 14 giugno 2017

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato – Approvazione della revisione straordinaria del programma degli interventi 2016-2019 per le annualità 2017-2018-2019 del gestore HERA S.p.A e proposta di integrazione del Piano di Ambito.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 14 giugno 2017



Approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Locale di Ferrara

F.to Caterina Ferri

Il segretario verbalizzante

F.to Pier Luigi Maschietto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 28 luglio 2017
