

CLPC/2020/1 del 30 aprile 2020

CONSIGLIO LOCALE di PIACENZA

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Approvazione Consuntivo 2018.
Programma Operativo Interventi 2015 - 2019**

IL COORDINATORE F.to
Dott. Raffaele Veneziani

CLPC/2020/1

CONSIGLIO LOCALE di PIACENZA

L'anno **2020** il giorno trenta del mese di aprile alle ore 10,00 si è riunito il Consiglio Locale di Piacenza convocato con lettera PG/AT/2020/3242 del 22 aprile 2020.

La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle “Linee Guida temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza dell'emergenza epidemiologica COVID 19”, approvate dal Consiglio di Ambito con deliberazione n.13 del 14/04/2020.

La seduta è integralmente sottoposta a registrazione conservata agli atti

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
AGAZZANO			NO	0,7848
ALSENO	Zucchi Davide	Sindaco	SI'	1,5682
ALTA VAL TIDONE	Albertini Franco	Sindaco	SI'	1,1488
BESENZONE			NO	0,4734
BETTOLA	Negri Paolo	Sindaco	SI'	1,0491
BOBBIO	Pasquali Roberto	Sindaco	SI'	1,2518
BORGONOVO			NO	2,3674
CADEO	Genesi Alessandro	Assessore	SI'	1,9180
CALENDASCO	Zangrandi Filippo	Sindaco	SI'	0,8923
CAORSO			NO	1,5702
CARPANETO	Arfani Andrea	Sindaco	SI'	2,3406
CASTELL'ARQUATO			NO	1,5367
CASTEL S. GIOVANNI	Fontana Lucia	Sindaco	SI'	4,0744
CASTELVETRO	Luca Quintavalla	Sindaco	SI'	1,7848
CERIGNALE			NO	0,2398
COLI	Silenzi Isabella	Assessore	SI'	0,4674
CORTEBRUGNATELLA	Guarnieri Mauro	Sindaco	SI'	0,3866
CORTEMAGGIORE	Zilli Maria Rosa	Assessore	SI'	1,4638

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
FARINI			NO	0,6097
FERRIERE	Opizzi Carlotta	Assessore	SI'	0,6012
FIORENZUOLA D'ARDA	Gandolfi Romeo	Sindaco	SI'	4,4321
GAZZOLA	Maserati Simone	Sindaco	SI'	0,7646
GOSSOLENGO	Balestrieri Andrea	Sindaco	SI'	1,7413
GRAGNANO	Calza Patrizia	Sindaco	SI'	1,4439
GROPPARELLO			NO	0,8570
LUGAGNANO			NO	1,3781
MONTICELLI D'ONG.	Distante Gimmi	Sindaco	SI'	1,7404
MORFASSO	Calestani Paolo	Sindaco	SI'	0,5101
OTTONE			NO	0,3579
PIACENZA	Baio Elena	Vice Sindaco	SI'	28,7436
PIANELLO			NO	0,8474
PIOZZANO	Burgazzoli Lorenzo	Sindaco	SI'	0,3784
PODENZANO	Piva Alessandro	Sindaco	SI'	2,7542
PONTEDELL'OLIO	Chiesa Alessandro	Sindaco	SI'	1,6004
PONTENURE			NO	2,0094
RIVERGARO	Mezzadri Marina	Assessore	SI'	2,1460
ROTOFRENO	Veneziani Raffaele	Sindaco	SI'	3,5086
S.GIORGIO P.NO			NO	1,8514
S. PIETRO IN CERRO	Boselli Stefano	Sindaco	SI'	0,4592
SARMATO	Ferrari Claudia	Sindaco	SI'	1,0264
TRAVO	Albasi Ludovico	Sindaco	SI'	0,7628
VERNASCA	Sidoli Giuseppe	Sindaco	SI'	0,8334
VIGOLZONE	Argellati Gianluca	Sindaco	SI'	1,4103
VILLANOVA	Emani Emanuele	Vice Sindaco	SI'	0,7466
ZERBA	Borrè Claudia	Vice Sindaco	SI'	0,2218

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ZIANO			NO	0,9456
PROVINCIA di PIACENZA	Albertini Franco	Consigliere	SI'	10,0000

Presenti n. 33 quote 84,17 Assenti n. 14 quote 15,83

Riconosciuta la validità della seduta Raffaele Veneziani, in qualità di Coordinatore, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Approvazione Consuntivo 2018. Programma Operativo Interventi 2015 - 2019

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'Ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 1 del 21 marzo 2016 del Consiglio Locale di Piacenza è stato approvato l'Aggiornamento del Programma degli Interventi per gli anni 2015-2019 e la Proposta di integrazione del Piano d'Ambito e di variazione del Piano economico-finanziario;
- con deliberazione n. 32 del 26 aprile 2016 del Consiglio d'Ambito è stata approvata l'Integrazione del Piano d'Ambito di Piacenza conseguentemente all'approvazione del consuntivo degli interventi 2014 e all'approvazione del programma degli interventi 2015-2019 di cui allo schema regolatorio AEEGSII;
- con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 3 del 15 marzo 2018 per il Gestore IRETI S.p.A. è stata approvata la revisione straordinaria annualità 2018-2019 Programma Operativo Interventi 2015-2019 ed il nuovo Programma Operativo Interventi 2020-2022 con conseguente Proposta di aggiornamento del Piano di Ambito;

- con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 26 del 19 aprile 2018 sono state approvate le Modifiche al Piano degli Interventi del Piano di Ambito del territorio di Piacenza a seguito della deliberazione del Consiglio Locale n. 3 del 15/03/2018;
- con deliberazione n.51 del Consiglio d'ambito 28 giugno 2018 è stato approvato l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria vigente (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, per i bacini tariffari di Parma, Piacenza e Reggio Emilia gestiti da IREN S.p.A. e dalla partecipata IRETI S.p.A;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 inoltre dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore Ireti S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2018 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata ai Comuni interessati in allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale;

rilevato che i dati presentati relativi all'annualità 2018 sono stati analizzati e sintetizzati nell'Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:

- interventi non avviati;
- interventi anticipati/conclusi;
- interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 2015 - 2019 vigente - annualità 2018, autorizzati con nulla osta ai sensi della CAMB 75/2017;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al +/- 20%;

rilevato inoltre che:

- gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore, per quanto riguarda il consuntivo netto, mentre leggermente inferiore per quanto riguarda l'importo lordo a fronte dei minori contributi incassati rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 approvato per l'annualità 2018;
- per n.19 interventi la mancata esecuzione è legata all'adeguamento degli impianti ai valori limite del Cromo esavalente, in quanto in attesa di revisione dei limiti di potabilità da parte del Ministero;
- è stata effettuata un'analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore del +/- 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva.

ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2018 come indicato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto,

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata, a voti resi nelle forme di legge, all'unanimità, con voti a favore n. 33 (quote 84,17), contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2018 per il gestore Ireti S.p.A. per il bacino tariffario di Piacenza come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2018
Gestore: IRETI S.p.A. (PC)**

30 aprile 2020

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2018

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2018, del Programma Operativo Interventi 2015-2019 del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Piacenza n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera n. 3 del 15 marzo 2018 e Delibera del Consiglio d'Ambito n.51 del 28 giugno 2018, che il gestore IRETI S.p.A. ha presentato tramite il software ARSI.

PIANIFICATO 2018		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2018	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 18.812.713	- € 80.949	€ 18.731.764	Importo Lordo Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 1.999.826	-€ 1.164.681	€ 835.145	Importo Contributo Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 16.812.887	€ 1.083.732	€ 17.896.619	Importo Netto Consuntivo [A]-[B]

Tab.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IRETI S.p.A. abbia effettuato maggiori investimenti netti rispetto alla pianificazione approvata, precisamente pari a + €. 1.083.732 a fronte dei minori contributi incassati pari a - € 1.164.681.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

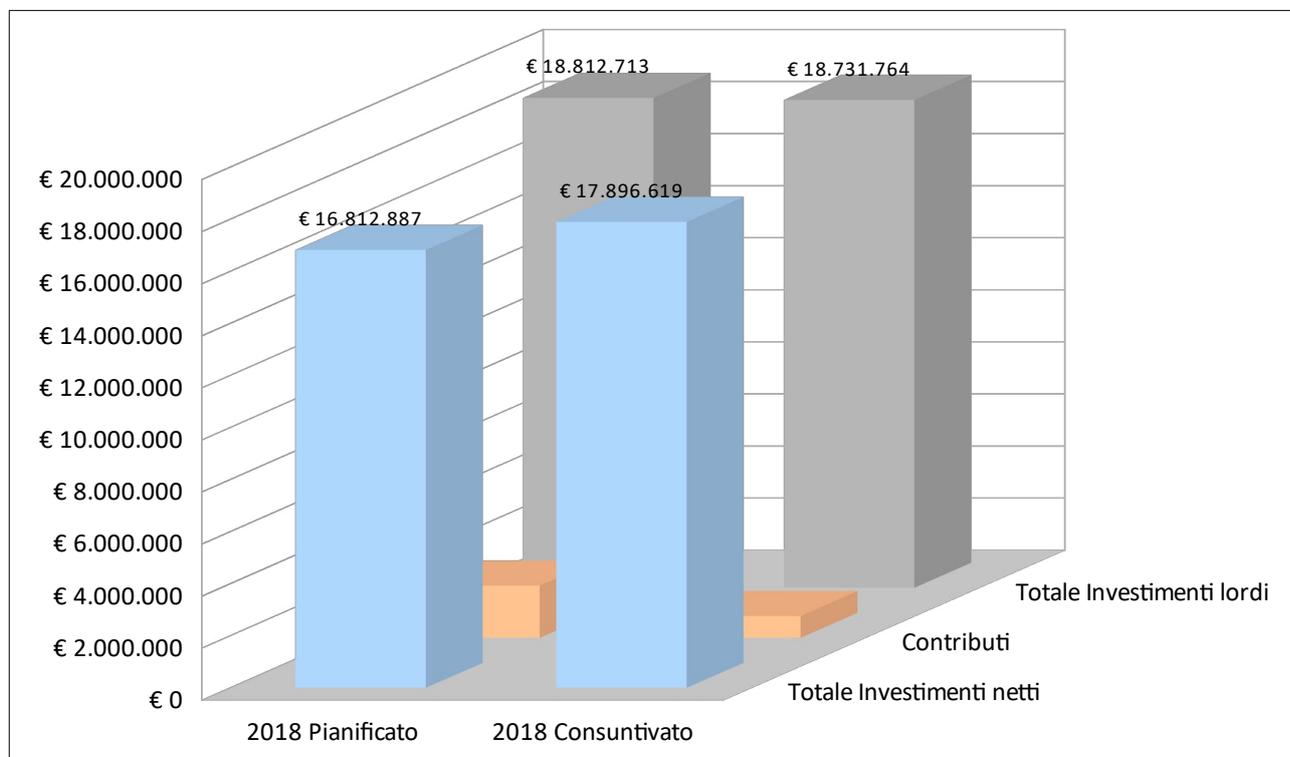


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2018 riferiti ai servizi di ACQUEDOTTO, DEPURAZIONE,FOGNATURA:

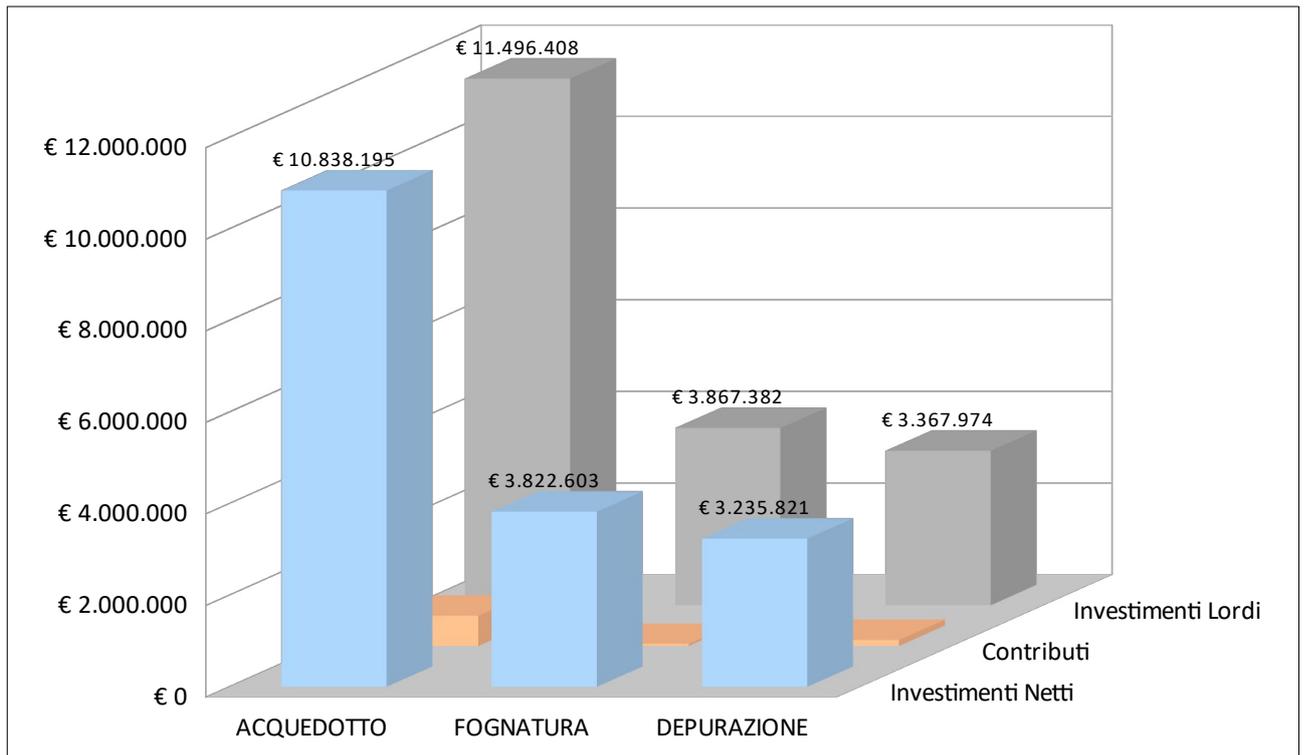


Fig.2 – Istogramma di confronto investimenti realizzati nel 2018 , suddivisi per Servizio

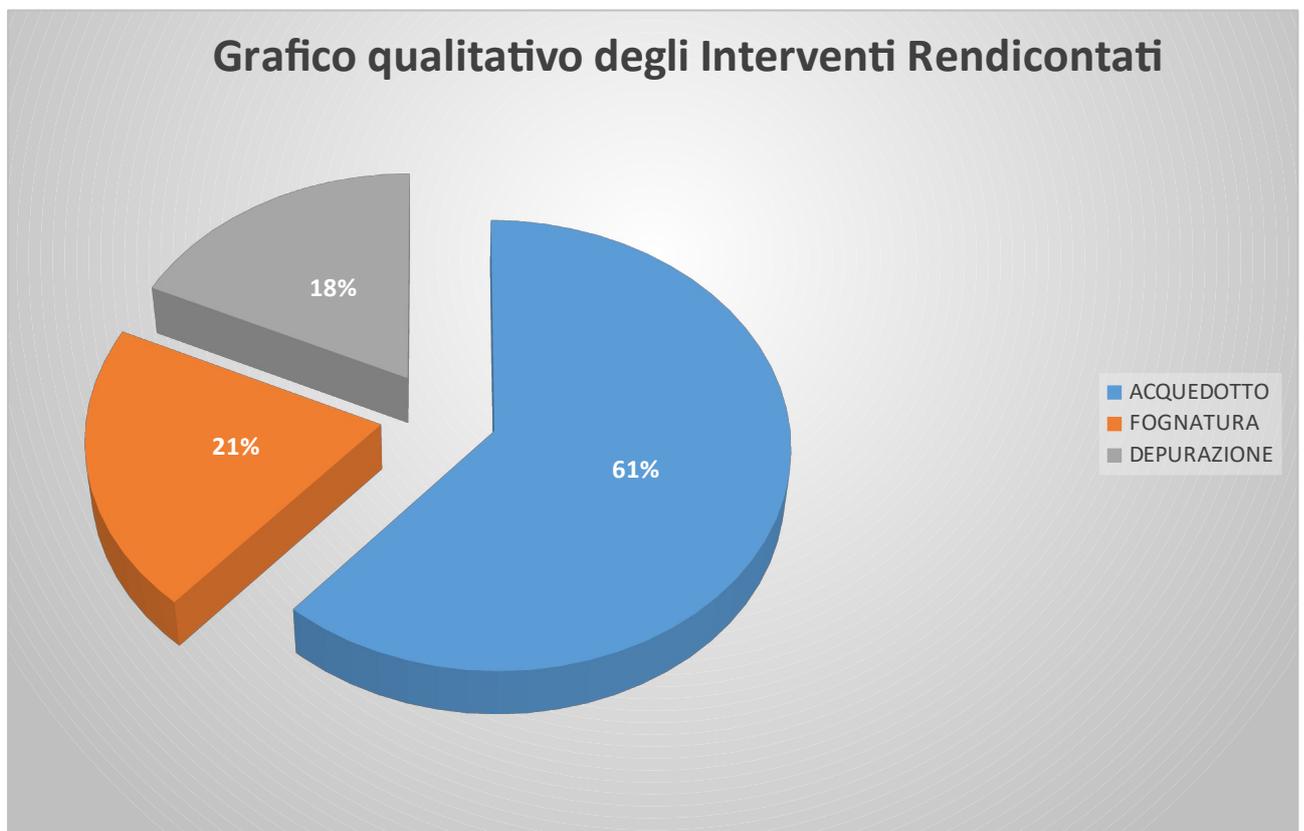


Fig.3 – Illustrazione qualitativa degli interventi realizzati nell'annualità 2018, suddivisi per servizio

ULTERIORI INTERVENTI EMERGENZA IDRICA FINANZIATI DALLA PROTEZIONE CIVILE

INCREMENTO CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2018

Il gestore ha inoltre avviato nel 2017 e terminato nel 2018 una serie di interventi nei territori maggiormente colpiti dalla crisi idrica, finanziati dalla Protezione Civile - atto DPGR n. 158/2017 e DPGR 178/2017.

Sono stati rilasciati 28 visti, per interventi ultimati, per un importo di circa **€5.049.065**, che si aggiungono in parte agli investimenti realizzati nelle annualità 2017 e 2018, (parte è già stato rendicontato, annualità 2017, in ARSI ID:2018PCIE0258 - €1.100.670). Il contributo ammesso a finanziamento per tali interventi è circa **€2.799.701**, l'eccedenza cadrà in tariffa.

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o meno e il relativo provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2018: 126

Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2018: 106

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2018	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2018	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	50	€ 0	€ 3.360.713	NO	Vedi TAB. LLE 3	
Interventi con avvio anticipato nel 2018 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	30	€ 1.289.465	€ 0	NO	2014PCIE0009 2014PCIE0012 2014PCIE0015 2014PCIE0018 2014PCIE0024 2014PCIE0037 2014PCIE0046 2014PCIE0056 2014PCIE0057 2014PCIE0059 2015PCIE0111 2015PCIE0128 2016PCIE0157 2016PCIE0163 2016PCIE0164 2016PCIE0170 2016PCIE0189 2016PCIE0194 2016PCIE0195 2016PCIE0196 2017PCIE0218 2017PCIE0220 2017PCIE0221 2017PCIE0222 2017PCIE0223 2017PCIE0224 2018PCIE0277 2018PCIE0280 2018PCIE0282 2018PCIE0286	
Interventi avviati nel 2018 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	2	€ 77.750	€ 200.000	NO	<u>2018PCIE0304*</u> <u>2018PCIE0305*</u> NUOVI TITOLI autorizzati con NULLA OSTA ai sensi della CAMB 75/2017	

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2018	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2018	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	69	€ 15.492.276	€ 13.532.000	NO	2014PCIE0002 2014PCIE0004 2014PCIE0005 2014PCIE0007 2014PCIE0008 2014PCIE0011 2014PCIE0013 2014PCIE0014 2014PCIE0016 2014PCIE0019 2014PCIE0020 2014PCIE0021 2014PCIE0030 2014PCIE0032 2014PCIE0033 2014PCIE0038 2014PCIE0039 2014PCIE0040 2014PCIE0041 2014PCIE0042 2014PCIE0048 2014PCIE0051 2014PCIE0053 2014PCIE0060 2014PCIE0063 2014PCIE0071 2015PCIE0075 2015PCIE0084 2015PCIE0087 2015PCIE0088 2015PCIE0090 2015PCIE0091 2015PCIE0092 2015PCIE0100 2015PCIE0101 2015PCIE0105 2015PCIE0107 2015PCIE0109 2015PCIE0117 2015PCIE0118 2015PCIE0119 2015PCIE0120 2015PCIE0124 2015PCIE0130 2015PCIE0136 2015PCIE0139 2016PCIE0154 2016PCIE0155 2016PCIE0165 2016PCIE0168 2016PCIE0176 2016PCIE0177 2016PCIE0186 2016PCIE0188 2017PCIE0197 2017PCIE0210 2017PCIE0212 2017PCIE0213 2017PCIE0214 2018PCIE0027A 2018PCIE0027B 2018PCIE0027C 2018PCIE0227 2018PCIE0228 2018PCIE0259 2018PCIE0261 2018PCIE0271 2018PCIE0281 2018PCIE0294	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	5	€ 1.872.273	€ 1.720.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

Tab.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella sopra riportata risulta che per l'annualità 2018, n.50 interventi, che erano stati programmati, hanno avuto uno scostamento tra pianificato e rendicontato pari al -100% (per l'elenco si vedano le Tabelle 3 sotto riportate), e per i quali la giustificazione è risultata esaustiva (Allegato 1). Il Gestore ha avviato anticipatamente oppure chiuso (code di Intervento) rispetto a quanto programmato n.30 interventi, ha avviato n.2 interventi che non erano nel Piano d'ambito (Nuovo ID), autorizzati tramite Nulla osta ai sensi della CAMB 75/2017. Per n.69 interventi lo scostamento rispetto alle previsioni di spesa è risultato superiore al +/- 20% e per i quali la giustificazione fornita è risultata esaustiva. Per n.5 interventi lo scostamento è inferiore al +/- 20% e quindi non passibile di giustificazione.

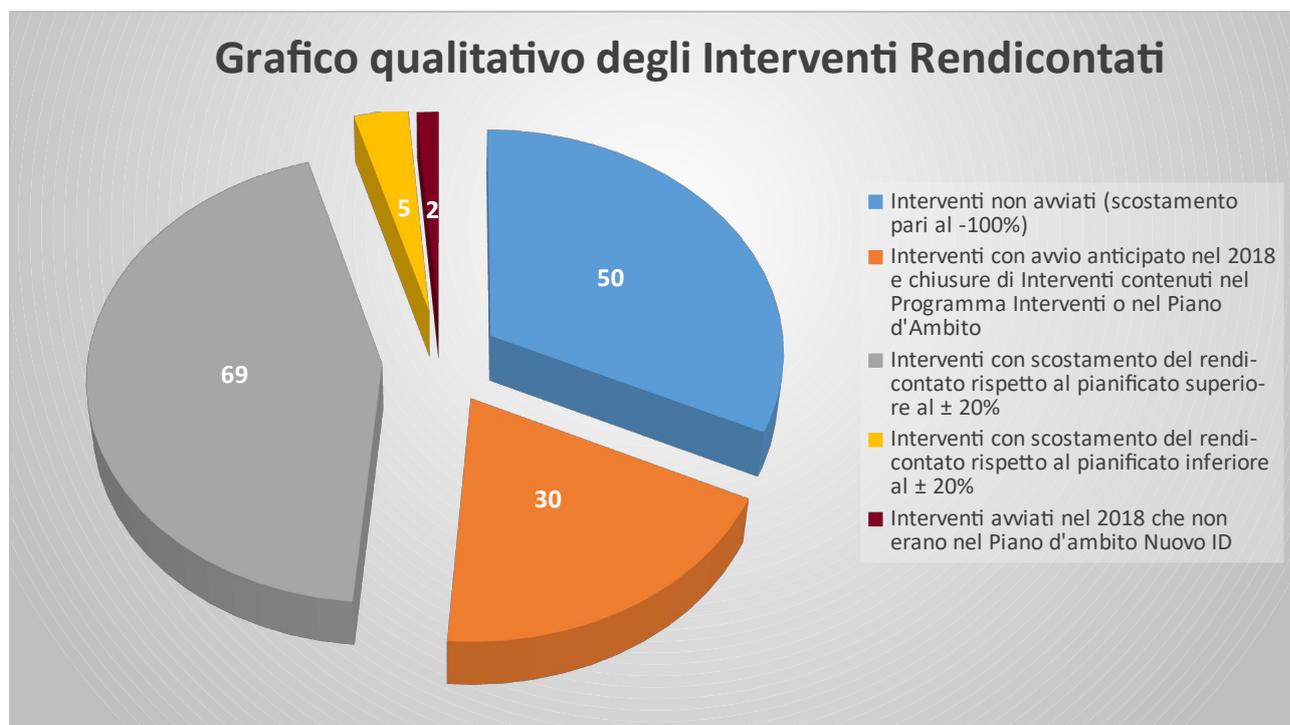


Fig.4 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

Entrando più nel dettaglio dei n.50 interventi per i quali lo scostamento è risultato pari al -100%, si possono esplicitare come segue:

- n.5 interventi, il ritardo nella realizzazione è legata all'attesa di autorizzazioni

Comune	ID ATERSIR	Descrizione Intervento	Importo Progettuale	Investimenti Lordi 2018
Farini	2016PCIE0162	Rifacimento tratti di fognatura nel capoluogo di Farini in fregio all'alveo del torrente Nure	223.000	140.000
Travo	2016PCIE0175	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Travo	108.000	80.000
Grandi Opere	2016PCIE0178	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure nel tratto ponte Cantoniera - Ponte Nano	1.145.000	567.500
Coli	2017PCIE0203	* Ripristino danni alluvione depuratore Pradella	50.000	50.000
Bobbio	2017PCIE0207	* Ripristino danni alluvione depuratore Piancasale	100.000	100.000

TAB 3.a - Interventi previsti nel 2018 e non realizzati in attesa di autorizzazioni (scostamento pari a -100%)

- n.1 intervento è stato anticipato nell'annualità 2017

Comune	ID ATERSIR	Descrizione Intervento	Importo Progettuale	Investimenti Lordi 2018
Castel San Giovanni	2015PCIE0106	Rifacimento acquedotto e fognatura via Bixio, Mozza, Portone e Zilli	335.000	10.000

TAB 3.b - Intervento previsto nel 2018, anticipato nel 2017 (scostamento pari a -100%)

- n.19 interventi la mancata esecuzione è legata all'adeguamento degli impianti ai valori limite del Cromo esavalente, in quanto in attesa di revisione dei limiti di potabilità da parte del Ministero

Comune	ID ATERSIR	Descrizione Intervento	Importo Progettuale	Investimenti Lordi 2018
Bobbio	2018PCIE0231	Acq Bobbio - Impianto di trattamento Serbatoio Piancasale	170.000	8.500
Bobbio	2018PCIE0230	Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di trattamento Serbatoio Caione	190.000	9.500
Cortebrugnatella	2018PCIE0232	Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso località Roncoli	215.000	10.750
Cortebrugnatella	2018PCIE0233	Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso località Fossoli	135.000	6.750
Cerignale	2018PCIE0234	Acq Cerignale - Impianto di trattamento Serbatoio Cerignale 18	210.000	10.500
Cerignale	2018PCIE0235	Acq Cerignale - Impianto di trattamento Serbatoio Cerignale 14 Le Piane	165.000	8.250
Cerignale	2018PCIE0236	Acq Cerignale-Carissasca - Impianto di trattamento Serbatoio Camminata	215.000	10.750
Coli	2018PCIE0237	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio 16 Filippazzi	210.000	10.500
Coli	2018PCIE0239	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Coste delle Guardie	175.000	8.750
Coli	2018PCIE0238	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Forno di Sopra	150.000	7.500
Farini	2018PCIE0241	Acq Farini-Ca' Gregorio-Boli - Impianto di trattamento Serbatoio Colletta	160.000	8.000
Ferriere	2018PCIE0242	Acq Val Nure - Impianto di trattamento Serbatoio Toni	925.000	46.250
Ferriere	2018PCIE0243	Acq Ferriere-Canafurone - Impianto di trattamento Serbatoio Castel Canafurone	165.000	8.250
Ferriere	2018PCIE0244	Acq Ferriere-Rocconi - Impianto di trattamento Serbatoio Nuovo Carbonaie	215.000	10.750
Ferriere	2018PCIE0245	Acq Ferriere - Impianto di trattamento Serbatoio Bardogna di Sopra	175.000	8.750
Farini	2018PCIE0254	Acq Farini-Groppallo - Impianto di trattamento Serbatoio Chiarabini o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione	145.000	7.250
Farini	2018PCIE0257	Acq Farini-Groppallo - Impianto di trattamento Serbatoio Costiolo o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione	165.000	8.250
Ferriere	2018PCIE0247	Acq Ferriere-Sarmadasco - Impianto di trattamento Serbatoio Sarmadasco	210.000	10.500
Coli	2018PCIE0252	Acq Coli-Gavi - Impianto di trattamento Serbatoio Gavi o alimentazione da fonti alternative tramite realizzazione di opere di adduzione	160.000	8.000

TAB 3.c - Interventi adeguamento Cromo esavalente, non realizzati (scostamento pari a -100%)

- n.1 intervento è stato posticipato alle annualità successive

Comune	ID ATERSIR	Descrizione Intervento	Importo Progettuale	Investimenti Lordi 2018
Bettola	2016PCIE0152	Acquedotto zona Generesso 2° stralcio: studio di fattibilità	10.000	10.000

TAB 3.d – Intervento previsto nel 2018, posticipato annualità successive (scostamento pari a -100%)

- n.14 interventi per i quali i i cui costi sono confluiti in altri codici Arsi

Comune	ID ATERSIR	Descrizione Intervento	Importo Progettuale	Investimenti Lordi 2018
Podenzano	2015PCIE0127	Studio sistemazione criticità fognarie San Polo e Turro	10.000	10.000
Bettola	2017PCIE0202	* Rifacimento camera di riduzione pressione a Bettola	30.000	30.000
Bobbio	2018PCIE0229	Acq Bobbio - Impianto di trattamento Serbatoio Arelli	355.000	17.750
Coli	2018PCIE0240	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Pellegrini (da realizzare)	175.000	8.750
Morfasso	2018PCIE0246	Acq Morfasso - Impianto di trattamento Serbatoio Case Negri	190.000	9.500
Bobbio	2018PCIE0248	Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di trattamento Serbatoio Mezzano o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione	145.000	7.250
Bobbio	2018PCIE0249	Acq Bobbio-Cassolo-Cavarelli - Impianto di trattamento Serbatoio Cassolo o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione	185.000	9.250
Bobbio	2018PCIE0250	Acq Bobbio-Cassolo-Cavarelli - Impianto di trattamento Serbatoio Cavarelli-Bertuzzi o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione	185.000	9.250
Coli	2018PCIE0251	Acq Coli-Perino- Impianto di trattamento Serbatoio Case Trebbia o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione	135.000	6.750
Farini	2018PCIE0253	Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Pastori o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione	145.000	7.250
Ferriere	2018PCIE0255	Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Montalto o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione	145.000	7.250
Coli	2018PCIE0256	Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Grapazuolo o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione	185.000	9.250
Opere Pluricomunali	2018PCIE0292	CRISI IDRICA: studio per ricerca nuove fonti di approvvigionamento, interconnessioni sorgenti/pozzi	300.000	50.000
Opere Pluricomunali	2018PCIE0306	Nuovi allacci		1.139.213

TAB 3.e - Interventi previsti nel 2018 i cui costi sono confluiti in altri codici ARSI (scostamento pari a -100%)

- n.2 interventi, in ritardo di esecuzione per i quali è stata avviata la progettazione preliminare

Comune	ID ATERSIR	Descrizione Intervento	Importo Progettuale	Investimenti Lordi 2018
Nibbiano, Alta Val Tidone	2018PCIE0260	2° stralcio - Interconnessione acquedotto Pianello con Trevozzo di Nibbiano (nuova tubazione definitiva per collegamento degli acquedotti)	550.000	250.000
Pianello Val Tidone	2018PCIE0262	2° stralcio - Interconnessione acquedotto Intercomunale Castel San Giovanni-Sarmato-Borgonovo-Ziano con l'acquedotto di Pianello (nuova tubazione definitiva per collegamento degli acquedotti)	1.300.000	300.000

TAB 3.f - Interventi previsti nel 2018 e non realizzati (scostamento pari a -100%)

- n.8 interventi per i quali è in corso un approfondimento e verifiche progettuali ai fini della realizzazione dell'intervento stesso

Comune	ID ATERSIR	Descrizione Intervento	Importo Progettuale	Investimenti Lordi 2018
Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Rottofreno, Sarmato, Grandi opere, Calendasco	2015PCIE0085	Acquedotto intercomunale Val Tidone, 2° Stralcio: collegamento CALENDASCO-SARMATO-CASTEL SAN GIOVANNI-BORGONOVO-collegamento ROTTOFRENO- Cattagnina	900.000	10.000
Bobbio	2015PCIE0097	Sistemazione adduttrice da sorgente Arelli - studio preliminare	10.000	10.000
Castell'Arquato	2015PCIE0103	Sistemazione rete fognaria via Marconi	50.000	50.000
Ottone	2015PCIE0125	Rifacimento Fosse Imhoff loc. Fabbrica e Bertassi (frane)	50.000	25.000
Bettola	2016PCIE0158	Interventi straordinari sul pozzo Bussini	245.000	199.000
Bettola	2016PCIE0182	Acquisizione Acquedotto in loc. Olmo - Studio di fattibilità	10.000	10.000
Bettola	2016PCIE0183	Nuova rete fognaria in loc. Recesio - Studio di fattibilità	10.000	10.000
Rottofreno	2016PCIE0193	Collettamento scarichi zona produttiva di Via Piave a Rottofreno - Studio di fattibilità.	10.000	10.000

TAB 3.g - Interventi previsti nel 2018 e non realizzati (scostamento pari a -100%)

Facendo un'analisi riferita alla qualità tecnica del servizio (RQTI), risulta come rispetto al totale degli investimenti realizzati nell'annualità 2018: il 18% ha riguardato interventi riferiti al Macroindicatore **M1** - Perdite idriche; il 32% al Macroindicatore **M2** - Interruzioni del servizio; il 10% al Macroindicatore **M3** - Qualità dell'acqua erogata; il 21% al Macroindicatore **M4a** - Adeguatezza del sistema fognario; il 3% al Macroindicatore **M5** - Smaltimento fanghi in discarica e il 16% al Macroindicatore **M6** - Qualità dell'acqua depurata.

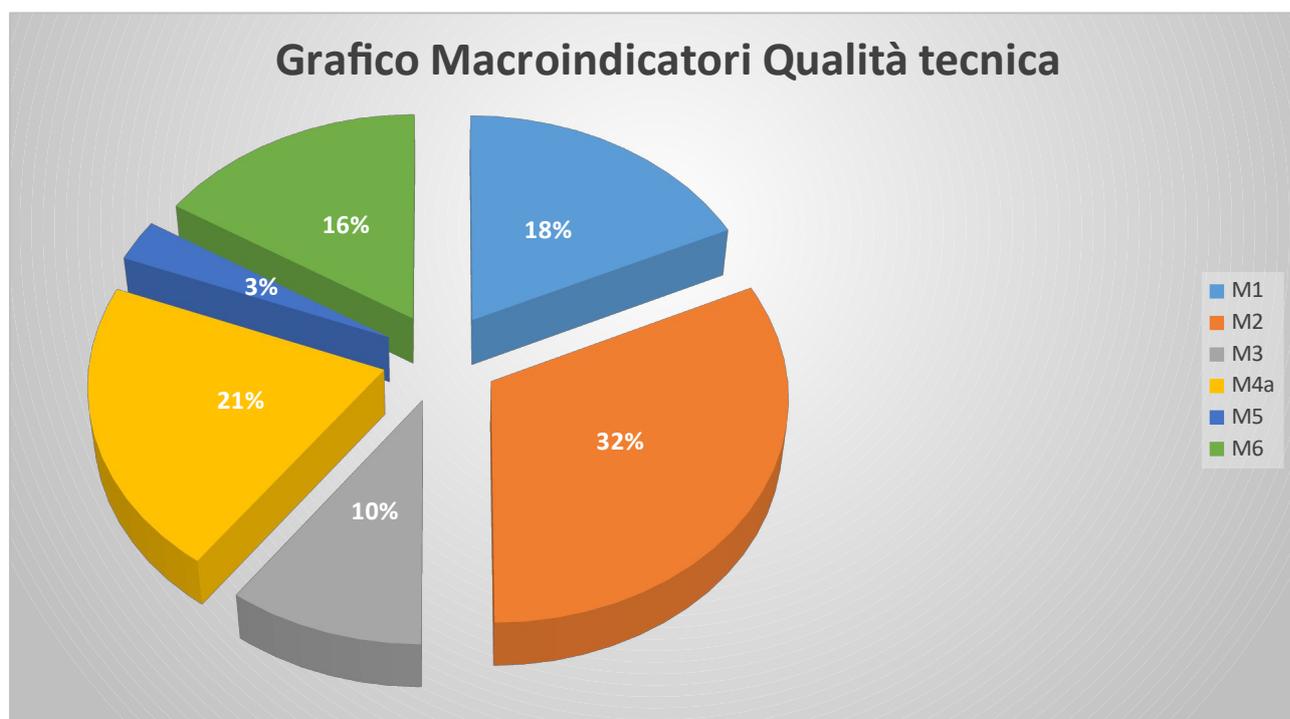


Fig.5 – Illustrazione qualitativa degli Investimenti realizzati con riferimento alla Qualità Tecnica (RQTI)

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del $\pm 20\%$ del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Scostamento di Scostamento		
2014PCIE0001	203 - Realizzazione nuovo impianto di depurazione (biodischi) per l'agglomerato Osteria Nuova 2 e relativi collegamenti fognari (studio fattibilità NUOVA SOLUZIONE)	DEPURAZIONE	Vernasca	115.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PCIE0002	E2008001 - Potenziamento vasche dell'impianto di depurazione di Borgonovo, e progetto di adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006).	DEPURAZIONE	Borgonovo Val Tidone	1.500.000	10.000	0	10.000	18.683	0	18.683	86%	CAMB 75 Franchigia < 20.000- Scostamento < 100%	
2014PCIE0003	E2008005 - Sistemazioni delle inadeguatezze della rete fognaria del Capoluogo e limitrofe	FOGNATURA	Sarmato	551.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PCIE0004	G20080001 - Miglioramento della qualità dell'acqua nel comune di PIACENZA, 1° Stralcio: Impianto di produzione acqua potabile località Mortizza - Collegamento Piacenza -Mortizza - Collegamento pozzo esistente Mortizza-scuole - perforazione di tre nuovi pozzi	ACQUEDOTTO	Grandi opere, Piacenza	5.300.000	800.000	0	800.000	993.180	383.298	609.882	24%	Completata perforazione dei 3 pozzi e realizzata rete collegamento interna. Nel 2019 previste opere di completamento.	
2014PCIE0005	G20080003-1 - Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 1° Stralcio: Adeguamento e automazione potabilizz. sino 140 l/s - Condotta Mignano-LUGAGNANO, dorsale sinistra Ongina, adduttrice loc. MOCOMERO, potabilizzatore San Protaso. A servizio dei comuni FIORENZUOLA, CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO, VERNASCA, CARPANETO e GROPPARELLO	ACQUEDOTTO	Carpaneto, Castell'Arquato, Fiorenzuola, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Grandi opere, Gropparello	2.600.000	218.000	0	218.000	157.819	0	157.819	-27%	La minor spesa è dovuta all'anticipo delle lavorazioni fatte nel 2017.	
2014PCIE0006	G20080007-1 -Acquedotto intercomunale Val Tidone, 1° Stralcio: collegamento CALENDASCO-SARMATO-CASTEL SAN GIOVANNI-BORGONOVO-PIACENZA. Potenziamento pozzi Mottaziana - collegamento BORGONOVO e ROTTOFRENO e PIACENZA.	ACQUEDOTTO	Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Rottofreno, Sarmato, Grandi opere, Calendasco	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PCIE0007	G20080008 - Acquedotto intercomunale Bassa Val Trebbia: Collegamenti acquedottistici Torrazzo Momeliano Pigazzano.	ACQUEDOTTO	Gazzola, Travo, Grandi opere, Piozzano	1.180.000	300.000	0	300.000	592.880	0	592.880	97%	Maggiori costi dovuti a ricollegamenti di tratti di rete non presenti in cartografia e modifiche funzionali dei serbatoi intermedi per aumentare portata in arrivo al serbatoio Boffalora.	
2014PCIE0008	G20080009 - Razionalizzazione sistema sorgenti Alta Val Trebbia, Alta Val Nure, Alta Val d'Arda. Comuni Cerignale, Zerba, Ottone, Cortebrugatella, Bobbio, Vernasca, Morfasso Lugagnano, Ferriere, Farini, Bettola, Gropparello, Caminata, Pecorara.	ACQUEDOTTO	Bettola, Bobbio, Caminata, Lugagnano Val d'Arda, Pecorara, Zerba, Vernasca, Grandi opere, Cerignale, Morfasso, Ottone, Cortebrugatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Alta Val Tidone	1.000.000	30.000	0	30.000	500	0	500	-98%	Realizzati interventi in base alle necessità.	
2014PCIE0009	G20080011 - Sistema depurativo intercomunale Bassa Ovest. 1° Stralcio: completamento collettamento di CALENDASCO	DEPURAZIONE	Calendasco, Grandi opere	500.000	0	0	0	30.502	0	30.502	100%	Code pagamenti prestazioni professionali pregresse e chiusura contabilità lavori.	
2014PCIE0010	G20080012 -Sistema depurativo intercomunale Bassa Est: stralcio funzionale relativo al potenziamento sino a 10.000 AE dell'impianto di depurazione di S.Giuliano	DEPURAZIONE	Villanova sull'Arda, Castelvetro Piacentino, Grandi opere	1.450.000	200.000	0	200.000	228.195	0	228.195	14%		

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del \pm 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Scostamento di Scostamento		
2014PCIE0011	G20080013 - Sistema depurativo intercomunale Bassa Est: 1° stralcio collettamento Soarza + VILLANOVA(Est+Ovest) + Villanova zona artigianale + Cignano all'impianto di depurazione di S.Giuliano, e adeguamento scarichi loc. Cantarana mediante realizzazione di fossa Imhoff.	DEPURAZIONE	Castelvetro Piacentino, Villanova sull'Arda, Grandi opere	1.750.000	100.000	0	100.000	70.668	0	70.668	-29%	Minori spese dovute a sospensione dei lavori di collettamento in attesa del potenziamento del depuratore di San Giuliano.	
2014PCIE0012	G20080014 - Sistema depurativo PODENZANO-VIGOLZONE, 1° stralcio: collettamento di Vigolzone nel reticolo fognario di Podenzano.	FOGNATURA	Grandi opere, Podenzano, Vigolzone	160.851	0	0	0	68	0	68	100%	Ore personale.	
2014PCIE0013	G20080015 -Adeguamento scarichi dell'agglomerato di NIBBIANO mediante realizzazione nuovo impianto di depurazione a biosidchi	DEPURAZIONE	Grandi opere, Nibbiano, Alta Val Tidone	650.000	30.000	0	30.000	21.146	0	21.146	-29%	CAMB 75 Franchigia < 20.000- Scostamento < 100%	
2014PCIE0014	G20080016 - Sistemazione reticolo fognario di CAMINATA e Costiola e adeguamento scarichi dell'agglomerato mediante realizzazione nuovo impianto di depurazione a biosidchi	DEPURAZIONE	Grandi opere, Caminata, Alta Val Tidone	500.000	30.000	0	30.000	163.581	0	163.581	445%	In attesa della predisposizione ed approvazione del nuovo strumento urbanistico sono stati anticipati i lavori di collettamento fognario.	
2014PCIE0015	G20080017 - Intervento di ristrutturazione dell'impianto di depurazione del capoluogo CASTEL SAN GIOVANNI, con adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006).	DEPURAZIONE	Grandi opere, Castel San Giovanni	3.512.000	0	0	0	709.344	0	709.344	100%	Costi sostenuti per completare alcune lavorazioni che non è stato possibile effettuare nelle annualità precedenti.	
2014PCIE0016	G20080018 -Collettamento loc. Trevozzo (NIBBIANO) all'impianto di depurazione di Pianello V.T., potenziamento depuratore di PIANELLO e sistemazione strada di accesso	FOGNATURA	Grandi opere, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Alta Val Tidone	700.000	100.000	0	100.000	52.702	0	52.702	-47%	Minori spese dovute a sospensione dei lavori di collettamento in attesa del potenziamento del depuratore di Pianello. Residuo costi 2017 relativi all'attraversamento del Tidone.	
2014PCIE0017	G20080019 - Adeguamento agglomerato Strà (NIBBIANO) mediante sistemazione delle fosse Imhoff.	DEPURAZIONE	Grandi opere, Nibbiano, Alta Val Tidone	120.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PCIE0018	G20080020 - Adeguamento agglomerato Valconasso di Pontenure.	DEPURAZIONE	Grandi opere, Pontenure	847.000	0	0	0	18.580	132.154	-113.573	100%	Code lavori anni precedenti.	
2014PCIE0019	G20080022 - Realizzazione tratti di fognatura e impianto di depurazione biologico per COLI, collettamento Coli Capoluogo (agglomerato: Coli, Baselica, Cerreto, Boioli, Peveri, Poggiolo, Corte, Pradaglione, Mazzucchi, Molino) ed estendimento rete loc.Caminata	FOGNATURA	Grandi opere, Coli	1.158.201	30.000	0	30.000	83.669	0	83.669	178%	Costi derivanti da opere di completamento. Restano da eseguirsi le pavimentazioni interne all'impianto.	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del \pm 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Scostamento di Scostamento		
2014PCIE0046	P2010121 - Collegamento acquedotto in località Vitalta.	ACQUEDOTTO	Vernasca	180.000	0	0	0	17.235	0	17.235	100%	Spese notarili per servitù.	
2014PCIE0047	P2010125 - Realizzazione di impianto per adeguamento scarico dell'agglomerato Bacedasco Alto	DEPURAZIONE	Castell'Arquato	100.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PCIE0048	P2010133 - Completamento rete fognaria località Case Gatti. 1° Stralcio: rete.	FOGNATURA	Podenzano	100.000	84.000	0	84.000	6.185	0	6.185	-92%	Lavori non avviati in attesa di AUA.	
2014PCIE0049	P2010135 - Distributori di acqua pubblica.	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	480.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PCIE0050	P2010139 - Sostituzione tubo di collegamento Gusano-Monterosso per collegamento alla dorsale Val D'Arda.	ACQUEDOTTO	Gropparello	205.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PCIE0051	P2010174 - Nuovo serbatoio, impianto di rilancio e relativi collegamenti idraulici serbatoio. 1° Stralcio - Carpaneto	ACQUEDOTTO	Carpaneto	800.000	50.000	0	50.000	106.834	0	106.834	113%	Costi sostenuti per completare alcune lavorazioni che non è stato possibile effettuare nelle annualità precedenti	
2014PCIE0052	P2010239 - Nuovo pozzo Altoè.	ACQUEDOTTO	Podenzano	300.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PCIE0053	P2011001 - Impianto di telegestione depuratori.	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	450.000	50.000	0	50.000	12.182	0	12.182	-75%	Realizzati interventi in base alle necessità.	
2014PCIE0054	P2011004 - Acquedotto zona Generesso 1° stralcio	ACQUEDOTTO	Bettola	100.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PCIE0055	P2011005 - Rifacimento acquedotto loc. Piancasale, Terme di Bobbio Progetto Asse 3.	ACQUEDOTTO	Bobbio	224.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PCIE0056	P2011007 - Ristrutturazione rilancio Campo Sportivo Castel San Giovanni e sostituzione tratti di adduttrice per serbatoio Ginestre	ACQUEDOTTO	Castel San Giovanni	450.000	0	0	0	39.128	0	39.128	100%	Conclusi lavori elettrici	
2014PCIE0057	P2011016 - Collettamento scarichi via Tinazzo.	FOGNATURA	Monticelli d'Ognina	160.000	0	0	0	231	0	231	100%	Intervento pianificato in annualità successive. Anticipate alcune attività di progettazione.	
2014PCIE0058	P2011018 - Estensione rete idrica loc. Spaneto e Verbeto.	ACQUEDOTTO	Nibbiano, Alta Val Tidone	237.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PCIE0059	P2011028 - Ristrutturazione impianto di depurazione di Travo capoluogo.	DEPURAZIONE	Travo	1.000.000	0	0	0	365	0	365	100%	Spese dovute ad attività di rilievo e progettazione.	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del $\pm 20\%$ del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Scostamento di Scostamento		
2014PCIE0060	P2011032 - Adeguamento degli scarichi fognari dell'agglomerato Ziano 5.	DEPURAZIONE	Ziano Piacentino	250.000	10.000	0	10.000	2.252	0	2.252	-77%	CAMB 75 Franchigia < 20.000- Scostamento < 100%	
2014PCIE0061	P2011034 - Completamento fognatura zona artigianale e Roncovero.	FOGNATURA	Bettola	50.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PCIE0062	P2014001 - Collettamento scarichi in Via XXIV Maggio.	FOGNATURA	Cadeo	30.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PCIE0063	P2014003 - Ampliamento impianto di depurazione di Gossolengo.	DEPURAZIONE	Gossolengo	1.700.000	50.000	0	50.000	4.572	0	4.572	-90%	L'ampliamento del depuratore di Gossolengo richiede l'occupazione dell'attuale area destinata alla stazione ecologica ed il conseguente spostamento della stessa che dovrebbe essere a carico del comune il quale sta valutando la nuova area da utilizzare a tal fine.	
2014PCIE0064	P2014005 - Rifacimento rete acquedotto via Dante per rifacimento pavimentazione	ACQUEDOTTO	Piacenza	380.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PCIE0065	P2014006 - Realizzazione tratto di fognatura in località La Verza.	FOGNATURA	Piacenza	800.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PCIE0066	P2014007 - Ampliamento impianto di depurazione di Pieve Dugliara, 1° stralcio: inserimento impianto ex Gragnanino e collegamenti	DEPURAZIONE	Rivergaro	100.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PCIE0067	P2014008 - Rifacimento sottoservizi piazza Paolo per rifacimento pavimentazione	ACQUEDOTTO	Rivergaro	290.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PCIE0068	P2014009 - Rifacimento caricamento e distribuzione acquedotto via Taccella Ca' Leone	ACQUEDOTTO	Rivergaro	165.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PCIE0069	P2014011 - Sostituzione tubazione acquedotto Mocomero per frana.	ACQUEDOTTO	Vernasca		0	0	0	0	0	0	0%		
2014PCIE0070	P2014-ACQ/FOG/DEP - Serie di piccoli interventi approvati nel piano 2011-2012	FOGNATURA	Opere pluricomunali	500.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PCIE0071	P2014012/P2014025 - VARI INTERVENTI VEDI CAMPO "NOTE"	TUTTI	Caorso, Castell'Arquato, Gazzola, Lugagnano Val d'Arda, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Villanova sull'Arda, Coli, Farini, Ferriere, Pianello Val Tidone, Piozzano, Travo	3.425.000	510.000	0	510.000	331.397	0	331.397	-35%	Titolo cumulativo: in corso Via Stallone, in corso progettazione esecutiva Centovera e San Lorenzo.	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018				Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del $\pm 20\%$ del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Scostamento di Scostamento	
2014PCIE0072	Cartografia	TUTTI	Opere pluricomunali		200.000	0	200.000	223.381	0	223.381	11%	
2015PCIE0073	G2008005 - Acquedotto intercomunale Val Nure - potenziamento; 1° STRALCIO Nuovo serbatoio Vigolzone e collegamento Podenzano - Manutenzione opere captazione	ACQUEDOTTO	Podenzano, Vigolzone, Opere pluricomunali, Grandi opere		0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0074	P2011025 - Sistemazione acquedotto loc. Cattagnina	ACQUEDOTTO	Rottofreno	60.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0075	P2010063 - Ristrutturazione impianto Quattrocasse	ACQUEDOTTO	Monticelli d'Ognina	60.000	60.000	0	60.000	466	0	466	-99%	L'amministrazione Comunale di Monticelli si sta occupando dello svincolo da parte della Soprintendenza.
2015PCIE0076	P2010009 - Completamento del reticolo fognario-depurativo della località Missano	FOGNATURA	Bettola	70.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0077	P2010064 - Sistema fognario depurativo loc.Solaro (confluito in altro ID)	FOGNATURA	Ferriere		0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0078	Rifacimento reti acquedotto e fognatura in occasione del rifacimento della pavimentazione di via Roma	TUTTI	Agazzano	168.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0079	Revisione e potenziamento della rete acquedotto. Opere integrative	ACQUEDOTTO	Lugagnano Val d'Arda	900.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0080	Realizzazione nuova fognatura per collettamento al depuratore della fognatura recapitante nella F.I. del Sacchello	FOGNATURA	Sarmato	160.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0081	Realizzazione impianto di sollevamento reflui loc. Due Case	FOGNATURA	Podenzano	50.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0082	Collettamento di S.Pedretto all'i.dep. di S.Giuliano	DEPURAZIONE	Castelvetro Piacentino	1.141.545	0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0083	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI DI EMERGENZA - ALLUVIONE 2015	TUTTI	Opere pluricomunali	1.508.345	0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0084	Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 2° Stralcio: Nuovo serbatoio diga di Mignano. A servizio dei comuni FIORENZUOLA, CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO, VERNASCA, CARPANETO e GROPPARELLO	ACQUEDOTTO	Carpaneto, Castell'Arquato, Fiorenzuola, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Grandi opere, Gropparello	800.000	200.000	0	200.000	15.450	0	15.450	-92%	Difficoltà nel completamento delle pratiche di acquisizione dell'area. Area ancora da acquisire.

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del $\pm 20\%$ del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Scostamento di Scostamento		
2015PCIE0113	Sistemazione reticolo fognario del Capoluogo zona Grondana (confluito negli interventi alluvione)	FOGNATURA	Ferriere	50.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2015PCIE0114	Rifacimento fognatura via Ugo Foscolo	FOGNATURA	Fiorenzuola	25.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2015PCIE0115	Rifacimento sottoservizi rotonda Via Illica	FOGNATURA	Fiorenzuola	80.000		0	0	0	0	0	0%		
2015PCIE0116	Rifacimento rete acquedotto strada comunale per Olza	ACQUEDOTTO	Fiorenzuola	50.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2015PCIE0117	Potenziamento dell'impianto di depurazione agglomerato Canneto - Studio di fattibilità	DEPURAZIONE	Gazzola	250.000	10.000	0	10.000	125	0	125	-98%	CAMB 75 Franchigia < 20.000- Scostamento < 100%	
2015PCIE0118	Sistemazione acquedotto e fognatura via dei Rivi	FOGNATURA	Gossolengo	200.000	100.000	0	100.000	191.004	0	191.004	91%	Code lavori anni precedenti.	
2015PCIE0119	Rifacimento rete acquedotto via Marconi	ACQUEDOTTO	Gossolengo	80.000	10.000	0	10.000	39.206	0	39.206	292%	Code lavori anni precedenti. Maggior spesa rispetto a importo progettuale dovuto a prescrizioni dell'amministrazione comunale riguardo a modalità di gestione del transito. Nel 2019 previsti i ripristini definitivi.	
2015PCIE0120	Sistemazione rete fognaria loc. Niviano di Sopra	FOGNATURA	Lugagnano Val d'Arda	150.000	10.000	0	10.000	69.895	0	69.895	598%	Lavori conclusi nel 2018. L'importo totale non supera quello di progetto. Nel 2019 costi servitù.	
2015PCIE0121	Rifacimento rete acquedotto via Garibaldi-via Risorgimento	ACQUEDOTTO	Lugagnano Val d'Arda	115.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2015PCIE0122	Collegamento acquedotto San Nazzaro al serbatoio Quattro Case (Capoluogo)	ACQUEDOTTO	Monticelli d'Ognina	100.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2015PCIE0123	Realizzazione fognatura per sistemazione criticità via Breda - studio fattibilità	FOGNATURA	Monticelli d'Ognina	100.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2015PCIE0124	Rifacimento rete acquedotto loc. Colombello	ACQUEDOTTO	Morfasso	120.000	110.000	0	110.000	202.091	0	202.091	83%	Lavori avviati nel 2018. Il progetto esecutivo ha evidenziato un importo maggiore di quello previsto.	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del $\pm 20\%$ del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Scostamento di Scostamento		
2016PCIE00196	P2008001 - Contributi	DEPURAZIONE	Agazzano		0	0	0	0	0	0	0%		
2016PCIE0152	Acquedotto zona Generesso 2° stralcio: studio di fattibilità	ACQUEDOTTO	Bettola	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	Intervento posticipato.	
2016PCIE0153	Interventi di miglioramento della distribuzione idropotabile. 2° stralcio	ACQUEDOTTO	Podenzano	1.865.000	270.000	0	270.000	275.891	0	275.891	2%		
2016PCIE0154	Completamento rete fognaria in loc. Bassano.	FOGNATURA	Rivergaro	70.000	65.000	0	65.000	8.377	0	8.377	-87%	Problemi relativi all'acquisizione delle aree per il passaggio delle tubazioni.	
2016PCIE0155	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure: attraversamento Nure a Farini	ACQUEDOTTO	Grandi opere, Farini	216.000	216.000	0	216.000	6.620	0	6.620	-96%	Lavori vincolati a quelli del rifacimento del Ponte da parte della Provincia di Piacenza. Inizieranno nel 2019.	
2016PCIE0156	Dorsale acquedottistica della Val D'Arda: sistemazione briglia di Bardetti	ACQUEDOTTO	Fiorenzuola, Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Carpaneto, " "	80.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PCIE0157	Interventi straordinari sul pozzo Le Forche	ACQUEDOTTO	Bettola	110.000	0	0	0	20.481	0	20.481	100%	Lavori in corso.	
2016PCIE0158	Interventi straordinari sul pozzo Bussini	ACQUEDOTTO	Bettola	245.000	199.000	0	199.000	0	0	0	-100%	In corso di definizione la necessità dell'intervento.	
2016PCIE0159	Interventi straordinari sull'impianto di sollevamento Auxilia	FOGNATURA	Bobbio	50.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PCIE0160	Interventi straordinari sull'impianto di sollevamento Dorbida	FOGNATURA	Bobbio	73.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PCIE0161	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Marsaglia	DEPURAZIONE	Cortebrugnatella	160.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PCIE0162	Rifacimento tratti di fognatura nel capoluogo di Farini in fregio all'alveo del torrente Nure	FOGNATURA	Farini	223.000	140.000	0	140.000	0	0	0	-100%	Lavori in parte realizzati. Per concluderli è necessario attendere i lavori dell'Amministrazione Provinciale.	
2016PCIE0163	Interventi straordinari sul pozzo Borcaglia	ACQUEDOTTO	Farini	110.000	0	0	0	19.209	0	19.209	100%	Lavori in corso.	
2016PCIE0164	Rifacimento tratti di fognatura nel capoluogo di Ferriere in fregio agli alvei dei torrenti Grondana e Nure	FOGNATURA	Ferriere	260.000	0	0	0	133.008	0	133.008	100%	Costi sostenuti per completare alcune lavorazioni che non è stato possibile effettuare nelle annualità precedenti.	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del \pm 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Scostamento di Scostamento		
2016PCIE0165	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Ferriere capoluogo	DEPURAZIONE	Ferriere	1.145.000	450.000	225.000	225.000	103.325	0	103.325	-77%	Lavori in corso. Costi in linea con avanzamento cantiere.	
2016PCIE0166	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Ottone	DEPURAZIONE	Ottone	54.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PCIE0167	Interventi straordinari sul pozzo Cisiano	ACQUEDOTTO	Rivergaro	245.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PCIE0168	Interventi straordinari sul pozzo Fabiano	ACQUEDOTTO	Rivergaro	51.000	51.000	0	51.000	112.177	0	112.177	119%	Realizzata difesa spondale sulla base delle indicazioni del STB.	
2016PCIE0169	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Pieve Dugliara	DEPURAZIONE	Rivergaro	190.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PCIE0170	Interventi straordinari sull'impianto di sollevamento Molinazzo	FOGNATURA	Rivergaro	314.000	0	0	0	565	0	565	100%	Intervento pianificato in annualità precedenti, costi relativi a verifiche. Eseguito nel 2019.	
2016PCIE0171	Interventi straordinari sul pozzo Colombarola	ACQUEDOTTO	San Giorgio Piacentino	50.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PCIE0172	Interventi straordinari sul pozzo Campo Sportivo	ACQUEDOTTO	Travo	150.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PCIE0173	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Bobbio capoluogo	DEPURAZIONE	Bobbio	200.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PCIE0174	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Case Trebbia	DEPURAZIONE	Coli	56.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PCIE0175	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Travo	DEPURAZIONE	Travo	108.000	80.000	0	80.000	0	0	0	-100%	In attesa di autorizzazioni. Lavori in corso nel 2019.	
2016PCIE0176	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Albarola	DEPURAZIONE	Vigolzone	351.000	321.000	160.500	160.500	120.159	0	120.159	-62%	Lavori in corso. Costi in linea con avanzamento cantiere.	
2016PCIE0177	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure nel tratto ponte Farini - ponte Cantoniera.	ACQUEDOTTO	Grandi opere, Ferriere, Farini	2.035.000	965.000	482.500	482.500	1.785.537	0	1.785.537	85%	Acquistati i materiali idraulici relativi a tutte le tratte. In attesa di autorizzazioni.	
2016PCIE0178	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure nel tratto ponte Cantoniera - Ponte Nano	ACQUEDOTTO	Grandi opere, Ferriere, Farini	1.145.000	567.500	283.750	283.750	0	0	0	-100%	In attesa di autorizzazioni.	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del \pm 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Scostamento di Scostamento		
2017PCIE0206	* Ripristino danni alluvione fosse imhoff	DEPURAZIONE	Ottone	30.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2017PCIE0207	* Ripristino danni alluvione depuratore Piancasale	DEPURAZIONE	Bobbio	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	-100%	In attesa di autorizzazioni.	
2017PCIE0208	* Rifacimento sorgente Lardana	ACQUEDOTTO	Ferriere	100.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2017PCIE0209	* Ripristino pozzo Trebbia	ACQUEDOTTO	Rivergaro	26.500	0	0	0	0	0	0	0%		
2017PCIE0210	* Collegamento acquedottistico Cortemaggiore-Besenzone (e studio serbatoio Besenzone)	ACQUEDOTTO	Besenzone	290.000	100.000	0	100.000	129.649	0	129.649	29%	Lavori in corso che proseguiranno anche nel 2019 come da pianificazione.	
2017PCIE0211	* 2° stralcio: Collegamento pozzo zona artigianale Carpaneto con serbatoio	ACQUEDOTTO	Carpaneto	60.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2017PCIE0212	* Potenziamento pozzi esistenti	ACQUEDOTTO	Calendasco, Piacenza	80.000	70.000	0	70.000	21.434	0	21.434	-69%	Lavori iniziati a fine anno, in corso nel 2018.	
2017PCIE0213	* Realizzazione nuovi pozzi a Calendasco	ACQUEDOTTO	Calendasco, Piacenza	1.500.000	50.000	50.000	0	33.627	0	33.627	-32%	CAMB 75 Franchigia < 20.000- Scostamento < 100%	
2017PCIE0214	* Interconnessione acquedotto Fiorenzuola con acquedotto Castell'Arquato per alimentazione idrica di Castell'Arquato e Lugagnano con i pozzi di Fiorenzuola	ACQUEDOTTO	Fiorenzuola, Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Alseno, Carpaneto, Gropparello, Vernasca	400.000	200.000	0	200.000	153.061	0	153.061	-23%	I lavori sono proseguiti nel 2018. L'avanzamento fisico coincide con quanto pianificato. Sono stati riscontrati alcuni problemi interni di liquidazione delle contabilità che si sono risolti nel 2018.	
2017PCIE0215	* Interventi di ottimizzazione delle opere di presa delle sorgenti che alimentano la rete acquedottistica	ACQUEDOTTO	Cortebrugnatella	70.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2017PCIE0216	* Interconnessione tra serbatoio Scagliotti e la località Osera	ACQUEDOTTO	Coli	20.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2017PCIE0217	* Interconnessione tra serbatoio Bobbiano e la località Chiosi	ACQUEDOTTO	Travo	15.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2017PCIE0218	* Interconnessione tra pozzo Caminata e la località Trebecco	ACQUEDOTTO	Nibbiano, Alta Val Tidone	25.000	0	0	0	18.561	0	18.561	100%	Intervento iniziato nel 2017 e concluso nel 2018.	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del $\pm 20\%$ del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Scostamento di Scostamento		
2017PCIE0219	* 1° stralcio, interconnessione acquedotto intercomunale Castel San Giovanni - Sarmato - Borgonovo - Ziano con l'acquedotto di Pianello (tubazione provvisoria)	ACQUEDOTTO	Pianello Val Tidone	160.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2017PCIE0220	* Adeguamento rete idrica per potabilizzazione pozzo Sisco - collegamento pozzo Sisco al nuovo serbatoio Vezzeno	ACQUEDOTTO	Carpaneto	70.000	0	0	0	12	0	12	100%	Errore di imputazione.	
2017PCIE0221	* Adeguamento rete idrica per potabilizzazione pozzo Piacentino - collegamento pozzo Piacentino al nuovo serbatoio Vezzeno	ACQUEDOTTO	Carpaneto	190.000	0	0	0	43.594	0	43.594	100%	Intervento iniziato nel 2017 e concluso nel 2018 con maggior spesa dovuta a necessità di posare ulteriore tratto e realizzare un nuovo attraversamento del Vezzeno.	
2017PCIE0222	* 1° stralcio, interconnessione acquedotto Pianello con Trevozzo di Nibbiano (tubazione provvisoria)	ACQUEDOTTO	Nibbiano	90.000	0	0	0	229	0	229	100%	Code lavori anni precedenti.	
2017PCIE0223	* Tubazioni definitive relative alle interconnessioni idrauliche degli acquedotti di Bobbio con le loc. Cascina Ponte, Bellocchio, Caldarola, Cascina Alpeggiani e altre minori	ACQUEDOTTO	Bobbio	200.000	0	0	0	403	0	403	100%	Code lavori anni precedenti.	
2017PCIE0224	* Interconnessione col serbatoio Ettoli e il serbatoio Penni per alimentare la località Case Ettoli	ACQUEDOTTO	Vernasca	30.000	0	0	0	3.858	0	3.858	100%	Code lavori anni precedenti.	
2017PCIE0225	* 1° stralcio, interconnessione tra serbatoio Dobbio e serbatoio Roncaglie a beneficio di Pecorara (tubazione provvisoria)	ACQUEDOTTO	Pecorara, Alta Val Tidone	100.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2018PCIE0027A	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI DI EMERGENZA	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		2.000.000	0	2.000.000	3.324.258	0	3.324.258	66%	Maggiori costi dovuti a: interventi di manutenzione non prevedibili a impianto potabilizzazione Caorso, maggiori manutenzioni straordinarie reti Bobbio e Ponte dell'Olio, rifacimento tubazioni vetuste Castel San Giovanni e Vigolzone.	
2018PCIE0027B	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED INTERVENTI DI EMERGENZA	FOGNATURA	Opere pluricomunali		800.000	0	800.000	2.125.630	0	2.125.630	165%	Maggiori costi per sostituzione reti ammalorate Piacenza, Castel San Giovanni e Bobbio, rinnovo impianti sollevamento (opere murarie, idrauliche ed elettromeccaniche).	
2018PCIE0027C	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED INTERVENTI DI EMERGENZA	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali		800.000	0	800.000	1.080.789	0	1.080.789	35%	Maggiori costi dovuti a rinnovo impianto aerazione Dep. Piacenza e Borgonovo, acquisto griglie verticali automatiche, sistemazione strutturale locale idrovore Dep. Piacenza.	
2018PCIE0227	Trattamento Pozzi Piacenza (Via Degani, Via XXIV Maggio)	ACQUEDOTTO	Piacenza	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	370.772	0	370.772	-62%	Minori lavori dovuti ad assenza autorizzazioni per Via XXIV Maggio.	
2018PCIE0228	Trattamento Pozzo Marchesana	ACQUEDOTTO	Gossolengo	500.000	200.000	0	200.000	63.683	0	63.683	-68%	Cantiere avviato fine 2018.	
2018PCIE0229	Acq Bobbio - Impianto di trattamento Serbatoio Arelli	ACQUEDOTTO	Bobbio	355.000	17.750	17.750	0	0	0	0	-100%	Progettazione definitiva in corso. Costi di progettazione confluiti su codice studio 2017PCIE0197.	
2018PCIE0230	Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di trattamento Serbatoio Caione	ACQUEDOTTO	Bobbio	190.000	9.500	9.500	0	0	0	0	-100%	Intervento non partito, in attesa di definizione parametro Cromo	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del $\pm 20\%$ del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Scostamento di Scostamento		
2018PCIE0231	Acq Bobbio - Impianto di trattamento Serbatoio Piancasale	ACQUEDOTTO	Bobbio	170.000	8.500	8.500	0	0	0	0	-100%	Intervento non partito, in attesa di definizione parametro Cromo	
2018PCIE0232	Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso località Roncoli	ACQUEDOTTO	Cortebrugnatella	215.000	10.750	10.750	0	0	0	0	-100%	Intervento non partito, in attesa di definizione parametro Cromo	
2018PCIE0233	Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso località Fossoli	ACQUEDOTTO	Cortebrugnatella	135.000	6.750	6.750	0	0	0	0	-100%	Intervento non partito, in attesa di definizione parametro Cromo	
2018PCIE0234	Acq Cerignale - Impianto di trattamento Serbatoio Cerignale 18	ACQUEDOTTO	Cerignale	210.000	10.500	10.500	0	0	0	0	-100%	Intervento non partito, in attesa di definizione parametro Cromo	
2018PCIE0235	Acq Cerignale - Impianto di trattamento Serbatoio Cerignale 14 Le Piane	ACQUEDOTTO	Cerignale	165.000	8.250	8.250	0	0	0	0	-100%	Intervento non partito, in attesa di definizione parametro Cromo	
2018PCIE0236	Acq Cerignale-Carissasca - Impianto di trattamento Serbatoio Camminata	ACQUEDOTTO	Cerignale	215.000	10.750	10.750	0	0	0	0	-100%	Intervento non partito, in attesa di definizione parametro Cromo	
2018PCIE0237	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio 16 Filippazzi	ACQUEDOTTO	Coli	210.000	10.500	10.500	0	0	0	0	-100%	Intervento non partito, in attesa di definizione parametro Cromo	
2018PCIE0238	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Forno di Sopra	ACQUEDOTTO	Coli	150.000	7.500	7.500	0	0	0	0	-100%	Intervento non partito, in attesa di definizione parametro Cromo	
2018PCIE0239	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Coste delle Guardie	ACQUEDOTTO	Coli	175.000	8.750	8.750	0	0	0	0	-100%	Intervento non partito, in attesa di definizione parametro Cromo	
2018PCIE0240	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Pellegrini (da realizzare)	ACQUEDOTTO	Coli	175.000	8.750	8.750	0	0	0	0	-100%	Progettazione definitiva in corso. Costi di progettazione confluiti su codice studio 2017PCIE0197.	
2018PCIE0241	Acq Farini-Ca' Gregorio-Boli - Impianto di trattamento Serbatoio Colletta	ACQUEDOTTO	Farini	160.000	8.000	8.000	0	0	0	0	-100%	Intervento non partito, in attesa di definizione parametro Cromo	
2018PCIE0242	Acq Val Nure - Impianto di trattamento Serbatoio Toni	ACQUEDOTTO	Ferriere	925.000	46.250	46.250	0	0	0	0	-100%	Intervento non partito, in attesa di definizione parametro Cromo	
2018PCIE0243	Acq Ferriere-Canafurone - Impianto di trattamento Serbatoio Castel Canafurone	ACQUEDOTTO	Ferriere	165.000	8.250	8.250	0	0	0	0	-100%	Intervento non partito, in attesa di definizione parametro Cromo	
2018PCIE0244	Acq Ferriere-Rocconi - Impianto di trattamento Serbatoio Nuovo Carbonaie	ACQUEDOTTO	Ferriere	215.000	10.750	10.750	0	0	0	0	-100%	Intervento non partito, in attesa di definizione parametro Cromo	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del $\pm 20\%$ del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Scostamento di Scostamento		
2018PCIE0245	Acq Ferriere - Impianto di trattamento Serbatoio Bardogna di Sopra	ACQUEDOTTO	Ferriere	175.000	8.750	8.750	0	0	0	0	-100%	Intervento non partito, in attesa di definizione parametro Cromo	
2018PCIE0246	Acq Morfasso - Impianto di trattamento Serbatoio Case Negri	ACQUEDOTTO	Morfasso	190.000	9.500	9.500	0	0	0	0	-100%	Progettazione definitiva in corso. Costi di progettazione confluiti su codice studio 2017PCIE0197.	
2018PCIE0247	Acq Ferriere-Sarmadasco - Impianto di trattamento Serbatoio Sarmadasco	ACQUEDOTTO	Ferriere	210.000	10.500	10.500	0	0	0	0	-100%	Intervento non partito, in attesa di definizione parametro Cromo	
2018PCIE0248	Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di trattamento Serbatoio Mezzano o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione	ACQUEDOTTO	Bobbio	145.000	7.250	7.250	0	0	0	0	-100%	Progettazione definitiva in corso. Costi di progettazione confluiti su codice studio 2017PCIE0197.	
2018PCIE0249	Acq Bobbio-Cassolo-Cavarelli - Impianto di trattamento Serbatoio Cassolo o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione	ACQUEDOTTO	Bobbio	185.000	9.250	9.250	0	0	0	0	-100%	Progettazione definitiva in corso. Costi di progettazione confluiti su codice studio 2017PCIE0197.	
2018PCIE0250	Acq Bobbio-Cassolo-Cavarelli - Impianto di trattamento Serbatoio Cavarelli-Bertuzzi o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione	ACQUEDOTTO	Bobbio	185.000	9.250	9.250	0	0	0	0	-100%	Progettazione definitiva in corso. Costi di progettazione confluiti su codice studio 2017PCIE0197.	
2018PCIE0251	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Case Trebbia o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione	ACQUEDOTTO	Coli	135.000	6.750	6.750	0	0	0	0	-100%	Progettazione definitiva in corso. Costi di progettazione confluiti su codice studio 2017PCIE0197.	
2018PCIE0252	Acq Coli-Gavi - Impianto di trattamento Serbatoio Gavi o alimentazione da fonti alternative tramite realizzazione di opere di adduzione	ACQUEDOTTO	Coli	160.000	8.000	8.000	0	0	0	0	-100%	Intervento non partito, in attesa di definizione parametro Cromo	
2018PCIE0253	Acq Farini-Groppallo - Impianto di trattamento Serbatoio Pastori o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione	ACQUEDOTTO	Farini	145.000	7.250	7.250	0	0	0	0	-100%	Progettazione definitiva in corso. Costi di progettazione confluiti su codice studio 2017PCIE0197.	
2018PCIE0254	Acq Farini-Groppallo - Impianto di trattamento Serbatoio Chiarabini o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione	ACQUEDOTTO	Farini	145.000	7.250	7.250	0	0	0	0	-100%	Intervento non partito, in attesa di definizione parametro Cromo	
2018PCIE0255	Acq Farini-Groppallo - Impianto di trattamento Serbatoio Montalto o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione	ACQUEDOTTO	Farini	145.000	7.250	7.250	0	0	0	0	-100%	Progettazione definitiva in corso. Costi di progettazione confluiti su codice studio 2017PCIE0197.	
2018PCIE0256	Acq Farini-Groppallo - Impianto di trattamento Serbatoio Grapazuolo o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione	ACQUEDOTTO	Farini	185.000	9.250	9.250	0	0	0	0	-100%	Progettazione definitiva in corso. Costi di progettazione confluiti su codice studio 2017PCIE0197.	
2018PCIE0257	Acq Farini-Groppallo - Impianto di trattamento Serbatoio Costiolo o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione	ACQUEDOTTO	Farini	165.000	8.250	8.250	0	0	0	0	-100%	Intervento non partito, in attesa di definizione parametro Cromo	

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO			CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del \pm 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Scostamento di Scostamento	
2018PCIE0301	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Ferriere	ACQUEDOTTO	Ferriere	220.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0302	Ulteriori interventi di adeguamento a cromo - allineamento a POI	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	2.950.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0304	Potenziamento sistema acquedottistico della località Merlera, La Costa, Cappiano e Bicchignano	ACQUEDOTTO	Vigolzone	1.010.000	60.000	0	60.000	77.125	0	77.125	28%	CAMB 75 Franchigia < 20.000- Scostamento < 100%
2018PCIE0305	Sistema acquedottistico della località San Michele di Morfasso	ACQUEDOTTO	Morfasso	140.000	140.000	40.000	100.000	625	0	625	-99%	Cantiere avviato fine 2018.
2018PCIE0306	Nuovi allacci	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		1.139.213	433.076	706.137	0	0	0	-100%	Titolo inserito a fine 2018. I costi saranno caricati a partire dal 2019
TOTALI					18.812.713	1.999.826	16.812.887	18.731.764	835.145	17.896.619		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza n. 1 del 30/04/2020

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Approvazione Consuntivo 2018.
Programma Operativo Interventi –2015-2019**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Bologna, 30 aprile 2020

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Piacenza

F.to Raffaele Veneziani

Il segretario verbalizzante

F.to Fausta Pizzaghi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 15 giugno 2020

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna
