



CLPR/2018/6 dell'11 maggio 2018.

CONSIGLIO LOCALE di PARMA.

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Montagna 2000 S.p.A. Programma Operativo
Interventi 2015-2019: approvazione consuntivo 2016.**

LA COORDINATRICE
F.to Tiziana Benassi

CLPR/2018/6

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di maggio alle ore 14,30 presso la Sala Consiglio del Comune di Parma – Strada Repubblica n. 1 - si è riunito il Consiglio Locale di Parma convocato con lettera prot. n. PG/AT/2018/2986 del 4.05.2018.

Assume la presidenza la Coordinatrice Locale Tiziana Benassi, che chiama la funzionaria Fausta Pizzaghi ad assisterla in qualità di segretaria verbalizzante.

Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBARETO	Riccoboni Davide	Sindaco	SI'	0,6059
BARDI			NO	0,6385
BEDONIA			NO	0,8811
BERCETO			NO	0,6019
BORE			NO	0,3471
BORGO VAL DI TARO			NO	1,5743
BUSSETO			NO	1,5303
CALESTANO			NO	0,5809
COLLECCHIO	Zanetti Michela	Assessore	SI'	2,8284
COLORNO			NO	1,8860
COMPIANO			NO	0,4083
CORNIGLIO			NO	0,5741
FELINO	Leoni Elisa	Sindaco	SI'	1,8294
FIDENZA	Malvisi Davide	Assessore	SI'	5,0320
FONTANELLATO			NO	1,5152
FONTEVIVO			NO	1,2243
FORNOVO DI TARO	Grenti Emanuela	Sindaco	SI'	1,3691
LANGHIRANO	Bricoli Giordano	Sindaco	SI'	2,0497
LESIGNANO DE' BAGNI			NO	1,0975
MEDESANO	Ghidini Riccardo	Sindaco	SI'	2,2163
MEZZANI	Azzali Romeo	Sindaco	SI'	0,8366

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
MONCHIO DELLE CORTI	Moretti Claudio	Sindaco	SI'	0,3823
MONTECHIARUGOLO			NO	2,1820
NEVIANO DEGLI ARDUINI			NO	0,8951
NOCETO	Maini Giovanna	Assessore	SI'	2,6033
PALANZANO			NO	0,4164
PARMA	Benassi Tiziana	Assessore	SI'	33,5283
PELLEGRINO PAR.SE			NO	0,3977
POLESINE - ZIBELLO			NO	0,8301
ROCCABIANCA			NO	0,7772
SALA BAGANZA			NO	1,2175
SALSOMAGGIORE TERME	Trevisan Marco	Assessore	SI'	3,8919
S. SECONDO PAR.SE			NO	1,2415
SISSA TRECASALI	Gaibazzi Patrizia	Assessore	SI'	1,7100
SOLIGNANO			NO	0,5385
SORAGNA			NO	1,1189
SORBOLO	Cesari Nicola	Sindaco	SI'	2,0153
TERENZO			NO	0,4221
TIZZANO VAL PARMA	Bodria Amilcare	Sindaco	SI'	0,5961
TORNOLO			NO	0,4045
TORRILE	Gentile Antonio	Vice Sindaco	SI'	1,6090
TRAVERSETOLO	Lanzi Michele	Assessore	SI'	1,9533
VALMOZZOLA			NO	0,3031
VARANO DE' MELEGARI			NO	0,7052
VARSÌ			NO	0,4384
PROVINCIA DI PARMA			NO	10,0000

Presenti n. 17 quote 65,1 Assenti n. 30 quote 34,9

Riconosciuta la validità della seduta la Coordinatrice Tiziana Benassi, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Montagna 2000 S.p.A. Programma Operativo Interventi 2015-2019: approvazione consuntivo 2016.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di approvazione dei piani d’ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.2 del 24 marzo 2016 del Consiglio locale di Parma è stato approvato il Programma Operativo Interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore Montagna 2000 S.p.A., proponendo al Consiglio d’ambito la conseguente integrazione del Piano d’Ambito e la variazione del Piano economico-finanziario;
- con deliberazione n. 55 del 7 ottobre 2016 del Consiglio d’ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Parma di competenza del gestore Montagna 2000 S.p.A., dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato” che tra l’altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all’anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che:

- il gestore Montagna 2000 S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2016 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente è stata precedentemente inviata ai Comuni interessati;

rilevato che:

- dai dati presentati è emerso che non sono stati eseguiti interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo Interventi 2015-19 - approvato con deliberazione n.2 del 24 marzo 2016 del Consiglio Locale di Parma - o a quanto previsto dal Piano d'Ambito;
- sono presenti diciannove interventi contenuti nel Programma Operativo Interventi 2015-2019 o nel Piano d'Ambito che hanno avuto avvio anticipato nel 2016 o chiusura, sempre nel 2016, di interventi programmati nelle precedenti annualità, per un importo complessivo di € 215.389;
- non sono stati avviati quindici interventi, per un'importo complessivo di € 564.000;
- dai dati presentati si evince che gli investimenti totali netti a tariffa realizzati risultano essere inferiori, rispetto a quanto previsto dal programma operativo, per un importo di € 774.231, così come gli investimenti totali lordi; per il territorio di Berceto gli investimenti totali netti a tariffa realizzati risultano essere inferiori, rispetto a quanto previsto dal programma operativo, per un importo di € 72.972, così come gli investimenti totali lordi;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- il gestore ha prodotto giustificazioni rispetto agli scostamenti e in diversi casi non sono state ritenute esaustive dall'Agenzia; tuttavia sono state prodotti ulteriori chiarimenti da parte del gestore, che sono riportate nella nota allegata prot.n.00636/EG/eg del 21/03/2018 (agli atti dell'Agenzia prot. AT/2018/2032);
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a seguito della trasmissione della documentazione oggetto della presente ai Comuni interessati non sono pervenute osservazioni;

ritenuto pertanto:

- di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 come indicato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di accogliere le motivazioni del gestore sui ritardi e gli scostamenti riscontrati;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, unanimi a favorevoli n. 17 (quote 65,1), contrari 0, astenuti 0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 per il gestore Montagna 2000 S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

ALLEGATO n.1 - Deliberazione del Consiglio Locale di Parma n.6 del 11.05.2018



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2016
Gestore: MONTAGNA 2000 S.p.A. (PR)

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2016, del Programma Operativo degli interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n. 2 del 24 marzo 2016, che il gestore Montagna 2000 ha presentato attraverso il software ARSI.

PIANIFICATO 2016		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2016	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 1.218.000	-€ 774.231	€ 443.769	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 0	€ 0	€ 0	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 1.218.000	-€ 774.231	€ 443.769	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

BERCETO				
PIANIFICATO 2016		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2016	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 75.000	-€ 72.972	€ 2.028	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 0	€ 0	€ 0	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 75.000	-€ 72.972	€ 2.028	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]

TAB.2 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato - territorio di BERCETO

Dalla Tabella 1 riepilogativa si nota come il gestore MONTAGNA 2000 abbia effettuato nel corso del 2016 investimenti netti (a tariffa) in misura nettamente inferiore, rispetto a quanto pianificato, per un importo di **- € 774.231**.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati, si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

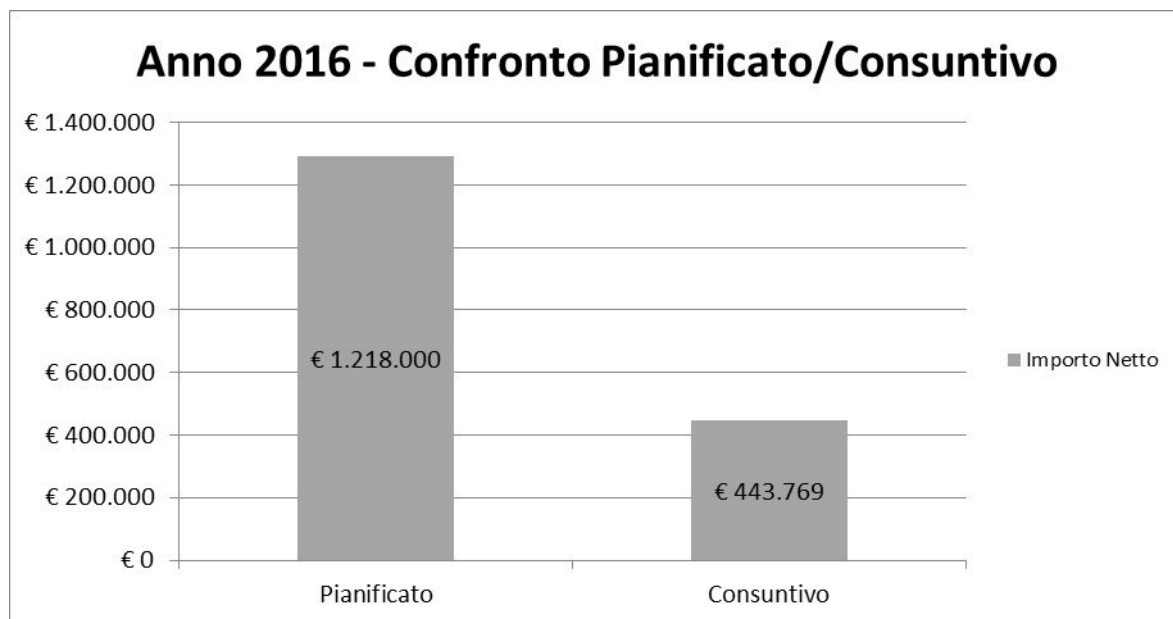


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato programmato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento, che il gestore ha fornito, non risulta esaustiva.

Numero di interventi programmati nel 2016: n.24 - Numero di interventi rendicontati nel 2016: n.28

	Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2016	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2016	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	15	€ 0	€ 564.000	2016PRMA0091, 2014PRMA0007, 2014PRMA0018, 2016PRMA0094, 2016PRMA0099, 2014PRMA0084, 2016PRMA0093, 2016PRMA0102, 2016PRMA0103, 2014PRMA0051, 2014PRMA0060, 2014PRMA0069, 2014PRMA0070, 2014PRMA0071, 2014PRMA0074
Interventi con avvio anticipato nel 2016 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma Interventi o nel Piano d'Ambito	19	€ 215.389	€ 0	no
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	7	€ 178.048	€ 595.000	2016PRMA0095 2016PRMA0096 2014PRMA0066
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	2	€ 50.332	€ 59.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA

TAB.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla Tabella 3 sopra riportata si nota come l'attività del gestore abbia avuto scostamenti nella realizzazione degli interventi rispetto alla pianificazione 2016 approvata.

Nello specifico dei 24 interventi pianificati nel 2016 solo 9 sono stati avviati e la maggior parte di questi (7) presenta uno scostamento $> \pm 20\%$ tra pianificato e consuntivo investimenti.

Il gestore ha prodotto chiarimenti rispetto agli scostamenti effettuati e in diversi casi le giustificazioni non sono state ritenute esaustive dall'Agenzia. Tuttavia sono state altresì prodotte ulteriori chiarimenti da parte del gestore, che sono riportate nella nota allegata prot. N. 00636/EG/eg del 21/03/2018 (agli atti della scrivente Agenzia prot. AT/2018/2032). Sono inoltre stati attuati controlli specifici.

Per avere però un quadro di maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

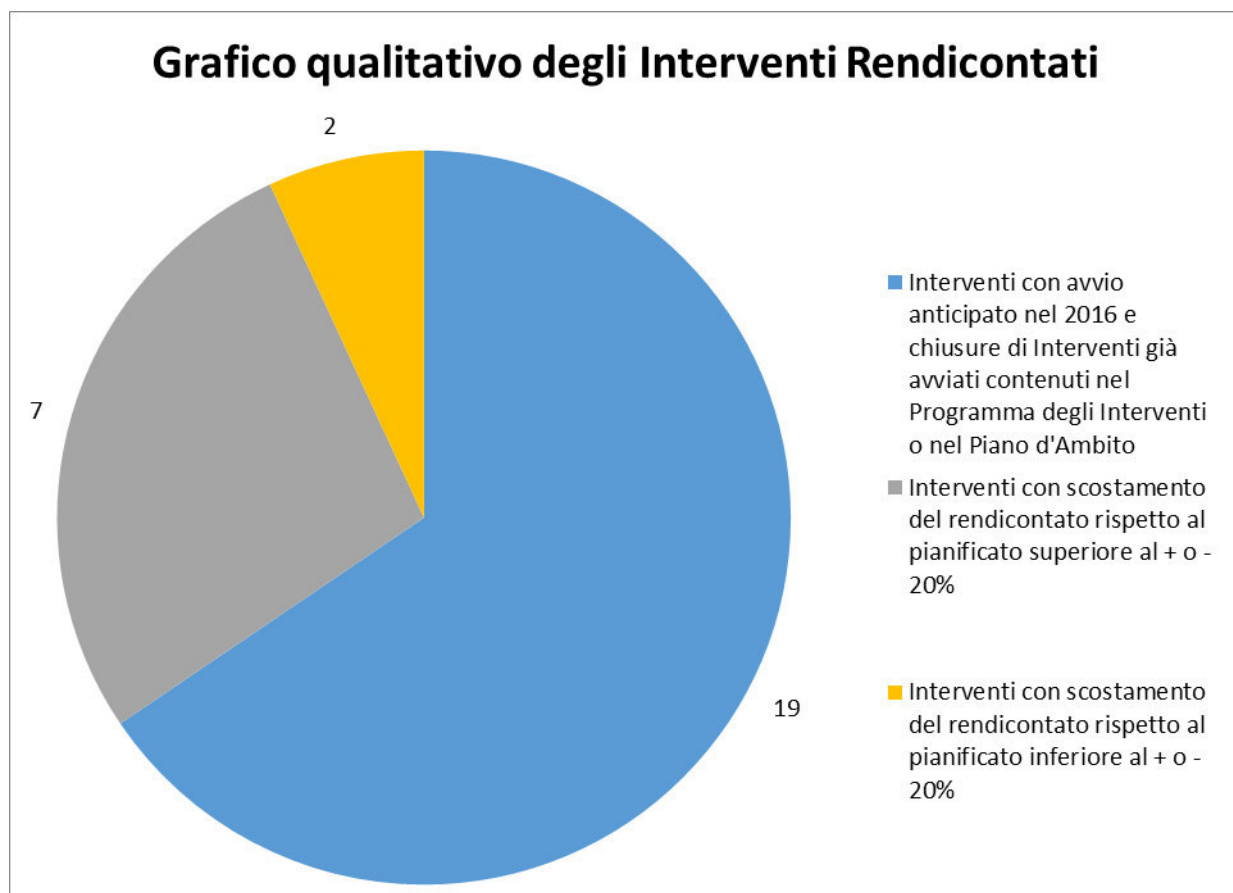


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ELENCO INTERVENTI NON AVVIATI – 2016

ID ATERSIR	Comuni	DESCRIZIONE INTERVENTO	Servizio	INVESTIMENTI LORDI 2016
2016PRMA0091	Albareto	Rifacimento e adeguamento della rete idrica di distribuzione del Capoluogo in Via Gotelli, via Partigiani per la Libertà, Via Sabini, ecc.	ACQUEDOTTO	35.000
2014PRMA0007	Bardi	BA126 - Sostituzione e adeguamento tratti reti idrica acquedotti Capoluogo, Lagacci, Granere e altri minori	ACQUEDOTTO	15.000
2014PRMA0018	Bedonia	BE118 - Recupero funzionale e messa in sicurezza opere di presa e serbatoio a servizio degli acquedotti di Scopolo-Pilati e Alpe	ACQUEDOTTO	15.000
2016PRMA0094	Bore	Ripristino sorgenti e serbatoi, sostituzione e adeguamento tratti di rete idrica acquedotti Capoluogo, Zani, Rovina ed altri minori	ACQUEDOTTO	28.000
2016PRMA0099	Fornovo di Taro	Completamento e messa in esercizio nuovo serbatoio idrico in loc. Case Tebaldi	ACQUEDOTTO	143.000
2014PRMA0084	Opere pluricomunali	RICA156 - Rilievi e cartografia	TUTTI	10.000
2016PRMA0093	Opere pluricomunali	Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	30.000
2016PRMA0102	Opere pluricomunali	Messa a norma degli impianti elettrici e interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti	ACQUEDOTTO	28.000
2016PRMA0103	Opere pluricomunali	Sistemi di telecontrollo dei serbatoi, degli impianti di depurazione e delle reti idriche-fognarie	TUTTI	10.000
2014PRMA0051	Pellegrino Parmense	PP140 - Sostituzione ed adeguamento impianti elettrici serbatoi Case Volpi, Varone ed altri Minori	ACQUEDOTTO	18.000
2014PRMA0060	Terenzo	TE65A-TE66F - Lavori di sostituzione tratti di rete fognaria ed idrica in loc. Boschi di Bardone	FOGNATURA	30.000
2014PRMA0069	Valmozzola	VA70A-VA72F -Lavori di costruzione impianto di depurazione in loc. Mormorola (AGGLOMERATO 145 A.E.)	DEPURAZIONE	52.000
2014PRMA0070	Valmozzola	VA72F- Lavori di costruzione rete fognaria ed impianto di trattamento reflui in loc. San Martino -La Borella (50AE), Maestri (35AE), Roncotasco (10AE) e rifacimento condotte in loc. diverse.	DEPURAZIONE	101.000
2014PRMA0071	Valmozzola	VA157 - Sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotti in loc. Mormorola, Mariano ecc..	ACQUEDOTTO	15.000
2014PRMA0074	Varano de' Melegari	VM134 - Sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica e impianto di sollevamento acquedotti Capoluogo e Castagnola.	ACQUEDOTTO	34.000
		TOTALE		564.000

TAB.3 Interventi previsti nel 2016 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

Borgo Val di Taro (PR), 21 marzo '18

Prot. n. 00636/EG/eg

A mezzo PEC

Spett.le
**ATERSIR - Agenzia Territoriale
dell'Emilia-Romagna
per i servizi idrici e rifiuti**
Via Cairoli, 8/F
40121 Bologna (BO)

c.a. dr. ing. Marco Grana Castagnetti
geom. Anna Maria Ramorino

Oggetto : attuazione parziale POI 2016 – considerazioni

Gentile Ing. Grana,

in relazione al POI 2016 per il quale è stato rendicontato sul portale ARSI l'importo di € 445.797,06 si ritiene doveroso, anche a seguito di Vostra richiesta, offrire una panoramica delle ragioni che hanno costretto la società a non cantierare opere pianificate nel piano operativo degli investimenti.

Al momento della nomina del nuovo management risalente al maggio 2015 per l'amministratore unico ed al settembre dello stesso anno per il direttore generale voluto proprio per garantire un cambio di gestione si è evidenziata una pesante situazione economica, finanziaria e di credibilità con i soci, le banche, gli utenti, i fornitori e con la stessa Agenzia che Lei rappresenta.

La società ha chiuso il bilancio al 31.12.2015 con l'inerzia della precedente gestione mentre il nuovo management cercava di comprendere le cause del dissesto finanziario e le azioni da intraprendere; il debito con i fornitori era fuori controllo ed il servizio non certo eccellente. Aggravava questa già fosca situazione la totale indisponibilità delle banche a finanziare la società associata ad un sistematico ricorso a pignoramenti e/o azioni invasive da parte dei fornitori.

Come era noto ai soci, alla stessa agenzia di regolazione e controllo, ed agli stakeholder la società versava in condizioni preagoniche al termine del 2015 ed il primo semestre 2016 è stato di forte sofferenza. Riteniamo quindi che nel corso del precedente anno la società ha fatto qualche intervento ed ha gettato le basi per il lavoro del 2017.

Le scelte societarie nel corso del secondo semestre del 2016 e nel 1Q 2017 non sono state del tutto libere ma condizionate e focalizzate a terminare quelle opere che potevano generare la perdita di contributi pubblici e/o sanzioni amministrative come nel caso di quelle comminate dalla Provincia di Parma.

Pur non appartenente al Servizio Idrico Integrato è stato necessario provvedere alla ristrutturazione del Centro di Raccolta del Comune di Fornovo di Taro (PR) per adempiere ad una obbligazione contrattuale contratta in passato e che avrebbe creato pregiudizio alla scrivente in caso di mancata ottemperanza. Il valore complessivo dell'opera è stato di k€ 137.

Tutte queste opere sono state finanziate con i risparmi ottenuti dalla ottimizzazione dei servizi e gestendo oculatamente i flussi di cassa in ingresso ed uscita; si precisa che le erogazioni a ML effettuate dagli Istituti di Credito sono avvenute nel corso del mese di agosto del 2017 e, in grade parte, si sono rese necessarie per far fronte ai costi dell'emergenza idrica che abbiamo tempestivamente rendicontato e che ancora oggi

Montagna 2000 s.p.a.

Sede legale: via Filippo Corridoni, 6 | 43043 Borgo Val di Taro (PR) | tel. 0525 922211 | fax. 0525 96452 |
montagna2000@legalmail.it

C. F. e P. IVA 01887790341 | REA di Parma n°185618 | www.montagna2000.it





dobbiamo completamente incassare . Nella situazione descritta , nel corso del 2016 , non si poteva fare altro che mettere in sicurezza la società garantendone la sopravvivenza e , con essa , quella dei Comuni Soci , dei fornitori , dei dipendenti . Quella di un intero territorio !

Nel corso del 2017 abbiamo rispettato gli impegni pianificati e , nella revisione straordinaria del POI , abbiamo inserito investimenti che compensano quelli non realizzati nel corso del 2016 *garantendo quindi che nel periodo 2016-2019 il volume complessivo degli investimenti finanziati con la tariffa sia quello previsto dal piano pur se con esecuzione in annualità diverse .*

Riteniamo che quanto sopra descritto , il puntuale adempimento della scrivente agli obblighi economici con l'Agencia in termini di canoni concessori correnti , costi di funzionamento e pagamento dell'ingente debito pregresso stiano a testimoniare la volontà ad adempiere agli obblighi assunti e da assumente .

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario o anche soltanto utile porgiamo distinti saluti.

Montagna 2000 S.p.A.

Il direttore generale

Emilio Guidetti



MONTAGNA 2000 (PR) - CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2016

ID ATERSIR	COMUNI	DESCRIZIONE INTERVENTO	Servizio	Importo progettuale	IMPORTO LORDO 2016	CONTRIBUTI 2016	IMPORTO NETTO 2016	IMPORTO LORDO 2016	CONTRIBUTI 2016	IMPORTO NETTO 2016	Scostamento %	Note del gestore scostamento > ± 20% del consuntivo rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016 per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PRMA0028	Bore	BO132 - Interventi vari	TUTTI		0	0	0	6.628	0	6.628	100	Il consuntivo è più alto perchè doveva essere inserito nel codice 2016PRMA0090
2014PRMA0029	Bore	BO133 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0	
2016PRMA0094	Bore	Ripristino sorgenti e serbatoi, sostituzione e adeguamento tratti di rete idrica acquedotti Capoluogo, Zani, Rovina ed altri minori	ACQUEDOTTO	43.000	28.000	0	28.000	0	0	0	-100	Previsto completamento nelle annualità successive
2014PRMA0030	Borgo Val di Taro	BVT100 - Adeguamento e recupero funzionale del serbatoio idrico in località Peticcio a servizio dell'acquedotto di Borgotaro Capoluogo	ACQUEDOTTO	53.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0031	Borgo Val di Taro	BVT101 - Potenziamento/rifacimento tratti acquedotto rurale delle Tre Fontane (ex PRIP 2011)	ACQUEDOTTO	175.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0032	Borgo Val di Taro	BVT102 - Completamento opere di presa acquedotto Tre Fontane e collegamento alla rete di adduzione	ACQUEDOTTO	42.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0033	Borgo Val di Taro	BVT103 - Rifacimento/estensione collettore fognario nel Rio Varacola in loc. Costazza	FOGNATURA	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0034	Borgo Val di Taro	BVT104 - Rifacimento e messa a norma impianto di trattamento reflui in loc. Monticelli (100AE)	DEPURAZIONE	56.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0035	Borgo Val di Taro	BVT105 - Interventi vari	TUTTI		0	0	0	12.627	0	12.627	100	Il consuntivo è più alto perchè doveva essere inserito nel codice 2016PRMA0090
2014PRMA0036	Borgo Val di Taro	BVT106 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0037	Borgo Val di Taro	BVT107 - Sistemazione reti di adduzione acquedotti	ACQUEDOTTO	45.000	0	0	0	0	0	0	0	
2016PRMA0095	Borgo Val di Taro	Rifacimento parziale e recupero funzionale cunicolo fognario in Piazza Verdi.Largo Roma nel Capoluogo	FOGNATURA	100.000	100.000	0	100.000	20.500	0	20.500	-79	Previsto completamento nelle annualità successive
2016PRMA0096	Borgo Val di Taro	Potenziamento sistema depurativo (II livello) dell'agglomerato di Borgotaro (7.500 AE)	DEPURAZIONE	200.000	200.000	0	200.000	46.978	0	46.978	-76	Lavori completati al 30.04.2017
2014PRMA0038	Compiano	CO121 - Rifacimento/potenziamento tratti di rete di distribuzione di Sugremaro e Compiano Capoluogo	ACQUEDOTTO	65.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0039	Compiano	CO122 - Potenziamento/miglioramento acquedotto rurale di Costa Mezzana, Oratorio, ecc. (PRIP 2011)	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0040	Compiano	CO123 - Interventi vari	TUTTI		0	0	0	4.779	0	4.779	100	Il consuntivo è più alto perchè doveva essere inserito nel codice 2016PRMA0090
2014PRMA0041	Compiano	CO124 - Telecontrollo serbatoi idrici e sollevamento fognario di Isola	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0042	Compiano	CO125 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0	
2016PRMA0097	Compiano	Lavori di miglioramento e adeguamento acquedotti minori e reti di distribuzione	ACQUEDOTTO	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
2016PRMA0098	Compiano	Ampliamento depuratore a servizio dell'agglomerato di Sugremaro (a.e.>200)	DEPURAZIONE	225.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0043	Fornovo di Taro	FDT146 - Variante alla condotta di pompaggio acquedotto del Capoluogo e alimentazione località Salita con consolidamento area	ACQUEDOTTO	185.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0044	Fornovo di Taro	FDT147 - Lavori di ristrutturazione impianto sollevamento gallerie filtranti	ACQUEDOTTO	100.000	0	0	0	2.500	0	2.500	100	Prevista realizzazione negli anni successivi al 2019
2014PRMA0045	Fornovo di Taro	FDT148 - Lavori di ristrutturazione depuratore del Capoluogo (II livello)	DEPURAZIONE	150.000	0	0	0	600	0	600	100	lavori in corso di realizzazione
2014PRMA0046	Fornovo di Taro	FDT149 - Lavori di ristrutturazione rete fognaria del Capoluogo	FOGNATURA	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0047	Fornovo di Taro	FDT150 - Interventi vari	TUTTI		0	0	0	10.824	0	10.824	100	Il consuntivo è più alto perchè doveva essere inserito nel codice 2016PRMA0090
2014PRMA0048	Fornovo di Taro	FDT151 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0049	Fornovo di Taro	FDT152 - Telecontrolli serbatoi	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0	
2016PRMA0099	Fornovo di Taro	Completamento e messa in esercizio nuovo serbatoio idrico in loc. Case Tebaldi	ACQUEDOTTO	143.000	143.000	0	143.000	0	0	0	-100	Previsto completamento opere annualità successive.
2016PRMA0106	Fornovo di Taro, Terenzo	* Interventi strutturali necessari al superamento delle criticità sull'acquedotto intercomunale Monte Bosso, a servizio dei comuni di Fornovo di Taro e Terenzo	ACQUEDOTTO	67.587	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0084	Opere pluricomunali	RICA156 - Rilievi e cartografia	TUTTI	100.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	Previsto completamento nelle annualità successive

MONTAGNA 2000 (PR) - CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2016

ID ATERSIR	COMUNI	DESCRIZIONE INTERVENTO	Servizio	Importo progettuale	IMPORTO LORDO 2016	CONTRIBUTI 2016	IMPORTO NETTO 2016	IMPORTO LORDO 2016	CONTRIBUTI 2016	IMPORTO NETTO 2016	Scostamento %	Note del gestore scostamento > ± 20% del consuntivo rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016 per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PRMA0085	Opere pluricomunali	DEP157 -Interventi di adeguamento al sistema depurativo (sistemazione fosse Imhoff, rifacimenti carraie e recinzioni, realizzazione dissabbiatori in testa alle fosse, adeguamento by-pass, sostituzione chiusini, allacciamento scarichi)	DEPURAZIONE	135.000	0	0	0	1.378	0	1.378	100	Rientrano tra i lavori in corso
2016PRMA0090	Opere pluricomunali	Interventi vari di manutenzione straordinaria	TUTTI	1.000.000	165.000	0	165.000	84.000	0	84.000	-49	Opere inserite nelle manutenzioni straordinarie dei vari comuni.
2016PRMA0093	Opere pluricomunali	Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	200.000	30.000	0	30.000	0	0	0	-100	Previsto completamento nelle annualità successive
2016PRMA0101	Opere pluricomunali	Lavori di messa in sicurezza delle captazioni idriche	ACQUEDOTTO	350.000	50.000	0	50.000	9.770	0	9.770	-80	Progetto in attesa di autorizzazione definitiva da parte dei comuni.
2016PRMA0102	Opere pluricomunali	Messa a norma degli impianti elettrici e interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti	ACQUEDOTTO	200.000	28.000	0	28.000	0	0	0	-100	Previsto completamento nelle annualità successive.
2016PRMA0103	Opere pluricomunali	Sistemi di telecontrollo dei serbatoi, degli impianti di depurazione e delle reti idriche-fognarie	TUTTI	150.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	Lavori in corso di esecuzione
2014PRMA0050	Pellegrino Parmense	PP139 - Sostituzione ed adeguamento tratti rete idrica acquedotti Capoluogo, Ca' del Rengo ed altri minori	ACQUEDOTTO	60.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0051	Pellegrino Parmense	PP140 - Sostituzione ed adeguamento impianti elettrici serbatoi Case Volpi, Varone ed altri Minori	ACQUEDOTTO	33.000	18.000	0	18.000	0	0	0	-100	Lavori in corso di affidamento.
2014PRMA0052	Pellegrino Parmense	PP141 - Interventi vari	TUTTI		0	0	0	30.829	0	30.829	100	Il consuntivo è più alto perchè doveva essere inserito nel codice 2016PRMA0090
2014PRMA0053	Pellegrino Parmense	PP142 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0054	Solignano	SOL159 - Ripristino sorgenti, sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotto Capoluogo, Fopla e loc. diverse	ACQUEDOTTO	40.000	40.000	0	40.000	12.000	0	12.000	-70	Completamento anni successivi
2014PRMA0055	Solignano	SOL160 - Lavori di ristrutturazione condotte idriche del Capoluogo	ACQUEDOTTO	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0056	Solignano	SOL161 - Completamento rete fognaria e fossa imhoff in loc. Case Boselli di Fosio	DEPURAZIONE	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0057	Solignano	SOL162 - Lavori di miglioramento e potenziamento reti fognarie del Capoluogo	FOGNATURA	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0058	Solignano	SOL163 - Interventi vari	TUTTI		0	0	0	11.357	0	11.357	100	Il consuntivo è più alto perchè doveva essere inserito nel codice 2016PRMA0090
2014PRMA0059	Solignano	SOL164 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0	
2016PRMA0100	Solignano	Lavori di miglioramento e potenziamento reti di adduzione e distribuzione degli acquedotti funzionali	ACQUEDOTTO	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0060	Terenzo	TE65A-TE66F - Lavori di sostituzione tratti di rete fognaria ed idrica in loc. Boschi di Bardone	FOGNATURA	68.000	30.000	0	30.000	0	0	0	-100	Prevista realizzazione anni successivi
2014PRMA0061	Terenzo	TE165 - Lavori di rifacimento tratti di condotte fognarie nel Capoluogo	FOGNATURA	35.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0062	Terenzo	TE166 - Interventi vari	TUTTI		0	0	0	8.314	0	8.314	100	Il consuntivo è più alto perchè doveva essere inserito nel codice 2016PRMA0090
2014PRMA0063	Terenzo	TE167 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0064	Tornolo	TE168 - Installazione di telecontrolli sui serbatoi idrici di Tarsogno, Tornolo e S.Maria del Taro	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0065	Tornolo	TO86 - Sistemazione ed adeguamento impianto di depurazione di Tarsogno (AGGLOMERATO 547 A.E.)	DEPURAZIONE	28.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0066	Tornolo	TO169 - Ristrutturazione vecchi allacciamenti utenze acquedotti in località varie	ACQUEDOTTO	60.000	30.000	0	30.000	1.250	0	1.250	-95	Previsto completamento anni successivi
2014PRMA0067	Tornolo	TO170 - Interventi vari	TUTTI		0	0	0	11.025	0	11.025	100	Il consuntivo è più alto perchè doveva essere inserito nel codice 2016PRMA0090
2014PRMA0068	Tornolo	TO171 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0069	Valmazzola	VA70A-VA72F -Lavori di costruzione impianto di depurazione in loc. Mormorola (AGGLOMERATO 145 A.E.)	DEPURAZIONE	52.000	52.000	0	52.000	0	0	0	-100	Lavoro completato nel 2017
2014PRMA0070	Valmazzola	VA72F- Lavori di costruzione rete fognaria ed impianto di trattamento reflui in loc. San Martino -La Borella (50AE), Maestri (35AE), Roncotasco (10AE) e rifacimento condotte in loc. diverse.	DEPURAZIONE	137.000	101.000	0	101.000	0	0	0	-100	Previsto completamento anni successivi
2014PRMA0071	Valmazzola	VA157 - Sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotti in loc. Mormorola, Mariano ecc..	ACQUEDOTTO	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	-100	Previsto completamento anni successivi

MONTAGNA 2000 (PR) - CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2016

ID ATERSIR	COMUNI	DESCRIZIONE INTERVENTO	Servizio	Importo progettuale	IMPORTO LORDO 2016	CONTRIBUTI 2016	IMPORTO NETTO 2016	IMPORTO LORDO 2016	CONTRIBUTI 2016	IMPORTO NETTO 2016	Scostamento %	Note del gestore scostamento > ± 20% del consuntivo rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016 per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PRMA0072	Valmazzola	VA158 - sistemi di contabilizzazione acqua	TUTTI		0	0	0	4.242	0	4.242	100	Realizzazione di interventi
2014PRMA0073	Valmazzola	VAR156 - Interventi vari	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0074	Varano de' Melegari	VM134 - Sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica e impianto di sollevamento acquedotti Capoluogo e Castagnola.	ACQUEDOTTO	114.000	34.000	0	34.000	0	0	0	-100	Completato primo semestre del 2017
2014PRMA0075	Varano de' Melegari	VM135 - Adeguamento e sostituzione tratti di rete idrica in Loc. Riviano, Monte Salso, Monti Alti e altre minori.	ACQUEDOTTO	65.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0076	Varano de' Melegari	VM136 - Interventi vari	TUTTI		0	0	0	4.095	0	4.095	100	Il consuntivo è più alto perchè doveva essere inserito nel codice 2016PRMA0090
2014PRMA0077	Varano de' Melegari	VM137 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0078	Varano de' Melegari	VM138 - Realizzazione impianti di telecontrollo serbatoi Pozzo Peschiera, Castagnola, Castello, Monte Mariolo e Lovai	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0	
2016PRMA0107	Varano de' Melegari	* Collettore acque reflue Viazzano e Piani Riva	FOGNATURA		0	0	0	39.124	0	39.124	100	Intervento nuovo inserimento
2014PRMA0079	Varsi	81MD - Lavori di ripristino sorgenti e serbatoi e sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotti in loc. Varsi, Rocca, Sgui e Baghetti	ACQUEDOTTO	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0080	Varsi	VAR153 - Lavori di ripristino sorgenti e serbatoi e sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotti frazionali	ACQUEDOTTO	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0081	Varsi	VAR80F-VAR82F - Lavori di costruzione impianto di trattamento reflui in loc. Lubbia di sopra e adeguamento collettori nel Capoluogo e in loc. Pontremoli - 1° STRALCIO	DEPURAZIONE	35.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0082	Varsi	VAR154 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0083	Varsi	VAR155 - Interventi vari	TUTTI		0	0	0	11.322	0	11.322	100	Il consuntivo è più alto perchè doveva essere inserito nel codice 2016PRMA0090
2016PRMA0104	Varsi	Realizzazione nuova linea di distribuzione a servizio di via Cenni nel Capoluogo	ACQUEDOTTO	19.000	19.000	0	19.000	15.161	0	15.161	-20	Economie, ribassi d'asta.
		TOTALE INTERVENTI 2016			1.218.000	0	1.218.000	443.769	0	443.769		

ID ATERSIR	COMUNI	DESCRIZIONE INTERVENTO	Servizio	Importo progettuale	IMPORTO LORDO 2016	CONTRIBUTI 2016	IMPORTO NETTO 2016	IMPORTO LORDO 2016	CONTRIBUTI 2016	IMPORTO NETTO 2016	Scostamento %	Note del gestore scostamento > ± 20% del consuntivo rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016 per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PRMA0022	Berceto	BER143 - Ristrutturazione rete fognaria in loc. Fugazzolo di Sotto, Tralariva e Case Brusini	FOGNATURA	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0023	Berceto	BER144 - Interventi vari (comprese manutenzioni straordinarie)	TUTTI	30.000	15.000	0	15.000	2.028	0	2.028	-86	Comune uscito dalla gestione di Montagna 2000
2014PRMA0021	Berceto	16MD - Lavori di sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotti in località Pian Farioli, Ghiare ed altri minori	ACQUEDOTTO	120.000	60.000	0	60.000	0	0	0	-100	Comune uscito dalla gestione di Montagna 2000 S.p.A.
2015PRMA0086	Berceto	BER14D - adeguamento depuratori Capoluogo e Ghiare	DEPURAZIONE	70.883	0	0	0	0	0	0	0	
2015PRMA0088	Berceto	BER16A - Ripristino sorgenti , sostituzione adeguamento tratti rete idrica acquedotti località Cervellino, Corchia e altri minori	ACQUEDOTTO	140.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PRMA0087	Berceto	BER15F - Adeguamento collettore via di Sales e località Poggio	FOGNATURA	140.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0024	Berceto	BER145 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE INTERVENTI 2016			75.000	0	75.000	2.028	0	2.028		

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 6 dell'11 maggio 2018.

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Montagna 2000 S.p.A. Programma Operativo
Interventi 2015-2019: approvazione consuntivo 2016.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 11 maggio 2018

Approvato e sottoscritto

La Coordinatrice del Consiglio Locale di Parma

F.to Tiziana Benassi

La segretaria verbalizzante

F.to Fausta Pizzaghi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 11 settembre 2018
