

CLPR/2020/1 del 15 gennaio 2020

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Emiliambiente S.p.A. approvazione del
consuntivo degli investimenti per l'anno 2018**

IL COORDINATORE
F.to Tiziana Benassi

CLPR/2020/1

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

L'anno **2020**, il giorno quindici del mese di gennaio, alle ore 14,00, presso Sala Consiglio del Comune di Parma, si è riunito il Consiglio Locale di Parma convocato con lettera PG/AT/2020/63 dell'8.01.2020.

Assume la presidenza il Coordinatore Locale, che chiama Fausta Pizzaghi, funzionaria di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretaria verbalizzante.

Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBARETO	Riccoboni Davide	Sindaco	SI'	0,6059
BARDI			NO	0,6385
BEDONIA			NO	0,8811
BERCETO			NO	0,6019
BORE			NO	0,3471
BORGO VAL DI TARO	Rossi Diego	Sindaco	SI'	1,5743
BUSSETO			NO	1,5303
CALESTANO			NO	0,5809
COLLECCHIO	Dodi Gian Carlo	Vice Sindaco	SI'	2,8284
COLORNO	Grassi Mirka	Assessore	SI'	1,8860
COMPIANO	Mariani Francesco	Sindaco	SI'	0,4083
CORNIGLIO			NO	0,5741
FELINO	Leoni Elisa	Sindaco	SI'	1,8294
FIDENZA	Amigoni Franco	Assessore	SI'	5,0320
FONTANELLATO			NO	1,5152
FONTEVIVO			NO	1,2243
FORNOVO DI TARO	Cardi Lucia	Assessore	SI'	1,3691
LANGHIRANO			NO	2,0497
LESIGNANO DE' BAGNI	Bruzzone Gianni	Vice Sindaco	SI'	1,0975

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
MEDESANO	Cantoni Gianpaolo	Vice Sindaco	SI'	2,2163
MONCHIO DELLE CORTI			NO	0,3823
MONTECHIARUGOLO			NO	2,1820
NEVIANO DEGLI ARDUINI			NO	0,8951
NOCETO	Maini Giovanna	Assessore	SI'	2,6033
PALANZANO			NO	0,4164
PARMA	Benassi Tiziana	Assessore	SI'	33,5283
PELLEGRINO PAR.SE			NO	0,3977
POLESINE - ZIBELLO			NO	1,3746
ROCCABIANCA			NO	0,7772
SALA BAGANZA			NO	1,2175
SALSOMAGGIORE TERME	Taccagni Marco	Presidente Consiglio com.le	SI'	3,8919
S. SECONDO PAR.SE			NO	1,2415
SISSA TRECASALI	Bernardi Nicola	Sindaco	SI'	1,7100
SOLIGNANO			NO	0,5385
SORAGNA			NO	1,1189
SORBOLO MEZZANI	Comelli Marco	Assessore	SI'	2,6562
TERENZO			NO	0,4221
TIZZANO VAL PARMA			NO	0,5961
TORNOLO			NO	0,4045
TORRILE	Gentile Antonio	Vice Sindaco	SI'	1,6090
TRAVERSETOLO	Lanzi Michele	Assessore	SI'	1,9533
VALMOZZOLA			NO	0,3031
VARANO DE' MELEGARI	Restiani Giuseppe	Sindaco	SI'	0,7052
VARSÌ			NO	0,4384
PROVINCIA DI PARMA	Rossi Diego	Presidente	SI'	10,000



Presenti n. 19 quote 77,50 Assenti n. 26 quote 22,50

Riconosciuta la validità della seduta Tiziana Benassi, in qualità di Coordinatore, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Emiliambiente S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2018

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'Ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.2 del 24 marzo 2016 e n.7 del 11 maggio 2018 del Consiglio locale di Parma è stato approvato il Programma operativo degli interventi per gli anni 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore Emiliambiente S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- la deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 inoltre dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

- con deliberazione n. 60 del 25 luglio 2018 del Consiglio d'ambito è stato approvato l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria vigente (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, per il bacino tariffario di Parma gestito da EMILIAMBIENTE S.p.A;

dato atto che il gestore Emiliambiente S.p.A ha completato la rendicontazione degli investimenti 2018 attraverso il software ARSI;

rilevato che dai dati presentati è emerso per l'annualità 2018 che:

- non sono stati introdotti interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal programma operativo degli interventi 2015-19, approvato con deliberazioni n.2 del 24 marzo 2016 e n.7 del 11 maggio 2018 del Consiglio Locale di Parma, ai sensi della Delibera n° 75 del 12 ottobre 2017;
- non è stato avviato n. 1 intervento, finanziato al 50% con contributi Fondo Sviluppo Coesione, posticipandolo alle annualità successive, per un importo complessivo lordo di €. 10.000;
- sono stati anticipati/conclusi n. 4 interventi previsti in altre annualità per un importo complessivo lordo di €.37.713;
- per n.6 interventi si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- gli investimenti realizzati risultano essere di importo inferiore rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 approvato per l'annualità 2018;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

dato atto che il Gestore ha inoltre avviato nel 2017 e terminato nel 2018 una serie di interventi nei territori maggiormente colpiti dalla crisi idrica, finanziati dalla Protezione Civile – atto DPGR n.158/2017, DPGR 178/2017 e DPC 1922/2019, attualmente in corso di rendicontazione, relativamente ad interventi conclusi non compresi nell'importo pianificato 2018;

ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2018 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n. 19 (quote 77,50), voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2018 per il gestore Emiliambiente S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2018
Gestore: Emiliambiente S.p.A. (PR)**

15 gennaio 2020

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2018

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2018, del Programma Operativo Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.2 del 24 marzo 2016 e revisionato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.7 del 11 maggio 2018, su proposta presentata dal gestore Emiliambiente S.p.A. entro marzo 2018.

Il consuntivo è desunto dal software ARSI.

PIANIFICATO 2018		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2018	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 2.618.400	- € 160.734	€ 2.457.666	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 25.000	€ 243.508	€ 268.508	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 2.593.400	- € 404.242	€ 2.189.158	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore Emiliambiente S.p.A. abbia effettuato minori investimenti rispetto alla pianificazione approvata e precisamente: rispetto agli investimenti lordi la differenza ammonta a - € 160.734, mentre facendo il confronto con gli investimenti netti è di - € 404.242 a fronte dei maggiori contributi incassati pari ad € 243.508, non sono stati considerati gli Investimenti di Struttura.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

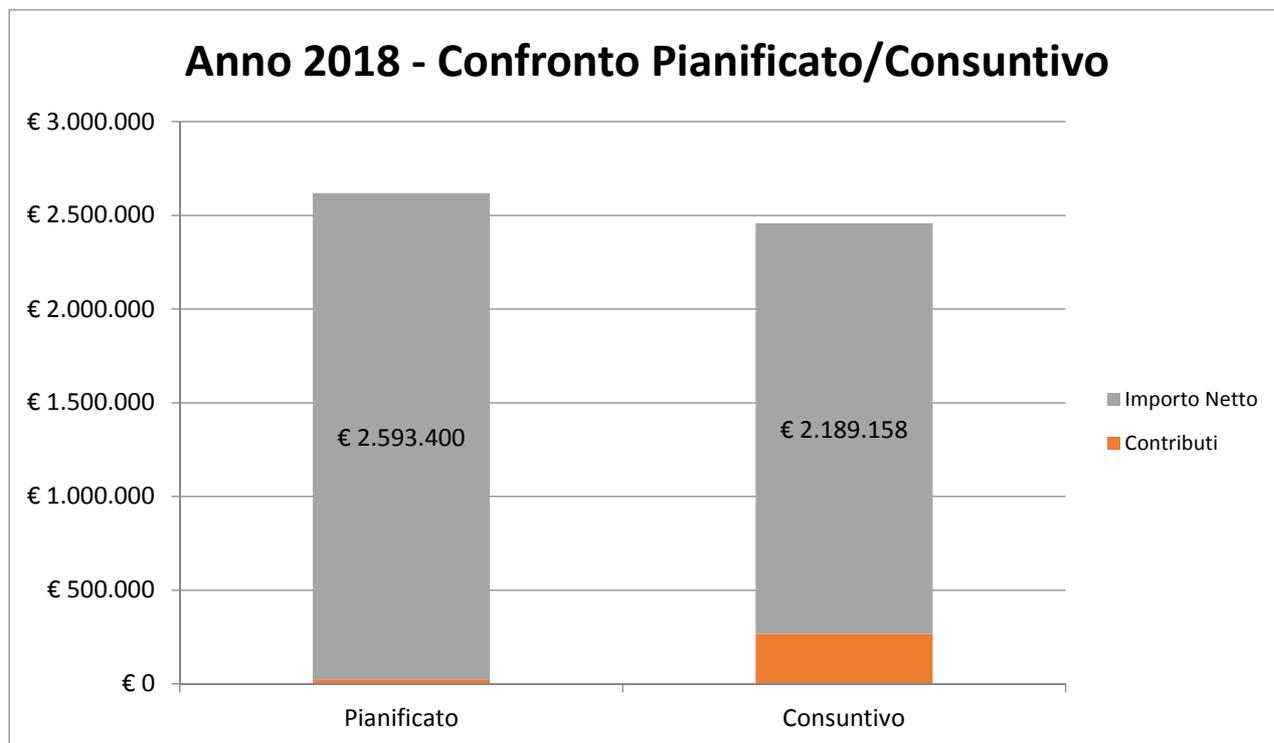


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018

ULTERIORI INTERVENTI EMERGENZA IDRICA FINANZIATI DALLA PROTEZIONE CIVILE

INCREMENTO CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2018

Il gestore ha inoltre avviato nel 2017, e terminato nel 2018, una serie di interventi nei territori maggiormente colpiti dalla crisi idrica, finanziati dalla Protezione Civile - atto DPGR n. 158/2017, DPGR 178/2017 e DPC 1922/2019 – per un importo di circa €. 540.688 attualmente in corso di rendicontazione, sono stati rilasciati 4 visti per un importo pari ad €. 534.789, relativamente ad interventi conclusi non compresi nell'importo pianificato 2018.

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2018: 9

Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2018: 12

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2018	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2018	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	1	€ 0	€ 10.000	NO	2018PREA0033	
Interventi con avvio anticipato nel 2018 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	4	€ 37.713	€ 0	NO	2014PREA0023 2016PREA0030 2014PREA0010 2014PREA0013	
Interventi avviati nel 2018 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0					
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	6	€ 1.197.631	€ 1.578.400	NO	2014PREA0015 2014PREA0021 2014PREA0016 2018PREA0032 2014PREA0012 2018PREA0035	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	2	€ 1.222.322	€ 1.030.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che il gestore, nel 2018, non ha avviato n.1 intervento che era stato programmato (per l'elenco si veda la Tabella "Allegato 1"), e per il quale la giustificazione è risultata esaustiva.

Ha avviato anticipatamente oppure chiuso rispetto a quanto programmato n.4 interventi e n.6 interventi hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno e per i quali la giustificazione è risultata esaustiva. Per n.2 interventi lo scostamento è inferiore al +/- 20% e quindi non passibile di giustificazione.

Risultano esclusi dalle tabelle e dai grafici della presente relazione gli ulteriori interventi dovuti all'emergenza idrica e finanziati dalla Protezione Civile che sono stati realizzati tra l'annualità 2017 e il 2018, attualmente in corso di rendicontazione.

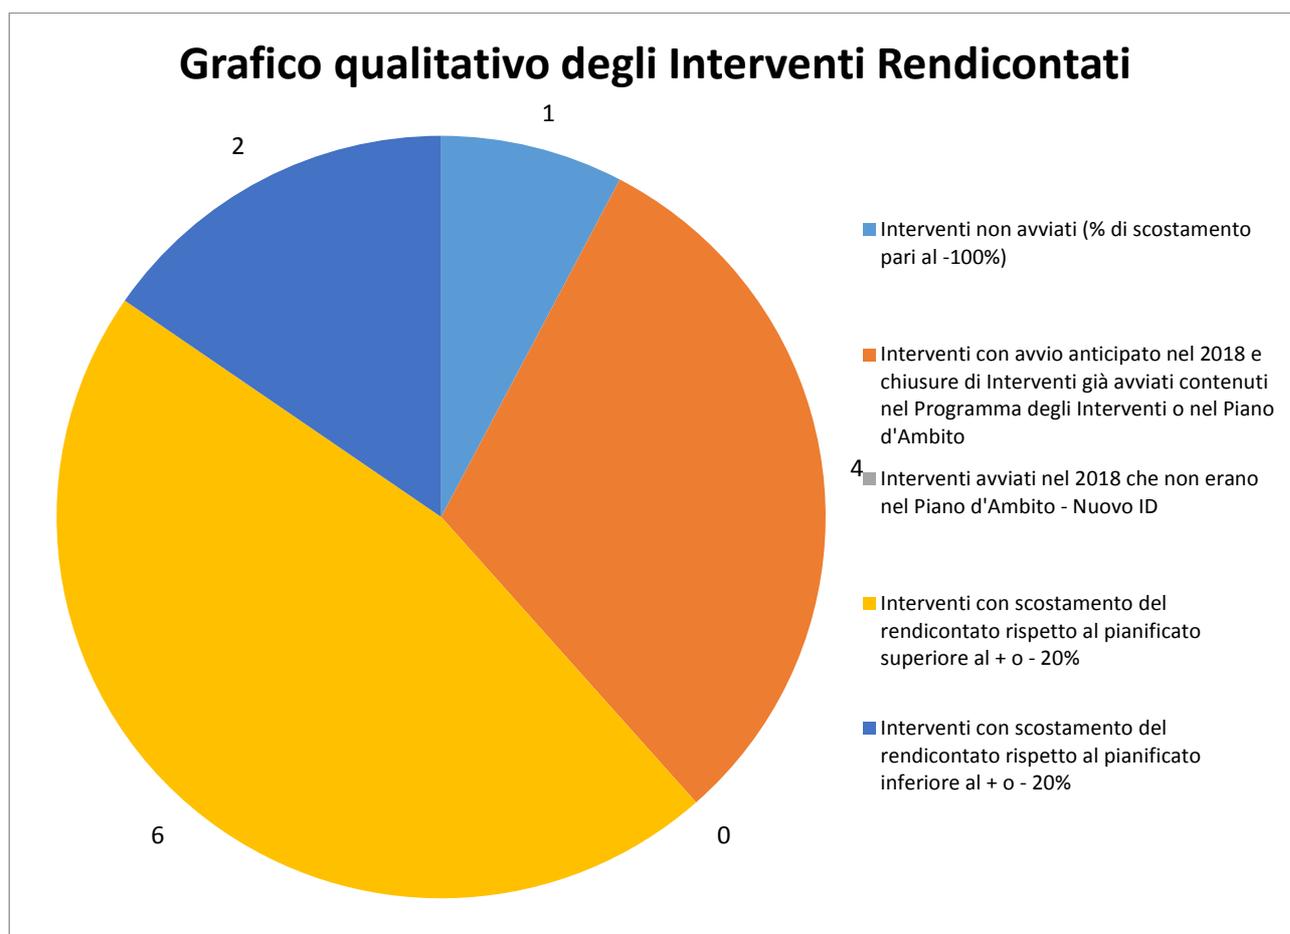


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

Comune	ID ATERSIR	Descrizione intervento	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	INVESTIMENTI LORDI 2018
Opere pluricomunali	2018PREA0033	Ricerca perdite acquedotto, contatori, pressioni e sostituzione contatori - FSC	400.000	10.000

TAB 3. Interventi previsti nel 2018 e non realizzati (percentuale di scostamento pari a -100%)

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendiconto rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PREA0001	Potenz.depuratore Busseto (abbattimento azoto/linea fanghi) + Adeguamento impianto depuraz. Busseto	DEPURAZIONE	Busseto	700.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PREA0002	008-EA - Condotte fognarie collettamento reflui Vedole-Colorno	FOGNATURA	Colorno	205.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PREA0003	009-EA - Adeguamento e potenziamento depuratore Fidenza	DEPURAZIONE	Fidenza	1.587.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PREA0004	013-EA - Condotte fognarie collettamento reflui S.Margherita-Fidenza per adeguamento scarichi EA 200-2000	FOGNATURA	Fidenza	500.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PREA0005	019-EA - Adeguamento e miglioramento reti e imp.acqua e sistema fognario-depurativo	FOGNATURA	Fontanellato	400.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PREA0006	022-EA - Realizzazione fognatura per collettamento reflui Ragazzola a Roccabianca	FOGNATURA	Roccabianca	330.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PREA0007	024-EA - Adeguamento impianto depurazione San Secondo, livello III.	DEPURAZIONE	San Secondo	160.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PREA0008	030-EA - Rifacimento condotta alimentazione San Polo	ACQUEDOTTO	Torrile, Colorno	425.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PREA0009	032-EA - Depuratore Vicomero (quotaparte)	FOGNATURA	Torrile	130.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PREA0010	034-EA - Collettamento Viarolo a R.C.Canneto e potenziamento depuratore	FOGNATURA	Sissa Trecasali	1.060.000	0	0	0	843	0	843	100%	Chiusura contabilità lavori.
2014PREA0011	037-EA - Sostituzione condotta adduttrice interconnessione comuni della Bassa	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	1.567.100	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PREA0012	041-EA - Manut. Straordinaria reti e centrali di adduzione	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	1.440.000	250.000	0	250.000	388.327	0	388.327	55%	Maggiori spese dovute all'esecuzione di alcuni interventi molto rilevanti e non preventivati (sostituzione rete Dn. 400 in via XI Febbraio-Trecasali - 60.000 circa - Sostituzione rete Dn. 300 in via 1° Maggio a S.Polo - 40.000 circa - Risanamento pensile di Priorato - 30.000 circa
2014PREA0013	042-EA - Potenziamento telecontrollo rete idrica e fognaria	TUTTI	Opere pluricomunali	295.000	0	0	0	1.709	0	1.709	100%	Completamento lavori avviati negli anni precedenti
2014PREA0014	043-EA - Manut. straordinaria reti e centrali di distribuzione	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	6.900.000	1.010.000	0	1.010.000	1.202.971	252.020	950.950	19%	
2014PREA0015	045-EA - Manutenzione straordinaria patrimonio in uso (impianti, reti fognatura e depurazione)	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	6.351.601	1.086.000	0	1.086.000	740.015	16.488	723.527	-31%	Economie di spesa dovute a ritardi da parte dell'impresa nell'esecuzione delle opere previste

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PREA0016	054-EA - Realizzazione collettore fognario e aumento potenzialità del depuratore di Colorno sud (3° Livello).	DEPURAZIONE	Colorno	720.000	122.400	0	122.400	17.169	0	17.169	-85%	Ritardo nell'affidamento dei lavori. Contratto da stipulare nel 2019
2014PREA0017	055-EA - Sistema fognario-depurativo SALSOMAGGIORE-Fidenza. Potenziamento depuratore urbano Fidenza 2°stralcio	DEPURAZIONE	Fidenza, Salsomaggiore	10.900.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PREA0018	057-EA - Riqualficazione impianti e reti acquedotto/fognatura Salsomaggiore	FOGNATURA	Salsomaggiore	8.770.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PREA0019	058-EA - Rifacimento e potenziamento reti acquedotto e serbatoio Salsomaggiore	ACQUEDOTTO	Salsomaggiore	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PREA0020	060-EA - Bonifica c.le di Priorato ed efficientamento pozzi nelle c.li di captazione.	ACQUEDOTTO	Fontanellato, Fidenza	2.410.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PREA0021	061-EA - Ricerca perdite acquedotto, controllo pressioni, sostituzione contatori	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	3.590.000	100.000	0	100.000	37.202	0	37.202	-62%	Eseguito parzialmente in quanto nel 2019 verrà avviato un intervento massivo di ricerca perdite sull'intero territorio in gestione.
2014PREA0022	062-EA - Potenziamento impianto di depurazione di Treccasali (2° liv.)	DEPURAZIONE	Sissa Treccasali	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PREA0023	063-EA - SIT Cartografia e modellazione reti	TUTTI	Busseto, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Roccabianca, San Secondo, Salsomaggiore, Torrile, Sissa Treccasali, Opere pluricomunali	490.000	0	0	0	10.100	0	10.100	100%	Aggiornamento SIT come previsto dalla normativa Rer
2014PREA0024	046-EA - Quota allestimento sede e attrezzature (HW SW)	STRUTTURA	Colorno, Fidenza, Fontanellato, Roccabianca, San Secondo, Salsomaggiore, Torrile, Sissa Treccasali, Opere pluricomunali, Busseto	3.039.000	200.000	0	200.000	200.677	0	200.677	0%	
2015PREA0025	007-EA - Depurazione reflui Mezzano Rondani	DEPURAZIONE	Colorno		0	0	0	0	0	0	0%	
2015PREA0026	003-EA - Collettamento reflui Soragna Busseto	FOGNATURA	Busseto, Soragna		0	0	0	0	0	0	0%	
2015PREA0027	031-EA - Collettamento reflui S.Andrea al depuratore di S.Polo	FOGNATURA	Torrile		0	0	0	0	0	0	0%	
2015PREA0028	056-EA - Adeguamento scarichi acque reflue Fontanellato	DEPURAZIONE	Fontanellato		0	0	0	0	0	0	0%	
2015PREA0029	044-EA - Strumentazione per attività di ricerca perdite	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	325.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PREA0030	Intervento di riqualificazione strutturale (realizzazione laboratorio, locali telecontrollo, viabilità) dep. di Fidenza e realizzazione asfalto.	DEPURAZIONE	Fidenza	400.000	0	0	0	25.060	0	25.060	100%	Anticipazione di alcune opere propedeutiche alla realizzazione del manto stradale previsto nel 2019

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2016PREA0031	Installazione inverter nelle c.li di captazione	ACQUEDOTTO	Fontanellato, Fidenza, Salsomaggiore	150.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PREA0032	Manutenzione straordinaria della centrale idrica di Parola (Fidenza) - FSC	ACQUEDOTTO	Fidenza	600.000	10.000	5.000	5.000	14.087	0	14.087	40%	Le spese progettuali sono state maggiori rispetto a quello preventivato
2018PREA0033	Ricerca perdite acquedotto, contatori, pressioni e sostituzione contatori - FSC	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	400.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	-100%	L' intervento finanziato con i fondi FSC verrà affidato nel 2020 e prevede la sostituzione dei contatori d'utenza
2018PREA0034	Sostituzione condotta adduttrice nei Comuni di Parma e Fontanellato - FSC	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	2.852.900	20.000	10.000	10.000	19.351	0	19.351	-3%	
2018PREA0035	Sostituzione reti e allacciamenti reti distributive dei comuni in gestione - FSC	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	600.000	10.000	5.000	5.000	831	0	831	-91%	Ritardo nell'affidamento della progettazione dei lavori
2019PREA0036	Nuovi allacciamenti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		0	0	0	0	0	0	0%	
2019PREA0038	Manutenzione Straordinaria Acque meteoriche	FOGNATURA	Opere pluricomunali		0	0	0	0	0	0	0%	
2019PREA0039	Cartografia	FOGNATURA	Opere pluricomunali	325.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2019PREA0040	Interventi di rinnovo reti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		0	0	0	0	0	0	0%	
2019PREA0041	Manutenzione straordinaria fognature	FOGNATURA	Opere pluricomunali		0	0	0	0	0	0	0%	
2019PREA0042	Manutenzione straordinaria depurazione	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali		0	0	0	0	0	0	0%	
2019PREA0043	Manutenzione straordinaria acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		0	0	0	0	0	0	0%	
2019PREA0044	Modellazione idraulica di acquedotti, distrettualizzazione della rete, analisi e ricerca delle perdite idriche, progetto generale acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2019PREA0045	Investimenti di Struttura	STRUTTURA	Opere pluricomunali		0	0	0	0	0	0	0%	
2019PREA0046	Messa in sicurezza e opere accessorie di miglioramento al Depuratore di Fidenza	DEPURAZIONE	Fidenza	180.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2019PREA0047	Rifacimento pozzo 3 di San Donato	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	250.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2019PREA0048	Ricostruzione cabina viale Battej, opere accessorie e demolizione persnile	ACQUEDOTTO	Sissa Trecasali	330.000	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTALI				62.582.601	2.818.400	25.000	2.793.400	2.658.343	268.508	2.389.835		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 1 del 15 gennaio 2020

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Emiliambiente S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2018

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 15 gennaio 2020



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma

F.to Tiziana Benassi

Il segretario verbalizzante

F.to Fausta Pizzaghi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 17 giugno 2020

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna
