

CLPR/2020/3 del 15 gennaio 2020

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore MONTAGNA 2000 approvazione del
consuntivo degli investimenti per l'anno 2018**

IL COORDINATORE
F.to Tiziana Benassi

CLPR/2020/3

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

L'anno **2020**, il giorno quindici del mese di gennaio, alle ore 14,00, presso Sala Consiglio del Comune di Parma, si è riunito il Consiglio Locale di Parma convocato con lettera PG/AT/2020/63 dell'8.01.2020.

Assume la presidenza il Coordinatore Locale, che chiama Fausta Pizzaghi, funzionaria di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretaria verbalizzante.

Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBARETO	Riccoboni Davide	Sindaco	SI'	0,6059
BARDI			NO	0,6385
BEDONIA			NO	0,8811
BERCETO			NO	0,6019
BORE			NO	0,3471
BORGO VAL DI TARO	Rossi Diego	Sindaco	SI'	1,5743
BUSSETO			NO	1,5303
CALESTANO			NO	0,5809
COLLECCHIO	Dodi Gian Carlo	Vice Sindaco	SI'	2,8284
COLORNO	Grassi Mirka	Assessore	SI'	1,8860
COMPIANO	Mariani Francesco	Sindaco	SI'	0,4083
CORNIGLIO			NO	0,5741
FELINO	Leoni Elisa	Sindaco	SI'	1,8294
FIDENZA	Amigoni Franco	Assessore	SI'	5,0320
FONTANELLATO			NO	1,5152
FONTEVIVO			NO	1,2243
FORNOVO DI TARO	Cardi Lucia	Assessore	SI'	1,3691
LANGHIRANO			NO	2,0497
LESIGNANO DE' BAGNI	Bruzzone Gianni	Vice Sindaco	SI'	1,0975

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
MEDESANO	Cantoni Gianpaolo	Vice Sindaco	SI'	2,2163
MONCHIO DELLE CORTI			NO	0,3823
MONTECHIARUGOLO			NO	2,1820
NEVIANO DEGLI ARDUINI			NO	0,8951
NOCETO	Maini Giovanna	Assessore	SI'	2,6033
PALANZANO			NO	0,4164
PARMA	Benassi Tiziana	Assessore	SI'	33,5283
PELLEGRINO PAR.SE			NO	0,3977
POLESINE - ZIBELLO			NO	1,3746
ROCCABIANCA			NO	0,7772
SALA BAGANZA			NO	1,2175
SALSOMAGGIORE TERME	Taccagni Marco	Presidente Consiglio com.le	SI'	3,8919
S. SECONDO PAR.SE			NO	1,2415
SISSA TRECASALI	Bernardi Nicola	Sindaco	SI'	1,7100
SOLIGNANO			NO	0,5385
SORAGNA			NO	1,1189
SORBOLO MEZZANI	Comelli Marco	Assessore	SI'	2,6562
TERENZO			NO	0,4221
TIZZANO VAL PARMA			NO	0,5961
TORNOLO			NO	0,4045
TORRILE	Gentile Antonio	Vice Sindaco	SI'	1,6090
TRAVERSETOLO	Lanzi Michele	Assessore	SI'	1,9533
VALMOZZOLA			NO	0,3031
VARANO DE' MELEGARI	Restiani Giuseppe	Sindaco	SI'	0,7052
VARSI			NO	0,4384
PROVINCIA DI PARMA	Rossi Diego	Presidente	SI'	10,000

Presenti n. 19 quote 77,50 Assenti n. 26 quote 22,50

Riconosciuta la validità della seduta Tiziana Benassi, in qualità di Coordinatore, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore MONTAGNA 2000 approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2018

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'Ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.2 del 24 marzo 2016 del Consiglio locale di Parma è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore Montagna 2000 S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n.8 dell'11 maggio 2018 del Consiglio locale di Parma è stata approvata la revisione straordinaria del programma degli interventi per gli anni 2018-2019 del servizio idrico integrato per il gestore Montagna 2000 S.p.A., che costituisce proposta di aggiornamento del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- la deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 inoltre dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;

- il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;
- con deliberazione n. 30 del 10 aprile 2019 del Consiglio d'ambito è stato approvato l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia vigente (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione ARERA n.918/2017/R/idr, per il bacino tariffario di Parma gestito da MONTAGNA2000 S.p.A.

dato atto che il gestore Montagna 2000 S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2018 attraverso il software ARSI;

rilevato che dai dati presentati è emerso per l'annualità 2018 che:

- è stato eseguito n.1 intervento aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 2015-19 approvato con Deliberazione n.2 del 24 marzo 2016 e n.8 del 11 maggio 2018 del Consiglio Locale di Parma, approvato con nulla osta ai sensi della Delibera n°75 del 12 ottobre 2017;
- non sono stati avviati n.25 interventi per un importo complessivo lordo di € 2.159.852;
- sono stati anticipati/conclusi n.10 interventi previsti in altre annualità per un importo complessivo lordo di € 273.281;
- per n.21 interventi si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 approvato per l'annualità 2018;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

dato atto che il Gestore ha inoltre avviato nel 2017 e terminato nel 2018 una serie di interventi nei territori maggiormente colpiti dalla crisi idrica, finanziati dalla Protezione Civile – atto DPGR n.158/2017 e DPGR 178/2017, attualmente in corso di rendicontazione relativamente ad interventi conclusi non compresi nell'importo pianificato 2018;

ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2018 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n. 19 (quote 77,50), voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti per l'annualità 2018 del gestore Montagna 2000 S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2018
Gestore: Montagna 2000 (PR)**

15 gennaio 2020

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2018

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2018, del Programma Operativo Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.2 del 24 marzo 2016, e revisionato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.8 del 11 maggio 2018, su proposta presentata dal gestore Montagna 2000 entro marzo 2018.

Il consuntivo è desunto dal software ARSI.

PIANIFICATO 2018		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2018	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 3.184.852	-€ 1.714.813	€ 1.470.039	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 1.910.002	-€ 1.910.002	€ 0	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 1.274.850	€ 195.189	€ 1.470.039	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018

Dalla tabella si nota come il gestore Montagna 2000 abbia effettuato investimenti lordi inferiori rispetto alla pianificazione approvata pari a - €1.714.813, e maggiori rispetto agli investimenti netti pari + €195.189 non essendo stati incassati contributi estranei alla tariffa del SII (escluso il Comune di Berceto).

Lo scostamento che si evidenzia è dovuto principalmente alla mancata esecuzione di interventi legati all'adeguamento degli impianti ai valori limite del Cromo esavalente, in quanto in attesa di revisione dei limiti di potabilità da parte del Ministero.

BERCETO				
PIANIFICATO 2018		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2018	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 70.000	- € 70.000	€ 0	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 0	€ 0	€ 0	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 70.000	- € 70.000	€ 0	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]

TAB.2 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018 - territorio di Berceto

Per avere un quadro più esaustivo degli investimenti rendicontati rispetto alla pianificazione approvata, si vedano le tabelle e i grafici successivi, nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

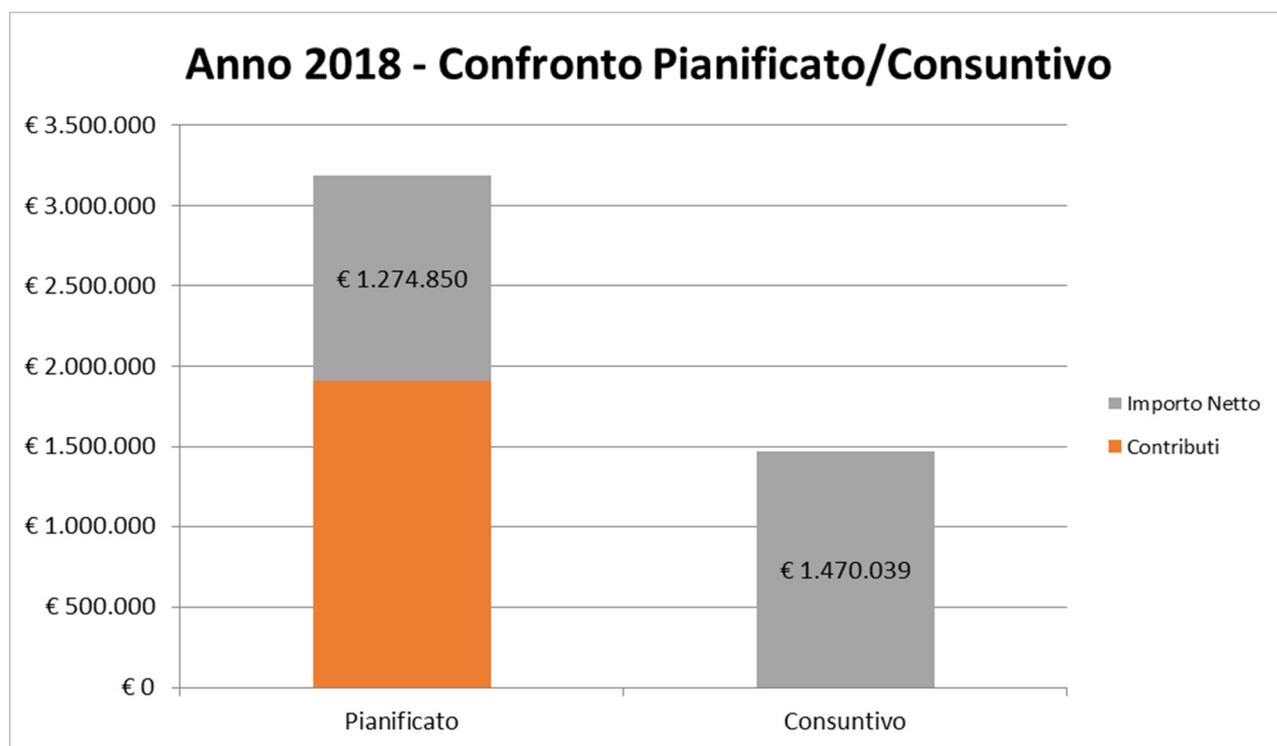


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

ULTERIORI INTERVENTI EMERGENZA IDRICA FINANZIATI DALLA PROTEZIONE CIVILE

INCREMENTO CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2018

Il gestore ha inoltre avviato nel 2017 e terminato nel 2018, una serie di interventi nei territori maggiormente colpiti dalla crisi idrica, finanziati dalla Protezione Civile - atto DPGR n. 158/2017 e DPGR 178/2017 – per un importo di circa €. 1.399.898 attualmente in corso di rendicontazione. Sono stati rilasciati 15 visti per un importo pari ad €. 1.297.955 relativi ad interventi conclusi, non compresi nell'importo pianificato per l'annualità 2018.

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato pianificato e indicano le valutazioni in merito alle note giustificative degli scostamenti fornite dal gestore.

Numero di interventi pianificati nel 2018: 51 (oltre a 4 Berceto)

Numero di interventi rendicontati nel 2018: 36

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2018	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2018	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100% - esclusi interventi Berceto)	25	0	2.159.852	NO	2014PRMA0015 2014PRMA0027 2014PRMA0037 2014PRMA0038 2014PRMA0055 2014PRMA0056 2014PRMA0057 2014PRMA0061 2014PRMA0075 2018PRMA0108 2018PRMA0109 2018PRMA0110 2018PRMA0111 2018PRMA0112 2018PRMA0113 2018PRMA0114 2018PRMA0115 2018PRMA0116 2018PRMA0117 2018PRMA0118 2018PRMA0119 2018PRMA0120 2018PRMA0125 2018PRMA0132 2018PRMA0136
Interventi con avvio anticipato nel 2018 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	10	273.281	0	NO	2014PRMA0018 2014PRMA0054 2014PRMA0060 2014PRMA0066 2014PRMA0070 2016PRMA0091 2016PRMA0094 2016PRMA0099 2016PRMA0106 2018PRMA0127
Interventi avviati nel 2018 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID (<i>nulla-osta CAMB.75/2018</i>)	1	27.719	62.000	NO	2018PRMA0137
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	21	1.087.345	872.000	NO	2014PRMA0002 2014PRMA0007 2014PRMA0008 2014PRMA0013 2014PRMA0031 2014PRMA0044 2014PRMA0045 2014PRMA0050 2014PRMA0051 2014PRMA0065 2014PRMA0084 2014PRMA0085 2016PRMA0093 2016PRMA0098 2016PRMA0101 2016PRMA0102 2016PRMA0103 2018PRMA0128 2018PRMA0133 2018PRMA0134 2018PRMA0135
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	4	81.694	91.000	NO	

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che il gestore non ha avviato n.25 interventi che erano stati programmati e per i quali la giustificazione è risultata esaustiva.

Di questi 25 interventi:

- N. 13 interventi sono relativi al Cromo esavalente per €. 1.910.002;
- N. 6 interventi sono in fase di progettazione ed il ritardo è dovuto a difficoltà nel reperire informazioni su reti ed impianti per €. 140.000;
- N. 4 interventi sono stati ultimati in annualità precedenti oppure in accordo con le amministrazioni comunali non risultano più necessari per complessivi €. 49.000;
- N. 1 intervento è legato al passaggio di gestione da parte dei Comuni al Gestore delle acque bianche per €.60.000;
- N.1 intervento è legato alla difficoltà nell'ottenere le autorizzazioni dai privati per complessivi €. 850;

Per l'elenco di tali interventi si rimanda alla Tabella 3.

Il gestore ha inoltre concluso posticipatamente nel 2018 (rispetto a quanto programmato) n.10 interventi di cui n.9 sono code intervento per €. 251.080 e n. 1 intervento ha avuto avvio anticipato per €. 22.200.

Il gestore ha avviato n. 1 nuovo intervento che non era nel Piano d'Ambito, a cui è stato attribuito un nuovo codice identificativo ID:2018PRMA0137, autorizzato mediante nulla-osta ATERSIR - CAMB.75/2018.

Per n. 21 interventi si è verificato uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al $\pm 20\%$ e le relative giustificazioni sono risultate esaustive, nello specifico:

- N. 4 interventi lo scostamento è dovuto a code interventi pianificati in annualità precedenti e precisamente era stato pianificato l'importo di €. 170.000 e consuntivato l'importo di €. 376.312;
- N. 3 interventi si sono ottenuti risparmi in sede di aggiudicazione dei lavori oppure si è optato per soluzioni più convenienti e precisamente era stato pianificato l'importo di €. 50.000 ed è stato consuntivato l'importo di €. 28.215;
- N. 4 interventi sono relativi ai capitoli delle manutenzioni straordinarie/opere pluricomunali dove si sono resi necessari maggiori investimenti e precisamente era stato pianificato l'importo di €. 195.000 ed è stato consuntivato l'importo di €. 531.873;
- N.4 interventi sono in corso, anche se in ritardo, per arrivo della stagione invernale e precisamente era stato pianificato l'importo di €. 167.000 e consuntivato €.102.968;
- N.1 intervento è in ritardo in quanto è stata data priorità ai depuratori principali che avevano criticità più elevate e precisamente era pianificato l'importo di €. 45.000 e consuntivato €. 750;
- N. 3 interventi sono stati realizzati in manutenzione e precisamente importo pianificato €. 45.000 e consuntivato €. 37.981;
- N. 2 risultano in ritardo per l'ottenimento di autorizzazioni e precisamente importo pianificato €. 200.000 e consuntivato €. 9.246.

Per n. 4 interventi lo scostamento è inferiore al $\pm 20\%$ e quindi non è risultato necessario richiedere giustificazioni.

Risultano esclusi dalle tabelle e dai grafici della presente relazione gli ulteriori interventi dovuti all'emergenza idrica e finanziati dalla Protezione Civile che sono stati realizzati tra l'annualità 2017 e il 2018, attualmente in corso di rendicontazione.

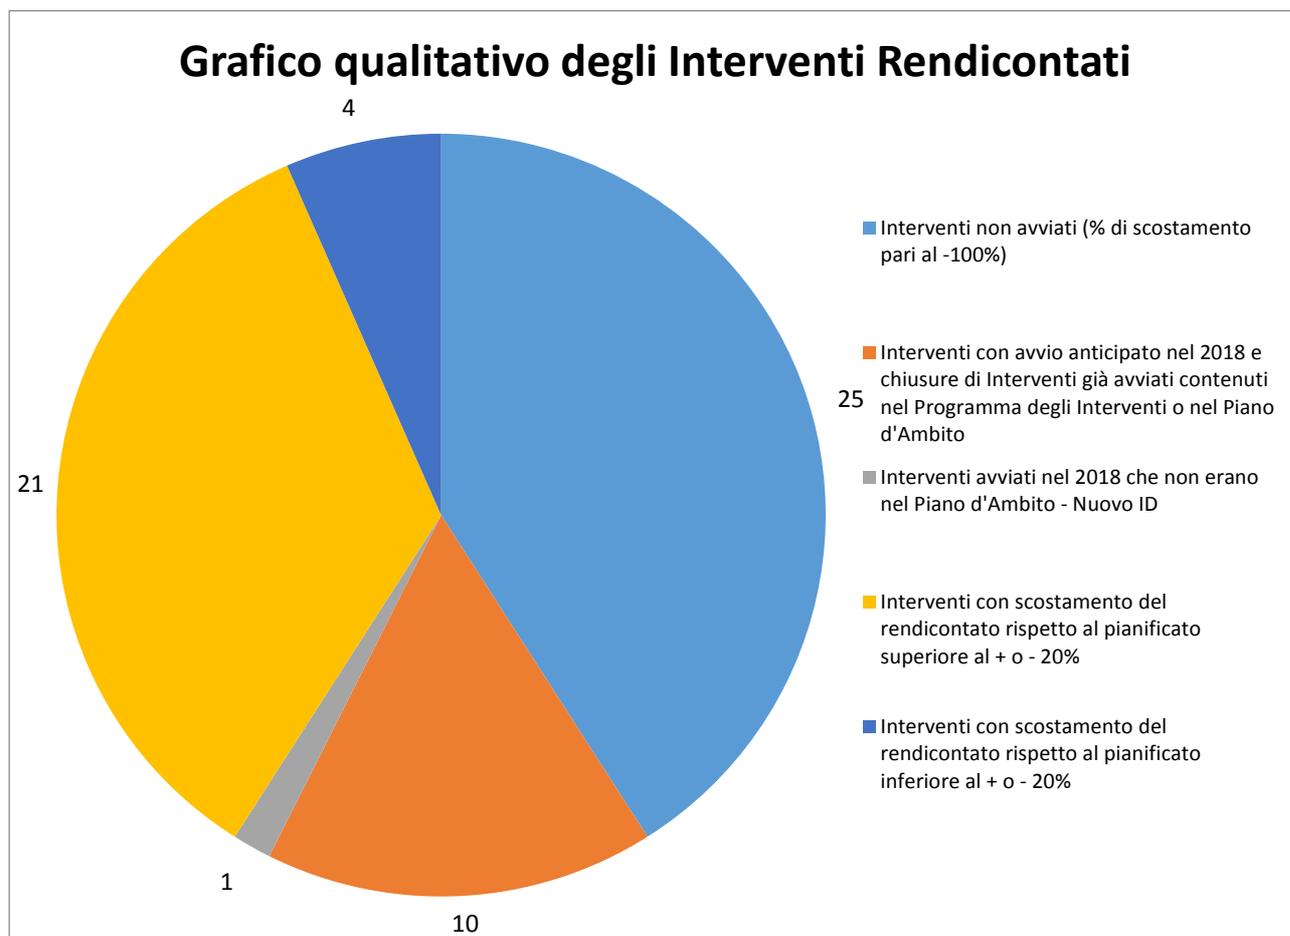


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

COMUNI	CODICE	TITOLO INTERVENTO	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2018
Bedonia	2014PRMA0015	BE115 -Nuovo impianto di trattamento reflui e collegamento alla fognatura esistente in loc. Alpe (175 A.E.)	75.000	50.000
Bore	2014PRMA0027	BO131 - sostituzione e adeguamento tratti rete idrica in loc.Felloni, Castiglione,Pozzolo, Franchi , altri minori e ripristino sorgenti In loc. Pozzolo	45.000	20.000
Borgo Val di Taro	2014PRMA0037	BVT107 - Sistemazione reti di adduzione acquedotti	45.000	20.000
Compiano	2014PRMA0038	CO121 - Rifacimento/potenziamento tratti di rete di distribuzione di Sugremaro e Compiano Capoluogo	65.000	20.000
Solignano	2014PRMA0055	SOL160 - Lavori di ristrutturazione condotte idriche del Capoluogo	40.000	10.000
Solignano	2014PRMA0056	SOL161 - Completamento rete fognaria e fossa imhoff in loc. Case Boselli di Fosio	50.000	20.000
Solignano	2014PRMA0057	SOL162 - Lavori di miglioramento e potenziamento reti fognarie del Capoluogo	30.000	10.000
Terenzo	2014PRMA0061	TE165 - Lavori di rifacimento tratti di condotte fognarie nel Capoluogo	35.000	15.000
Varano de' Melegari	2014PRMA0075	VM135 - Adeguamento e sostituzione tratti di rete idrica in Loc. Riviano, Monte Salso, Monti Alti e altre minori.	65.000	20.000
Albareto	2018PRMA0108	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Farneto	189.840	189.840
Bardi	2018PRMA0109	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Faggio	129.909	129.909
Bardi	2018PRMA0110	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Cugno di Gazzo	161.438	161.438
Bardi	2018PRMA0111	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Groppo Gora	131.920	131.920
Bardi	2018PRMA0112	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Gazzo	122.853	122.853
Bardi	2018PRMA0113	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Granere Vallecca	238.143	238.143
Bedonia	2018PRMA0114	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Cornolo	146.846	146.846
Borgo Val di Taro	2018PRMA0115	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Roccamurata	103.765	103.765
Fornovo di Taro	2018PRMA0116	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Citerna Case Bottini	177.352	177.352
Fornovo di Taro	2018PRMA0117	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Prinzerza Costa Piantonia Belvedere	108.970	108.970
Fornovo di Taro	2018PRMA0118	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Piazza	198.280	198.280

COMUNI	CODICE	TITOLO INTERVENTO	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2018
Solignano	2018PRMA0119	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Filippi pozzo	93.171	93.171
Varsi	2018PRMA0120	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Manganini Lamberti	107.515	107.515
Bedonia	2018PRMA0125	BED8A - Ripristino sorgenti, sostituzione e/o potenziamento tratti di rete acquedotto Alpe e Castagnola		850
Varano de' Melegari	2018PRMA0132	VDM74D - Costruzione impianto di depurazione loc. Vianino		4.000
Opere pluricomunali	2018PRMA0136	Manutenzioni straordinarie acque bianche		60.000

TAB.3 Interventi previsti nel 2018 e non realizzati (scostamento pari a -100%, esclusi interventi Berceto)

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PRMA0001	AL90A - Potenziamento capacità di stoccaggio serbatoio di accumulo in località Roncole di Gotra - 1° STRALCIO	ACQUEDOTTO	Albareto	53.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0002	AL108 - Estendimento e rifacimento dell'acquedotto rurale a servizio delle località Case Mazzetta, Casale, Case Sartori, ecc. (PRIP 2011)	ACQUEDOTTO	Albareto	77.000	37.000	0	37.000	48.266	0	48.266	30%	LAVORI SOSPESI PER ARRIVO INVERNO E CONDIZIONI METEO AVVERSE
2014PRMA0003	AL109 - Interventi su fossa Imhoff a servizio dell'agglomerato di Boschetto	DEPURAZIONE	Albareto		0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0004	AL110 - Interventi vari	TUTTI	Albareto		0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0005	AL111 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	Albareto		0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0006	AL112 - Telecontrolli serbatoi	ACQUEDOTTO	Albareto		0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0007	BA126 - Sostituzione e adeguamento tratti reti idrica acquedotti Capoluogo, Lagacci, Granere e altri minori	ACQUEDOTTO	Bardi	102.000	30.000	0	30.000	74.590	0	74.590	148%	SCOSTAMENTO DOVUTO A COMPLETAMENTO DEI LAVORI ANNO PRECEDENTE
2014PRMA0008	BA127 - Realizzazione impianti clorazione a pannelli fotovoltaici in Loc. Gazzo, Grezzo, Ca' Alfieri e altri minori	ACQUEDOTTO	Bardi	45.000	20.000	0	20.000	540	0	540	-97%	Si è intervenuti sugli impianti di disinfezione con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
2014PRMA0009	3MD - Adeguamento impianto Saliceto (attualmente 1° Livello)	DEPURAZIONE	Bardi	12.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0010	BA128 - Interventi vari	TUTTI	Bardi		0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0011	BA129 - Telecontrollo serbatoi idrici	ACQUEDOTTO	Bardi		0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0012	BA130 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	Bardi		0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0013	BE113 - Installazione di nuovi impianti di disinfezione sugli acquedotti frazionali	ACQUEDOTTO	Bedonia	65.000	15.000	0	15.000	2.878	0	2.878	-80%	Risparmi determinati da differente tipologia impiantistica. Si è optato per l'installazione di una tipologia di impianto molto meno costosa ma ugualmente efficace nella disinfezione: impianti alimentati da batterie 12/24V ricaricabili anziché complessi impianti alimentati da costosi pannelli fotovoltaici
2014PRMA0014	BE114 - Estendimento/rifacimento di alcuni tratti della fognatura di Masanti di Sopra	FOGNATURA	Bedonia	21.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0015	BE115 - Nuovo impianto di trattamento reflui e collegamento alla fognatura esistente in loc. Alpe (175 A.E.)	DEPURAZIONE	Bedonia	75.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	DIFFICOLTA' NEL REPERIRE INFORMAZIONI SU RETI E IMPIANTI ESISTENTI. Sono in corso le attività di rilievo della rete esistente,

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PRMA0016	BE116 - Sistemazione acquedotti e serbatoi danneggiati da frane	ACQUEDOTTO	Bedonia	30.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0017	BE117 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	Bedonia		0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0018	BE118 - Recupero funzionale e messa in sicurezza opere di presa e serbatoio a servizio degli acquedotti di Scopolo-Pilati e Alpe	ACQUEDOTTO	Bedonia	45.000	0	0	0	20.500	0	20.500	100%	Coda intervento pianificato annualità precedenti. TERMINATO anno 2018
2014PRMA0019	BE119 - Interventi vari	TUTTI	Bedonia		0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0020	BE120 - Telecontrolli serbatoi idrici e depuratore Capoluogo	ACQUEDOTTO	Bedonia		0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0021	16MD - Lavori di sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotti in località Pian Farioli, Ghiare ed altri minori	ACQUEDOTTO	Berceto	120.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0022	BER143 - Ristrutturazione rete fognaria in loc. Fugazzolo di Sotto, Tralariva e Case Brusini	FOGNATURA	Berceto	40.000	15.000	0	15.000	0	0	0	-100%	
2014PRMA0023	BER144 - Interventi vari (comprese manutenzioni straordinarie)	TUTTI	Berceto		25.000	0	25.000	0	0	0	-100%	
2014PRMA0024	BER145 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	Berceto	80.000	5.000	0	5.000	0	0	0	-100%	
2014PRMA0025	BSVV86A - Lavori di realizzazione e potenziamento serbatoi e collegamento alla rete acquedottistica ex Consorzio "Monte Barigazzo"	ACQUEDOTTO	Berceto, Solignano, Valmozzola, Varsi	200.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0026	20 MD - Ripristino sorgenti e serbatoi, sostituzione e adeguamento tratti di rete idrica acquedotti Capoluogo, Zani, Rovina ed altri minori	ACQUEDOTTO	Bore	47.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0027	BO131 - sostituzione e adeguamento tratti rete idrica in loc.Felloni, Castiglione,Pozzolo, Franchi , altri minori e ripristino sorgenti In loc. Pozzolo	ACQUEDOTTO	Bore	45.000	20.000	0	20.000	0	0	0	-100%	DIFFICOLTA' REPERIRE INFORMAZIONI AFFIDABILI SU RETI E IMPIANTI. In corso progettazione
2014PRMA0028	BO132 - Interventi vari	TUTTI	Bore		0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0029	BO133 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	Bore		0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0030	BVT100 - Adeguamento e recupero funzionale del serbatoio idrico in località Peticcio a servizio dell'acquedotto di Borgotaro Capoluogo	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	53.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0031	BVT101 - Potenziamento/rifacimento tratti acquedotto rurale delle Tre Fontane (ex PRIP 2011)	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	175.000	100.000	0	100.000	6.258	0	6.258	-93%	DIFFICOLTA' NELL'OTTENERE AUTORIZZAZIONI PROPRIETARI

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2018PRMA0122	AL91A - Nuovi estendimenti loc. Case Sartori, Case Bosini, ecc.. Installazione impianti clorazione e sistemazione opere captazione	ACQUEDOTTO	Albareto		1.000	0	1.000	996	0	996	0%	
2018PRMA0123	Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati	ACQUEDOTTO	Bardi	100.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PRMA0124	Rinnovo delle reti idriche nei centri abitati	ACQUEDOTTO	Bedonia	100.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PRMA0125	BED8A - Ripristino sorgenti, sostituzione e/o potenziamento tratti di rete acquedotto Alpe e Castagnola	ACQUEDOTTO	Bedonia		850	0	850	0	0	0	-100%	Ritardo ad ottenere autorizzazioni dai proprietari aree interessate
2018PRMA0126	Installazione misuratori non precedentemente censiti e in punti nodali della rete acquedotto	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	60.000	30.000	0	30.000	30.600	0	30.600	2%	
2018PRMA0127	Progetto per la riduzione delle perdite delle reti di distribuzione mediante gestione e controllo delle pressioni e la distrettualizzazione delle reti	ACQUEDOTTO	Varano de' Melegari, Borgo Val di Taro, Fornovo di Taro	180.000	0	0	0	22.200	0	22.200	100%	Lavori anticipati di 1 anno rispetto al pianificato a causa di situazione di emergenza perdite sulla rete di distribuzione di Fornovo
2018PRMA0128	BVT27A - Ripristino sorgenti potenziamento tratto reti acquedotti del Capoluogo e in loc. Arola - Monticelli	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro		7.000	0	7.000	4.806	0	4.806	-31%	RISPARMIO IN FASE DI AFFIDAMENTO
2018PRMA0129	Installazione misuratori non precedentemente censiti e in punti nodali della rete acquedotto	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	60.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PRMA0130	Rinnovo delle reti idriche nei centri abitati	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	100.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PRMA0131	Installazione misuratori non precedentemnte censiti e in punti nodali della rete acquedotto	ACQUEDOTTO	Varano de' Melegari	30.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PRMA0132	VDM74D - Costruzione impianto di depurazione loc. Vianino	DEPURAZIONE	Varano de' Melegari		4.000	0	4.000	0	0	0	-100%	LAVORI FINITI MA IN FASE DI LIQUIDAZIONE ACQUISTO AREA
2018PRMA0133	Manutenzione straordinaria acquedotti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	1.000.000	85.000	0	85.000	276.151	0	276.151	224%	SI SONO RESI NECESSARI MOLTI INTERVENTI STRAORDINARI ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA NON PREVISTI IN FASE DI PIANIFICAZIONE. IN PARTICOLARE, LO STATO DI AVANZATA VETUSTA' DI ALCUNE RETI DI DISTRIBUZIONE E DI ALCUNI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO HANNO RICHIESTO INTERVENTI URGENTI NON PREVENTIVATI CHE SE NON REALIZZATI AVREBBERO CREATO INTERRUZIONI DEL SERVIZIO O MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD MINIMI DI FORNITURA
2018PRMA0134	Manutenzioni straordinarie fognature	FOGNATURA	Opere pluricomunali		51.000	0	51.000	66.601	0	66.601	30%	SI SONO RESE NECESSARI MOLTI INTERVENTI STRAORDINARI ALLA RETE FOGNARIA NON PREVISTI IN FASE DI PIAIFICAZIONE CAUSATI ESSENZIALMENTE DA INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI BREVI TRATTI DI COLLETTORI DISPERDENTI LIQUAMI

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del \pm 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2018PRMA0135	Manutenzione straordinaria depuratori	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali		34.000	0	34.000	106.586	0	106.586	213%	SI SONO RESI NECESSARI MOLTI INTERVENTI STRAORDINARI AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NON PREVISTI IN FASE DI PIANIFICAZIONE. INFATTI, L'AVANZATO STATO DI VETUSTA' DI ALCUNI IMPIANTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE POMPE DI SOLLEVAMENTO E RICIRCOLO E AGLI AERATORI DELLA FASE DI OSSIDAZIONE DI ALCUNI DEPURATORI HANNO DETERMINATO INTERVENTI URGENTI SENZA I QUALI NON SAREBBE STATO POSSIBILE IL RISPETTO DEI LIMITI TABELLARI DELLE ACQUE DI SCARICO.
2018PRMA0136	Manutenzioni straordinarie acque bianche	ACQUE BIANCHE	Opere pluricomunali		60.000	0	60.000	0	0	0	-100%	AL 31.12.2018 NESSUN COMUNE AVEVA CONFERITO IL SERVIZIO AL GESTORE DEL SII
2018PRMA0137	* Lavori di rifacimento fognatura via Lungo Taro Imbriani	FOGNATURA	Borgo Val di Taro	62.000	62.000	0	62.000	27.719	0	27.719	-55%	LAVORI IN CORSO SOSPESI PER ARRIVO INVERNO
2019PRMA0138	Interventi Emergenza Idrica 2017 - OCDPC 468/2017	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		0	0	0	0	0	0	0%	
TOTALI				10.412.472	3.254.852	1.910.002	1.344.850	1.470.039	0	1.470.039		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 3 del 15 gennaio 2020

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato – Gestore MONTAGNA 2000 approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2018**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 15 gennaio 2020

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma
F.to Tiziana Benassi

Il segretario verbalizzante
F.to Fausta Pizzaghi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 17 giugno 2020
