

CLRA/2020/6 del 9 dicembre 2020

CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2019 - Gestore HERA S.p.A.**

IL COORDINATORE

F.to Valentina Palli

CLRA/2020/6

CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA

L'anno **2020** il giorno 9 del mese di dicembre alle ore 14.00, si è riunito il Consiglio Locale di Ravenna convocato con lettera protocollo PG.AT/2020/0008636 del 01/12/2020, in seduta telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Valentina Palli.

Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALFONSINE				3,2301
BAGNACAVALLO	CORZANI CATERINA	ASSESSORE	SI'	4,2542
BAGNARA DI ROMAGNA	FRANCONE RICCARDO	SINDACO	SI'	0,9101
BRISIGHELLA				2,2465
CASOLA VALSENIO				1,1623
CASTELBOLOGNESE				2,4123
CERVIA				6,5292
CONSELICE	PULA PAOLA	SINDACO	SI'	2,5543
COTIGNOLA				2,1009
FAENZA	ORTOLANI LUCA	ASSESSORE	SI'	12,9909
FUSIGNANO	PASI NICOLA	SINDACO	SI'	2,2502
LUGO	GALLETTI MARIA PIA	ASSESSORE	SI'	7,8591
MASSA LOMBARDA	AVVEDUTI LAURA	ASSESSORE	SI'	2,4835
RAVENNA	BARONCINI GIANANDREA	ASSESSORE	SI'	31,8503
RIOLO TERME	NICOLARDI ALFONSO	SINDACO	SI'	1,7425
RUSSI	PALLI VALENTINA	SINDACO	SI'	2,9457
S.AGATA SUL SANTERNO	EMILIANI ENEA	SINDACO	SI'	0,9962
SOLAROLO				1,4817
PROVINCIA DI RAVENNA				10,0000

Presenti n. 11, quote 70,8370

Assenti n. 8, quote 29,1630

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2019 - Gestore HERA S.p.A.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 1 del 12 febbraio 2016 il Consiglio locale di Ravenna ha approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. proponendo al Consiglio d'ambito la conseguente integrazione del Piano di Ambito e la variazione del Piano economico-finanziario;
- con deliberazione n. 41 del 26 luglio 2016 il Consiglio d'ambito ha approvato, per il bacino di Ravenna, la determinazione, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr;
- con deliberazione n. 5 del 25 luglio 2017 il Consiglio locale di Ravenna ha approvato la revisione, per gli anni 2017-2019, del programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 2 del 23 aprile 2018 il Consiglio locale di Ravenna ha approvato la revisione straordinaria, per gli anni 2018-2019, del programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 50 del 28 giugno 2018 il Consiglio d'Ambito ha approvato l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria allora vigente (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione tariffaria per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, anche per il bacino di Ravenna. Con tale deliberazione, fra l'altro, si è dato atto che il PdI-cronoprogramma degli investimenti, redatto secondo lo schema previsto dall'Autorità di Regolazione, è stato predisposto modificando alcuni importi di interventi già esistenti e/o introducendo nuovi interventi al fine di rispettare gli adempimenti richiesti per l'adeguamento agli standard della RQTI (deliberazione ARERA n. 917/2017/R/idr) e che pertanto l'approvazione dell'atto di ATERSIR ha costituito modifica e integrazione dei POI approvati dai Consigli Locali;

considerato altresì che:

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che il gestore HERA s.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2019 attraverso il software ARSI;

dato atto altresì che la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato che dai dati presentati è emerso quanto segue (come da tabella 3 della relazione allegata):

- il Gestore non ha avviato n. 32 interventi che erano stati programmati;
- vi sono stati 0 interventi con avvio anticipato e 25 interventi per i quali è stato rendicontato un importo diverso da zero nonostante nella pianificazione fossero considerati conclusi;
- nella annualità 2019 non sono stati rilasciati dalla struttura tecnica di ATERSIR nulla osta ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017 relativi ad interventi del bacino di Ravenna;

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli **n.11** , quote **70,8370**, astenuti n.0, contrari n.0;

DELIBERA

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 dal gestore HERA S.p.A. come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2019**

**GESTORE: HERA S.P.A.
BACINO TARIFFARIO: RAVENNA**

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2019, del Programma operativo degli interventi (POI) del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Ravenna n. 01 del 12 Febbraio 2016 e successivamente modificato nel corso del 2017 con delibera n.ro 05 del 25 Luglio 2017 e delibera n.ro 02 del 23 Aprile 2018, che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA %
GESTORE HERA	€ 17.294.000	€ 14.090.312	-€ 3.203.688	-19%
INVESTITORI TERZI	€ 6.356.000	€ 1.203.310	-€ 5.152.690	-81%
FONDO PERDUTO	€ 1.720.000	€ 0	-€ 1.720.000	-100%
TOTALE	€ 25.370.000	€ 15.293.622	-€ 10.076.378	-40%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, abbia effettuato nel corso del 2019 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un 19 %, con riferimento a quelli direttamente finanziati, e per circa un 81 % per quelli finanziati da altro soggetto investitore (Società degli assets), rispetto a quanto era stato preventivato.

Complessivamente lo scostamento è stato del -40%.

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato alla presente relazione.

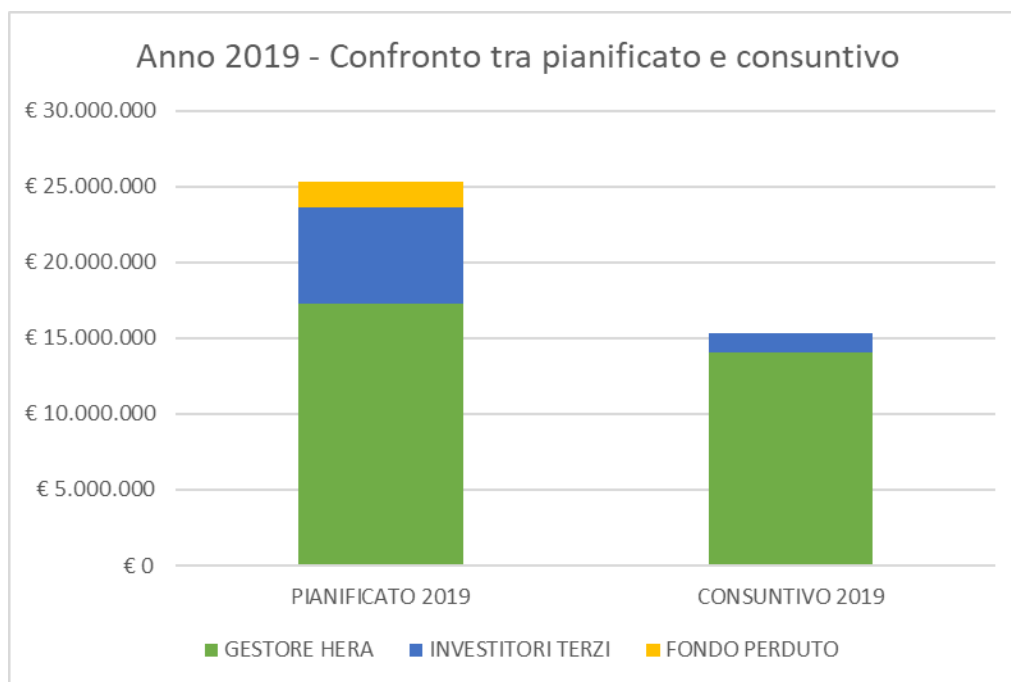


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019

ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio.

	PIANIFICATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA %
ACQUEDOTTO	€ 11.026.000	€ 6.548.850	-€ 4.477.150	-41%
DEPURAZIONE	€ 6.158.000	€ 4.637.422	-€ 1.520.578	-25%
FOGNATURA	€ 7.811.000	€ 3.855.563	-€ 3.955.437	-51%
ACQUE BIANCHE	€ 375.000	€ 251.786	-€ 123.214	-33%
TOTALE	€ 25.370.000	€ 15.293.622	-€ 10.076.378	-40%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

La tabella seguente sintetizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato, suddiviso in base alle casistiche riportate.

COD	TIPOLOGIA	Numero	Importo Lordo Pianificato nel 2019 [€]	Importo Lordo a consuntivo nel 2019 [€]
1a	Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	28	€ 8.441.000	€ 0
1b	Interventi non avviati dalle scorse annualità (con importo pianificato pari a zero nel 2019)	4	€ 0	€ 0
2a	Interventi con avvio anticipato nel 2019 (già presenti nel POI o nel Piano d'Ambito)	0	€ 0	€ 0
2b	Chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	25	€ 0	€ 2.650.931
3	Interventi avviati nel 2019 che non erano contenuti nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	2	€ 0	€ 178.197
4	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	40	€ 13.570.000	€ 8.963.803
5	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	7	€ 3.359.000	€ 3.500.691
	TOTALE	106	€ 25.370.000	€ 15.293.622

TAB.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta quanto segue:

- il gestore ha rendicontato nel 2019 n.ro 106 interventi, di cui 32 con importo a consuntivo pari a zero (interventi non avviati); di questi, 4 riportavano un importo pianificato pari a zero, ma sono stati

comunque considerati perché presentavano importi pianificati per le precedenti annualità senza essere mai stati avviati;

- non vi sono interventi con avvio anticipato rispetto a quanto pianificato (2a) e vi sono n.ro 25 interventi per i quali è stato rendicontato un importo diverso da zero nonostante nella pianificazione tali interventi fossero da considerare conclusi (2b);

Inoltre si può notare come rispetto ai 74 interventi che il gestore ha rendicontato con importo diverso da zero, circa il 54 % di questi (40 interventi) abbia avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno, con una diminuzione totale degli importi lordi relativi a questa categoria di circa il 34% rispetto al pianificato.

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo degli interventi.

	PIANIFICATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA %
< 500k	€ 3.092.000	€ 737.578	-€ 2.354.422	-76%
500k - 1.000k	€ 1.320.000	€ 1.423.867	€ 103.867	8%
1.000k - 2.000k	€ 480.000	€ 2.447.034	€ 1.967.034	410%
2.000k - 5.000k	€ 2.555.000	€ 90.928	-€ 2.464.072	-96%
>5.000k	€ 8.704.000	€ 340.125	-€ 8.363.875	-96%
CONTI CUMULATIVI	€ 9.219.000	€ 10.254.089	€ 1.035.089	11%
TOTALE	€25.370.000	€15.293.622	-€10.076.378	-40%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

ALLEGATO

HERA SpA
Consuntivo investimenti annualità 2019 Bacino tariffario di Ravenna

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	PIANO ATERSIR 2019				CONSUNTIVO HERA 2019						
						PIANO ATERSIR 2019 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2019 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2019 INV. DI TERZI	PIANO ATERSIR 2019 INV. GESTORE	CONS 2019 INV. LORDI	CONS 2019 CONTRIBUTI	CONS 2019 INV. DI TERZI	CONS 2019 INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDI	% SCOSTA MENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2019
2014RAHA0001	DEPURATORE ALFONSINE:AUTOMAZIONE PER ADEG.LIM.AZOTO	DEPURAZIONE	Gestore	Alfonsine	260.000,00	10.000,00	0		10.000,00	16.040,41	0		16.040,41	6.040,41	60	(scostamento quantitativamente minore a +/- 20.000 euro rispetto al pianificato)
2014RAHA0004	REALIZZ.FOENATURA,VIA RASPONA ALFONSINE	FOENATURA	TEAM	Alfonsine	445.000,00	0	0	0		9.412,64	0	9.412,64		9.412,64	100	INTERVENTO CONCLUSO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ESCLUSIVAMENTE AD ASPETTI CONTABILI (ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE)
2017RAHA0020	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA VIA BASSA - LONGASTRINO	FOENATURA	Gestore	Alfonsine	310.000,00	300.000,00	0		300.000,00	6.446,94	0		6.446,94	-293.553,06	-97	LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL DILATARS DEI TEMPI PER L' INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE OTTIMALE DA PARTE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, COME DA NOTA ADDOTTA NELL' ANNUALITA' 2018. NEL CORSO DEL 2019 SI E' APPURATO CHE LA PRIMA SOLUZIONE PROPOSTA NON E' STATA RITENUTA REALIZZABILE. PERTANTO, COME RECEPITO NEL NUOVO POI 2020-24, E' STATA PREDISPOSTA UNA NUOVA PROPOSTA CHE PREVEDE LA REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO PER STRALCI A PARTIRE DAL 2021
2014RAHA0009	Potenziamento Rete Boncellino - Il stralcio	ACQUEDOTTO	Romagna Acque	Bagnacavallo	564.000,00	0	0	0		306.828,56	0	306.828,56		306.828,56	100	INTERVENTO E' ATTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. LO SCOSTAMENTO E' LEGATO ALLA RIPIANIFICAZIONE DEL 2017 , LE CUI MOTIVAZIONI SONO GIA' STATE ADDOTTE NELLE NOTE DELL'ANNO DI COMPETENZA
2014RAHA0016	COLLEGAMENTO ALLA DEPURAZIONE DI MASIERA	FOENATURA	TEAM	Bagnacavallo	600.000,00	0	0	0		19.790,00	0	19.790,00		19.790,00	100	INTERVENTO CONCLUSO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ESCLUSIVAMENTE AD ASPETTI CONTABILI (ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE)
2017RAHA0001	OTTIMIZZAZIONE SIST.FOG.SU SCOLO REDINO	FOENATURA	Gestore	Bagnacavallo	552.000,00	20.000,00	0		20.000,00	10.761,80	0		10.761,80	-9.238,20	-46	(scostamento quantitativamente minore a +/- 20.000 euro rispetto al pianificato)
2015RAHA0003	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE VILLA VEZZANO	DEPURAZIONE	Gestore	Brisighella	450.000,00	50.000,00	0		50.000,00	0	0	0	0	-50.000,00	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'ID E' STATO STRALCIATO IN QUANTO L'INTERVENTO VERRA' FINANZIATO DALLE SOCIETA' DEGLI ASSET CON.AMI. VEDI NUOVO ID 2019RAHA0010
2014RAHA0021	ADEGUAMENTO RETE FOGNA V.FRIULI	FOENATURA	CONAMI	Brisighella	423.509,00	197.000,00	0	197.000,00		65.233,76	0	65.233,76		-131.766,24	-66	SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO ALL' ALLUNGAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA LAVORI IN RELAZIONE ALLE PRESCRIZIONI FORNITE DA RFI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
2015RAHA0004	REALIZZAZIONE COLLETTORE SCARICO POTABILIZZATORE DI CASOLA	ACQUEDOTTO	Gestore	Casola Valsenio	100.000,00	0	0	0		1.080,61	0		1.080,61	1.080,61	100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE IN SEDE DI STESURA DEL PIANO ATERSIR 2020-2023, PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A CONAMI, L'ID VIENE ANNULLATO E SOSTITUITO DAL 2019RAHA0013
2018RAHA0008	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN ACC LAGHI DEL CESTINA - FSC Scheda 25	ACQUEDOTTO	Gestore	Casola Valsenio	320.000,00	30.000,00	15.000,00		15.000,00	2.928,34	0		2.928,34	-27.071,66	-90	SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA PROGETTAZIONE A PARTIRE DAL 2020, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI RITARDI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN ARCO PIANO
2015RAHA0005	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CASOLA VALSENI	FOENATURA	Gestore	Casola Valsenio	250.000,00	200.000,00	0		200.000,00	11.870,97	0		11.870,97	-188.129,03	-94	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'INTERVENTO DI COLLETTAMENTO DEI REFLUI E' STATO RIDIMENSIONATO RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO ED E' TERMINATO NEL 2019. IN ACCORDO CON IL COMUNE, IN CONCOMITANZA CON I LAVORI CHE VERRANNO SVOLTI DAL COMUNE STESSO,LE RISOLRSE NON UTILIZZATE VERRANNO IMPEGATE NEGLI ANNO 2020-2021 PER UNA RAZIONALIZZAZIONE IDRAULICA DELLA RETE FOGNARIA DI CASOLA VALSENI, NELLE VIE MACELLO E ROMA, AL FINE DI RISOLVERE LA SITUAZIONE DI PROMISCUITA' CON LE CONDOTTE DI ACQUEDOTTO DEMANIALI PROCEDENDO ALLA SEPARAZIONE DELLE RETI
2014RAHA0101	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE - CONAMI	ACQUEDOTTO	CONAMI	Castel Bolognese	11.154.000,00	3.536.000,00	0	3.536.000,00		0	0		-3.536.000,00	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. (COLLEGATO A ID 2015BOHA0073-2017BOHA0017-2020BOHA0047). LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE TUTTE LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI CASTELBOLOGNESE SONO STATE FINANZIATE DAL PIANO NAZIONALE ACQUEDOTTI CON CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E SONO STATE RENDICONTATE NELL'ID 2017BOHA0017	
2015RAHA0006	POTENZIAMENTO RETE IDRICA MILANO MARITTIMA	ACQUEDOTTO	Gestore	Cervia	447.000,00	0	0	0		135.210,10	0		135.210,10	135.210,10	100	SCOSTAMENTO LEGATO AL RECUPERO DI PARTE DELLE LAVORAZIONI INIZIALMENTE PREVISTE NEL 2018 E GIA' MOTIVATE NELLE NOTE DEL 2018
2014RAHA0029	ADEGUAMENTO DEPURATORE DI CERVIA E NUOVA VASCA DI EGUALIZZAZIONE	DEPURAZIONE	Gestore	Cervia	5.962.000,00	400.000,00	0		400.000,00	37.206,52	0		37.206,52	-362.793,48	-90	INTERVENTO ANCORA IN FASE DI PROGETTAZIONE. LO SCOSTAMENTO E' IMPUTABILE PRINCIPALMENTE ALLA SOVRAPPESIZIONE CON ALTRE ATTIVITA' (PICCO DI INTERVENTI LEGATI ALLA DGR 201). L' AVANZAMENTO RISULTA COMUNQUE COERENTE CON QUANTO APPROVATO NEL NUOVO POI 2020-24
2014RAHA0031	DEPURATORE CERVIA: AUTOMAZIONE ADEGUAMENTO LIMITI AZOTO	DEPURAZIONE	Gestore	Cervia	410.000,00	10.000,00	0		10.000,00	113.667,55	0		113.667,55	103.667,55	1036	INTERVENTO IN FASE DI ULTIMAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEGUENZIALE ALL'AVVIO ANTICIPATO DELL'INTERVENTO, COME GIA' INDICATO NELLE NOTE DELLE ANNUALITA' CORRISPONDENTI
2014RAHA0035	COLLETTAMENTO A DEPURATORE DI MONTALETTO DI CERVIA -1E II STRALCIO	FOENATURA	Romagna Acque	Cervia	754.000,00	0	0	0		147.894,26	0	147.894,26		147.894,26	100	INTERVENTO CONCLUSO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ESCLUSIVAMENTE AD ASPETTI CONTABILI (ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE)
2014RAHA0036	REALIZZAZIONE IMP.SOLLEVAMENTO FOGNARIO TANTLON-CERVIA	FOENATURA	Romagna Acque	Cervia	138.000,00	0	0	0		21.951,04	0	21.951,04		21.951,04	100	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2017. SCOSTAMENTO LEGATO UNICAMENTE AD ASPETTI CONTABILI RELATIVI AL FLUSSO DI FATTURAZIONE VERSO LA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE ANCORA IN CORSO
2014RAHA0040	REALIZZ. COLL. F.N ZONA SUD CERVIA	FOENATURA	Romagna Acque	Cervia	3.468.000,00	200.000,00	0	200.000,00		0	0	0		-200.000,00	-100	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA RIPROGRAMMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE A SEGUITO DI NECESSARIE VERIFICHE PUNTUALI SULLO STATO ATTUALE DELLE INFRASTRUTTURE FOGNARIE ALLA LUCE DELLA CAMPAGNA DI MISURE EFFETTUATA E DEI PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE MINORE REALIZZATI
2014RAHA0041	BYPASS PRINCIPALE NORD CERVIA III LOTTO	FOENATURA	Romagna Acque	Cervia	878.000,00	0	0	0		4.342,44	0	4.342,44		4.342,44	100	INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. SCOSTAMENTO CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI
2017RAHA0002	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO CERVIA	FOENATURA	Gestore	Cervia	508.000,00	0	0	0		40.033,08	0		40.033,08	40.033,08	100	LO SCOSTAMENTO E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE OMOGENEA NEGLI ANNI DI ARCO PIANO, IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI MANIFESTANO ANNO PER ANNO
2014RAHA0043	RICONFIGURAZIONE ALIMENTAZIONE IDRICA LAVEZZOLA	ACQUEDOTTO	Gestore	Conselice	529.631,15	0	0	0		28.251,83	0		28.251,83	28.251,83	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO CONSEGUENZIALE ALLA RIPIANIFICAZIONE DELLE ANNUALITA' 2016-2017
2018RAHA0009	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN PVC - FSC Scheda 26	ACQUEDOTTO	Gestore	Conselice	480.000,00	30.000,00	15.000,00		15.000,00	3.112,38	0		3.112,38	-26.887,62	-89	SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA PROGETTAZIONE A PARTIRE DAL 2020, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI RITARDI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN ARCO PIANO

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	TIPO INVESTIMENTO . (Gestore o Società Asset)	COMUNE	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	PIANO ATERSIR 2019				CONSUNTIVO HERA 2019						NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2019
						PIANO ATERSIR 2019 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2019 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2019 INV. DI TERZI	PIANO ATERSIR 2019 INV. GESTORE	CONS 2019 INV. LORDI	CONS 2019 CONTRIBUTI	CONS 2019 INV. DI TERZI	CONS 2019 INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDI	% SCOSTAMENTO	
2017RAHA0017	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI LAVEZZOLA	DEPURAZIONE	CONAMI	Conselice	984.330,00	360.000,00	150.000,00	210.000,00		0	0	0		-360.000,00	-100	LA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO E' STATA COMPLETATA E SONO STATI AVVIATI I LAVORI A FINE 2019. POICHE' L'ACCORDO ATTUATIVO NON E' ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2019, IL CONSUNTIVO RISULTA PARI A ZERO. I COSTI PROGESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO
2018RAHA0006	LAVEZZOLA-SEPARAZIONE FOGNE NERE ZONA INDUSTRIALE	FOGNATURA	Gestore	Conselice	260.000,00	120.000,00	0	120.000,00	0	0	0	0	-120.000,00	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'ID E' STATO STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A CONAMI, L'ID VIENE ANNULLATO E SOSTITUITO DAL 2019RAHA0023	
2014RAHA0055	ESTENSIONE RETE LOC.REDA III LOTTO - HERA	ACQUEDOTTO	Gestore	Faenza	700.000,00	0	0	0	33.913,54	0	0	33.913,54	33.913,54	100	INTERVENTO TERMINATO. COSTI FINALI PER PERFEZIONAMENTO SERVITU' E CHIUSURA ATTIVITA' CONTABILI	
2014RAHA0063	COLLETTAMENTO DEPURAZIONE QUART.VIA DALPOZZO VIA BIASOLA	FOGNATURA	Romagna Acque	Faenza	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	RIPROGRAMMATO L' AVVIO DELLA PROGETTAZIONE IN QUANTO DALLE VERIFICHE PRELIMINARI EFFETTUATE E' EMERSA LA NECESSITA' DI VALUTARE L' EFFETTIVA ESIGENZA DELL' INTERVENTO COSI' COME DEFINITO A POI, IN QUANTO NON SUSSISTONO CRITICITA' NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO	
2015RAHA0010	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORE VIA BOARIA	FOGNATURA	Romagna Acque	Faenza	942.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	0	-30.000,00	-100	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO A PARTIRE DAL 2021 COME DA NUOVO POI 2020-2024	
2015RAHA0011	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SOLLEVAMENTO BAMBOLE	FOGNATURA	Romagna Acque	Faenza	2.020.000,00	850.000,00	0	850.000,00	0	0	0	0	-850.000,00	-100	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO A PARTIRE DAL 2021 COME DA NUOVO POI 2020-2024	
2014RAHA0071	ADEGUAMENTO DEPURATORE LUGO:REALIZZAZIONE LINEA DI PIOGGIA	DEPURAZIONE	Gestore	Lugo	4.298.000,00	1.200.000,00	0	1.200.000,00	75.293,23	0	0	75.293,23	-1.124.706,77	-93	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLO SLITTAMENTO DELL' INTERVENTO PER SOVRAPPORZIONE CON ALTRE ATTIVITA' (PICCO DI INTERVENTI LEGATI ALLA DGR 201). LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA HA COMUNQUE PERMESSO DI IDENTIFICARE E AVVIARE UN SET DI INTERVENTI CHE PERMETTONO DI ANTICIPARE LA RISOLUZIONE DELLE ESIGENZE DI BREVE TERMINE GIA' NEL 2020. IL NUOVO POI 2020-24 RISULTA COERENTE CON QUESTO SCENARIO	
2015RAHA0012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA 2 DEL DEPURATORE	DEPURAZIONE	Gestore	Lugo	1.145.000,00	0	0	0	589.924,71	0	0	589.924,71	589.924,71	100	INTERVENTO IN FASE DI ULTIMAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEGUENZIALE ALL'AVVIO POSTICIPATO DELL'INTERVENTO NEL 2017 A CAUSA DELLE PROTRATTE TEMPISTICHE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DA PARTE DEL COMUNE DI LUGO, CON UNA TEMPISTICA COMPLESSIVA DI REALIZZAZIONE DI UN ANNO SUPERIORE RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO A POI. LA PREVISIONE DI CONSUNTIVO FINALE RESTA IN LINEA CON L'IMPORTO DI PROGETTO DELIBERATO	
2015RAHA0014	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA DEPURATORE DI LUGO	DEPURAZIONE	Romagna Acque	Lugo	1.512.000,00	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0	0	-40.000,00	-100	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO A PARTIRE DAL 2021 COME DA NUOVO POI 2020-2024	
2014RAHA0079	COLLEGAMENTO A DEPURATORE AREA OVEST - I STRALCIO (Balzarina)	FOGNATURA	Gestore	Lugo	361.000,00	0	0	0	28.745,01	0	0	28.745,01	28.745,01	100	INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEGUENZIALE AL RECUPERO DELLE REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI	
2014RAHA0080	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SAN BERNARDINO	FOGNATURA	Gestore	Lugo	260.000,00	0	0	0	20.905,58	0	0	20.905,58	20.905,58	100	NEL 2019 SONO STATE AVVIATE LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEGUENZIALE ALLO SLITTAMENTO 2018 GIA' MOTIVATO NELLE NOTE 2018	
2017RAHA0003	ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA BEDAZZO	FOGNATURA	Gestore	Lugo	350.000,00	320.000,00	0	320.000,00	0	0	0	0	-320.000,00	-100	INTERVENTO CONCLUSO. COME INDICATO NELLA NOTA 2017 L'INTERVENTO E' STATO ANTICIPATO PER NECESSITA' DI RISOLVERE IN TEMPI BREVI LE CRITICITA' IDRAULICHE. SI REGISTRANO MINORI COSTI RISPETTO ALL'IMPORTO TOTALE PIANIFICATO	
2017RAHA0004	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA CENNACHIARA	FOGNATURA	Gestore	Lugo	173.000,00	280.000,00	0	280.000,00	0	0	0	0	-280.000,00	-100	LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO, COME RECEPITO NEL NUOVO POI 2020-24, E CONTESTUALMENTE ANCHE RIDIMENSIONATO IN TERMINI DI IMPORTO PROGETTO IN QUANTO DALLE VERIFICHE EFFETTUATE NON SONO PRESENTI CRITICITA' COGENTI. ERANO COMUNQUE STATE ANTICIPATE ALCUNE LAVORAZIONI NEL 2017 IN CONCOMITANZA AI LAVORI DELL'ID 2017RAHA0003	
2017RAHA0005	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA PASTORELLA LOCALITA' VOLTANA	FOGNATURA	Gestore	Lugo	300.000,00	280.000,00	0	280.000,00	460,82	0	0	460,82	-279.539,18	-99	LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO, IN ACCORDO CON IL COMUNE DI LUGO, A PARTIRE DAL 2020, COME RECEPITO DAL NUOVO POI 2020-24. LA RIPIANIFICAZIONE E' LEGATA AL FATTO CHE IL COMUNE ESEGUIRA' L'ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E SUCCESSIVAMENTE IL GESTORE PROCEDERA' AD ULTIMARE I COLLEGAMENTI/ALLACCIAMENTI DI RETE	
2018RAHA0007	INTERVENTO INTEGRATIVO VIA LATO DI MEZZO-LUGO	FOGNATURA	Gestore	Lugo	90.000,00	80.000,00	0	80.000,00	0	0	0	0	-80.000,00	-100	LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO IN ACCORDO CON IL COMUNE DI LUGO, COME RECEPITO DAL NUOVO POI 2020-24. AL MOMENTO NON SI EVIDENZIANO PARTICOLARI CRITICITA' E PERTANTO L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO SECONDO LE TEMPISTICHE DI INTERVENTO DEL COMUNE CHE DI FATTO ESEGUIRA' L'ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E SUCCESSIVAMENTE IL GESTORE PROCEDERA' AD ULTIMARE GLI ALLACCIAMENTI DI RETE	
2019RAHA0031	RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA LUGO	FOGNATURA	Gestore	Lugo	400.000,00	0	0	0	36.629,13	0	0	36.629,13	36.629,13	100	LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE L'ID NON ERA PRESENTE NEL POI 2017-2019, MA E' STATO INSERITO CON L'APPROVAZIONE DEL POI 2020-2024. NEL 2019 E' INIZIATA LA FASE DI PROGETTAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA AL FINE DI POTER AVVIARE LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE GIA' A PARTIRE DAL 2020 IN QUANTO RITENUTE PRIORITARIE	
2014RAHA0089	ADEGUAMENTO DEPURATORE MASSA LOMBARDA LIMITI AZOTO	DEPURAZIONE	Gestore	Massa Lombarda	560.000,00	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0	0	-100.000,00	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'ID E' STATO STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A CONAMI. L'ID VIENE SOSTITUITO DAL 2019RAHA0032	
2018RAHA0011	CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE STRADALI	ACQUE BIANCHE	Gestore	Opere Pluricomunali		195.000,00	0	195.000,00	210.585,62	0	0	210.585,62	15.585,62	7		
2018RAHA0012	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA	ACQUE BIANCHE	Gestore	Opere Pluricomunali		180.000,00	0	180.000,00	41.200,76	0	0	41.200,76	-138.799,24	-77	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUE METEORICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
2014RAHA0090	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - RA	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali		490.000,00	0	490.000,00	800.315,01	0	0	800.315,01	310.315,01	63	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
2014RAHA0091	RINNOVO RETI ACQUA PROGRAMMATO - RA-ATO 7	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali		2.790.000,00	0	2.790.000,00	1.387.322,65	0	0	1.387.322,65	-1.402.677,35	-50	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SULLE RETI COMPESATA DA MAGGIORI INVESTIMENTI PER RINNOVO RETI/ALLACCI LEGATI A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO ID 2014RAHA0093 E MAGGIORI ATTIVITA' DI RIPRISTINO ASFALTI 2014RAHA0094	
2014RAHA0092	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO - RA	ACQUEDOTTO	Gestore	Opere Pluricomunali		150.000,00	0	150.000,00	39.920,42	0	0	39.920,42	-110.079,58	-73	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE COMPENSATO DA MAGGIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ID 2014RAHA0090	

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	PIANO ATERSIR 2019				CONSUNTIVO HERA 2019						NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2019
						PIANO ATERSIR 2019 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2019 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2019 INV. DI TERZI	PIANO ATERSIR 2019 INV. GESTORE	CONS 2019 INV. LORDI	CONS 2019 CONTRIBUTI	CONS 2019 INV. DI TERZI	CONS 2019 INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDI	% SCOSTAMENTO	
2014RAHA0123	Depuratore Ravenna - Adeguamento Linea Fanghi	DEPURAZIONE	Gestore	Ravenna	5.000.000,00	128.000,00	0		128.000,00	882,43	0		882,43	-127.117,57	-99	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE IN SEDE DI STESURA DEL PIANO ATERSIR 2020-2023, PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A RASDF, L'ID VIENE ANNULLATO E SOSTITUITO DAL 2019RAHA0045
2014RAHA0124	REVAMPING LINEA ACQUE DEP. RAVENNA	DEPURAZIONE	Gestore	Ravenna	1.642.000,00	200.000,00	0		200.000,00	1.344.534,92	0		1.344.534,92	1.144.534,92	572	LAVORI IN CORSO DI ULTIMAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AD UN DIVERSO SVILUPPO DELL'OPERA NELLE VARIE ANNUALITA' DI PIANO, NEL RISPETTO PERO' DELLA FINE LAVORI PREVISTA
2014RAHA0127	REVAMPING DEPURATORE RAVENNA II LOTTO (FANGHI, OSS.)	DEPURAZIONE	Ravenna Holding	Ravenna	1.182.718,00	0	0	0		435.000,00	0	435.000,00		435.000,00	100	INTERVENTO IN CORSO. SCOSTAMENTO 2019 CONSEGUENTE ALLA CONTABILIZZAZIONE DI LAVORI PREVISTI NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI, LA CUI RIPIANIFICAZIONE E' GIA' STATA MOTIVATA NELLE NOTE DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI
2017RAHA0007	DEP. RAVENNA: FILTRAZIONE E DISINFEZIONE	DEPURAZIONE	Gestore	Ravenna	4.800.000,00	110.000,00	0		110.000,00	0	0		0	-110.000,00	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'ID E' STATO STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A RASDF, L'ID VIENE ANNULLATO E SOSTITUITO DAL 2019RAHA0046
2018RAHA0014	DEPURATORE RAVENNA: REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ACQUE	DEPURAZIONE	Romagna Acque	Ravenna	13.959.000,00	285.000,00	0	285.000,00		0	0	0		-285.000,00	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO A PARTIRE DAL 2021 COME DA NUOVO POI 2020-2024
2014RAHA0130	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA PONTE NUOVO	FOGNATURA	Gestore	Ravenna	557.000,00	0	0		0	104.613,47	0		104.613,47	104.613,47	100	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEGUENTE ALLE TEMPISTICHE NECESSARIE ALL'OTTENIMENTO DEGLI ACCORDI BONARI COME GIA' EVIDENZIATO NELLE NOTE DELL'ANNO 2018
2014RAHA0131	COLLEGAMENTO A DEP. BORGO MONTONE	FOGNATURA	Gestore	Ravenna	195.000,00	0	0		0	200	0		200	200,00	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO RELATIVO AL PERFEZIONAMENTO DELLE SERVITU' RESIDUE
2014RAHA0134	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDROVORA BIDENTE	FOGNATURA	Gestore	Ravenna	800.000,00	0	0		0	552.219,80	0		552.219,80	552.219,80	100	INTERVENTO CONCLUSO NEL CORSO 2019. LO SCOSTAMENTO E' CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE 2017 GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELL' ANNUALITA' PRECEDENTI CORRISPONDENTE. PREVISTA CHIUSURA CONTABILE NEL 2020
2014RAHA0141	RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO GAMBELLARA	FOGNATURA	Gestore	Ravenna	502.000,00	0	0		0	31.592,99	0		31.592,99	31.592,99	100	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA, CON PREVISTA CONCLUSIONE LAVORI NEL 2020. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEGUENTE ALL'AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO DI INTERVENTO (REALIZZAZIONE ULTRIORE SOLLEVAMENTO) PER COLLEGARE NUOVE ZONE ALLA RETE FOGNARIA CHE VA AL DEPURATORE DI RUSSI, GIA' EVIDENZIATO NELLE NOTE DEL 2018. AD OGGI NON SI EVIDENZIANO ULTERIORI CRITICITA' PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA
2014RAHA0143	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA PORTO FUORI	FOGNATURA	Gestore	Ravenna	410.000,00	30.000,00	0		30.000,00	0	0		0	-30.000,00	-100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE IN SEDE DI STESURA DEL PIANO ATERSIR 2020-2023, PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A RASDF, L'ID VIENE ANNULLATO E SOSTITUITO DAL 2019RAHA0050
2014RAHA0147	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI DUCENTA	FOGNATURA	Romagna Acque	Ravenna	234.000,00	0	0	0		47.500,00	0	47.500,00		47.500,00	100	INTERVENTO CONCLUSO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ESCLUSIVAMENTE AD ASPETTI CONTABILI (ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE)
2014RAHA0149	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI ERBOSA	FOGNATURA	Ravenna Holding	Ravenna	150.000,00	0	0	0		8.869,28	0	8.869,28		8.869,28	100	INTERVENTO CONCLUSO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ESCLUSIVAMENTE AD ASPETTI CONTABILI (ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE)
2014RAHA0151	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE MENSA-MATELLICA	FOGNATURA	Romagna Acque	Ravenna	526.000,00	0	0	0		12.420,00	0	12.420,00		12.420,00	100	INTERVENTO CONCLUSO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ESCLUSIVAMENTE AD ASPETTI CONTABILI (ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE)
2014RAHA0154	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE BOTTEGA LA GUARNERA	FOGNATURA	Romagna Acque	Ravenna	325.000,00	0	0	0		65.501,62	0	65.501,62		65.501,62	100	INTERVENTO CONCLUSO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ESCLUSIVAMENTE AD ASPETTI CONTABILI (ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE)
2015RAHA0026	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - SOLLEVAMENTO BIDENTE	FOGNATURA	Romagna Acque	Ravenna	2.476.000,00	100.000,00	0	100.000,00		0	0	0		-100.000,00	-100	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO A PARTIRE DAL 2021 COME DA NUOVO POI 2020-2024
2015RAHA0027	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - SOLLEVAMENTO NORD CITTA'	FOGNATURA	Romagna Acque	Ravenna	10.085.000,00	130.000,00	0	130.000,00		0	0	0		-130.000,00	-100	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO A PARTIRE DAL 2021 COME DA NUOVO POI 2020-2024
2017RAHA0009	COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLE RETI IN LOCALITA' CASALBORSETTI	FOGNATURA	Gestore	Ravenna	250.000,00	240.000,00	0		240.000,00	21.355,94	0		21.355,94	-218.644,06	-91	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE IN SEDE DI STESURA DEL PIANO ATERSIR 2020-2023, PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A RASDF, L'ID VIENE ANNULLATO E SOSTITUITO DAL 2019RAHA0053
2017RAHA0010	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO RAVENNA	FOGNATURA	Gestore	Ravenna	580.000,00	100.000,00	0		100.000,00	1.133,10	0		1.133,10	-98.866,90	-98	LO SCOSTAMENTO E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE OMOGENEA NEGLI ANNI DI ARCO PIANO, IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI MANIFESTANO ANNO PER ANNO. NEL 2019 NON SONO STATI SVILUPPATI INTERVENTI SPECIFICI
2017RAHA0011	RICOSTRUZIONE PREMENTE PORTO CORSINI	FOGNATURA	Gestore	Ravenna	1.000.000,00	30.000,00	0		30.000,00	2.920,32	0		2.920,32	-27.079,68	-90	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE IN SEDE DI STESURA DEL PIANO ATERSIR 2020-2023, PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A RASDF, L'ID VIENE ANNULLATO E SOSTITUITO DAL 2019RAHA0054
2017RAHA0018	ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE ZONA DARSENA	FOGNATURA	Gestore	Ravenna	6.041.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	44.266,97	0		44.266,97	-1.455.733,03	-97	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA COMPLESSITA' DEL PROGETTO E COMUNQUE IN COERENZA CON LA PRIORITA' E LE TEMPISTICHE DELLA DGR 569. AVVIATI I LAVORI NEL 2020 CON AVANZAMENTO IN LINEA CON QUANTO APPROVATO NEL NUOVO POI 2020-24
2018RAHA0001	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTI RETE NERA PENISOLA TRATTAROLI	FOGNATURA	Gestore	Ravenna	425.000,00	25.000,00	0		25.000,00	0	0		0	-25.000,00	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A RASDF L'ID VIENE ANNULLATO E SOSTITUITO DAL 2019RAHA0057
2018RAHA0002	POTENZIAMENTO COLLETTORE PORTO CORSINI-DEPURATORE	FOGNATURA	Gestore	Ravenna	2.525.000,00	75.000,00	0		75.000,00	15.635,10	0		15.635,10	-59.364,90	-79	SCOSTAMENTO 2019 IMPUTABILE AD UN LIEVE SLITTAMENTO DELL' ATTIVITA' PROGETTUALE IN QUANTO SONO ANCORA IN CORSO DI APPROFONDIMENTO LA DEFINIZIONE DELLA ARCHITETTURA COMPLESSIVA DEL SISTEMA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DEPURATORE DI MARINA DI RAVENNA (DISMISSIONE E COLLETTAMENTO RISPETTO A POTENZIAMENTO).
2018RAHA0003	RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA-1° stralcio	FOGNATURA	Gestore	Ravenna	660.000,00	210.000,00	0		210.000,00	26.311,06	0		26.311,06	-183.688,94	-87	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' IN RELAZIONE ALLE PRIORITA' CONDIVISE CON ARPAE E CON L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE (PRIORITA' AD OPERE DI SEPARAZIONE ZONA SAPIR)
2018RAHA0004	RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA-2° stralcio	FOGNATURA	Gestore	Ravenna	1.000.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0	0		0	-20.000,00	-100	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA POSTICIPAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE PRELIMINARE CHE ERANO STATE PIANIFICATE NEL 2019 CON IMPORTO PARI A 20.000 EURO, MA CON VALENZA PURAMENTE INDICATIVA . LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE RESTANO AD OGGI PIANIFICATE NELLE ANNUALITA' SUCCESSIVE COME RECEPITO DAL NUOVO POI 2020-24

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	TIPO INVESTIMENTO . (Gestore o Società Asset)	COMUNE	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	PIANO ATERSIR 2019				CONSUNTIVO HERA 2019						
						PIANO ATERSIR 2019 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2019 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2019 INV. DI TERZI	PIANO ATERSIR 2019 INV. GESTORE	CONS 2019 INV. LORDI	CONS 2019 CONTRIBUTI	CONS 2019 INV. DI TERZI	CONS 2019 INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDI	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2019
2018RAHA0005	POTENZIAMENTO RETI ACQUE METEORICHE - 1^ STRALCIO (collettori+potenziamento idrovora Sapir)	FOGNATURA	Gestore	Ravenna	4.143.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0	0		0	-20.000,00	-100	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA RIPROGRAMMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE A SEGUITO DI NECESSARIE VERIFICHE PUNTUALI SULLO STATO ATTUALE DELLE INFRASTRUTTURE FOGNARIE, INDISPENSABILI PER POTER FORMULARE UNA CORRETTA IPOTESI PROGETTUALE
2018RAHA0015	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN ZONA PORTO S.VITALE ZONA SAPIR	FOGNATURA	Romagna Acque	Ravenna	1.090.000,00	170.000,00	0	170.000,00		0	0		0	-170.000,00	-100	LA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO E' STATA COMPLETATA E SONO STATI AVVIATI I LAVORI A FINE 2019. POICHE' L'ACCORDO ATTUATIVO NON E' ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2019, IL CONSUNTIVO RISULTA PARI A ZERO. I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO
2014RAHA0163	COLLEGAMENTO ZONA ARTIGIANALE MONALDINA NORD - II STRALCIO	FOGNATURA	Gestore	Russi	300.000,00	22.000,00	0		22.000,00	0	0		0	-22.000,00	-100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE IN SEDE DI STESURA DEL PIANO ATERSIR 2020-2023, PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A RASDF, L'ID VIENE ANNULLATO E SOSTITUITO DAL 2019RAHA0060
2014RAHA0164	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ZONA ARTIGIANALE RUSSI-FIUMAZZO II STRALCIO	FOGNATURA	Romagna Acque	Russi	1.020.000,00	0	0	0		39.942,60	0	39.942,60		39.942,60	100	INTERVENTO CONCLUSO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ESCLUSIVAMENTE AD ASPETTI CONTABILI (ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE)
2014RAHA0165	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ZONA ARTIGIANALE RUSSI III STRALCIO	FOGNATURA	Romagna Acque	Russi	593.000,00	0	0	0		18.624,14	0	18.624,14		18.624,14	100	INTERVENTO CONCLUSO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ESCLUSIVAMENTE AD ASPETTI CONTABILI (ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE)
2014RAHA0167	COLLETTAMENTO ZONA ARTIGIANALE "MONALDINA NORD" - I STRALCIO	FOGNATURA	Romagna Acque	Russi	361.000,00	0	0	0		0	0	0		0,00	0	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2019. PERTANTO LA RENDICONTAZIONE ECONOMICA RISULTA PARI A ZERO. NEL 2019 E' STATA COMPLETATA LA PROGETTAZIONE. NEL 2020 PREVISTA LA SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO E LA CONSEGUENTE RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI
2017RAHA0014	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO RUSSI	FOGNATURA	Gestore	Russi	360.000,00	0	0		0	3.593,22	0		3.593,22	3.593,22	100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019, COME GIA' INDICATO NELLE NOTE DEL 2018, E' CONSEQUENZIALE ALLE DIFFICOLTA' RICONTRATE NELL' OTTENIMENTO DELLE SERVITU' E ACQUISTO DELL' AREA DAI PRIVATI
2017RAHA0015	ADEGUAMENTO FOGNATURA TRATTO MAZZARI SOLLEVAMENTO VIA GIARDINO	FOGNATURA	Gestore	Sant'Agata sul Santerno	250.000,00	0	0		0	3.509,25	0		3.509,25	3.509,25	100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO L'INTERVENTO E' STATO ANNULLATO E SOSTITUITO DAL 2019RAHA0062 PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A CONAMI
2015RAHA0031	DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA SOLAROLO	ACQUEDOTTO	Gestore	Solarolo	25.000,00	0	0		0	0	0		0	0,00	0	IN QUESTI ANNI SONO STATE SVOLTE VALUTAZIONI RELATIVE AI COSTI/BENEFICI DI QUESTO INTERVENTO CHE NON E' PERO' RISULTATO PRIORITARIO IN QUANTO IL DISTRETTO SU CUI SI ANDREBBE AD OPERARE CON IL MONITORAGGIO E OTTIMIZZAZIONE DEL REGIME DI PRESSIONI RISULTA NON AVERE PARTICOLARI PROBLEMI DI PERDITE DI RETE. PERTANTO SI E' DECISO DI INTERVENIRE A PARTIRE DAL 2021 MA CON INTERVENTI TECNICI DI MINORE IMPATTO RISPETTO A QUELLI INIZIALMENTE IPOTIZZATI
2017RAHA0016	RICOSTRUZIONE PREMENTE SOLLEVAMENTO MADONNA DELLA SALUTE-ISTRALCIO	FOGNATURA	Gestore	Solarolo	330.000,00	600.000,00	0		600.000,00	113.353,70	0		113.353,70	-486.646,30	-81	L'INTERVENTO RELATIVO AL I STRALCIO E' IN FASE DI CONCLUSIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AD UNA RIDEFINIZIONE DELL'IMPORTO DI PROGETTO (DA 1.200.000 EURO A 300.000 EURO) COME RECEPITO NEL NUOVO POI 2020-24. LA RIDEFINIZIONE DELL'IMPORTO PROGETTO E' DOVUTA ALLO SCORPORO DEL II STRALCIO CHE VERRA' FINANZIATO DALLA SOCIETA' DEGLI ASSET CONAMI CON ID 2019RAHA0064
Totale						25.370.000	1.720.000	6.356.000	17.294.000	15.293.622	0	1.203.310	14.090.312	-10.076.378		

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 6 del 9 dicembre 2020

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2019 - Gestore HERA S.p.A.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore
Responsabile ad interim
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 9 dicembre 2020

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Valentina Palli

Il Segretario verbalizzante
F.to Benedetta Casadei

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 6 maggio 2021

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna
