

CLRE/2020/5 del 11 dicembre 2020

**CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA**

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.A. Approvazione Consuntivo 2019.  
Programma Operativo Interventi 2015 - 2019**

IL COORDINATORE  
F.to Nico Giberti

CLRE/2020/5

### CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA

L'anno **2020** il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 10,00 si è riunito il Consiglio Locale di Reggio Emilia convocato con lettera prot. PG.AT/2020/0008708 del 03/12/2020.

La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle “Linee Guida temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza dell'emergenza epidemiologica COVID 19”, approvate dal Consiglio di Ambito con deliberazione n.13 del 14/04/2020.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBINEA	Giberti Nico	Sindaco	SI'	1,5851
BAGNOLO IN PIANO	Gianluca Paoli	Sindaco	SI'	1,6839
BAISO	Corti Fabrizio	Sindaco	SI'	0,7471
BIBBIANO	Loretta Bellelli	Assessore	SI'	1,7746
BORETTO	Matteo Benassi	Sindaco	SI'	1,0384
BRESCELLO			NO	1,0827
CA DEL BOSCO SOPRA	Bellaria Luigi	Sindaco	SI'	1,8441
CAMPAGNOLA EMILIA	Alessandro Santachiara	Sindaco	SI'	1,0744
CAMPEGINE	Claudio Mori	Assessore	SI'	1,0150
CANOSSA			NO	0,8069
CARPINETI	Tiziano Borghi	Sindaco	SI'	0,8685
CASALGRANDE	Silvia Miselli	Vice Sindaco	SI'	3,1321
CASINA	Stefano Costi	Sindaco	SI'	0,9242
CASTELLARANO	Zanni Giorgio	Sindaco	SI'	2,5376
CASTELNOVO MONTI	Bini Enrico	Sindaco	SI'	1,8554
CASTELNOVO SOTTO	Francesco Monica	Sindaco	SI'	1,5599
CAVRIAGO	Francesca Bedogni	Sindaco	SI'	1,7328
CORREGGIO	Fabio Testi	Assessore	SI'	4,1013
FABBRICO	Roberto Ferrari	Sindaco	SI'	1,2627

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
GATTATICO			NO	1,1379
GUALTIERI			NO	1,2538
GUASTALLA	Camilla Verona	Sindaco	SI'	2,5294
LUZZARA			NO	1,6499
MONTECCHIO EMILIA	Ferri Stefano	Assessore	SI'	1,8115
NOVELLARA			NO	2,3210
POVIGLIO			NO	1,3174
QUATTROCASTELLA	Alberto Olmi	Sindaco	SI'	2,2355
REGGIO EMILIA	Bonvicini Carlotta	Assessore	SI'	25,5927
REGGIOLO	Roberto Angeli	Sindaco	SI'	1,6575
RIO SALICETO	Lucio Malavasi	Sindaco	SI'	1,1682
ROLO	Luca Nasi	Sindaco	SI'	0,8465
RUBIERA			NO	2,4723
S. MARTINO IN RIO	Paolo Fuccio	Sindaco	SI'	1,4314
S. POLO D'ENZA	Cavatorti Elisa	Assessore	SI'	1,1458
S. ILARIO D'ENZA	Fabrizio Ferri	Assessore	SI'	1,9271
SCANDIANO	Nasciuti Matteo	Sindaco	SI'	4,0962
TOANO	Vincenzo Volpi	Sindaco	SI'	0,9123
VENTASSO			NO	0,9043
VETTO	Aronne Ruffini	Vice Sindaco	SI'	0,5206
VEZZANO SUL CROSTOLO			NO	0,8741
VIANO	Borghi Nello	Sindaco	SI'	0,7430
VILLA MINOZZO	Elio Ivo Sassi	Sindaco	SI'	0,8249
PROVINCIA di REGGIO EMILIA	Zanni Giorgio	Presidente	SI'	10,0000

Presenti n. 33 quote 86,18 Assenti n. 10 quote 13,82

Riconosciuta la validità della seduta Nico Giberti, in qualità di Coordinatore assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:



**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.A. Approvazione Consuntivo 2019. Programma Operativo Interventi 2015 - 2019**

**Vista** la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato** che:

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’Ambito la funzione di approvazione dei piani d’ambito;

**considerato** che:

- con deliberazione n.4 del 01 aprile 2016 e n.10 del 19 dicembre 2017 del Consiglio locale di Reggio Emilia è stato approvato ed aggiornato il Programma Operativo degli Interventi per gli anni 2015-2019 del Servizio Idrico Integrato per il gestore Iren S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d’Ambito;
- con deliberazione n. 27 del 19 aprile 2018 del Consiglio d’Ambito sono state approvate le modifiche al Piano degli Interventi del Piano di Ambito del territorio di Reggio Emilia a seguito della deliberazione del Consiglio Locale n. 10 del 19 dicembre 2017;
- con deliberazione n. 51 del 28 giugno 2018 del Consiglio d’Ambito è stato approvato l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria vigente (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, per i bacini tariffari di Parma, Piacenza e Reggio Emilia gestiti da IREN S.p.A. e dalla partecipata IRETI S.p.A.;
- con deliberazione n° 5 del 30 novembre 2018 del Consiglio Locale di Reggio Emilia è stato approvato il Programma Operativo degli Interventi per gli anni 2019-2022, con revisione straordinaria annualità 2019, per il Gestore IREN Reggio Emilia;
- con deliberazione n° 39 del 24 maggio 2019 il Consiglio d’Ambito ha approvato l’aggiornamento del Piano d’Ambito della Provincia di Reggio Emilia.
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 inoltre dispone che:

- entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
- il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
- il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

**dato atto che:**

- il gestore Iren S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2019 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata ai Comuni interessati in allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale;

**rilevato** che i dati presentati relativi all'annualità 2019 sono stati analizzati e sintetizzati nell'Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:

- interventi non avviati;
- interventi anticipati/conclusi;
- interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 2015 - 2019 vigente - annualità 2019, autorizzati con nulla osta ai sensi della CAMB 75/2017;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al +/- 20%;

**rilevato** inoltre che:

- gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 approvato per l'annualità 2019;
- è stata effettuata un'analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva.

**ritenuto** pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 come indicato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto,



**visto** lo Statuto dell'Agencia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**dato atto** che il verbale della seduta è depositato agli atti.

**posta** quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti a favore n. 33 (quote 86,16), resi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 per il gestore Iren S.p.A. per il bacino tariffario di Reggio Emilia come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA  
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato  
Consuntivo investimenti annualità 2019  
Gestore: IREN S.p.A. (RE)**

**11 dicembre 2020**

## RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019


La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2019, del Programma Operativo Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Reggio Emilia n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n° 5 del 30 novembre 2018 e Delibera del Consiglio d'Ambito n.51 del 28 giugno 2018, che il gestore IREN S.p.A. ha presentato tramite il software ARSI.

PIANIFICATO 2019		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2019	
Importo Lordo Pianificato [A]	€ 24.223.650	<b>+ € 5.856.133</b>	€ 30.079.783	Importo Lordo a Consuntivo [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 1.385.060	<b>-€ 493.681</b>	€ 891.379	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 22.838.590	<b>€ 6.349.814</b>	€ 29.188.404	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]

**Tab.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019**

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IREN S.p.A. abbia effettuato maggiori investimenti netti rispetto alla pianificazione approvata precisamente pari ad €. 6.349.814 a fronte dei minori contributi incassati pari a - € 493.681.


Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

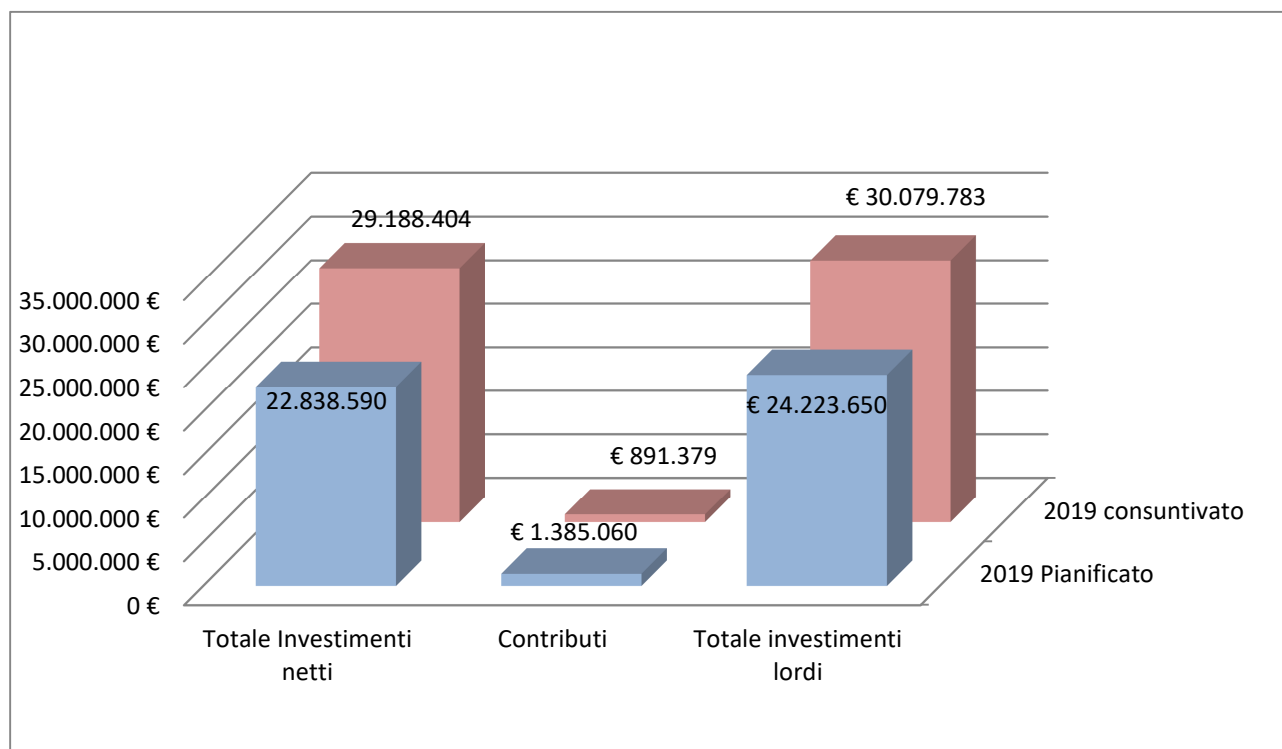

**Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019**



Gli investimenti realizzati nell'annualità 2019 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

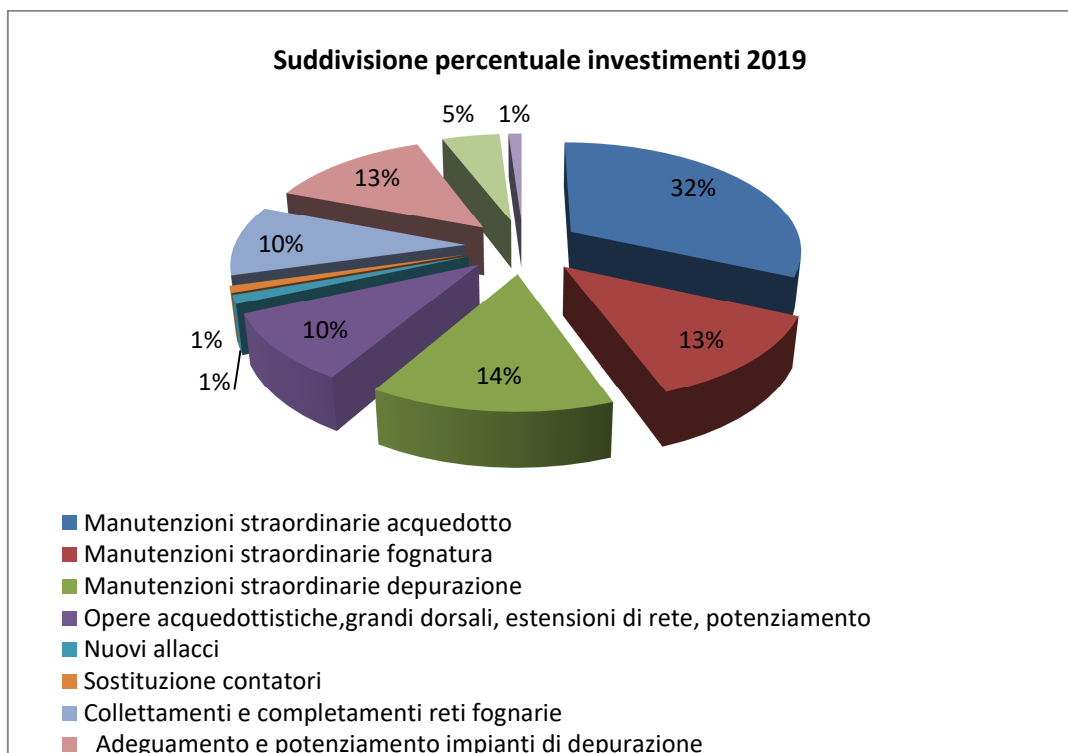


**Fig.2 –Suddivisione investimenti 2019 per servizio**

Nella tabella e nel grafico che seguono è riportato il numero degli interventi raggruppati sulla base degli scostamenti verificati e la rappresentazione grafica con indicazione della percentuale di ciascuna categoria rapportata al totale:

interventi non iniziati (-100%)	26
interventi eseguiti anticipatamente o code di interventi (+100%)	70
interventi con scostamento superiore a + o - 20%	33
interventi con scostamento inferiore a + o - 20%	4

**Tab.2– Interventi che presentano scostamento tra pianificato e quanto rendicontato**

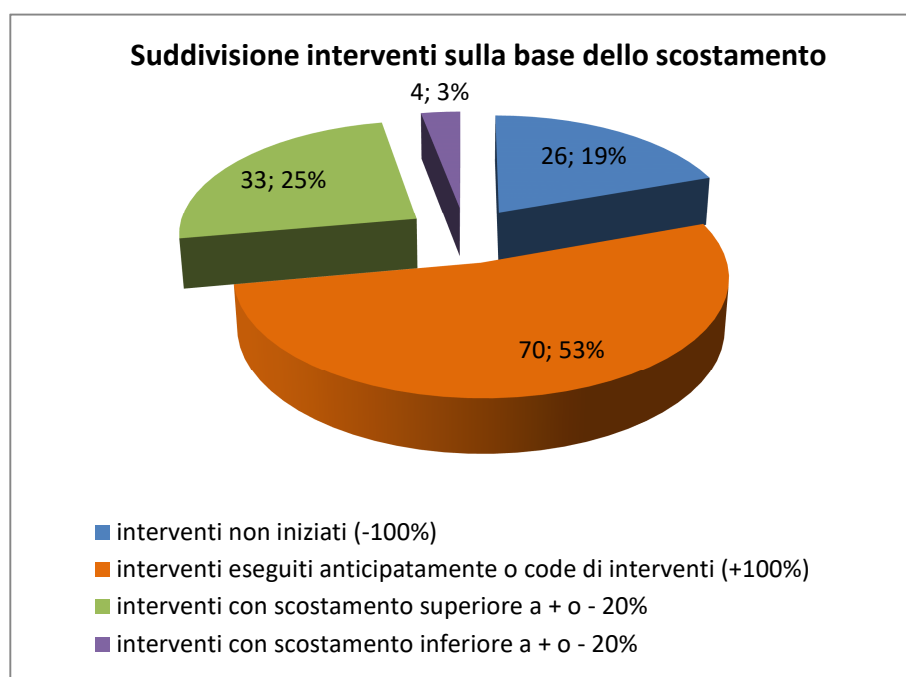

**Fig.3 –Interventi realizzati nell'annualità 2019 suddivisi per scostamento**

Dalla tabella sopra riportata e dal relativo grafico risulta che per l'annualità 2019, n.26 interventi, che erano stati programmati per complessivi €. 2.642.820, non sono stati avviati (scostamento pari a -100%), (per l'elenco si veda la Tab. 4), per i quali la giustificazione è risultata esaustiva (Allegato 1).

Il Gestore ha avviato anticipatamente oppure chiuso prima rispetto a quanto programmato n.70 interventi e n.33 interventi hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno, e per i quali la giustificazione fornita è risultata esaustiva. Per n.5 interventi lo scostamento è inferiore al +/- 20% e quindi non passibile di giustificazione.

#### RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o meno e il relativo provvedimento che ATERSIR intende eventualmente adottare.

Numero di interventi programmati nel 2019 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 64

Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2019: 108

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2019	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2019	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	26	€ 0	€ 2.642.820	NO	Vedi TAB.L, 2 e 4 e Fig. 3. Vedi il dettaglio in ALLEGATO 1	
Interventi con avvio anticipato nel 2019 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito (+100%)	70	€ 7.245.322	€ 0	NO	2014REIA0001 2014REIA0004 2014REIA0006 2014REIA0008 2014REIA0012 2014REIA0019 2014REIA0023 2014REIA0025 2014REIA0026 2014REIA0028 2014REIA0030 2014REIA0031 2014REIA0032 2014REIA0033 2014REIA0034 2014REIA0036 2014REIA0039 2014REIA0041 2014REIA0042 2014REIA0043 2014REIA0045 2014REIA0050 2014REIA0051 2014REIA0052 2014REIA0055 2014REIA0056 2014REIA0057 2014REIA0058 2014REIA0063 2014REIA0065 2014REIA0071 2014REIA0080 2014REIA0081 2014REIA0082 2014REIA0083 2014REIA0094 2016REIA0105 2016REIA0107 2016REIA0108 2016REIA0113 2016REIA0114 2016REIA0115 2016REIA0116 2016REIA0120 2016REIA0121	

					2016REIA0122 2016REIA0127 2016REIA0129 2016REIA0132 2016REIA0133 2016REIA0134 2016REIA0140 2016REIA0142 2016REIA0145 2017REIA0149 2017REIA0150 2017REIA0153 2017REIA0155 2017REIA0157 2017REIA0158 2017REIA0160 2017REIA0161 2017REIA0163 2017REIA0164 2017REIA0166 2017REIA0167 2018REIA0193 2018REIA0203 2018REIA0211 2018REIA0252	
Interventi avviati nel 2019 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	NO					
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	33	€ 18.764.962	€ 17.667.205	NO	2014REIA0007 2014REIA0021 2014REIA0064 2014REIA0066 2014REIA0086 2014REIA0091 2016REIA0057 2016REIA0109 2016REIA0117 2016REIA0126 2016REIA0128 2016REIA0136 2016REIA0138 2017REIA0154 2017REIA0159 2017REIA0162 2017REIA0165 2017REIA0168 2018REIA0174 2018REIA0175 2018REIA0176 2018REIA0199 2018REIA0204 2018REIA0217 2018REIA0228 2018REIA0233 2018REIA0235 2018REIA0249 2018REIA0250 2018REIA0254 2018REIA0255 2018REIA0256 2018REIA0257	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	5	€ 4.359.931	€ 4.283.225	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

**Tab.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato**

Gli interventi pianificati e non realizzati, con scostamento -100% sono n. 26 e sintetizzati nella tabella che segue:

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019
2014REIA0010	5.8.Uspf.113 - Risanamento fognature capoluogo 1° stralcio	FOGNATURA	Campegine	95.000 €	95.000 €
2014REIA0072	5.8.Uspf.125b - Realizzazione rete fognaria Capoluogo Zona sportiva 2° stralcio	FOGNATURA	San Martino in Rio	130.000 €	130.000 €
2014REIA0087	5.2.25 - Estendimenti acqua in zone non servite. zone contaminate da arsenico Comuni di Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto	ACQUEDOTTO	Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto	200.000 €	50.000 €
2014REIA0088	5.4.11 - Estensione fognere o miste	FOGNATURA	Opere pluricomunali	369.044 €	100.000 €
2016REIA0112	Potenziamento collettore Caprara-Meletole I°lotto	FOGNATURA	Campegine	1.000.000 €	50.000 €
2016REIA0118	Studio razionalizzazione rete fognaria in loc. diverse del comune di Casina	FOGNATURA	Casina	20.000 €	20.000 €
2016REIA0124	Tagliata: realizzazione impianto di depurazione e rete di collettamento	FOGNATURA	Guastalla	180.000 €	180.000 €
2016REIA0135	Depuratore di Rubiera: sistemazione e potenziamento linea fanghi	DEPURAZIONE	Rubiera	180.000 €	180.000 €
2016REIA0139	Risanamento fognature in loc. Sedrio 2° lotto	FOGNATURA	Vezzano sul Crostolo	100.000 €	100.000 €
2017REIA0152	Realizzazione collettore fognario acque nere in loc. Mapriana	FOGNATURA	Castelnovo Monti	100.000 €	100.000 €
2018REIA0178	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario tra via Malaguti - Via dei Gonzaga e Via Guido da Bagnolo-Via Gandhi	FOGNATURA	Bagnolo in Piano	150.000 €	150.000 €
2018REIA0184	Estendimento rete acquedotto nella frazione di Lentigione nelle vie: Molino-Caselle, Del Porto, Viazza, Imperiale inferiore, Via Bernieri	ACQUEDOTTO	Brescello	20.000 €	20.000 €

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019
2018REIA0187	Piano Fognario - Risoluzione problematiche connesse alla presenza di acque parassite provenienti da canali di bonifica in via Gandhi	FOGNATURA	Cadelbosco di Sopra	100.000 €	100.000 €
2018REIA0192	Piano Fognario - Intervento di messa in sicurezza fognatura in Via san Prospero	FOGNATURA	Carpineti	76.745 €	76.745 €
2018REIA0197	Piano Fognario - Rifacimento condotta fognaria in Via Marconi	FOGNATURA	Casina	37.820 €	37.820 €
2018REIA0198	Piano Fognario - Risoluzione problematiche connesse alla presenza di acque parassite provenienti da canali di bonifica in Via Canalino	FOGNATURA	Castelnovo di Sotto	100.000 €	100.000 €
2018REIA0208	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Fattori nel tratto tra Via Codisotto a sera e Via Allende	FOGNATURA	Gualtieri	400.000 €	200.000 €
2018REIA0213	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Galilei e Via Parri	FOGNATURA	Montecchio	150.000 €	150.000 €
2018REIA0224	Raddoppio collettore fognario in Viale Isonzo	FOGNATURA	Reggio Emilia	500.000 €	50.000 €
2018REIA0229	Razionalizzazione rete fognaria in Via del Partigiano	FOGNATURA	Reggio Emilia	100.000 €	100.000 €
2018REIA0231	Depuratore di Mancasale: adeguamento linea di digestione anaerobica	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	1.800.000 €	100.000 €
2018REIA0232	Depuratore di Roncoesi: adeguamenti impiantistici diversi	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	1.000.000 €	200.000 €
2018REIA0236	Potenziamento impianto chimico-fisico depuratore di Mancasale	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	600.000 €	100.000 €
2018REIA0237	Raddoppio collettore fognario attraversamento canale Fiuma - tratto sollevamento Ponte testa - depuratore di Reggiolo	FOGNATURA	Reggiolo	300.000 €	50.000 €
2018REIA0240	Piano Fognario - Estendimento rete fognaria nera in via Crocetta	FOGNATURA	Rolo	123.255 €	123.255 €
2018REIA0242	Rifacimento collettore fognario in Via Gazzata	FOGNATURA	San Martino in Rio	80.000 €	80.000 €

**Tab.4 – Interventi pianificati ma non avviati**

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL  
C.L. DI REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con  
delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n. n° 5 del 30 novembre  
2018**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo	Scostamento	Note giustificative
2014REIA0001	5.8.Uspf.90 - Potenziamento fognature Via Chierici e collegamento fognario e adeguamento Rio delle Muratte loc. Borzano	FOGNATURA	Albinea	185.000 €	0 €	0 €	0 €	116.587 €	0 €	116.587 €	100	Intervento ultimato: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti
2014REIA0002	5.3.39 - Potenziamento adduttrice DN 600 e DN 400	ACQUEDOTTO	Bagnolo in Piano	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0003	5.3.40 - Potenziamento adduttrice da pensile a DN 600	ACQUEDOTTO	Bagnolo in Piano	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0004	5.8.Uspf.91 - Realizzazione rete in loc. Casale	FOGNATURA	Baiso	150.000 €	0 €	0 €	0 €	48.430 €	0 €	48.430 €	100	Progettazione conclusa, cantiere in corso
2014REIA0005	5.6.D09.8 - Barco: scaricatore collettore Ciano-Roncoesi	FOGNATURA	Bibbiano	56.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0006	5.10.D15.1 5.10.D15.21 5.8.Uspf.111 - Agglomerato Boretto: potenziamento depuratore a 7500 AE	DEPURAZIONE	Boretto	1.317.024 €	0 €	0 €	0 €	165.377 €	0 €	165.377 €	100	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti: cantiere in corso per lavori di sistemazione dell'area e ristrutturazione del vecchio impianto
2014REIA0007	5.10.D15.12 5.10.D15.26 - Adeguamento della potenzialità del depuratore capoluogo (completamento 1° linea)	DEPURAZIONE	Brescello	2.151.000 €	500.000 €	0 €	500.000 €	883 €	0 €	883 €	-99	Progettazione definitiva ultimata. In attesa approvazione variazione di destinazione urbanistica da parte del Comune di Brescello
2014REIA0008	5.10.D15.41 - Potenziamento impianto depurazione	DEPURAZIONE	Cadelbosco di Sopra	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €	561 €	0 €	561 €	100	Intervento ultimato. Coda di intervento pianificato in annualità precedenti
2014REIA0009	5.8.Uspf.112 - Estendimento rete fognaria capoluogo 1° stralcio	FOGNATURA	Campagnola	95.228 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0010	5.8.Uspf.113 - Risanamento fognature capoluogo 1° stralcio	FOGNATURA	Campegine	95.000 €	95.000 €	0 €	95.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	In corso di definizione con l'amministrazione Comunale le priorità di intervento che sono correlate a quanto previsto sul collettore principale di cui al codice 2016REIA0112
2014REIA0011	5.8.Uspf.129 a - Completamento rete fognaria in località Rossena	FOGNATURA	Canossa	47.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL  
C.L. DI REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con  
delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n. n° 5 del 30 novembre  
2018**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo	Scostamento	Note giustificative
2014REIA0012	5.8.Uspf.129 b - Razionalizzazione e risanamento rete fognaria in località Castello di Canossa	FOGNATURA	Canossa	150.000 €	0 €	0 €	0 €	29.254 €	0 €	29.254 €	100	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato nell'annualità precedente
2014REIA0013	Completamento terza uscita centrale idrica	ACQUEDOTTO	Campegine	157.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0014	5.8.Uspf.114 - Realizzazione collegamento rete fognaria località s.Biagio al depuratore di Cà perizzi 1° stralcio	FOGNATURA	Carpinetti	93.033 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0015	Sistemazione scarico Rio Fontanello	FOGNATURA	Carpinetti	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0016	5.8.Uspf.130 - Realizzazione collegamento rete fognaria località S.Biagio al depuratore di Cà perizzi2° stralcio	FOGNATURA	Carpinetti	95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0017	5.10.D15.40 - Adeguamento impianto: nuovo ispessitore	DEPURAZIONE	Casalgrande	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0018	5.8.Uspf.94 - Ristrutturazione rete fognaria capoluogo 3° stralcio	FOGNATURA	Casalgrande	278.527 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0019	Realizzazione di terzo pozzo S.Donnino	ACQUEDOTTO	Casalgrande	200.000 €	0 €	0 €	0 €	11.148 €	0 €	11.148 €	100	Intervento ultimato: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti. Manca collegamento elettrico
2014REIA0020	Realizzazione estendimento rete fognaria in località Rovetto	FOGNATURA	Casina	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0021	5.3.36 - M.RE Barazzone 6 km DN 300 (Gabellina)	ACQUEDOTTO	Casina	1.020.000 €	320.000 €	0 €	320.000 €	3.938 €	0 €	3.938 €	-98	Progettazione ultimata, in corso di ottenimento le servitù di passaggio in terreni privati
2014REIA0022	5.3.28 - Raddoppio adduttrice 4 km DN 500	ACQUEDOTTO	Castellarano	398.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL  
C.L. DI REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con  
delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n. n° 5 del 30 novembre  
2018**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo	Scostamento	Note giustificative
2014REIA0023	5.8.Uspf.116 - Realizzazione di Nuova fossa imoff Montebabbio (100AE)	DEPURAZIONE	Castellarano	150.000 €	0 €	0 €	0 €	25.597 €	0 €	25.597 €	100	Cantiere in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione a causa del fallimento dell'impresa esecutrice Siteco. I lavori sono stati riaffidati ad una nuova impresa e si prevede l'ultimazione nella primavera 2020
2014REIA0024	5.8.Uspf.78 - Collegamento fognario località Farneto a rete depurata	FOGNATURA	Castellarano	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0025	5.10.D15.23 - Adeguamento impianto di depurazione Rio Dorgola (2° linea acqua trattamento nutrienti ed adeguamento linea fanghi 1° stralcio)	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti	700.000 €	0 €	0 €	0 €	5.774 €	0 €	5.774 €	100	Progettazione ultimata, in fase di ottenimento le autorizzazioni
2014REIA0026	5.10.D15.5 - Potenziamento Costa de Grassi: 2° linea	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti	250.000 €	0 €	0 €	0 €	100.537 €	0 €	100.537 €	100	Cantiere in corso. In ritardo rispetto alla pianificazione per problemi geologici dovuti alla limitrofa frana quiescente che sembra essersi riattivata
2014REIA0027	5.10.D15.13 - Potenziamento Impianto Ca' Perizzi - Posa biodischi linea 4	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0028	5.10.D15.17 - Castelnovo ne' Monti - Rio Spirola secondario - Realizzazione nitrifiltr.+sist.esistente	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti	300.000 €	0 €	0 €	0 €	161.061 €	0 €	161.061 €	100	Cantiere in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione a causa del fallimento dell'impresa individuata per la realizzazione dell'impianto elettrico. Si prevede l'ultimazione nella primavera 2020
2014REIA0029	5.10.D15.35 - Rio Maillo sedimentatore secondario	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0030	5.10.D15.7 5.10.D15.14 - Meletole: Impianto di depurazione 1° e 2° Linea	DEPURAZIONE	Castelnovo di Sotto	3.110.000 €	0 €	0 €	0 €	463.214 €	0 €	463.214 €	100	Coda di intervento pianificato per l'annualità 2016. Ad oggi intervento ultimato e impianto in esercizio. Rimangono da realizzare alcune opere di completamento e la ristrutturazione della vecchia linea
2014REIA0031	5.8.Uspf.96 - Estendimento fognario in Via Alberici, Meletole	FOGNATURA	Castelnovo di Sotto	154.710 €	0 €	0 €	0 €	172 €	0 €	172 €	100	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti
2014REIA0032	5.8.Uspf.117 - Estendimento fognario Via Peschiera	FOGNATURA	Castelnovo di Sotto	150.000 €	0 €	0 €	0 €	54.021 €	0 €	54.021 €	100	Intervento ultimato: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti per esecuzione ripristini stradali



**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL  
C.L. DI REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con  
delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n. n° 5 del 30 novembre  
2018**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo	Scostamento	Note giustificative
2014REIA0033	5.8.Uspf.131 - Risanamento fognature capoluogo con interventi vari via Rivasi, via Marzabotto, via 1° Maggio, via Arduini, via Costituzione, via Spaggiari, via Grandi, Sottopasso Pianella, Via Girondola, via Guerra	FOGNATURA	Cavriago	250.357 €	0 €	0 €	0 €	51.416 €	0 €	51.416 €	100	Intervento ultimato. Realizzati ripristini stradali e sistemazioni dell'area d'intervento
2014REIA0034	5.10.D15.24 - Cerreto Alpi: 400 AE biodischi	DEPURAZIONE	Collagna	535.000 €	0 €	0 €	0 €	3.308 €	0 €	3.308 €	100	Progettazione in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione per difficoltà di individuazione del sito più idoneo in relazione al contesto ambientale di pregio. Presentata la terza ipotesi progettuale al Comune e al Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano
2014REIA0035	PROGR 2009 tab. 2 - Canolo potenziamento impianto depurazione	DEPURAZIONE	Correggio	626.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0036	5.8.Uspf.96 - Interventi pregressi Dinazzano Lemizzone 1° lotto	FOGNATURA	Correggio	200.000 €	0 €	0 €	0 €	13.176 €	0 €	13.176 €	100	Progettazione in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Anticipata la sostituzione delle pompe del sollevamento in attesa di definire il percorso della nuova fognatura
2014REIA0037	5.8.Uspf.118 - Risanamento reticolo fognario in via Pozzi e limitrofe	FOGNATURA	Fabbrico	263.258 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0038	5.10.D15.42 - Potenziamento Impianto di depurazione Praticello: nuovo ispessitore	DEPURAZIONE	Gattatico	130.707 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0039	5.8.Uspf.98 - Potenziamento rete fognaria capoluogo. 1° stralcio	FOGNATURA	Gualtieri	140.000 €	0 €	0 €	0 €	30.941 €	0 €	30.941 €	100	E' stato realizzato un primo stralcio di collettore fognario. In corso modellazione idraulica per individuare le priorità di intervento
2014REIA0040	5.8.Uspf.80 - Risanamento fognatura scuole	FOGNATURA	Gualtieri	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0041	5.10.D15.19 - Impianto di depurazione Guastalla Nord: nitri-denitri	DEPURAZIONE	Guastalla	300.000 €	0 €	0 €	0 €	136.625 €	0 €	136.625 €	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
2014REIA0042	5.7.D11.3 - Madonna del Ficchetto: risoluzione criticità di deflusso	FOGNATURA	Guastalla	485.566 €	0 €	0 €	0 €	1.539 €	0 €	1.539 €	100	Intervento ultimato: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti
2014REIA0043	5.8.Uspf.99 - Collegamento fognario loc. San Giacomo alla rete depurata	FOGNATURA	Guastalla	165.000 €	0 €	0 €	0 €	942 €	0 €	942 €	100	Coda di intervento pianificato nelle annualità precedenti

<b>PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n. n° 5 del 30 novembre 2018</b>	<b>CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019</b>
---	---

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo	Scostamento	Note giustificative
2014REIA0044	5.8.Uspf.134 - Sistemazione fognature Giarola Campo	FOGNATURA	Ligonchio	137.820 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0045	5.3.7 - Nuovo serbatoio Luzzara mc 2000	ACQUEDOTTO	Luzzara	1.800.000 €	0 €	0 €	0 €	260.659 €	0 €	260.659 €	100	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti
2014REIA0046	5.5.D04.8 5.8.Uspf.120 - Casoni: collettamento a rete depurata	FOGNATURA	Luzzara	536.678 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0047	Realizzazione di 6° pozzo centale idrica	ACQUEDOTTO	Luzzara	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0049	5.3.8 - Completamento centrale idrica	ACQUEDOTTO	Novellara	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0050	5.11.1.13 - San Bernardino: nuovo impianto biosidchi 450 AE	DEPURAZIONE	Novellara	660.000 €	0 €	0 €	0 €	6.208 €	0 €	6.208 €	100	Intervento ultimato. Coda di intervento pianificato in annualità precedenti
2014REIA0051	5.7.D11.4 - Potenziamento reticolo fognario in Via Caravaggio (ex via Curie)	FOGNATURA	Novellara	155.000 €	0 €	0 €	0 €	40.001 €	0 €	40.001 €	100	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato nell'annualità precedente
2014REIA0052	5.8.Uspf.81 - Risanamento fognatura Via Nazario Sauro	FOGNATURA	Novellara	150.000 €	0 €	0 €	0 €	2.425 €	0 €	2.425 €	100	Progettazione in corso: Individuata l'area per la realizzazione dell'impianto di sollevamento, in corso verifiche geologiche per la presenza superficiale della falda
2014REIA0053	5.8.Uspf.101+ a - Risanamento e potenziamento rete fognaria Capoluogo	FOGNATURA	Poviglio	305.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0054	5.2.25 - Nuovo impianto osmosi Magallana ( acq. Quattro Castella)	ACQUEDOTTO	Quattro Castella	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0055	5.8.Uspf.102 - Potenziamento fognario Via Piave	FOGNATURA	Quattro Castella	150.000 €	0 €	0 €	0 €	119.045 €	0 €	119.045 €	100	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL  
C.L. DI REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con  
delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n. n° 5 del 30 novembre  
2018**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo	Scostamento	Note giustificative
2014REIA0056	5.8.Uspf.83 5.8.Uspf.121 - Realizzazione collettore fognario in loc. Miscoso	FOGNATURA	Ramiseto	103.644 €	0 €	0 €	0 €	5.349 €	0 €	5.349 €	100	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti. Ultime spese sostenute per collaudo statico a completamento della pratica sismica
2014REIA0057	5.3.38 - Interconnessione acquedotti Reggio-Roncocesi: attraversamento Crostolo	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	350.000 €	0 €	0 €	0 €	590.573 €	0 €	590.573 €	100	Intervento concluso: sfioramento dell'importo dovuto a maggiori lavorazioni richieste da AIPO a protezione argine del torrente Crostolo (palancolature, ringrossi arginali..), dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per il tombinamenti del canale esistente ai piedi dell'argine e da privati proprietari per la sistemazione definitiva dell'area di cantiere
2014REIA0058	5.9.D13.1 - Riuso reflui Mancasale - Opere di completamento	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	600.000 €	0 €	0 €	0 €	68.422 €	0 €	68.422 €	100	Intervento ultimato: coda di cantiere pianificato in precedenti annualità
2014REIA0059	5.8.Uspf.122a - Potenziamento rete fognaria Via Cipriani	FOGNATURA	Reggio Emilia	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0060	5.8.Uspd.103a - Estendimento fognario in Scaruffi	FOGNATURA	Reggio Emilia	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0061	Depuratore di Roncocesi - sistemazione e adeguamento digestori	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0062	Estendimento fognario in via Zannoni	FOGNATURA	Reggio Emilia	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0063	U.s.p.f. - Estendimento della rete fognaria in via Beethoven da via Zamenhof a via Sidoli, nella frazione di Massenzatico	FOGNATURA	Reggio Emilia	400.000 €	0 €	0 €	0 €	472.423 €	0 €	472.423 €	100	Cantiere in corso: coda di intervento pianificato in annualità precedenti.
2014REIA0064	5.8.Uspf.123 + 5.5.D04.7 - Agglomerato Rame - Connessione dell'agglomerato al sistema depurato di Reggiolo	FOGNATURA	Reggiolo	1.470.000 €	970.000 €	0 €	970.000 €	626.660 €	0 €	626.660 €	-35	Cantiere in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per la necessità di ricorrere a tecnologia microtunnelling anziché scavo a cielo aperto
2014REIA0065	5.10.D15.10 - Rio Saliceto: potenziamento impianto 6000 adeguamenti diversi - sedimentatore secondario	DEPURAZIONE	Rio Saliceto	150.000 €	0 €	0 €	0 €	103.592 €	0 €	103.592 €	100	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL  
C.L. DI REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con  
delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n. n° 5 del 30 novembre  
2018**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo	Scostamento	Note giustificative
2014REIA0066	5.8.Uspf.85 - Potenziamento scaricatore di piena fognature del capoluogo.	FOGNATURA	Rio Saliceto	258.000 €	258.000 €	0 €	258.000 €	8.125 €	0 €	8.125 €	-96	Progettazione conclusa: l'intervento prevede l'adeguamento del canale di scolo in uscita dallo scolmatore principale del reticolo comunale con la posa di un condotto scolare. Da realizzare in concomitanza ad una pista ciclabile da parte della Provincia
2014REIA0067	5.7.D11.10 - Potenziamento drenaggio urbano II° lotto	FOGNATURA	Rolo	602.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0068	5.7.D11.2 - Potenziamento drenaggio urbano III° lotto	FOGNATURA	Rolo	1.300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0069	5.8.Uspf.124 - Estendimento rete fognaria in Via Bedollo	FOGNATURA	Rolo	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.499 €	-10.499 €	0	
2014REIA0070	5.8.Uspf.86 5.8.Uspf.138 - Estendimento fognature in via delle Valli, via Togliatti e Completamento lavori TAV	FOGNATURA	Rubiera	235.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0071	5.8.Uspf.125a - Realizzazione rete fognaria Via Roma Capoluogo Zona sportiva 1° stralcio	FOGNATURA	San Martino in Rio	170.000 €	0 €	0 €	0 €	11.184 €	0 €	11.184 €	100	Progettazione esecutiva ultimata. Da considerare unitamente al codice 2014REIA0072: è stato realizzato un unico progetto da ~ 440.000,00. Si prevede la realizzazione dei lavori nel corso del 2020
2014REIA0072	5.8.Uspf.125b - Realizzazione rete fognaria Capoluogo Zona sportiva 2° stralcio	FOGNATURA	San Martino in Rio	130.000 €	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	Da considerare unitamente al codice 2014REIA0071: è stato realizzato un unico progetto di importo ~ 440.000,00
2014REIA0073	5.8.Uspf.139 - Realizzazione rete fognaria Capoluogo Zona sportiva 3° stralcio	FOGNATURA	San Martino in Rio	182.740 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0074	5.8.Uspf.87 - Costruzione nuovo scolmatore scuole su collettore Ciano Roncocesi e potenziamento fognatura via Riolo.	FOGNATURA	San Polo d'Enza	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0075	5.8.Uspf.141 - Collettore fognario in loc. Rampa d'Enza	FOGNATURA	Sant'Ilario d'Enza	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0076	5.8.Uspf.105 - Estendimento fognario in loc. Chiozza	FOGNATURA	Scandiano	320.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL  
C.L. DI REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con  
delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n. n° 5 del 30 novembre  
2018**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo	Scostamento	Note giustificative
2014REIA0077	Uspf - pregressi 5.8.Uspf.9 - Sistemazione fognature Arceto 2° e 3° lotto	FOGNATURA	Scandiano	380.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0078	5.8.Uspf.107 5.8.Uspf.127 - Risanamento fognature in loc. Sedrio	FOGNATURA	Vezzano sul Crostolo	108.248 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0079	5.10.D15.29 - Potenziamento impianto 5000 AE N+D+sedimentatore II + ispessimento	DEPURAZIONE	Viano	900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0080	5.10.D15.9 - Potenziamento impianto San Giovanni di Querciola	DEPURAZIONE	Viano	243.000 €	0 €	0 €	0 €	16.751 €	0 €	16.751 €	100	Intervento in fase di ultimazione: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti
2014REIA0081	5.8.Uspf.108 - Realizzazione collettore fognario in loc. Predale	FOGNATURA	Viano	181.829 €	0 €	0 €	0 €	105.516 €	0 €	105.516 €	100	Cantiere in corso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità. Si prevede l'ultimazione nella primavera 2020
2014REIA0082	Costruzione di depuratore al servizio della frazione di Gazzano	DEPURAZIONE	Villaminazzo	370.000 €	0 €	0 €	0 €	51.326 €	0 €	51.326 €	100	Coda di intervento pianificato in annualità precedenti: cantiere in corso
2014REIA0083	Costruzione reti di collettamento e depuratore al servizio della frazione di Carniana	FOGNATURA	Villaminazzo	700.000 €	0 €	0 €	0 €	2.745 €	0 €	2.745 €	100	Progettazione in corso: individuato il percorso per il collettore, in corso la raccolta delle servitù di passaggio
2014REIA0084	5.4.16 - Nuovi impianti di depurazione/potenziamento impianti esistenti	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0085	5.4.7 - Adeguamento depuratori al D.gls 152/06 e delibere regionali - Trattamenti appropriati	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0086	5.4.8 - Piano fognario	FOGNATURA	Opere pluricomunali	1.200.000 €	300.000 €	0 €	300.000 €	527.507 €	0 €	527.507 €	75	Sono stati qui consuntivati diversi interventi di Piano Fognario derivanti da precedenti annualità e non singolarmente codificati. ATTENZIONE! Rendicontati qui per errore - 54.254,92 dell'intervento 2016REIA0112 - Potenziamento collettore Caprara-Meletole
2014REIA0087	5.2.25 - Estendimenti acqua in zone non servite. zone contaminate da arsenico Comuni di Cadelbosco di Sopra e Castelnovo Sotto	ACQUEDOTTO	Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto	200.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	Nessuna richiesta di estendimento pervenuta per pozzi privati contaminati da arsenico

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL  
C.L. DI REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con  
delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n. n° 5 del 30 novembre  
2018**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo	Scostamento	Note giustificative
2014REIA0088	5.4.11 - Estensione fogne nere o miste	FOGNATURA	Opere pluricomunali	369.044 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	Non sono pervenute richieste di intervento da parte dei Comuni o dai privati. Capitolo che prevede il cofinanziamento al 50% da parte dei privati
2014REIA0089	5.4.8 - Adeguamento e nuova costruzione di collettori fognari verso gli impianti di trattamento o collettori esistenti	FOGNATURA	Opere pluricomunali		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0090	Distributori di acqua pubblica	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	198.856 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0091	5.2.2. - 5.2.4. - 5.2.5. - 5.2.6. - 5.2.9. - 5.2.9. - 5.2.11. - 5.2.12. - 5.2.13 - Manutenzioni straordinarie acqua	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	13.200.000 €	3.300.000 €	0 €	3.300.000 €	9.301.739 €	33.000 €	9.268.739 €	181	Nel corso del 2019, anche in concomitanza con lo slittamento del cantiere dell'adduttrice REGGIO-RONCOCESI, sono principalmente aumentate le attività di rifacimento prese che, in caso di rottura, permettono di rinnovare completamente la derivazione dell'utente con nuova tubazione in triplo strato, operazione da preferire rispetto alla semplice riparazione. Ricompresi in questo capitolo anche quota parte degli interventi di rinnovamento delle reti ai fini della riduzione delle perdite (per ~ 580.919,92) o per concomitanza ad interventi di riqualificazione da parte dei Comuni (rifacimento pavimentazioni pregiate di piazze, marciapiedi, piste ciclabili..)
2014REIA0092	5.2.19 - Interconnessioni acquedotti e nuove opere adduttrici (tab. 5.3)	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0093	5.2.20 - Nuovi serbatoi di stoccaggio	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2014REIA0094	5.4.1. - 5.4.2. - 5.4.3. - 5.4.4. - 5.4.5 - Manutenzioni straordinarie fog/dep	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	0 €	0 €	0 €	0 €	1.821.070 €	0 €	1.821.070 €	100	Code di interventi di Manutenzione Straordinaria FOG/DEP iniziate nell'anno precedente. I nuovi interventi sono stati correttamente rendicontati sui nuovi codici di MS
2014REIA0095	5.2.1 - Cartografia numerica acqua/fognature	TUTTI	Opere pluricomunali	1.588.814 €	330.000 €	0 €	330.000 €	313.980 €	0 €	313.980 €	-4	
2015REIA0096	Potenziamento impianto idr. linee TAV Autostrada A1-Sesso-RE	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL  
C.L. DI REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con  
delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n. n° 5 del 30 novembre  
2018**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo	Scostamento	Note giustificative
2015REIA0097	Serbatoio di Novellara - 1° Stralcio completamento	ACQUEDOTTO	Novellara		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2015REIA0098	Risoluzione probl.fognari Cavo Linarola-Novellara	FOGNATURA	Novellara		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2015REIA0099	Potenziamento collettore fognario via Fratelli Cervi	FOGNATURA	Montecchio	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2015REIA0100	EX 1601786-Montecchio collettore acque nere	FOGNATURA	Montecchio		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2015REIA0101	EX V1602274- Sezione trattamento impianto depurazione RONCOCESI	DEPURAZIONE	Reggio Emilia		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2015REIA0102	Collettore fognario in pressione Noceto di Gattatico	FOGNATURA	Gattatico		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2015REIA0103	Risanamento fognario NASSETA/ACQUABONA	FOGNATURA	Collagna		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2016REIA0057	Interconnessione acquedotti Reggio-Roncofesoli: realizzazione condotta DN 800	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	2.850.000 €	530.708 €	0 €	530.708 €	64.845 €	0 €	64.845 €	-87	Raggiunti gli accordi con i proprietari dei terreni privati, in corso di ottenimento le autorizzazioni da altri Enti (Consorzio di Bonifica, Soprintendenza Archeologica, Bonifica bellica..)
2016REIA0058	Riuso reflui Mancasale	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	2.540.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2016REIA0070	Rifacimento fognatura per acque nere in Via Luxemburg (ex via delle Valli, via Togliatti )	FOGNATURA	Rubiera	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2016REIA0105	Estensione rete fognaria in loc. Pieve Rossa, strada Provinciale Nord	FOGNATURA	Bagnolo in Piano	130.166 €	0 €	0 €	0 €	7.196 €	0 €	7.196 €	100	Progettazione esecutiva conclusa: risultano ad oggi ottenute le servitù di passaggio. Si prevede l'inizio dei lavori nella primavera 2020

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL  
C.L. DI REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con  
delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n. n° 5 del 30 novembre  
2018**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo	Scostamento	Note giustificative
2016REIA0106	Criticità deflusso porzione urbana defluente sulla Fossetta II° lotto	FOGNATURA	Bagnolo in Piano	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2016REIA0107	Ristrutturazione rete fognaria in Via Don P. Borghi e limitrofe	FOGNATURA	Bibbiano	141.360 €	0 €	0 €	0 €	15.656 €	0 €	15.656 €	100	Intervento ultimato: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti per esecuzione ripristini stradali
2016REIA0108	Razionalizzazione sistema fognario in Via Marchesi	FOGNATURA	Boretto	120.144 €	0 €	0 €	0 €	83.646 €	0 €	83.646 €	100	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti. Rimane da eseguire tappeto d'usura che verrà realizzato nell'estate 2020
2016REIA0109	Agglomerato Busana: potenziamento impianto di depurazione	DEPURAZIONE	Ventasso	325.000 €	325.000 €	0 €	325.000 €	3.756 €	0 €	3.756 €	-98	Progettazione in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per problematiche legate all'ottenimento di autorizzazione da parte di proprietà private limitrofe all'impianto esistente
2016REIA0110	Razionalizzazione sistema fognario in Via Zurco, Via Gabella, Via Torquato Tasso	FOGNATURA	Cadelbosco di Sopra	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2016REIA0111	Nuova vasca di stoccaggio Caprara (2000 mc)	ACQUEDOTTO	Campegine	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2016REIA0112	Potenziamento collettore Caprara-Meletole I°lotto	FOGNATURA	Campegine	1.000.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	ATTENZIONE! Spese di progettazione per ~ 54.254,92 rendicontati per errore nel codice 2014REIA0086 - Piano Fognario. Progettazione in corso: sono stati definiti, in accordo con il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, gli interventi più rilevanti ai fini della riduzione delle acque parassite nel collettore
2016REIA0113	Depuratore di Valestra: realizzazione 2^ linea	DEPURAZIONE	Carpinetti	250.000 €	0 €	0 €	0 €	43.097 €	0 €	43.097 €	100	Progettazione esecutiva ultimata, in attesa autorizzazioni. Si prevede l'inizio del cantiere per la primavera 2020
2016REIA0114	Risoluzione criticità idraulica collettore di Salvaterra, loc. Villaggio Macina Dinazzano	FOGNATURA	Casalgrande	500.000 €	0 €	0 €	0 €	4.667 €	0 €	4.667 €	100	Progettazione in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione. Alcuni eventi meteorici intensi hanno fatto tracimare il canale di scolo su cui scarica la rete fognaria del comparto. In corso studio idraulico con il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per individuare soluzione condivisa



**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL  
C.L. DI REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con  
delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n. n° 5 del 30 novembre  
2018**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo	Scostamento	Note giustificative
2016REIA0115	Acquedotto di Salvaterra: potenziamento adduttrice tratto terminale DN 200	ACQUEDOTTO	Casalgrande	180.000 €	0 €	0 €	0 €	114.515 €	0 €	114.515 €	100	Cantiere in fase di ultimazione: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
2016REIA0116	Agglomerato Salvaterra: adeguamento potenzialità impianto a 27.000 - Realizzazione 4° sedimentatore e progettazione dell'adeguamento del parametro Azoto Totale ai limiti di Tabella 2, allegato 5 D.Lgs 152/06	DEPURAZIONE	Casalgrande	150.000 €	0 €	0 €	0 €	32.892 €	0 €	32.892 €	100	Progettazione esecutiva conclusa: in corso di ottenimento le autorizzazioni. Si prevede l'inizio dei lavori nella primavera 2020
2016REIA0117	Potenziamento impianto di depurazione Casina 2	DEPURAZIONE	Casina	325.000 €	325.000 €	0 €	325.000 €	238 €	0 €	238 €	-99	Progettazione in ritardo rispetto alla pianificazione per difficoltà di individuazione delle priorità di intervento su un impianto in esercizio. Per procedere con la progettazione sono necessari dati gestionali di funzionamento complessi da monitorare
2016REIA0118	Studio razionalizzazione rete fognaria in loc. diverse del comune di Casina	FOGNATURA	Casina	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	Da definire le priorità di intervento con l'Amministrazione Comunale
2016REIA0119	Sostituzione adduttrice Via Manganella	ACQUEDOTTO	Castellarano	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2016REIA0120	Rifacimento collettore fognario in Via De Gasperi, Via Fontanesi e Via Risorgimento in loc. Felina	FOGNATURA	Castelnovo Monti	165.000 €	0 €	0 €	0 €	7.411 €	0 €	7.411 €	100	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti
2016REIA0121	Acquedotto Gabellina: adeguamento scarico acque controlavaggio Collagna	ACQUEDOTTO	Collagna	200.000 €	0 €	0 €	0 €	108 €	0 €	108 €	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
2016REIA0122	Potenziamento reticolo fognario in Via del Falegname	FOGNATURA	Correggio	700.000 €	0 €	0 €	0 €	596.124 €	0 €	596.124 €	100	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato nelle precedenti annualità
2016REIA0123	Estensione fognario in Via Ville loc. San Girolamo 1° lotto	FOGNATURA	Guastalla	105.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2016REIA0124	Tagliata: realizzazione impianto di depurazione e rete di collettamento	FOGNATURA	Guastalla	180.000 €	180.000 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	In corso approfondimenti per verificare la necessità dell'intervento. Tagliata non risulta nell'elenco degli agglomerati Del. 201/2016
2016REIA0125	Razionalizzazione sistema fognario in strada Barilla e limitrofe	FOGNATURA	Montecchio	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	

<b>PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n. n° 5 del 30 novembre 2018</b>	<b>CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019</b>
---	---

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo	Scostamento	Note giustificative
2016REIA0126	Sostituzione adduttrice Novellara-Bettolino	ACQUEDOTTO	Novellara	600.000 €	580.000 €	290.000 €	290.000 €	234.041 €	0 €	234.041 €	-59	FONDI FSC: Cantiere in corso
2016REIA0127	Eliminazione criticità di drenaggio area nord-est: Area Ex-Reggiane	FOGNATURA	Reggio Emilia	750.000 €	0 €	0 €	0 €	430.385 €	0 €	430.385 €	100	Cantiere in corso: coda di intervento pianificato in annualità precedenti.
2016REIA0128	Depuratore di Roncocesi - sistemazione e adeguamento impiantistica	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	1.200.000 €	450.000 €	0 €	450.000 €	1.149.002 €	0 €	1.149.002 €	155	Cantiere in corso con sfasamento temporale rispetto alla pianificazione
2016REIA0129	Depuratore di Mancasale - adeguamenti tecnologici	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	300.000 €	0 €	0 €	0 €	33.196 €	0 €	33.196 €	100	Intervento da considerare unitamente al codice 2018REIA0231 - Adeguamento linea digestione anaerobica. E' stato realizzato un unico progetto da ~ 2.200.000,00. In corso di definizione le modalità di appalto dei lavori
2016REIA0130	Depuratore di Mancasale - adeguamenti tecnologici	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	640.000 €	270.000 €	0 €	270.000 €	269.941 €	0 €	269.941 €	0	
2016REIA0131	Ristrutturazione collettore fognario in Via Lungocrostolo	FOGNATURA	Reggio Emilia	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2016REIA0132	Potenziamento collettore Villaggio Crostolo	FOGNATURA	Reggio Emilia	100.000 €	0 €	0 €	0 €	510 €	0 €	510 €	100	Progettazione conclusa. In attesa autorizzazione all'attraversamento di Autostrada A1
2016REIA0133	Risoluzione criticità idraulica rete fognaria in loc. Pieve, Parco Buda	FOGNATURA	Reggio Emilia	100.000 €	0 €	0 €	0 €	68.605 €	0 €	68.605 €	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
2016REIA0134	Nuovo serbatoio Rubiera mc 2000	ACQUEDOTTO	Rubiera	1.408.465 €	0 €	0 €	0 €	31.353 €	0 €	31.353 €	100	Progettazione conclusa: il Comune ha indetto Conferenza dei Servizi per il rilascio del PdC in deroga
2016REIA0135	Depuratore di Rubiera: sistemazione e potenziamento linea fanghi	DEPURAZIONE	Rubiera	180.000 €	180.000 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	Progettazione in ritardo rispetto alla pianificazione per difficoltà di individuazione delle priorità di intervento su un impianto in esercizio. Per procedere con la progettazione sono necessari dati gestionali di funzionamento complessi da monitorare
2016REIA0136	Depuratore di San Martino: potenziamento linea fanghi e progettazione dell'adeguamento del parametro Azoto Totale ai limiti di Tabella 2, allegato 5 D.Lgs 152/06	DEPURAZIONE	San Martino in Rio	200.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	25.832 €	0 €	25.832 €	-87	Progettazione esecutiva conclusa: in corso di ottenimento le autorizzazioni.

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL  
C.L. DI REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con  
delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n. n° 5 del 30 novembre  
2018**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo	Scostamento	Note giustificative
2016REIA0137	Rifacimento collettore di Arceto a monte dello scolmatore	FOGNATURA	Scandiano	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2016REIA0138	Depuratore di Bosco: sistema di aerazione seconda linea	DEPURAZIONE	Scandiano	180.000 €	180.000 €	0 €	180.000 €	8.514 €	0 €	8.514 €	-95	Progettazione in corso: valutazioni comparative tra diverse soluzioni tecnologiche
2016REIA0139	Risanamento fognature in loc. Sedrio 2° lotto	FOGNATURA	Vezzano sul Crostolo	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	Progettazione in ritardo rispetto alla pianificazione a causa della necessità di coordinamento con interventi da realizzare a carico di privati attuatori
2016REIA0140	Trattamenti Appropriati agglomerato <200 AE: realizzazione fossa imhoff a servizio della frazione di Pineto	DEPURAZIONE	Vetto d'enza	250.000 €	0 €	0 €	0 €	28.580 €	0 €	28.580 €	100	Intevento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
2016REIA0141	Sostituzione reti idriche da serb. Faggiola a serb. M.Te Cerlino. 1° e 2° stralcio	FOGNATURA	Viano	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2016REIA0142	Trattamenti Appropriati: realizzazione depuratore a servizio della frazione di Sologno	DEPURAZIONE	Villaminazzo	250.000 €	0 €	0 €	0 €	6.573 €	0 €	6.573 €	100	Progettazione ultimata, in corso di ottenimento le servitù di passaggio in terreni privati
2016REIA0143	Sistemazione rete fognaria in loc. Razzolo	FOGNATURA	Villaminazzo	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2016REIA0144	Completamento rete fognaria in loc. Minozzo	FOGNATURA	Villaminazzo	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2016REIA0145	Estendimento reti a carico di privati	FOGNATURA	Opere pluricomunali		0 €	0 €	0 €	208.982 €	89.600 €	119.382 €	100	Consuntivo dei lavori realizzati nel corso del 2019. Trattandosi di richieste di privati non è stata inserita una pianificazione
2016REIA0146	Contributi - Coll.soll.pretratt. Imhoff dep. LUZZARA (2014REIA0085)	DEPURAZIONE	Luzzara		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2016REIA0147	Contributi - Risanamento Cavo Ariolo RE (2014REIA0094)	DEPURAZIONE	Reggio Emilia		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL  
C.L. DI REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con  
delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n. n° 5 del 30 novembre  
2018**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo	Scostamento	Note giustificative
2016REIA0148	Contributi - Raccolta acque nere via Tassoni RE (5.4.17)	FOGNATURA	Reggio Emilia		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2017REIA0149	Potenziamento con spostamento dell'impianto di sollevamento fognario in Via G. di Vittorio	FOGNATURA	San Polo d'Enza	50.000 €	0 €	0 €	0 €	8.575 €	0 €	8.575 €	100	Progettazione conclusa. Il cantiere non è partito a causa di procedura fallimentare dell'impresa esecutrice Siteco. Occorre riaffidare la realizzazione ad altra esecutrice
2017REIA0150	Rifacimento collettore fognario in Via Colletta, villaggio artigianale Crostolo	FOGNATURA	Reggio Emilia	200.000 €	0 €	0 €	0 €	142.404 €	0 €	142.404 €	100	Intervento ultimato, su richiesta del Comune di Reggio Emilia intervento ripianificato per la primavera 2019 in concomitanza agli interventi di riqualificazione della zona artigianale
2017REIA0151	Realizzazione collettore fognario a servizio zona industriale "Dugara"	FOGNATURA	Brescello	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2017REIA0152	Realizzazione collettore fognario acque nere in loc. Mapriana	FOGNATURA	Castelnovo Monti	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	Intervento da realizzare in concomitanza ad opere in carico ad attuatori privati che non sono partiti. Posticipato in accordo con il Comune al 2020
2017REIA0153	Razionalizzazione sistema fognario in Via Bologna	FOGNATURA	Guastalla	145.179 €	0 €	0 €	0 €	1.339 €	0 €	1.339 €	100	Progettazione in ritardo: in corso valutazioni idrauliche di tutto il quartiere. Il problema di insufficienza non è limitato alla sola Via Bologna ma a tutto il reticolo della zona
2017REIA0154	Estendimento rete acqua a servizio frazione di Fontana (utenze ex - AIMAG)	ACQUEDOTTO	Rubiera	600.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	6.061 €	0 €	6.061 €	-98	Progettazione in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione per difficoltà di individuazione del percorso della rete esistente AIMAG da dismettere. Effettuati sopralluoghi con i tecnici AIMAG per individuare tutte le utenze da ricollegare
2017REIA0155	Studio razionalizzazione rete fognaria in loc. diverse del comune di Baiso	FOGNATURA	Baiso	30.000 €	0 €	0 €	0 €	3.143 €	0 €	3.143 €	100	In corso lo studio in alcune località indicate come critiche dal Comune di Baiso: Scaluccia, Gavia
2017REIA0156	Realizzazione collettore fognario zona industriale APEA	FOGNATURA	Boretto	550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL  
C.L. DI REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con  
delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n. n° 5 del 30 novembre  
2018**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo	Scostamento	Note giustificative
2017REIA0157	Acquedotto di Caprara:nuova adduttrice DN 300 da Autostrada A1 a Via Marconi	ACQUEDOTTO	Campegine	200.000 €	0 €	0 €	0 €	19.619 €	0 €	19.619 €	100	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato nell'annualità precedente
2017REIA0158	Realizzazione nuovo collettore fognario in Via De Amicis	FOGNATURA	Fabbrico	340.000 €	0 €	0 €	0 €	44.479 €	0 €	44.479 €	100	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato nell'annualità precedente
2017REIA0159	Rifacimento fognature in concomitanza riqualificazione asse viario Corso Garibaldi Viale Uberto I°	FOGNATURA	Reggio Emilia	200.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	50.910 €	0 €	50.910 €	-66	Realizzato 1°stralcio. Il 2°stralcio è da realizzare in concomitanza all'intervento di riqualificazione del Viale da parte del Comune
2017REIA0160	Realizzazione collettore fognario e impianto di sollevamento area Protezione Civile	FOGNATURA	Sant'Ilario d'Enza	150.000 €	0 €	0 €	0 €	2.858 €	0 €	2.858 €	100	Progettazione esecutiva ultimata. La realizzazione dell'intervento va coordinata con le attività in corso per l'allestimento dell'area di Protezione Civile da parte del Comune di Sant'Ilario
2017REIA0161	Sostituzione rete idrica in Via della Canalina 1° stralcio	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	250.000 €	0 €	0 €	0 €	50.510 €	0 €	50.510 €	100	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato nell'annualità precedente
2017REIA0162	Sostituzione rete idrica in Via Venturi	ACQUEDOTTO	Bibbiano	250.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	5.555 €	0 €	5.555 €	-97	Progettazione conclusa. Realizzazione posticipata su richiesta del Comune di Bibbiano per problemi legati alla gestione del traffico su Via Venturi in concomitanza a lavori sulla linea ferroviaria
2017REIA0163	Realizzazione collegamento fognario per la dismissione Imhoff Cimitero	FOGNATURA	Ventasso	50.000 €	0 €	0 €	0 €	681 €	0 €	681 €	100	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato in annualità precedenti.
2017REIA0164	Realizzazione impianto di depurazione in loc. Cereggiò	DEPURAZIONE	Ventasso	220.000 €	0 €	0 €	0 €	9.297 €	0 €	9.297 €	100	Progettazione definitiva conclusa: individuata area per la realizzazione della fossa Imhoff, in corso l'ottenimento delle servitù di passaggio del collettore
2017REIA0165	Potenziamento impianto di depurazione di Canolo a 3.000 AE	DEPURAZIONE	Correggio	600.000 €	500.000 €	0 €	500.000 €	967 €	0 €	967 €	-99	E' stata svolta un'analisi costi/benefici per confrontare l'intervento di potenziamento dell'impianto con la possibilità di collettare i reflui al depuratore di Reggiolo, ciò comporta un importo di progetto molto più elevato di quanto previsto a piano. Occorre ripianificazione
2017REIA0166	Sostituzione rete idrica in Strada Macchione	ACQUEDOTTO	Novellara	250.000 €	0 €	0 €	0 €	138.468 €	0 €	138.468 €	100	Intervento concluso: coda di cantiere pianificato nell'annualità precedente

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL  
C.L. DI REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con  
delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n. n° 5 del 30 novembre  
2018**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo	Scostamento	Note giustificative
2017REIA0167	Razionalizzazione sistema fognario in loc. Fellegara	FOGNATURA	Scandiano	200.000 €	0 €	0 €	0 €	2.599 €	0 €	2.599 €	100	Progettazione in ritardo di intervento pianificato in precedenti annualità: in corso verifiche sul campo (rilievi e videoispezioni) per circoscrivere la zona di intervento
2017REIA0168	Realizzazione reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	8.800.000 €	2.200.000 €	0 €	2.200.000 €	1.160.407 €	0 €	1.160.407 €	-47	a questo importo vanno aggiunti ~ 580.919,92 per code di cantieri iniziati l'anno precedente e rendicontati al punto MS acquedotto 2014REIA0091
2018REIA0169	ALLUVIONE LENTIGIONE - BRESCELLO 11/12/2017 - RIPRISTINO DANNI DEPURATORE	DEPURAZIONE	Brescello	85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2018REIA0170	ALLUVIONE LENTIGIONE - BRESCELLO 11/12/2017 - RIPRISTINO DANNI RETE FOGNARIA	FOGNATURA	Brescello	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2018REIA0171	"Contributi Progetto sperimentale Smart meter - comune Reggio di Emilia (rif. 2014REIA0091)"	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2018REIA0172	"Contributi Progetto Smart meter - comune di Scandiano (rif 2014REIA0091)"	ACQUEDOTTO	Scandiano		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2018REIA0173	"Contributi Realizzazione collettore fognario e sistemazione scarico nel Rio Moreno in Comune di Quattro Castella"	FOGNATURA	Quattro Castella		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	
2018REIA0174	Sostituzione contatori adempimento D.M. 93/2017	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	14.641.200 €	369.600 €	0 €	369.600 €	290.432 €	0 €	290.432 €	-21	L'attività di sostituzione massiva dei contatori è partita: in lieve ritardo rispetto al pianificato
2018REIA0175	Sostituzione rete adduttrice Cà di Scatola-Canova	ACQUEDOTTO	Ventasso	370.000 €	360.000 €	180.000 €	180.000 €	15.013 €	0 €	15.013 €	-95	Intervento finanziato con fondi FSC. Progettazione ultimata: in attesa di autorizzazioni
2018REIA0176	Sostituzione rete acquedotto in Viale Resistenza	ACQUEDOTTO	Rubiera	400.000 €	390.000 €	195.000 €	195.000 €	12.345 €	0 €	12.345 €	-96	Intervento finanziato con fondi FSC. Progettazione ultimata: in attesa di autorizzazioni
2018REIA0178	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario tra via Malaguti - Via dei Gonzaga e Via Guido da Bagnolo-Via Gandhi	FOGNATURA	Bagnolo in Piano	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	Progettazione in ritardo rispetto alla pianificazione: in corso verifiche gestionali e idrauliche per la corretta individuazione delle priorità di intervento

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL  
C.L. DI REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con  
delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n. n° 5 del 30 novembre  
2018**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo	Scostamento	Note giustificative
2018REIA0181	Estendimento rete acqua in Via Marchesi	ACQUEDOTTO	Boretto	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	88.652 €	0 €	88.652 €	-11	
2018REIA0184	Estendimento rete acquedotto nella frazione di Lentigione nelle vie: Molino-Caselle, Del Porto, Viazza, Imperiale inferiore, Via Bernieri	ACQUEDOTTO	Brescello	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	Progettazione in ritardo rispetto alla pianificazione: in corso verifiche con l'Amministrazione Comunale per l'individuazione corretta delle utenze interessate all'estensione dell'acquedotto. Trattandosi di area golenale sussistono diversi vincoli rispetto agli argini dell'Enza
2018REIA0187	Piano Fognario - Risoluzione problematiche connesse alla presenza di acque parassite provenienti da canali di bonifica in via Gandhi	FOGNATURA	Cadelbosco di Sopra	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	Progettazione in ritardo rispetto alla pianificazione: in corso verifiche gestionali e idrauliche per la corretta individuazione delle modalità di intervento
2018REIA0192	Piano Fognario - Intervento di messa in sicurezza fognatura in Via san Prospero	FOGNATURA	Carpineti	76.745 €	76.745 €	0 €	76.745 €	0 €	0 €	0 €	-100	Progettazione in corso: intervento da coordinare con un intervento di urbanizzazione in carico ad un soggetto privato
2018REIA0193	Sostituzione rete idrica in Via Statutaria	ACQUEDOTTO	Casalgrande	250.000 €	0 €	0 €	0 €	694 €	0 €	694 €	100	Anticipo spese di progettazione per intervento pianificato nel 2020
2018REIA0197	Piano Fognario - Rifacimento condotta fognaria in Via Marconi	FOGNATURA	Casina	37.820 €	37.820 €	0 €	37.820 €	0 €	0 €	0 €	-100	Progettazione in corso: intervento da coordinare con la riqualificazione della Piazza da parte dell'Amministrazione Comunale
2018REIA0198	Piano Fognario - Risoluzione problematiche connesse alla presenza di acque parassite provenienti da canali di bonifica in Via Canalino	FOGNATURA	Castelnovo di Sotto	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	Progettazione ultimata: si rende necessario separare la rete nera dal Canale di scolo in gestione al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale. Ciò comporta investimenti più elevati di quanto pianificato. Da definire il finanziamento dell'opera
2018REIA0199	Sostituzione rete idrica DN 500 in loc. Costarella, Croce	ACQUEDOTTO	Castelnovo Monti	480.000 €	372.247 €	0 €	372.247 €	75.482 €	0 €	75.482 €	-79	Cantiere in corso: coda di intervento pianificato in annualità precedenti.
2018REIA0203	Sostituzione rete idrica in Via Marzabotto	ACQUEDOTTO	Correggio	150.000 €	0 €	0 €	0 €	5.860 €	0 €	5.860 €	100	Progettazione conclusa, si prevede la realizzazione nella primavera 2020



**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL  
C.L. DI REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con  
delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n. n° 5 del 30 novembre  
2018**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo	Scostamento	Note giustificative
2018REIA0204	Sostituzione rete idrica in Via Gilberto	ACQUEDOTTO	Correggio	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	590 €	0 €	590 €	-99	Progettazione ultimata. Si prevede la realizzazione nella primavera 2020
2018REIA0208	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Fattori nel tratto tra Via Codisotto a sera e Via Allende	FOGNATURA	Gualtieri	400.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	Progettazione in corso: sulla base di un precedente studio idraulico, che prevedeva diversi interventi di potenziamento del reticolo urbano, sono in corso verifiche per definire le priorità di intervento e la fattibilità rispetto alle risorse economiche disponibili
2018REIA0211	Piano Fognario - Potenziamento della linea fognaria in Via Viazzolo Lungo	FOGNATURA	Guastalla	226.985 €	0 €	0 €	0 €	1.121 €	0 €	1.121 €	100	Anticipate spese di progettazione per intervento pianificato nel 2021
2018REIA0213	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Galilei e Via Parri	FOGNATURA	Montecchio	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	Progettazione in ritardo rispetto alla pianificazione: da verificare con l'Amministrazione Comunale le priorità di intervento
2018REIA0217	Sostituzione rete acqua adduttrice in loc. San Bernardino - 1° stralcio	ACQUEDOTTO	Novellara	250.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	6.950 €	0 €	6.950 €	-97	Intervento in ritardo rispetto alla pianificazione. Progettazione conclusa, problemi di ottenimento servitù per attraversamento di terreni privati
2018REIA0224	Raddoppio collettore fognario in Viale Isonzo	FOGNATURA	Reggio Emilia	500.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	Progettazione in ritardo rispetto alla pianificazione per la difficoltà di individuare la soluzione tecnica più idonea per attraversare la circonvallazione cittadina con una condotta di grande diametro: in corso verifiche geologiche per valutare tecnologia microtunnelling
2018REIA0228	Potenziamento impianto di pompaggio centrale idrica di Roncocesi	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	300.000 €	300.000 €	0 €	300.000 €	486 €	0 €	486 €	-99	L'intervento è conseguente alla realizzazione della nuova condotta adduttrice di cui al codice 2016REIA0057
2018REIA0229	Razionalizzazione rete fognaria in Via del Partigiano	FOGNATURA	Reggio Emilia	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	Progettazione in ritardo rispetto alla pianificazione. In corso rilievi e videoispezioni per individuare la soluzione progettuale più idonea in una zona di elevato traffico



**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL  
C.L. DI REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con  
delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n. n° 5 del 30 novembre  
2018**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo	Scostamento	Note giustificative
2018REIA0231	Depuratore di Mancasale: adeguamento linea di digestione anaerobica	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	1.800.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	Progettazione esecutiva completata. Da considerare unitamente al codice 2016REIA0129: Adeguamenti tecnologici e rifacimento digestori. E' stato realizzato un unico progetto da ~ 2.200.000,00, In attesa di definizione delle modalità di appalto
2018REIA0232	Depuratore di Roncofiesse: adeguamenti impiantistici diversi	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	1.000.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	Progettazione in ritardo rispetto alla pianificazione: In corso verifiche gestionali per individuare le priorità di intervento a seguito di quanto verrà realizzato al codice 2016REIA0128
2018REIA0233	Copertura vasca di equalizzazione e post ispessitori depuratore di Mancasale	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	130.000 €	130.000 €	0 €	130.000 €	946.535 €	0 €	946.535 €	628	Errore materiale nell'importo previsto a Piano: importo di progetto pari a ~ 1.300.000 e non 130.000!
2018REIA0235	Adeguamento impianto di condizionamento fanghi e stoccaggio depuratore di Mancasale	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	1.000.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	1.429 €	0 €	1.429 €	-99	Progettazione in ritardo rispetto alla pianificazione: In corso valutazioni comparative tra le diverse tecnologie applicabili
2018REIA0236	Potenziamento impianto chimico-fisico depuratore di Mancasale	DEPURAZIONE	Reggio Emilia	600.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	Progettazione in ritardo rispetto alla pianificazione: in corso valutazioni sull'opportunità di realizzare l'impianto presso un depuratore più baricentrico
2018REIA0237	Raddoppio collettore fognario attraversamento canale Fiuma - tratto sollevamento Ponte testa - depuratore di Reggiolo	FOGNATURA	Reggiolo	300.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	Progettazione in ritardo rispetto alla pianificazione per la difficoltà di individuare la soluzione tecnica più idonea per attraversare il Canale Fiuma con una condotta in sub-alveo: in corso verifiche geologiche
2018REIA0240	Piano Fognario - Estendimento rete fognaria nera in via Crocetta	FOGNATURA	Rolo	123.255 €	123.255 €	0 €	123.255 €	0 €	0 €	0 €	-100	Progettazione in ritardo rispetto alla pianificazione: in corso verifiche con il Comune di Rolo per individuare correttamente le utenze interessate
2018REIA0242	Rifacimento collettore fognario in Via Gazzata	FOGNATURA	San Martino in Rio	80.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	-100	Progettazione in ritardo rispetto alla pianificazione: in corso visioispezioni per verificare l'effettivo stato della condotta

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL  
C.L. DI REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con  
delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n. n° 5 del 30 novembre  
2018**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo	Scostamento	Note giustificative
2018REIA0249	Rifacimento tratto di rete fognaria in Via Manenti e Via Fontanaccio	FOGNATURA	Vetto d'enza	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	5.698 €	0 €	5.698 €	-96	Progettazione in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per problematiche geologiche. Da definire attentamente le modalità di scavo a profondità elevate in contesto urbano. Da considerare unitamente al 2018REIA0249: è in corso un unico progetto
2018REIA0250	Piano Fognario - Lavori di potenziamento, adeguamento e messa in sicurezza della rete fognaria in loc. Vetto Capoluogo	FOGNATURA	Vetto d'enza	156.650 €	156.650 €	0 €	156.650 €	10.361 €	0 €	10.361 €	-93	Progettazione in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione per problematiche geologiche. Da definire attentamente le modalità di scavo a profondità elevate in contesto urbano. Da considerare unitamente al 2018REIA0249: è in corso un unico progetto
2018REIA0252	Acquedotto Villa Minozzo: costruzione nuovo serbatoio in loc. Mulino di Tromba	ACQUEDOTTO	Villaminozzo	180.000 €	0 €	0 €	0 €	3.210 €	0 €	3.210 €	100	Anticipate spese per acquisto terreno per intervento pianificato nel 2021
2018REIA0253	Manutenzione straordinaria impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	8.000.000 €	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €	2.273.976 €	0 €	2.273.976 €	13	
2018REIA0254	Manutenzione straordinaria fognature	FOGNATURA	Opere pluricomunali	5.600.000 €	1.400.000 €	0 €	1.400.000 €	2.503.135 €	0 €	2.503.135 €	78	Maggiori necessità d'interventi di manutenzione straordinaria per: maggior numero d'interventi a seguito di rotture causate da molti fenomeni temporaleschi di forte intensità; maggiori sostituzioni di reti ammalorate in concomitanza di lavori di riqualificazione strade/piazze da parte delle Amministrazioni comunali.
2018REIA0255	Manutenzione straordinaria acque meteoriche	FOGNATURA	Opere pluricomunali	2.400.000 €	600.000 €	0 €	600.000 €	295.734 €	0 €	295.734 €	-50	Quota parte degli interventi di manutenzione straordinaria acque meteoriche sono rendicontati al codice 2014REIA0094 in quanto iniziate nell'annualità precedente
2018REIA0256	Estendimenti acqua in zone non servite	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	400.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	28.979 €	12.750 €	16.229 €	-71	Questi interventi vengono attivati su richiesta di privati cittadini o Amministrazioni Comunali. Nel corso del 2019 è stata realizzata l'estensione della rete di acquedotto in Via Cadorna, Comune di Gattatico e completata la progettazione dell'estensione in Via Montegrappa in Comune di Quattro Castella di cui si prevede la realizzazione nel 2020.

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI REGGIO EMILIA n.4 del 01 aprile 2016, revisionato con delibera n. 10 del 19 dicembre 2017 e n. n° 5 del 30 novembre 2018				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo	Scostamento	Note giustificative
2018REIA0257	Investimenti di Struttura	STRUTTURA	Opere pluricomunali	6.881.209 €	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	1.392.813 €	0 €	1.392.813 €	39	Al momento della predisposizione del POI non erano ancora noti i valori di pianificazione delle spese di struttura. Con Delibera del Consiglio d'Ambito n.32 del 19.04.2018, il tetto di struttura su investimenti messi a tariffa è pari a 1.842.265- annui.
2018REIA0258	Nuovi Allacci	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		1.213.625 €	720.060 €	493.565 €	1.122.950 €	745.530 €	377.420 €	-7	
<b>IMPORTO TOTALE:</b>					<b>24.223.650 €</b>	<b>1.385.060 €</b>	<b>22.838.590 €</b>	<b>30.079.783 €</b>	<b>891.379 €</b>	<b>29.188.404 €</b>		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 5 del 11 dicembre 2020

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.A. Approvazione Consuntivo 2019.  
Programma Operativo Interventi –2019-2022**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Bologna, 11 dicembre 2020

Il Direttore  
Responsabile ad interim  
Area Servizio Idrico Integrato  
F.to Ing. Vito Belladonna



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Reggio Emilia

F.to Nico Giberti

Il segretario verbalizzante

F.to Mario Ori

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 27 aprile 2021

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna
