



CLRE/2016/3 del 01 aprile 2016.

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato – Gestori: IRETI S.p.A. (ex-IREN S.p.A.), Azienda Servizi Toano (AST) S.r.l.**
Modifiche del programma degli interventi 2014 e presa d'atto del consuntivo 2014. Proposta di integrazione del Piano d'Ambito.

IL COORDINATORE

F.to Mirko Tutino

CLRE/2016/3

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA

L'anno duemilasedici il giorno 1 del mese di aprile alle ore 10.00 presso la Sala del Consiglio Provinciale "Palazzo Allende" – Corso Garibaldi n. 59 – Reggio Emilia, si è riunito il Consiglio Locale di Reggio Emilia, convocato dal Coordinatore del Consiglio Locale di ATERSIR con lettera protocollo PG/2016/2071 del 24 marzo 2016.

Assume la presidenza il Coordinatore Locale, che chiama il signor Enrico Menozzi, funzionario di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretario verbalizzante.

Risultano presenti all'appello:

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBINEA	Giberti Nico	Sindaco	SI'	1,5708
BAGNOLO IN PIANO			NO	1,6696
BAISO			NO	0,7328
BIBBIANO	Carletti Andrea	Sindaco	SI'	1,7603
BORETTO			NO	1,0241
BRESCELLO			NO	1,0684
CA DEL BOSCO SOPRA	Tellini Tania	Sindaco	SI'	1,8298
CAMPAGNOLA EMILIA	Santachiara Alessandro	Sindaco	SI'	1,0601
CAMPEGINE			NO	1,0007
CANOSSA	Grassi Marco	Consigliere	SI'	0,7926
CARPINETI	Borghi Tiziano	Sindaco	SI'	0,8542
CASALGRANDE	Vaccari Alberto	Sindaco	SI'	3,1178
CASINA			NO	0,9099
CASTELLARANO	Nucci Maria Ester	Assessore	SI'	2,5233
CASTELNOVO MONTI			NO	1,8411
CASTELNOVO SOTTO	Bottazzi Maurizio	Sindaco	SI'	1,5456
CAVRIAGO	Corradi Stefano	Assessore	SI'	1,7185
CORREGGIO	Malavasi Ilenia	Sindaco	SI'	4,0870
FABBRICO	Terzi Maurizio	Sindaco	SI'	1,2484
GATTATICO			NO	1,1237
GUALTIERI			NO	1,2395
GUASTALLA	Verona Camilla	Sindaco	SI'	2,5152
LUZZARA	Costa Andrea	Sindaco	SI'	1,6357
MONTECCHIO EMILIA	Golinelli Daniele	Assessore	SI'	1,7972
NOVELLARA	Carletti Elena	Sindaco	SI'	2,3067
POVIGLIO			NO	1,3031
QUATTROCASTELLA	Tagliavini Andrea	Sindaco	SI'	2,2213
REGGIO EMILIA	Tutino Mirko	Assessore	SI'	25,5784
REGGIOLO			NO	1,6432
RIO SALICETO	Malavasi Lucio	Sindaco	SI'	1,1539
ROLO	Allegretti Fabrizio	Sindaco	SI'	0,8323
RUBIERA			NO	2,4580
S. MARTINO IN RIO			NO	1,4171
S. POLO D'ENZA	Grasselli Edmondo	Vice Sindaco	SI'	1,1315
S. ILARIO D'ENZA	Moretti Marcello	Sindaco	SI'	1,9128
SCANDIANO	Mammi Alessio	Sindaco	SI'	4,0819
TOANO	Volpi Vincenzo	Sindaco	SI'	0,8980

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
VENTASSO			NO	0,9000
ETTO	Ruffini Aronne	Vice Sindaco	SI'	0,5063
VEZZANO SUL CROSTOLO	Bigi Mauro	Sindaco	SI'	0,8598
VIANO	Borghi Nello	Assessore	SI'	0,7288
VILLA MINOZZO	Manicardi Lucia	Assessore	SI'	0,8107
PROVINCIA di REGGIO EMILIA	Tutino Mirko	delegato	SI'	10,0000

Presenti n. 29 quote 80,67

Assenti n. 14 quote 19,33

Riconosciuta la validità della seduta Mirko Tutino, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestori: IRETI S.p.A. (ex-IREN S.p.A.), Azienda Servizi Toano (AST) S.r.l.**
Modifiche del programma degli interventi 2014 e presa d'atto del consuntivo 2014. Proposta di integrazione del Piano d'Ambito.

Vista la L.R. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

dato atto che gli attuali Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti sul territorio provinciale di Reggio Emilia sono: IRETI S.p.A. (ex Iren Emilia S.p.A.) e, limitatamente al territorio comunale di Toano, Azienda Servizi Toano (AST) S.r.l.;

considerato che:

- con deliberazione n. 2 del 17 aprile 2014 del Consiglio Locale di Reggio Emilia è stato approvato il Programma degli Interventi del Servizio Idrico Integrato per gli anni 2014-2017 per il gestore IREN S.p.A. (oggi IRETI S.p.A.) e il Programma degli Interventi del Servizio Idrico Integrato per gli anni 2014-2017 per il gestore Azienda Servizi Toano (AST) S.r.l.;
- con deliberazione n. 70 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d'Ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";

- con deliberazione n. 45 del 29 settembre 2015 del Consiglio d'Ambito è stato approvato il Piano d'Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato del bacino territoriale di Reggio Emilia che, per il periodo 2014-2017, conferma il Programma degli Interventi deliberato con la citata deliberazione n. 2 del 17 aprile 2014 del Consiglio Locale di Reggio Emilia;
- con deliberazione n. 4 del 23 ottobre 2015 il Consiglio Locale di Reggio Emilia prende atto della conferma del Programma Interventi (che costituisce parte B del Piano d'Ambito approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.45 del 2015) rispetto alla citata Deliberazione del Consiglio Locale n. dl 17 aprile 2014.

considerato, inoltre, che:

- le linee guida di cui al punto precedente prevedono che nel corso dell'anno N, il Gestore, nel rispetto di condizioni ivi specificate, possa procedere alla realizzazione degli interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dal Programma degli Interventi senza preventiva approvazione di una sua revisione solamente nei seguenti casi:
 - A. Interventi urgenti e indifferibili per cause di forza maggiore e/o per eventi naturali e imprevedibili e/o per sopravvenuti nuovi vincoli normativi o derivanti da prescrizioni autorizzative;
 - B. Anticipazioni/posticipazioni di interventi già previsti nel Piano o nel Programma degli interventi approvato;
 - C. Interventi di manutenzione straordinaria derivanti da criticità segnalate dalle Amministrazioni comunali;
 - D. Varianti al progetto e varianti in corso d'opera di interventi già previsti nel Programma degli interventi approvato;e che nell'anno N+1, preventivamente alla presa d'atto del consuntivo dell'anno N, ATERSIR provveda ad approvare le modifiche del programma degli interventi (ed eventualmente le modifiche del Piano di Ambito) conseguenti a quanto sopra.

dato atto che:

- il gestore IREN EMILIA S.p.A. (oggi IRETI S.p.A.), con nota in atti al protocollo PG/2015/0005492 del 05/08/2015, ha trasmesso il Consuntivo investimenti annualità 2014 degli interventi del Servizio Idrico Integrato per il bacino di competenza;
- il gestore AST S.r.l., con nota in atti al protocollo PG/2015/005352 del 04/08/2015, ha trasmesso il Consuntivo investimenti annualità 2014 degli interventi del Servizio Idrico Integrato per il bacino di competenza;
- l'Agenzia ha inviato alle Amministrazioni comunali i documenti istruttori relativi al consuntivo 2014 presentate dai rispettivi gestori: ai comuni dell'area IREN S.p.A. (oggi IRETI S.p.A.) con nota agli atti prot. PG/2015/0008562 del 01/12/2015 e al comune di Toano con nota agli atti prot. PG/2015/0008365 del 25/11/2015;

rilevato che:

- dai dati presentati è emerso che sono stati eseguiti interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Programma degli interventi 2014 approvato, limitatamente ai casi A, B, C e D sopra indicati e nel rispetto delle condizioni specificate nelle succitate linee guida;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione dei gestori e delle motivazioni fornite per ogni intervento, nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- il confronto tra il Programma degli Interventi approvato per il 2014 e la rendicontazione 2014, differenziati per i diversi Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti sul territorio provinciale di Reggio Emilia, sono contenuto nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto pertanto:

- di approvare le modifiche del Programma degli Interventi 2014, differenziato per i diversi Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti sul territorio provinciale di Reggio Emilia, conseguenti a quanto sopra;
- di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014, differenziato per i diversi Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti sul territorio provinciale di Reggio Emilia, come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di proporre al Consiglio d'Ambito l'integrazione del dettaglio degli interventi del Piano d'Ambito approvato con deliberazione n. 2 del 17/04/2016 del Consiglio Locale di Reggio Emilia relativamente all'individuazione di nuovi interventi così come identificati nell'allegato 1 parte integrante del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti a favore n. 29 (quote 80,67), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche del Programma degli Interventi 2014, differenziato per i diversi Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti sul territorio provinciale di Reggio Emilia, conseguenti a quanto sopra;
2. di proporre al Consiglio d'Ambito l'integrazione del dettaglio degli interventi del Piano d'Ambito approvato con deliberazione n. 2 del 17.04.2016 del Consiglio Locale di Reggio Emilia relativamente all'individuazione di nuovi interventi così come identificati nell'allegato 1 parte integrante del presente atto;
3. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014, differenziato per i diversi Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti sul territorio provinciale di Reggio Emilia, come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2014
REGGIO EMILIA Gestore: AST TOANO**

ottobre 2015


RIEPILOGO GENERALE - CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNUALITA' 2014

Le tabelle di seguito rappresentate descrivono la sintesi del consuntivo dell'annualità 2014 degli interventi del Servizio Idrico Integrato, che il gestore AST ha trasmesso in data 4 agosto 2015 (prot. P.G./2015/0005352). Il Programma degli Interventi che ha definito la pianificazione dell'annualità 2014 è stato approvato con Delibera del Consiglio Locale di Reggio Emilia n.2 del 17 aprile 2014.

Il totale lordo di pianificazione ammonta a € **109.700** (di cui € 17.700 di struttura) e la realizzazione degli interventi da parte del Gestore è di importo globale pari a € **64.209** (inclusa struttura), con uno scostamento del 41% ca..

TAB.1 – Sintesi confronto pianificazione/rendicontazione

PIANIFICATO 2014 (esclusa struttura)		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2014 (esclusa struttura)	
Importo lordo pianificato	€ 92.000	-€ 37.163	€ 54.837	Importo lordo a consuntivo
Importo contributi pianificato	0	0	0	Importo contributi a consuntivo
Importo netto pianificato	€ 92.000	- € 37.163	€ 54.837	Importo netto a consuntivo

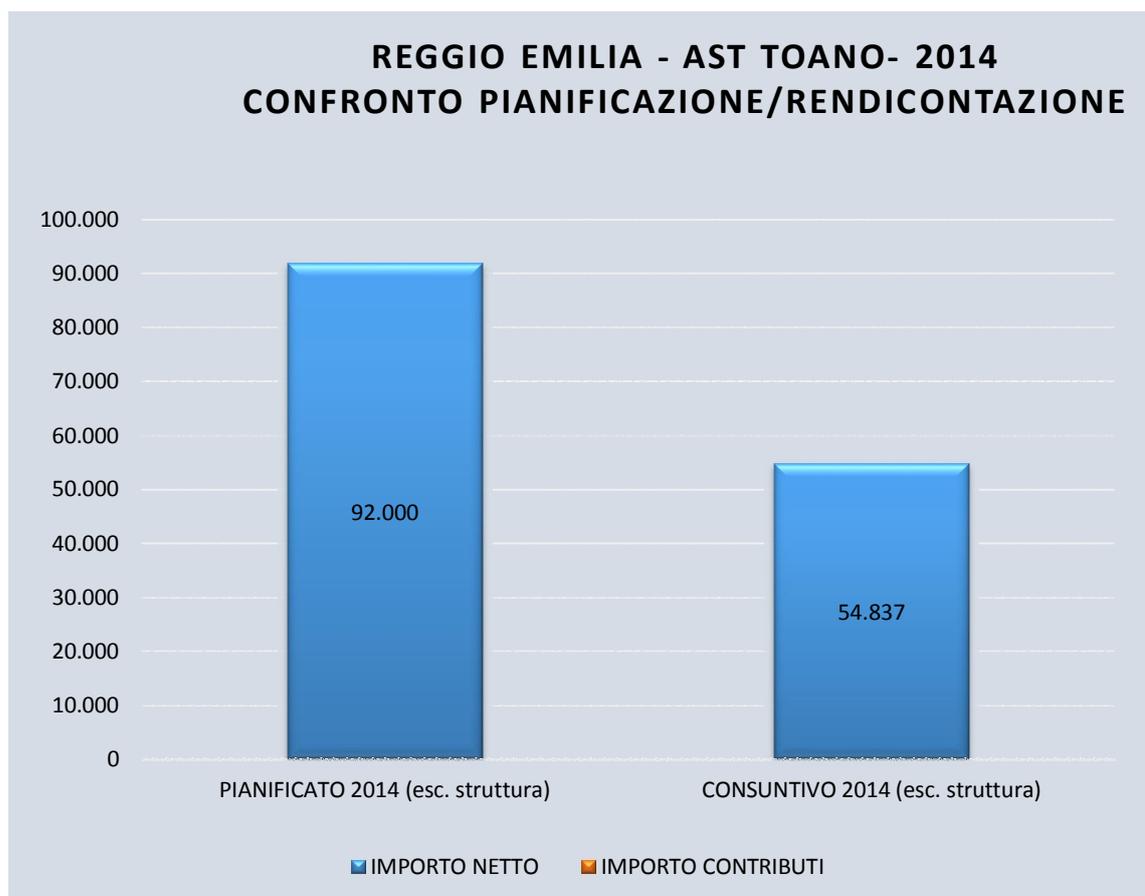

ANALISI DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella e il relativo grafico sintetizzano l'analisi degli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato approvato nel Programma degli Interventi per l'anno 2014.


Nella globalità gli interventi programmati nel 2014 risultano in totale 5 mentre gli interventi rendicontati risultano 7. La rendicontazione indica un intervento avente scostamento superiore al 20%, oltre a 2 interventi non avviati, pari al 73% circa dell'importo totale di pianificazione.

L'importo totale di rendicontazione del Gestore presenta uno scostamento di circa il 41% rispetto all'importo globale pianificato.

TAB.2 – Conteggio interventi rendicontati, suddivisi in base agli scostamenti rispetto al pianificato

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO CONSUNTIVO LORDO 2014	IMPORTO PIANIFICATO LORDO 2014	NOTE GIUSTIFICATIVE NON ESAUSTIVE	CODICE ATERSIR (NON ESAUSTIVE)	PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (scostamento = 100%)	2	0	80.000	-		-
Interventi con avvio anticipato nel 2014 - contenuti nel Pdl	2	10.924	0	-		-
Interventi avviati nel 2014 non inseriti nel Pdl	2	20.051	0	-		-
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato > + o - 20%	1	23.862	12.000	-		-
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato < + o - 20%	0	-	-	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		-
VARIE struttura (hw, sw, mezzi)	2	9.372	17.700	-		

REGGIO EMILIA - AST TOANO - 2014 ANALISI INTERVENTI RENDICONTATI

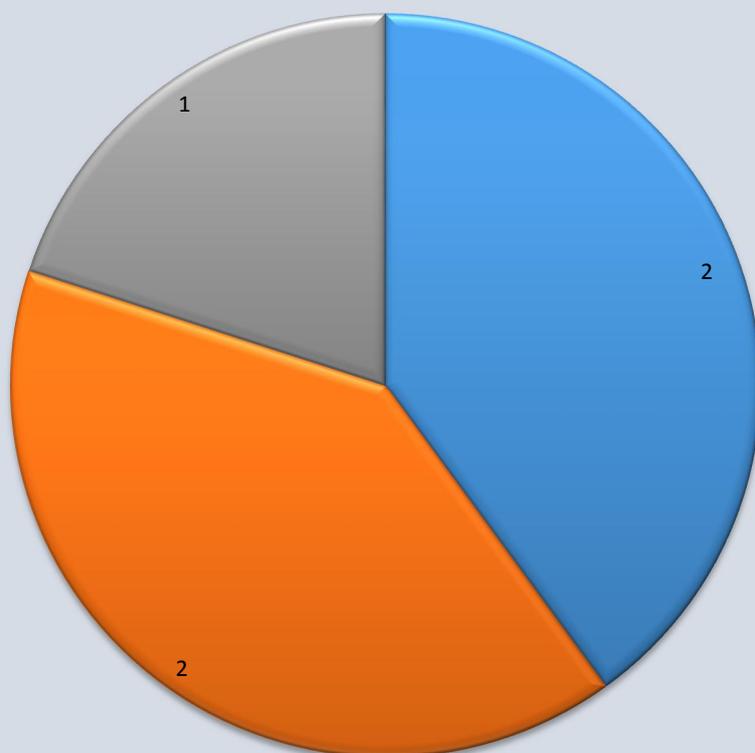

- Interventi con avvio anticipato nel 2014, contenuti nel Programma degli Interventi
- Interventi avviati nel 2014 che non erano nel Programma degli Interventi. Nuovo ID
- Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato > 20%

INTERVENTI NON AVVIATI

La tabella a seguire individua gli interventi non avviati che costituiscono il 40% del numero totale degli interventi, e il 59% circa dell'importo globale pianificato per l'annualità 2014.

Le giustificazioni del Gestore riguardano soprattutto cause tecnico-amministrative.

TAB.3 – Elenco interventi non avviati – 2014

Cod. ATERSIR	Cod.ATO	Comune	Descrizione intervento	Tipol.	Importo intervento	Investimenti 2014
2014REAT0001	AC1-14	Toano	Implementazione Telecontrollo con funzionalità per individuare guasti rete idrica	acq	20.000	20.000
2014REAT0005	FD1-14	Toano	Estendimento rete fogna Cavola	fog/dep	60.000	60.000
TOTALE						80.000

ALLEGATO 1
AST - RE - RENDICONTAZIONE 2014

				STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO			PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO			CONSUNTIVO 2014				
CODICE ATERSIR	SERVIZIO	TITOLO INTERVENTO	Comune	Investimenti lordi	Contributi	Investimenti netti	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% e in caso di interventi non previsti nel 2014
2014PRAT0001	A	Implementazione Telecontrollo con funzionalità utili per l'individuazione di guasti alla rete idrica	Toano	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000		-	-	-100%	Il software, utile anche per la rilevazione delle reti e degli impianti, non è stato acquistato in attesa di decisioni da parte della Regione Emilia Romagna in merito al sistema operativo per la carta inventario delle reti acquadotto e fognature.
2014PRAT0004	A	Investimenti generali relativi all'acquedotto	Toano	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	23.862	-	23.862	99%	Sono stati eseguiti investimenti generali in numero maggiore al previsto e con conseguenti costi superiori al previsti a seguito di guasti sul servizio acquedotto.
2014PRAT0005	F	Estendimento rete fogna Cavola	Toano	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000				-100%	Rinviato all'anno 2017 a seguito di modifica del Piano d'Ambito
	F	Manutenzione straordinaria della rete fognaria di località Pala-Pianella	Toano	0	0	0				2.458	-	2.458	#DIV/0!	Nell'anno 2014 è stato eseguita una manutenzione straordinaria sulla rete fognaria della loc. Pianella - via Pala a seguito di un guasto imprevisto. I lavori non erano inseriti nel Piano d'Ambito
2014PRAT0009	D	Nuovo impianto di depurazione di secondo livello in loc. La Collina - Montechiodo	Toano	12.000	0	12.000	0	0	0	5.741	-	5.741	#DIV/0!	Anticipato al 2014 a seguito di modifica del Piano d'Ambito con costo previsto di 12.000 euro. Si sono ottenute delle economie con l'acquisto diretto dei materiali da parte di AST e all'esecuzione di parte delle opere col personale dipendente di AST.
2014PRAT0011	D	Nuovo impianto di depurazione di secondo livello in loc. Manno	Toano	8.500	0	8.500	0	0	0	5.183	-	5.183	#DIV/0!	Anticipato al 2014 a seguito di modifica del Piano d'Ambito con costo previsto 8.500 euro. Si sono ottenute delle economie con l'acquisto diretto dei materiali da parte di AST e con l'esecuzione di parte delle opere col personale dipendente di AST.
	D	Manutenzione straordinaria sull'impianto di depurazione di secondo livello di Quara	Toano	0	0	0				17.593	-	17.593	#DIV/0!	Nell'anno 2014 è stato eseguita una manutenzione straordinaria sull'impianto di depurazione di Quara a seguito di un guasto imprevisto. I lavori non erano inseriti nel Piano d'Ambito
2014PRAT0012	G	Nuovo software gestionale	Toano	20.000	0	20.000	15.700	0	15.700	6.756	-	6.756	-57%	Nell'anno 2014 non è stato installato il verticale acquedotto. AST sta valutando la possibilità di rimanere col software in uso in quanto modificato dal fornitore ed ora idoneo all'emissione delle fatture del SII.
2014PRAT0013	G	Investimenti generali	Toano	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.616	-	2.616	31%	Acquistato un server. Il costo è stato superiore al previsto perché è stata acquistata una macchina più potente del previsto.
TOTALI							109.700	0	109.700	64.209	0	64.209		
* interventi non previsti nell'annualità 2014 - trattasi di nuovi interventi non presenti nella programmazione 2014														



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2014
REGGIO EMILIA Gestore: IREN ACQUA GAS**

ottobre 2015


RIEPILOGO GENERALE - CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNUALITA' 2014

Le tabelle di seguito rappresentate descrivono la sintesi del consuntivo dell'annualità 2014 degli interventi del Servizio Idrico Integrato che il gestore IREN ACQUA GAS ha trasmesso il 05/08/2015 (prot. PG2015/0005492). Il Programma degli Interventi che ha definito la pianificazione dell'annualità 2014 è stato approvato con Delibera del Consiglio Locale di Reggio Emilia n.2 del 17 aprile 2014.

Il totale lordo pianificato ammonta a € **20.828.558** (di cui € 1.100.000 di struttura) e la realizzazione degli interventi da parte del Gestore è di importo globale pari a **16.256.097** (inclusa struttura), con uno scostamento del 22% ca..

TAB.1 – Sintesi confronto pianificazione/rendicontazione

PIANIFICATO 2014 (esclusi investimenti di STRUTTURA)		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2014 (esclusi investimenti di STRUTTURA)	
Importo Lordo Pianificato	€ 19.728.558	-€ 4.572.461	€ 15.156.097	Importo Lordo a Consuntivo
Importo Contributi Pianificato	€ 971.418	-€ 309.640	€ 661.778	Importo Contributi
Importo Netto Pianificato	€ 18.757.140	-€ 4.262.821	€ 14.494.319	Importo Netto a Consuntivo

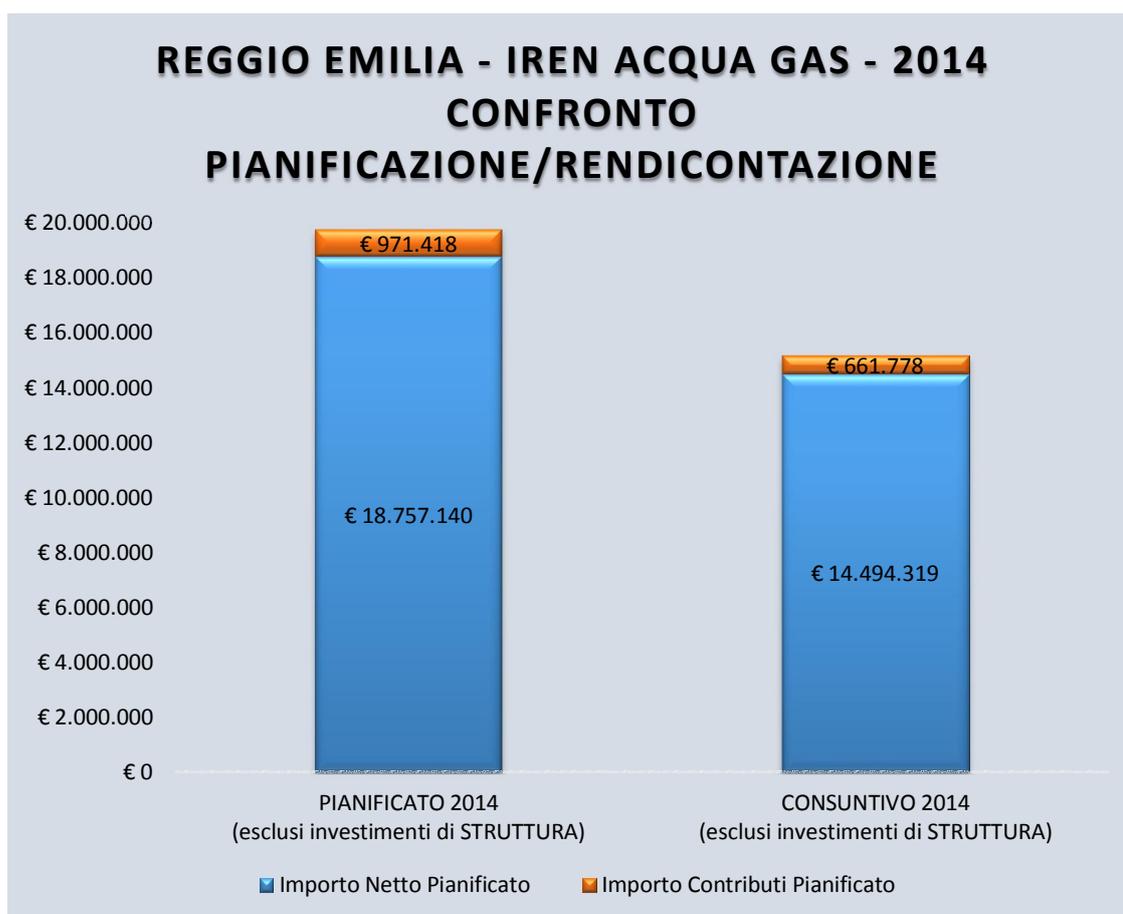

ANALISI DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella e il relativo grafico sintetizzano l'analisi degli scostamenti tra quanto il Gestore ha rendicontato e quanto era stato approvato nel Programma degli Interventi per l'anno 2014.

Gli interventi programmati nel 2014 risultano in totale 52, mentre gli interventi rendicontati sono 69 (di cui 24 non presenti nel Programma Interventi deliberato). La rendicontazione indica un numero consistente di interventi - 26 - aventi scostamento superiore al 20%, oltre a 14 interventi non avviati pari all'11% circa dell'importo totale degli interventi pianificato.

L'importo totale di rendicontazione del gestore presenta uno scostamento rispetto all'importo totale di pianificazione pari al 22% circa.

TAB.2 – Numero di interventi rendicontati suddivisi in base agli scostamenti

DESCRIZIONE	QUANTI-TA'	IMPORTO CON-SUNTIVO LORDO 2014	IMPORTO PIA-NIFICATO LORDO 2014	NOTE GIUSTIFICA-TIVE NON ESAU-STIVE	CODICE ATERSIR (NON ESAUSTIVE)
Interventi non avviati (scostamento 100%)	14	€ 0	€ 2.259.925	-	-
Interventi con avvio anticipato nel 2014 - contenuti nel Pdl	7	€ 56.152	€ 0	-	-
Interventi avviati nel 2014 non contenuti nel Pdl – presenti nel Piano d'Ambito	21	€ 541.855	€ 0	-	-
Interventi avviati nel 2014 non contenuti nel Pdl – nuovi ID	3	€ 407.444	€ 0	-	-
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore \pm 20%	10	€ 12.243.625	€ 11.798.033	-	-
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore \pm 20%	26	€ 1.907.021	€ 5.670.600	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA	-
VARIE struttura (hw, sw, mezzi)	2	€ 1.100.000	€ 1.100.000	-	-

REGGIO EMILIA - IREN ACQUA GAS - 2014 ANALISI DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI



- Interventi con avvio anticipato nel 2014 - contenuti nel Pdl
- Interventi avviati nel 2014 non contenuti nel Pdl – presenti nel Piano d'Ambito
- Interventi avviati nel 2014 non contenuti nel Pdl – nuovi ID
- Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato < ± 20%
- Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato > ± 20%

INTERVENTI NON AVVIATI

La tabella a seguire individua gli interventi non avviati che costituiscono l'11% circa dell'importo lordo pianificato per gli interventi in riferimento all'annualità 2014.

Le giustificazioni del Gestore riguardano soprattutto cause tecnico-amministrative, le tempistiche necessarie per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni o gli approfondimenti tecnico-progettuali la cui necessità è emersa nel corso del tempo.

TAB.3 – Elenco interventi non avviati

CODICE ATER-SIR	CODICE ATO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	TIPOL.	IMPORTO INTERVENTO	INVESTIMENTI 2014
2014REIA0013		Campegine	Completamento terza uscita centrale idrica	acq	157.500	157.500
2014REIA0026	5.10.D15.5	Castelnuovo Monti	Potenziamento Costa de Grassi: 2° linea	dep	150.000	150.000
2014REIA0027	5.10.D15.13	Castelnuovo Monti	Potenziamento Impianto Ca' Perizzi - Posa biodischi linea 4	dep	200.000	200.000
2014REIA0028	5.10.D15.17	Castelnuovo Monti	Castelnuovo ne' Monti - Rio Spirola secondario - Realizzazione nitrifiltr.+sist.esistente	dep	250.000	250.000
2014REIA0029	5.10.D15.35	Castelnuovo Monti	Rio Maillo sedimentatore secondario	dep	150.000	150.000
2014REIA0033	5.8.Uspf.131	Cavriago	Risanamento fognature capoluogo con interventi vari via Rivasi, via Marzabotto, via 1° Maggio, via Arduini, via Costituzione, via Spaggiari, via Grand, Sottopasso Pianella, Via Girondola, via Guerra	fog	250.357	20.000
2014REIA0038	5.10.D15.42	Gattatico	Potenziamento Impianto di depurazione Praticello: nuovo ispessitore	dep	130.707	130.707
2014REIA0042	5.7.D11.3	Guastalla	Madonna del Ficchetto: risoluzione criticità di deflusso	fog	485.566	485.566
2014REIA0051	5.7.D11.4	Novellara	Fognatura Via Curie	fog	86.225	86.225
2014REIA0052	5.8.Uspf.81	Novellara	Risanamento fognatura Via Nazario Sauro	fog	36.927	36.927
2014REIA0063	U.s.p.f. no codice	Reggio E.	Estensione della rete fognaria in via Beethoven da via Zamenhof a via Sidoli, nella frazione di Massenzatico	fog	400.000	30.000
2014REIA0065	5.10.D15.10	Rio Saliceto	Rio Saliceto: potenziamento impianto 6000 adeguamenti diversi - sedimentatore secondario	dep	150.000	150.000
2014REIA0071	5.8.Uspf.125a	San Martino in Rio	Realizzazione rete fognaria Zona sportiva 1° stralcio	fog	170.000	170.000
2014REIA0080	5.10.D15.9	Viano	Potenziamento impianto San Giovanni di Querciola	dep	243.000	243.000
TOTALE NON AVVIATI						2.259.925

ALLEGATO 1
IREN ACQUA GAS - RE - RENDICONTAZIONE 2014

NUOVO ID ATERSIR	CODICE EX-ATO	Servizio	Titolo intervento	Comune	STIMA IMPORTO INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO			CONSUNTIVO 2014			Percentuale di scostamento	Note gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti
					Investimenti lordi	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto		
2014REIA0001	5.8.Uspf.90	fog	Potenziamento fognature Via Chierici	Albinea	183.709	183.709		183.709	6.433	-	6.433	-96%	In Progettazione: difficoltà di ottenimento permessi di Enti e Privati
2014REIA0004	5.8.Uspf.91	fog	Realizzazione rete in loc. Casale	Baiso	95.000			0	1.059	-	1.059	#DIV/0!	Anticipata la progettazione nel 2014 su sollecitazione dell'Amm.ne Comunale: difficoltà di definizione del percorso per problemi geologici
2014REIA0005	5.6.D09.8	fog	Barco: scaricatore collettore Ciano-Roncoesi	Bibbiano	56.000	56.000		56.000	2.116	-	2.116	-96%	Progetto approvato per E. 33.000: verrà realizzato nella primavera 2015
2014REIA0006	5.10.D15.1 5.10.D15.21 5.8.Uspf.111	dep	Boretto – Poviglio: (convenzione) 1° stralcio - potenziamento depuratore 1500 AE	Boretto	1.317.024	600.000		600.000	289.553	-	289.553	-52%	Cantiere in corso. Rallentamento lavori dovuto alle continue piogge.
2014REIA0007	5.10.D15.12 5.10.D15.26	dep	Brescello - Adeguamento della potenzialità del depuratore capoluogo (completamento 1° linea)	Brescello	2.151.000			0	5.447	-	5.447	#DIV/0!	In progettazione, anticipate spese per valutazione acquisto terreno: in attesa variante di destinazione d'uso dell'area e formalizzazione acquisto terreno
2014REIA0008	5.10.D15.41	dep	Potenziamento impianto depurazione	Cadelbosco Sopra	1.400.000	700.000		700.000	390.413	-	390.413	-44%	Cantiere in corso. Rallentato dalle condizioni metereologiche.
2014REIA0009	5.8.Uspf.112	fog	Estendimento rete fognaria capoluogo 1° stralcio	Campagnola	95.228	95.228		95.228	4.890	-	4.890	-95%	Cantiere in corso. Partenza ritardata dovuta alla concomitanza con lavori per pista ciclabile comunale.
2014REIA0011	5.8.Uspf.129 a	fog	Completamento rete fognaria in località Rossena	Canossa	47.000	47.000		47.000	48.964	-	48.964	4%	Intervento ultimato
2014REIA0013		acq	Completamento terza uscita centrale idrica	Campegine	157.500	157.500		157.500		-		-100%	In Progettazione: problemi di ottenimento permessi di Enti e Privati
2014REIA0014	5.8.Uspf.114	fog	Realizzazione collegamento rete fognaria località s.Biagio al depuratore di Cà perizzi 1° stralcio	Carpinetti	93.033	93.033		93.033	91.295	-	91.295	-2%	Intervento ultimato
2014REIA0016	5.8.Uspf.130	fog	Realizzazione collegamento rete fognaria località S.Biagio al depuratore di Cà perizzi2° stralcio	Carpinetti	95.000			0	42.311	-	42.311	#DIV/0!	Cantiere in corso. Lavori anticipati su richiesta dell'Amm.ne Comunale per dare continuità al 1° stralcio.
2014REIA0017	5.10.D15.40	dep	Adeguamento impianto: nuovo ispessitore	Casalgrande	250.000	200.000		200.000	159.459	-	159.459	-20%	Cantiere in corso
2014REIA0022	5.3.28	acq	Raddoppio adduttrice 4 km DN 500	Castellarano	400.000	400.000		400.000	323.815	-	323.815	-19%	Cantiere in corso: opere principali ultimate, mancano i tappeti d'usura
2014REIA0024	5.8.Uspf.78	fog	Collegamento fognario località Farneto a rete depurata	Castellarano	69.293	69.273		69.273	19.990	-	19.990	-71%	In Progettazione: problemi di ottenimento permessi di Enti e Privati
2014REIA0026	5.10.D15.5	dep	Potenziamento Costa de Grassi: 2° linea	Castelnovo Monti	150.000	150.000		150.000	-	-	-	-100%	Intervento non attuato in quanto gli adeguamenti idraulici previsti risultano necessari ma non urgenti, si proporrà la ripianificazione dei lavori in un'annualità successiva
2014REIA0027	5.10.D15.13	dep	Potenziamento Impianto Ca' Perizzi - Posa biosidchi linea 4	Castelnovo Monti	200.000	200.000		200.000		-	-	-100%	Sono stati definiti con la Gestione gli aspetti tecnico-funzionali degli interventi da attuare, si procederà con la progettazione nel corso del 2015
2014REIA0028	5.10.D15.17	dep	Castelnovo ne' Monti - Rio Spirola secondario - Realizzazione nitri+filtr.+sist.esistente	Castelnovo Monti	250.000	250.000		250.000		-	-	-100%	Sono stati definiti con la Gestione gli aspetti tecnico-funzionali degli interventi da attuare, si procederà con la progettazione nel corso del 2015
2014REIA0029	5.10.D15.35	dep	Rio Maillo sedimentatore secondario	Castelnovo Monti	150.000	150.000		150.000		-	-	-100%	Intervento non attuato in quanto gli adeguamenti idraulici previsti risultano necessari ma non urgenti, si proporrà la ripianificazione dei lavori in un'annualità successiva
2014REIA0030	5.10.D15.7 5.10.D15.14	dep	Meletole: Impianto di depurazione 1° e 2° Linea	Castelnovo Sotto	3.110.000	500.000		500.000	24.053	-	24.053	-95%	Da appaltare: completata la progettazione esecutiva. Ritardo nell'ottenimento del permesso di costruire
2014REIA0033	5.8.Uspf.131	fog	Risanamento fognature capoluogo con interventi vari via Rivasi, via Marzabotto, via 1° Maggio, via Arduini, via Costituzione, via Spaggiari, via Grand, Sottopasso Pianella, Via Gironbola, via Guerra	Cavriago	250.357	20.000		20.000		-	-	-100%	Progettazione in corso
2014REIA0035	PROGR 2009 tab. 2	dep	Canolo potenziamento impianto depurazione	Correggio	626.000	386.000		386.000	334.537	-	334.537	-13%	Cantiere in corso: opere principali ultimate, mancano alcune opere di completamento
2014REIA0038	5.10.D15.42	dep	Potenziamento Impianto di depurazione Praticello: nuovo ispessitore	Gattatico	130.707	130.707		130.707		-	-	-100%	In progettazione: in attesa permesso di costruire
2014REIA0042	5.7.D11.3	fog	Madonna del Fichetto: risoluzione criticità di deflusso	Guastalla	485.566	485.566		485.566		-	-	-100%	Da Convenzione in essere con il Consorzio di bonifica, la realizzazione delle opere è a carico del Consorzio, che poi ci rifatterà il costo dei lavori. In attesa perciò dell'esecuzione dell'intervento.
2014REIA0044	5.8.Uspf.134	fog	Sistemazione fognature Giarola Campo	Ligonchio	137.820	137.820		137.820	42.545	-	42.545	-69%	Cantiere in corso: sospeso per maltempo riprenderà in primavera 2015
2014REIA0045	5.3.7	acq	Nuovo serbatoio Luzzara mc 2000	Luzzara	1.200.000	600.000		600.000	34.250	-	34.250	-94%	Da appaltare: completata la progettazione esecutiva
2014REIA0046	5.5.D04.8 5.8.Uspf.120	fog	Casoni: collettamento a rete depurata	Luzzara	536.678	536.678		536.678	2.738	-	2.738	-99%	In progettazione: in corso di ottenimento servitù di passaggio su terreni privati. Si rimane in attesa di conferma del finanziamento con fondi FAS
2014REIA0049	5.3.8	acq	Completamento centrale idrica	Novellara	300.000	50.000		50.000	29.091	-	29.091	-42%	Cantiere in corso: ritardo sulla fornitura Enel
2014REIA0050	5.11.1.13	dep	San Bernardino: nuovo impianto biosidchi 450 AE	Novellara	460.000	200.000		200.000	45.372	-	45.372	-77%	Acquistato terreno e appaltato: verrà realizzato nella primavera 2015
2014REIA0051	5.7.D11.4	fog	Fognatura Via Curie	Novellara	86.225	86.225		86.225		-	-	-100%	In attesa di definire le priorità di intervento con l'Amministrazione Comunale di Novellara
2014REIA0052	5.8.Uspf.81	fog	Risanamento fognatura Via Nazario Sauro	Novellara	36.927	36.927		36.927		-	-	-100%	In attesa di definire le priorità di intervento con l'Amministrazione Comunale di Novellara
2014REIA0053	5.8.Uspf.101+antico	fog	Risanamento e potenziamento rete fognaria Capoluogo	Poviglio	305.000	205.000		205.000	264.910	-	264.910	29%	Cantiere in corso: maggiore avanzamento lavoririspetto al pianificato
2014REIA0055	5.8.Uspf.102	fog	Potenziamento fognario Via Piave	Quattro Castella	75.000	75.000		75.000	1.664	-	1.664	-98%	Progettazione in corso

ALLEGATO 1
IREN ACQUA GAS - RE - RENDICONTAZIONE 2014

						STIMA IMPORTO INTERVENTO		PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO			CONSUNTIVO 2014				
NUOVO ID ATERSIR	CODICE EX-ATO	Servizio	Titolo intervento	Comune	Investimenti lordi	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti		
2014REIA0056	5.8.Uspf.83 5.8.Uspf.121	fog	Realizzazione collettore fognario in loc. Miscoso	Ramiseto	103.644	103.644		103.644	34.661	-	34.661	-67%	Cantiere in corso: sospeso per maltempo riprenderà in primavera 2015		
2014REIA0057	5.3.38	acq	Interconnessione acquedotti Reggio-Roncocesi	Reggio E.	3.200.000	250.000		250.000	11.091	0	11.091	-96%	In Progettazione: problemi di ottenimento permessi di Enti e Privati		
2014REIA0058	5.9.D13.1	dep	Riuso reflui Mancasale	Reggio E.	2.540.000	900.000	600.000	300.000	877.928	-	877.928	-2%	Cantiere in corso		
2014REIA0059	5.8.Uspf.122a	fog	Potenziamento rete fognaria Via Cipriani	Reggio E.	500.000	50.000	213.918	-163.918	80.776	-	80.776	62%	Intervento ultimato		
2014REIA0060	5.8.Uspd.103a	fog	Estendimento fognario in Scaruffi	Reggio E.	500.000	100.000		100.000	19.223	-	19.223	-81%	Cantiere in corso		
2014REIA0062	no codice	fog	Estendimento fognario in via Zannoni	Reggio E.	60.000	60.000		60.000	5.899	-	5.899	-90%	Progettato e Appaltato: verrà realizzato nella primavera 2015		
2014REIA0063	U.s.p.f. no codice	fog	Estendimento della rete fognaria in via Beethoven da via Zamenhof a via Sidoli, nella frazione di Massenzatico	Reggio E.	400.000	30.000		30.000			-	-100%	In progettazione		
2014REIA0065	5.10.D15.10	dep	Rio Saliceto: potenziamento impianto 6000 adeguamenti diversi - sedimentatore secondario	Rio Saliceto	150.000	150.000		150.000			-	-100%	Attraverso interventi di ottimizzazione gestionale l'impianto non presenta sforamenti. L'intervento verrà comunque ripianificato in annualità successive		
2014REIA0067	5.7.D11.10	fog	Potenziamento drenaggio urbano II° lotto	Rolo	602.000	452.000		452.000	431.023	-	431.023	-5%	Cantiere in corso		
2014REIA0068	5.7.D11.2	fog	Potenziamento drenaggio urbano III° lotto	Rolo	640.500			0	2.187	-	2.187	#DIV/0!	Anticipata progettazione per richiesta permessi		
2014REIA0069	5.8.Uspf.124	fog	Estendimento rete fognaria in Via Bedollo	Rolo	95.000			0	868	-	868	#DIV/0!	Anticipata progettazione su sollecitazione dell'Amm.ne Comunale		
2014REIA0070	5.8.Uspf.86 5.8.Uspf.138	fog	Estendimento fognature in via delle Valli, via Togliatti e Completamento lavori TAV	Rubiera	305.000	100.000		100.000	533	-	533	-99%	In Progettazione: problemi di ottenimento permessi di Enti e Privati		
2014REIA0071	5.8.Uspf.125a	fog	Realizzazione rete fognaria Zona sportiva 1° stralcio	San Martino in Rio	170.000	170.000		170.000			-	-100%	L'intervento previsto non è più necessario in quanto realizzato dal Comune con altre risorse: in attesa di ridefinire le priorità di intervento con l'Amministrazione Comunale di San Martino in Rio		
2014REIA0074	5.8.Uspf.87	fog	Costruzione nuovo scolamatore scuole su collettore Ciano Roncocesi e potenziamento fognatura via Riolo.	San Polo d'Enza	140.000			0	2.129	-	2.129	#DIV/0!	Anticipata progettazione su sollecitazione dell'Amm.ne Comunale		
2014REIA0075	5.8.Uspf.141	fog	Collettore fognario in loc. Rampa d'Enza	Sant'Illario d'Enza	140.000	140.000		140.000	135.829	-	135.829	-3%	Intervento ultimato		
2014REIA0077	Uspf - pregressi 5.8.Uspf.9	fog	Sistemazione fognature Arceto 2° e 3° lotto	Scandiano	350.000	350.000	157.500	192.500	293.029	-78.750	214.279	-16%	Cantiere in corso		
2014REIA0078	5.8.Uspf.107 5.8.Uspf.127	fog	Risanamento fognature in loc. Sedrio	Vezzano sul C.	108.248	108.248		108.248	16.988	-	16.988	-84%	In progettazione: in attesa autorizzazione ANAS per attraversamento SS 63		
2014REIA0080	5.10.D15.9	dep	Potenziamento impianto San Giovanni di Querciola	Viano	243.000	243.000		243.000			-	-100%	Ottimizzando alcuni parametri gestionali e ridefinendo le modalità di alcuni scarichi industriali l'impianto risulta adeguato. L'intervento verrà comunque ripianificato in annualità successive.		
2014REIA0081	5.8.Uspf.108	fog	Realizzazione collettore fognario in loc. Predale	Viano	287.820			0	2.152	-	2.152	#DIV/0!	Anticipata progettazione su sollecitazione dell'Amm.ne Comunale		
2014REIA0087	5.2.25	acq	Ulteriori estendimenti in zone non servite	Vari	290.000	190.000		190.000	123.911	-8.345	115.566	-35%	Cantiere in corso		
2014REIA0088	5.4.11	fog	Estensione fogne nere o miste	Vari	548.000	120.000		120.000	41.044		41.044	-66%	Lavori ultimati: si sono resi necessari minori interventi di quelli pianificati		
2014REIA0090			Distributori di acqua pubblica	Vari	160.000	80.000		80.000	45.947	-	45.947	-43%	Il distributore di Reggiolo è stato rimandato al 2015 su richiesta dell'Amministrazione		
2014REIA0091	5.2.2. - 5.2.4. - 5.2.5. - 5.2.6. - 5.2.9. - 5.2.9. - 5.2.11. - 5.2.12. - 5.2.13.	acq	Manutenzioni straordinarie acqua	Vari	22.350.000	5.800.000		5.800.000	6.396.421	-226.232	6.170.189	10%			
2014REIA0094	5.4.1. - 5.4.2. - 5.4.3. - 5.4.4. - 5.4.5.	fog/dep	Manutenzioni straordinarie fog/dep	Vari	13.730.000	3.230.000		3.230.000	3.310.784	-	3.310.784	3%			
2014REIA0095	5.2.1	acq	Cartografia numerica acqua/fognature	Vari	1.200.000	300.000		300.000	209.472	-	209.472	-30%	Minori attività rispetto al pianificato		
2014REIA0096	5.4.27	fog/dep	Investimenti generali di struttura (Fognatura/depurazione		1.980.000	495.000		495.000	495.000		495.000	0%			
2014REIA0097	5.4.28	acq	Investimenti generali di struttura (acquedotto)		2.420.000	605.000		605.000	605.000		605.000	0%			
non previsto		acq	INTERC/SOST RETE ACQ. SS467-CASTELLARANO						10.965	-	10.965		Coda di intervento pianificato e realizzato nel 2013 previsto al punto 5.3.28		
non previsto		acq	VIA ROMA S.MARTINO R.-POT.R.ACQUA+320001						12.927	-	12.927		Coda di intervento pianificato e realizzato nel 2013 previsto al punto 5.2.2 "Spostamenti condotte adduttrici e varie"		
non previsto		acq	SERBATOIO DI NOVELLARA 1° STRALCIO COMPL						19.970	-	19.970		Coda di intervento pianificato e realizzato nel 2012 previsto al punto 5.3.8 "Nuovi serbatoi di stoccaggio"		
non previsto		dep	EX V1602279-IMP. DEP. SORBOLO-LENTIGIONE						40.884	-	40.884		Coda di intervento realizzato nel 2010 previsto in tabella 2 "Opere capitalizzabili nel 2010"		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 3 del 01 aprile 2016

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato – Gestori: IRETI S.p.A. (ex-IREN S.p.A.), Azienda Servizi Toano (AST) S.r.l.**
Modifiche del programma degli interventi 2014 e presa d’atto del consuntivo 2014. Proposta di integrazione del Piano d’Ambito.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 1 aprile 2016

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale

F.to Mirko Tutino

Il segretario verbalizzante

F.to Enrico Menozzi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 11 maggio 2016

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna
