

CLRN/2015/3 del 18 dicembre 2015

**CONSIGLIO LOCALE DI RIMINI**

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A.**  
**Presenza d'atto del consuntivo 2014.**

IL COORDINATORE  
F.to Stefano Giannini

parere di regolarità tecnica  
il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

### CONSIGLIO LOCALE di RIMINI

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 10.15 presso la sede della Provincia di Rimini, si è riunito il Consiglio Locale di Rimini convocato con lettera protocollo AT/2015/8737 del 09/12/2015.

Assume la presidenza il Coordinatore Stefano Giannini che chiama il funzionario di ATERSIR Ing. Andrea Casadio ad assisterlo in qualità di segretario verbalizzante.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
BELLARIA IGEA MARINA	Giovanardi Giovanni	Assessore	SI	5,0261
CASTELDELCI			NO	0,4582
CATTOLICA			NO	4,5123
CORIANO	Morri Michele	Assessore	SI	2,8705
MAIOLO			NO	0,5596
MISANO ADRIATICO			NO	3,4304
NOVAFELTRIA	Biordi Giorgio	Assessore	SI	2,1793
PENNABILLI	Valenti Lorenzo	Sindaco	SI	1,1056
POGGIO TORRIANA	Antonini Franco	Vice-Sindaco	SI	1,5948
RICCIONE	Tosi Renata	Sindaco	SI	9,0400
RIMINI	Brasini Gian Luca	Assessore	SI	35,4884
SALUDECIO			NO	1,1084
SAN GIOVANNI in MARIGNANO			NO	2,6050
SAN LEO	Bindi Leonardo	Vice-Sindaco	SI	1,0938
SANT'AGATA FELTRIA	Ricci Paolo	Vice-Sindaco	SI	0,9201
SANTARCANGELO di ROMAGNA	Zangoli Emanuele	Sindaco	SI	5,5920
TALAMELLO			NO	0,6130
UNIONE VALCONCA (Comuni di Gemmano, Mondaino, Montecolombo, Montefiore conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna)	Santi Rizio	Sindaco Comune Gemmano	SI	8,9490
VERUCCHIO	Ronchi Davide	Consigliere	SI	2,8534
PROVINCIA di RIMINI				10,0000

Presenti n. 12

76,7130 quote

Assenti n. 8

23,2869 quote

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A.  
Presa d'atto del consuntivo 2014.**

**Vista** la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato** che

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art. 7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

**considerato** che:

- con deliberazione n. 3 del 29 aprile 2014 del Consiglio locale di Rimini è stato approvato il Programma degli Interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2014-2039, documento costitutivo del Piano d'ambito del servizio idrico integrato del bacino riminese in predisposizione;
- con deliberazione n. 4 del 29 aprile 2014 del Consiglio locale di Rimini è stato approvato il programma degli interventi 2014-2017 del servizio idrico integrato che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 22 del 28 aprile 2014 del Consiglio d'ambito è stato approvato il piano economico finanziario 2014-2015 del servizio idrico integrato per il gestore HERA s.p.a.;
- con deliberazione n. 70 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d'ambito ha approvato le *"Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato"*;
- con deliberazione n. 47 del 29 settembre 2015 del Consiglio d'ambito è stato approvato il Piano d'Ambito del bacino territoriale di Rimini, che prevede tra i propri allegati il *"Piano degli interventi 2014-2039 - territorio della provincia di Rimini"* (allegato parte B);

**considerato** che:

- le linee guida di cui al punto precedente prevedono che nel corso dell'anno N, il Gestore, nel rispetto di condizioni ivi specificate, possa procedere alla realizzazione degli interventi in modo conforme rispetto a quanto previsto dal Programma degli

interventi senza preventiva approvazione di una sua revisione solamente nei seguenti casi:

- A. Interventi urgenti e indifferibili per cause di forza maggiore e/o per eventi naturali e imprevedibili e/o per sopravvenuti nuovi vincoli normativi o derivanti da prescrizioni autorizzative;
- B. Anticipazioni/posticipazioni di interventi già previsti nel Piano o nel Programma degli interventi approvato;
- C. Interventi di manutenzione straordinaria derivanti da criticità segnalate dalle Amministrazioni comunali;
- D. Varianti al progetto e varianti in corso d'opera di interventi già previsti nel Programma degli interventi approvato;

e che nell'anno N+1, preventivamente alla presa d'atto del consuntivo dell'anno N, ATERSIR provveda ad approvare le modifiche del programma degli interventi (ed eventualmente le modifiche del Piano di Ambito) conseguenti a quanto sopra.

**dato atto** che:

- con lettera avente ad oggetto “Programma degli Interventi del Servizio Idrico Integrato 2014-2017. Rendicontazione del CONSUNTIVO annualità di gestione 2014”, in atti al protocollo ATERSIR PG/201/5672 del 20 agosto 2015, il gestore HERA S.p.A. ha trasmesso i dati relativi al consuntivo 2014 degli interventi del servizio idrico integrato;

**rilevato** che:

- dai dati presentati è emerso che non sono stati eseguiti interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Piano d'ambito approvato con deliberazione n. 47 del 29 settembre 2015 del Consiglio d'ambito;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che sulla base dell'istruttoria svolta è necessario avviare ulteriore istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del gestore HERA S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive;

**ritenuto** pertanto:

- di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di avviare l'istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del Gestore HERA S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**dato atto** che per le versioni integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene acquisita agli atti;

con voti a favore n. 11 (quote 67,6730), astenuti n. 1 (quote 9,0400 – Comune di Riccione);

### **DELIBERA**

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avviare l'istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del gestore HERA S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**  
**CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2014**  
**GESTORE: HERA S.P.A.**  
**SOTTOAMBITO: RIMINI**

## RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2014

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2014, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Rimini n. 04 del 28 Aprile 2014, che il gestore HERA ha presentato in data 20 Agosto 2015 (prot. PG/2015/0005672) come richiesto da ATERSIR in data 16 Luglio 2015 (prot. PG/2015/0004968).

		PIANIFICATO 2014	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2014
GESTORE HERA	Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 14'352'800	-€ 3'464'913	€ 10'887'887 [A]
	Importo Contributo Pianificato [B]	€ 1'860'500	-€ 833'421	€ 1'027'079 [B]
	Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 12'492'300	-€ 2'631'492	€ 9'860'808 [B]
CONTO TERZI	Importo pianificato da soggetto investitore diverso da Hera	€ 25'585'000	-€ 1'274'074	€ 24'310'926
<b>TOTALE</b>	<b>Totale pianificato</b>	<b>€ 39'937'800</b>	<b>-€ 4'738'987</b>	<b>€ 35'198'813</b>
	<b>Totale consuntivo</b>			

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2014

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, considerando sia gli interventi da essa finanziati che quelli finanziati da terzi, abbia effettuato nel corso del 2014 investimenti inferiori di circa un 10%, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

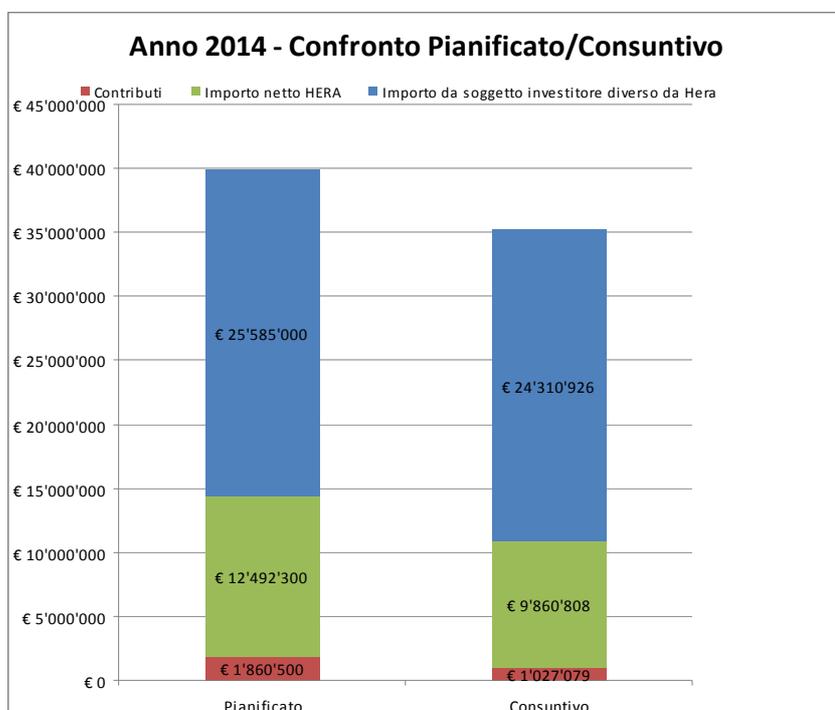


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2014

## RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2014: 68

Numero di interventi rendicontati nel 2014: 62

		Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2014	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2014	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR
1	Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	12	€ 0	€ 808.300	3	2014RNHA0011 2014RNHA0069 2014RNHA0074
2	Interventi con avvio anticipato nel 2014 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	2	€ 174.337	€ 0	0	
3	Interventi avviati nel 2014 che non erano nel Programma 2014-17	4	€ 140.905	€ 0	0	
4	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	24	€ 4.599.602	€ 6.459.000	0	
5	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	32	€ 30.283.969	€ 32.670.500	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA	

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che il gestore non ha avviato, nel 2014, 12 interventi che invece erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella 3); per 3 tra questi interventi le giustificazioni, che ATERSIR ha richiesto al gestore sulle cause che hanno portato allo slittamento dei progetti, non sono state ritenute esaustive e per tal motivo ATERSIR sta valutando quale provvedimento assumere.

Inoltre si può notare come rispetto ai 62 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 39% di questi (24 interventi) ha avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno.

## Grafico qualitativo degli Interventi Rendicontati

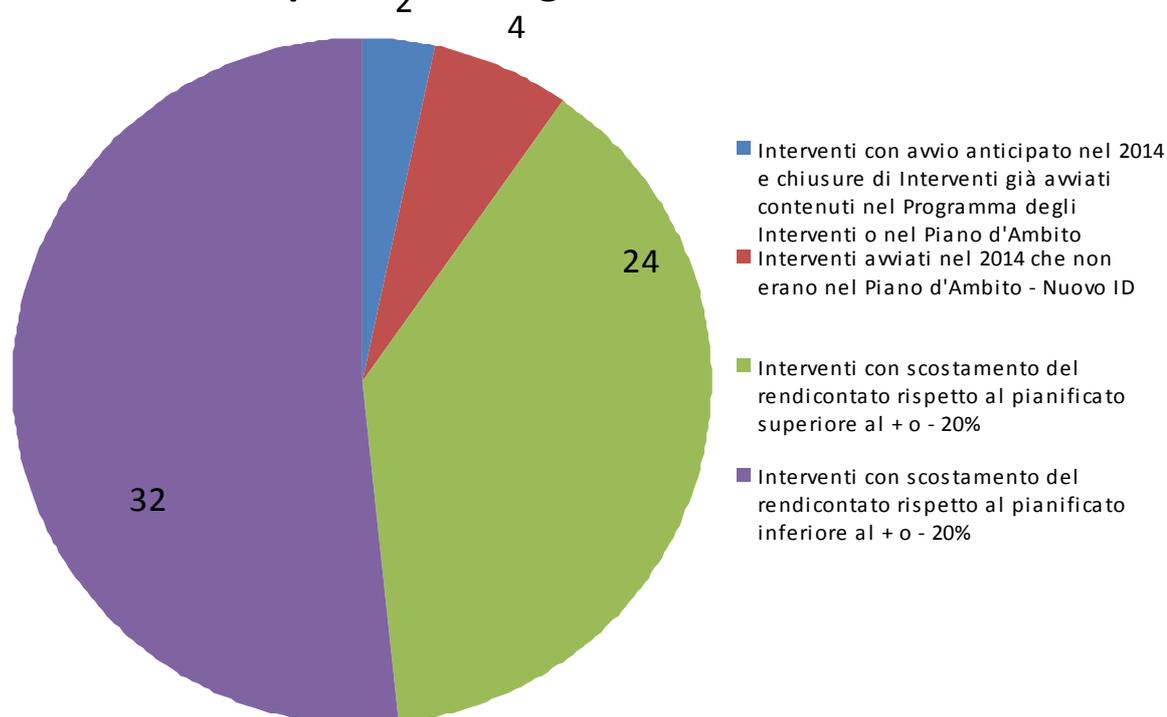


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione, Generale)	Titolo intervento (descrizione sintetica)	Comune	Soggetto investitore (gestore o patrimoniali)	Importo investimenti Lordo previsto
2014RNHA0004	FOGNATURA	SEPARAZIONE FOG. IN ALCUNE VIE (VIA DI VITTORIO)	Coriano	IPOTESI AMIR	20 000
2014RNHA0011	FOGNATURA	COMPLET.RETE FOG. AL COLL. NOVAFELTRIA	Novafeltria (PU)	GESTORE HERA	20 000
2014RNHA0020	DEPURAZIONE	ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - RN	Opere Pluricomunal	GESTORE HERA	100 000
2014RNHA0025	FOGNATURA	RILIEVO RETI FOGNARIE - RN - ATO 9	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	20 000
2014RNHA0034	FOGNATURA	ADEG. DEGLI SCARICHI DI AGGLOMERATI	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	253 300
2014RNHA0044	FOGNATURA	COMPLET.COLL.FOGN.V.ABBAZIA-MORCIANO	Morciano di Romagna	AMIR	100 000
2014RNHA0045	DEPURAZIONE	ADEG.SC.(4,18) - STRALCIO FOGNATURA - SALUDECIO	Saludecio	AMIR	50 000
2014RNHA0069	FOGNATURA	NUOVO SCOLMATORE MAVONE V.COVIGNANO RN	Rimini	GESTORE HERA	10 000
2014RNHA0070	FOGNATURA	ADEG RETE FOG V.S.CHIARA-VICOLO CIMA RN - FOSSA PATARA	Rimini	GESTORE HERA	100 000
2014RNHA0074	FOGNATURA	DEVIAZ. RETE FOG V.GIOVE RIMINI	Rimini	GESTORE HERA	15 000
2014RNHA0076	FOGNATURA	REAL. COLL. PRINCIPALE SU VIA CANONICA	Santarcangelo di Romagna	GESTORE HERA	20 000
2014RNHA0079	FOGNATURA	NUOVA COLLEG. CENTRO STORICO DI TORRIANA	Torriana	GESTORE HERA	100 000

808 300

TAB.3 Interventi previsti nel 2014 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO					PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
ID ATERSIR	Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione, Generale)	Titolo intervento (descrizione sintetica)	Comune	Soggetto investitore (gestore o patrimoniali)	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014RNHA0001	DEPURAZIONE	ADEG. E RISTRUTTURAZIONE DEP. CATTOLICA	Cattolica	GESTORE HERA	200.000	0	200.000	263.000	0	263.000	32%	INTERVENTO IN CORSO. I MAGGIORI ONERI SONO RELATIVI AL MAGGIOR AVANZAMENTO DEL CANTIERE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RNHA0002	FOGNATURA	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOG. CATTOLICA	Cattolica	GESTORE HERA	10.000	0	10.000	5.999	0	5.999	-40%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO A CAUSA DELLA NECESSITA' DI SVOLGERE RILIEVI INTEGRATIVI NON ESEGUIBILI NEL PERIODO ESTIVO.
2014RNHA0004	FOGNATURA	SEPARAZIONE FOG. IN ALCUNE VIE (VIA DI VITTORIO)	Coriano	IPOTESI AMIR	20.000	0	-	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO A CAUSA DELLA CONVENZIONE CON AMIR AD OGGI NON ANCORA FIRMATA. AMIR HA IN CAPO ANCHE LA
2014RNHA0005	FOGNATURA	COSTR. DI FOGNATURA LUNGO VIA MULAZZANO	Coriano	GESTORE HERA	150.000	0	150.000	48.339	0	48.339	-68%	PROGETTAZIONE CHE RISULTA NON ANCORA COMPLETATA.
2014RNHA0007	FOGNATURA	COLLET.FOGRANERA DA V.S.FELICE A M.CONCA	Montefiore Conca	GESTORE HERA	195.000	0	195.000	16.040	0	16.040	-92%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO A CAUSA DI RITARDI IN FASE DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI.
2014RNHA0008	FOGNATURA	NUOVO COLL. V.SAN FELICE A MONTEF. CONCA	Montefiore Conca	GESTORE HERA	30.000	0	30.000	29.988	0	29.988	0%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO A CAUSA DELLE TEMPISTICHE ASSOCIATE ALL'ITER AUTORIZZATIVO.
2014RNHA0009	FOGNATURA	ADEG.SCARICHI 3-5 TREBBIANO MONTEGRIDOLFO	Montegridolfo	GESTORE HERA	20.000	-63.500	-43.500	1.407	-42.475	-41.068	-93%	INTERVENTO CONCLUSO.
2014RNHA0010	FOGNATURA	ADEG. SCARICHI N° 4-5-6-7-13 MONTESCUDO	Montescudo	GESTORE HERA	50.000	0	50.000	49.963	0	49.963	0%	INTERVENTO CONCLUSO. LA RIDUZIONE DELL'IMPORTO CONSUNTIVATO NEL 2014 RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE È DOVUTO AD ECONOMIE DI CANTIERE E MANCATO PERFEZIONAMENTO SERVITÙ.
2014RNHA0011	FOGNATURA	COMPLET.RETE FOG. AL COLL. NOVAFELTRIA	Novafeltria (PU)	GESTORE HERA	20.000	0	20.000	0	0	0	-100%	PROGETTAZIONE PREVISTA PER IL 2014 RIPROGRAMMATA PER L'ANNUALITA' 2015 A SEGUITO DI RIDEFINIZIONE PRIORITÀ INTERVENTI.
2014RNHA0012	ACQUEDOTTO	PERF. E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI	Novafeltria (PU)	GESTORE HERA	20.000	0	20.000	9.388	0	9.388	-53%	MINORI ONERI PER ECONOMIE DI PROGETTO.
2014RNHA0013	FOGNATURA	DISM.DEP.PONTES.M.MADDALENA E COLL.FOGRANA	Novafeltria (PU)	GESTORE HERA	15.000	0	15.000	18.192	0	18.192	21%	MAGGIORI ONERI A CAUSA DELLE ULTERIORI ANALISI RESESI NECESSARIE DATA LA COMPLESSITA' DEL PROGETTO.
2014RNHA0014	ACQUEDOTTO	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - RN - ATO9	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	1.150.000	0	1.150.000	1.326.509	0	1.326.509	15%	
2014RNHA0015	ACQUEDOTTO	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - RN - ATO9	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	1.250.000	0	1.250.000	1.365.495	0	1.365.495	9%	
2014RNHA0016	ACQUEDOTTO	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	470.000	0	470.000	473.583	0	473.583	1%	
2014RNHA0017	ACQUEDOTTO	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - RN - ATO9	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	200.000	0	200.000	193.875	0	193.875	-3%	
2014RNHA0018	ACQUEDOTTO	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-RN-ATO9	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	80.000	0	80.000	79.912	0	79.912	0%	
2014RNHA0019	ACQUEDOTTO	DISTRETT. RETI ACQUA - RN ATO 9	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	30.000	0	30.000	28.774	0	28.774	-4%	
2014RNHA0020	DEPURAZIONE	ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - RN	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	100.000	0	100.000	0	0	0	-100%	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI AGLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA. E' STATA MODIFICATA IN CORSO D'ANNO LA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER IL 2014 IN BASE ALLE ESIGENZE EMERSE. SI È PERTANTO RITENUTO OPPORTUNO RIDESTINARE LE RISORSE TECNICO-ECONOMICHE SU INTERVENTI DI PRIORITÀ MAGGIORE.
2014RNHA0021	DEPURAZIONE	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	1.100.000	0	1.100.000	803.239	0	803.239	-27%	MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RNHA0022	FOGNATURA	MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGRANERA - RN	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	850.000	0	850.000	1.262.215	0	1.262.215	48%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RNHA0023	FOGNATURA	MANUT.STRA.IMP.FOGRANERA - RN	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	530.000	0	530.000	667.497	0	667.497	26%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RNHA0024	FOGNATURA	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - RN	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	100.000	0	100.000	132.271	0	132.271	32%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RNHA0025	FOGNATURA	RILIEVO RETI FOGNARIE - RN - ATO 9	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	20.000	0	20.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO IN QUANTO SONO IN CORSO ATTIVITA' DI CONTRATTUALIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI RILIEVI.
2014RNHA0026	ACQUEDOTTO	RINN RETE H2O V.BRANCA NOVAFELTRIA-ASSE3	Novafeltria (PU)	GESTORE HERA	0	-29.000	-29.000	0	-31.459	-31.459	#DIV/0!	INTERVENTO CONCLUSO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014RNHA0027	ACQUEDOTTO	RIN RETE H2O V.ROMAGNA NOVAFELTRIA-ASSE3	Novafeltria (PU)	GESTORE HERA	0	-92.000	-92.000	0	-97.437	-97.437	#DIV/0!	INTERVENTO CONCLUSO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014RNHA0028	ACQUEDOTTO	RIN RETE P.ZZA M.FELTRO PENNABILLI-ASSE3	Pennabilli	GESTORE HERA	0	-27.000	-27.000	0	-29.591	-29.591	#DIV/0!	INTERVENTO CONCLUSO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014RNHA0029	ACQUEDOTTO	RINN RETE H2O V.SERRA SALUDECIO-ASSE3	Saludecio	GESTORE HERA	0	-69.000	-69.000	0	-54.364	-54.364	#DIV/0!	INTERVENTO CONCLUSO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014RNHA0030	ACQUEDOTTO	RIN RETE H2O V.DEI POGGI SALUDECIO-ASSE3	Saludecio	GESTORE HERA	0	-85.000	-85.000	0	-87.960	-87.960	#DIV/0!	INTERVENTO CONCLUSO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014RNHA0031	ACQUEDOTTO	RINN RETE H2O V.LEONTINA S.LEO-ASSE3	San Leo	GESTORE HERA	0	-24.000	-24.000	0	-25.896	-25.896	#DIV/0!	INTERVENTO CONCLUSO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014RNHA0032	ACQUEDOTTO	RIN RETE P.ZZA GARIBALDI S.AGATA F-ASSE3	Sant'Agata Feltria	GESTORE HERA	0	-85.000	-85.000	0	-84.202	-84.202	#DIV/0!	INTERVENTO CONCLUSO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014RNHA0033	ACQUEDOTTO	RIN RETE P.ZZA GARIBALDI TALAMELLO-ASSE3	Talamello	GESTORE HERA	0	-46.000	-46.000	0	-38.804	-38.804	#DIV/0!	INTERVENTO CONCLUSO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014RNHA0034	FOGNATURA	ADEG. DEGLI SCARICHI DI AGGLOMERATI	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	253.300	0	253.300	0	0	0	-100%	CODICE ATERSIR GENERICO SUGLI ADEGUAMENTI DEGLI AGGLOMERATI CREATO DA ATERSIR IN PIANO DEL 22/2014 PER ACCORPARE TUTTI GLI INTERVENTI DI QUESTA TIPOLOGIA. IL CONSUNTIVO E' STATO RENDICONTATO NEI SINGOLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO.
2014RNHA0035	FOGNATURA	ADEG.SC.(72A,72B)COLLETT.DEP A CERASOLO	Coriano	GESTORE HERA	328.000	0	328.000	285.820	0	285.820	-13%	
2014RNHA0037	FOGNATURA	NUOVA FOG.E IMP.SOLL.V.ORSOLETO - P.BERNI	Poggio Berni	GESTORE HERA	7.500	0	7.500	6.741	0	6.741	-10%	INTERVENTO CONCLUSO.
2014RNHA0038	DEPURAZIONE	REAL. FITODEPURAZIONE BORGONUOVO - RIMINI	Rimini	GESTORE HERA	210.000	0	210.000	156.286	0	156.286	-26%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 PER RITARDI NELLE TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE (RILASCIO PRATICA SISMICA).
2014RNHA0039	FOGNATURA	ADEG. SCARICO V.RAVARINO - RIMINI	Rimini	GESTORE HERA	25.000	0	25.000	24.025	0	24.025	-4%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2014. SI RICHIEDE LA CHIUSURA DEL CODICE DI PIANO.
2014RNHA0040	FOGNATURA	ADEG. SCARICHI 24 E 71 - RIMINI	Rimini	GESTORE HERA	45.000	0	45.000	48.787	0	48.787	8%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2014.
2014RNHA0041	DEPURAZIONE	ADEG.SC.(4,18)CON NUOVO DEP.A S.ANSOVINO - SALUDECIO	Saludecio	GESTORE HERA	10.000	-57.800	-47.800	12.643	-57.781	-45.138	26%	INTERVENTO CONCLUSO. MODESTO INCREMENTO IMPORTO CONSUNTIVATO PER MAGGIORI OPERE DI FINITURA.
2014RNHA0042	FOGNATURA	ADEG.SCARICO 31-PIEVE CORENA VERUCCHIO	Verucchio	GESTORE HERA	35.000	0	35.000	36.141	0	36.141	3%	INTERVENTO CONCLUSO.
2014RNHA0043	FOGNATURA	ADEG.SCARICO 9 LOC MONTE UGONE-VERUCCHIO	Verucchio	GESTORE HERA	94.000	0	94.000	18.279	0	18.279	-81%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO IN SEGUITO ALLA RIDEFINIZIONE DEL PROGETTO PER PROBLEMATICHE GESTIONALI E REALIZZATIVE.
2014RNHA0044	FOGNATURA	COMPLET.COLL.FOGR.V.ABBAZIA-MORCIANO	Morciano di Romagna	AMIR	100.000	0	100.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO A CAUSA DELLA CONVENZIONE CON AMIR AD OGGI NON ANCORA FIRMATA.
2014RNHA0045	DEPURAZIONE	ADEG.SC.(4,18) - STRALCIO FOGNATURA - SALUDECIO	Saludecio	AMIR	50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO A CAUSA DELLA CONVENZIONE CON AMIR AD OGGI NON ANCORA FIRMATA.
2014RNHA0046	FOGNATURA	NUOVA FOG NERA V.DOGANA ICS 38 - VERUCCHIO	Verucchio	AMIR	150.000	0	150.000	19.445	0	19.445	-87%	INTERVENTO IN PARTE RIPRIANIFICATO AL 2015 POICHE' VINCOLI AUTORIZZATIVI DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI BACINO HANNO COMPORTATO LA REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.
2014RNHA0047	DEPURAZIONE	REAL. VASCA TESTA IMPIANTO DEP RICCIONE	Riccione	GESTORE HERA	100.000	0	100.000	10.000	0	10.000	-90%	IMPORTO 2014 COERENTE CON L'AVANZAMENTO DELL'ATTIVITÀ PROGETTUALE (COMPLETATA PROG. DEFINITIVA), OVVERO CON LA PROPOSTA PRESENTATA AD ATERSIR (PRE-DELIBERA DEL. N° 22 28-4-2014) E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA DA ATERSIR/COMUNE.
2014RNHA0048	FOGNATURA	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOG. RICCIONE	Riccione	GESTORE HERA	80.000	0	80.000	87.437	0	87.437	9%	
2014RNHA0049	ACQUEDOTTO	RETE DI COLL. SERBATOIO COVIGNANO	Rimini	IPOTESI ROMAGNA ACQUE(Delibera consiglio loc. RIMINI 19-12-2013)	0	0	0	171.394	0	171.394	#DIV/0!	I COSTI RENDICONTATI NEL 2014 SONO INTEGRALMENTE RELATIVI A COSTI DIRETTI SOSTENUTI DA ROMAGNA ACQUE.
2014RNHA0050	ACQUEDOTTO	ESTENSIONE VETTORE DI VIA ROMA LATO SUD	Rimini	GESTORE HERA	200.000	0	200.000	48.646	0	48.646	-76%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO POICHE' VINCOLATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI ARREDI URBANI DA PARTE DEL COMUNE.

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO					PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
ID ATERSIR	Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione, Generale)	Titolo intervento (descrizione sintetica)	Comune	Soggetto investitore (gestore o patrimoniali)	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendiconto rispetto il preventivo e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014RNHA0051	DEPURAZIONE	PSB-RICONVERSIONE DEP.MARECCHIESE	Rimini	GESTORE HERA	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO IL LAVORO VERRA' REALIZZATO DALLA SOCIETA' DEGLI ASSET RASDF. L'ID 2014RNHA0051 (INTERVENTO A CARICO DEL GESTORE) E' STATA SOSTITUITA DALL'ID 2015RNHA0002.
2014RNHA0052	DEPURAZIONE	PSB-RADDOPPIO DEPURATORE DI S. GIUSTINA	Rimini	ROMAGNA ACQUE	16.548.000			15.496.565	0		-6%	
2014RNHA0053	FOGNATURA	ADEG. INVASI CENTRO CAAR A VASCHE 1 PIOGGIA	Rimini	GESTORE HERA	0	0	0	2.943	0	2.943	#DIV/0!	ANTICIPATI COSTI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE IN QUANTO SONO STATI NECESSARI APPROFONDIMENTI PER DEFINIZIONE SOLUZIONE TECNICA APPROPRIATA.
2014RNHA0054	FOGNATURA	ESTENSIONE VETTORE DI VIA ROMA LATO SUD	Rimini	GESTORE HERA	100.000	0	100.000	75.061	0	75.061	-25%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO POICHE' VINCOLATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI ARREDI URBANI DA PARTE DEL COMUNE.
2014RNHA0056	FOGNATURA	PSB-DORSALE NORD PER DISM. DEP. BELLARIA	Rimini	ROMAGNA ACQUE - AMIR	8.692.000			7.211.448	0		-17%	INTERVENTO ROMAGNA ACQUE - AMIR (LA DORSALE NORD E' FINANZIATA AL 50% DA ROMAGNA ACQUE E AL 50% DA AMIR).
2014RNHA0059	FOGNATURA	PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN - PREMENTE	Rimini	IPOTESI ROMAGNA ACQUE (PSB)	25.000			27.457	0		10%	
2014RNHA0060	FOGNATURA	PSB-RISANAMENTO FOGNARIO 'ISOLA'	Rimini	GESTORE HERA	1.500.000	-582.200	917.800	1.279.192	-477.110	802.082	-15%	INTERVENTO CONCLUSO.
2014RNHA0061	FOGNATURA	PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN-I°STR-II°LOT	Rimini	GESTORE HERA	200.000	0	200.000	49.897	0	49.897	-75%	CRITICITA' LEGATE A TEMPI DI AVVIO DELL'ITER AUTORIZZATIVO STANNO PROVOCANDO UN ALLUNGAMENTO DEI TEMPI.
2014RNHA0062	FOGNATURA	PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN-I°STR-I°LOT	Rimini	GESTORE HERA	350.000	0	350.000	390.000	0	390.000	11%	
2014RNHA0063	FOGNATURA	PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN-II°STRALCIO	Rimini	GESTORE HERA	200.000	0	200.000	59.944	0	59.944	-70%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO A CAUSA DELLA REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ITER AUTORIZZATIVO ENTI E ACQUISIZIONE PERMESSI (SERVITU') CHE HANNO CREATO RALLENTAMENTI.
2014RNHA0064	FOGNATURA	PSB-REALIZ. VASCA LAMINAZIONE OSPEDALE	Rimini	GESTORE HERA	255.000	0	255.000	154.960	0	154.960	-39%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO A CAUSA DI RITARDI IN FASE DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI.
2014RNHA0065	FOGNATURA	PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN I STRALCIO	Rimini	GESTORE HERA	1.300.000	-700.000	600.000	489.996	0	489.996	-62%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO A CAUSA DELLE CRITICITA' INCONTRATE DURANTE LA FASE DI BONIFICA BELLICA.
2014RNHA0067	FOGNATURA	PSB-REAL. VASCA AUSA I STRALCIO	Rimini	GESTORE HERA	420.000	0	420.000	437.345	0	437.345	4%	
2014RNHA0069	FOGNATURA	NUOVO SCOLMATORE MAVONE V.COVIGNANO RN	Rimini	GESTORE HERA	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	PROGETTAZIONE POSTICIPATA PER IL 2015, CON SOPRAVVENUTE CRITICITA' CHE HANNO COMPORTATO UNO SLITTAMENTO DEI TEMPI PREVISTI.
2014RNHA0070	FOGNATURA	ADEG RETE FOG V.S.CHIARA-VICOLO CIMA RN - FOSSA PATARA	Rimini	GESTORE HERA	100.000	0	100.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO IN MODO CONDIVISO CON IL COMUNE E PERTANTO PIANIFICATO CON ALTRA TEMPISTICA.
2014RNHA0071	FOGNATURA	SEPARAZ. RETE IN VIA ARNO - PORTA SUD	Rimini	GESTORE HERA	150.000	0	150.000	60.744	0	60.744	-60%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO A CAUSA DI RITARDI IN FASE DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI.
2014RNHA0072	FOGNATURA	PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN II STRALCIO	Rimini	GESTORE HERA	25.000	0	25.000	23.253	0	23.253	-7%	
2014RNHA0074	FOGNATURA	DEVIAZ. RETE FOG V.GIOVE RIMINI	Rimini	GESTORE HERA	15.000	0	15.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO AL 2015 A CAUSA DI SOPRAVVENUTE MAGGIORI PRIORITA'.
2014RNHA0076	FOGNATURA	REAL. COLL. PRINCIPALE SU VIA CANONICA	Santarcangelo di Romagna	GESTORE HERA	20.000	0	20.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO A SEGUITO DI ANALISI PRIORITA' CHE HA PORTATO ALLA RICHIESTA DEL COMUNE DI SOSTITUIRE QUEST'INTERVENTO CON ALTRI PIU' URGENTI.
2014RNHA0078	FOGNATURA	ADEG. RETI FOGNA S.ARCANGELO Z.STAZIONE	Santarcangelo di Romagna	GESTORE HERA	30.000	0	30.000	26.053	0	26.053	-13%	
2014RNHA0079	FOGNATURA	NUOVA COLLEG. CENTRO STORICO DI TORRIANA	Torriana	GESTORE HERA	100.000	0	100.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO SOSPESO CAUSA PROBLEMI E CONTENZIOSI TRA PRIVATI.
2014RNHA0080	ACQUEDOTTO	ADDUTTRICE CORPOLO VILLA VERUCCHIO	Verucchio	GESTORE HERA	300.000	0	300.000	216.115	0	216.115	-28%	MINORI ONERI PER ECONOMIE IN FASE REALIZZATIVA.
2015RNHA0001	ACQUEDOTTO	RIORDINO DELLO SCHEMA IDRICO DEL CONCA	Cattolica	ROMAGNA ACQUE				29.012	0		#DIV/0!	I COSTI RENDICONTATI NEL 2014 SONO RELATIVI A COSTI DIRETTI SOSTENUTI DA ROMAGNA ACQUE.
2015RNHA0002	DEPURAZIONE	PSB-RICONVERSIONE DEP.MARECCHIESE	Rimini	ROMAGNA ACQUE				1.355.604	0		#DIV/0!	LAVORO INIZIALMENTE FINANZIATO DAL GESTORE E SUCCESSIVAMENTE TRASFERITO A RASDF. VEDI NOTA ID 2014RNHA0051.
PIANO INVESTIMENTI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI PARI CALIBRO - ATO 9	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	0	0	91.800	0	91.800	#DIV/0!	CASO C - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: il nuovo ID è stato creato nell'ottica di omogenizzazione Conti Cumulativi. Gli interventi di bonifica dei contatori sono stati scorporati dal conto cumulativo di Programma "manutenzione straordinaria reti acquedotto" nel quale erano precedentemente contenuti.
2014RNHA0083	ACQUEDOTTO	ADEGUAMENTI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 9	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	0	0	12.396	0	12.396	#DIV/0!	CASO A - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI: Interventi di adeguamento funzionale/normativo degli attraversamenti ferroviari della rete acquedotto e degli organi di sezionamento della rete stessa.
2014RNHA0084	ACQUEDOTTO	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.ACQUEDOTTO - ATO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	0	0	7.698	0	7.698	#DIV/0!	CASO C - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: il nuovo ID è stato creato nell'ottica di omogenizzazione Conti Cumulativi. Tali interventi sono stati scorporati dal conto cumulativo di Programma "manutenzione straordinaria impianti acquedotto" nel quale erano precedentemente contenuti.
					39.937.800	-1.860.500	12.492.300					

N.B.: in grassetto rosso vi sono i nuovi interventi rispetto al programma 2014-17 approvato dal Consiglio Locale il 29/04/2014 e già inseriti nel Piano d'ambito approvato con deliberazione n. 47 del 29 settembre 2015 del Consiglio d'ambito

35.198.813 -1.027.079 9.860.809

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore  
F.to Stefano Giannini

Il segretario verbalizzante  
F.to Ing. Andrea Casadio

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 11 gennaio 2016

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna
