

CLPR/2024/03 del 28 marzo 2024

**CONSIGLIO LOCALE di PARMA**

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore Emiliambiente S.p.A. Programma Operativo  
Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2022**

IL COORDINATORE  
Gianluca Borghi

CLPR/2024/03

### CONSIGLIO LOCALE di PARMA

L'anno **2024** il giorno **28** del mese di **marzo** alle ore **14:00** si è riunito il Consiglio Locale di Parma, convocato con lettera Prot. 18/03/2024.0002990.U, in seduta telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Gianluca Borghi. Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI PARMA				10
ALBARETO	Davide Riccoboni	Sindaco	Sì	0,5758
BARDI				0,5692
BEDONIA	Gianpaolo Serpagli	Sindaco	Sì	0,7699
BERCETO				0,5593
BORE				0,3246
BORGO VAL DI TARO				1,4068
BUSSETO				1,4245
CALESTANO				0,5742
COLLECCHIO	Roberto Dellavalle	Assessore, delegato	Sì	2,8389
COLORNO				1,8179
COMPIANO	Francesco Mariani	Sindaco	Sì	0,3942
CORNIGLIO	Giuseppe Del Sante	Sindaco	Sì	0,5175
FELINO				1,8579
FIDENZA	Franco Amigoni	Assessore, delegato	Sì	5,0655
FONTANELLATO	Corrado Modernelli	Consigliere, delegato	Sì	1,4639
FONTEVIVO				1,2124
FORNOVO DI TARO	Michela Zanetti	Sindaco	Sì	1,263
LANGHIRANO				2,1329
LESIGNANO DE' BAGNI				1,1117
MEDESANO				2,1257
MONCHIO DELLE CORTI				0,3557
MONTECHIARUGOLO				2,2112
NEVIANO DEGLI ARDUINI				0,8188
NOCETO				2,5636
PALANZANO	Ermes Boraschi	Sindaco	Sì	0,3939

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PARMA	Gianluca Borghi	Assessore, delegato	Sì	35,599
PELLEGRINO PAR.SE	Enrico Ferraroni	Consigliere, delegato	Sì	0,377
POLESINE - ZIBELLO				0,7607
ROCCABIANCA				0,7224
SALA BAGANZA	Norberto Vignali	Assessore, delegato	Sì	1,2519
SALSOMAGGIORE TERME	Michela Bonini	Assessore, delegato	Sì	3,7795
S. SECONDO PAR.SE	Francesco Ilardo	Vicesindaco, delegato	Sì	1,247
SISSA TRECASALI	Sara Tonini	Assessore, delegato	Sì	1,6113
SOLIGNANO	Thomas Villani	Assessore, delegato	Sì	0,5112
SORAGNA				1,0636
SORBOLO MEZZANI				2,4909
TERENZO				0,4124
TIZZANO VAL PARMA				0,5857
TORNOLO				0,3665
TORRILE				1,5884
TRAVERSETOLO				1,9056
VALMOZZOLA				0,2996
VARANO DE' MELEGARI				0,67
VARSI	Angelo Peracchi	Sindaco	Sì	0,4083

Presenti n. 17 quote 58,0679  
Assenti n.28 quote 41,9321

Riconosciuta la validità della seduta Gianluca Borghi, in qualità di Coordinatore, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Emiliambiente S.p.A. Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2022**

**Vista** la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato che:**

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di

cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;

- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'Ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

**considerato che:**

- con deliberazione n.5 del 15 gennaio 2020 del Consiglio locale di Parma è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore Emiliambiente S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d'Ambito;
- con deliberazione n.41 del Consiglio d'Ambito 28 settembre 2020 sono state approvate le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per il bacino tariffario di Parma, gestito da Emiliambiente S.p.A.;
- con deliberazione n.3 del 22 marzo 2021 del Consiglio d'Ambito è stato approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito del bacino territoriale di Parma;
- con deliberazione n. del 64 del 27 giugno 2022, modificata dalla Delibera CAMB 84/2022, il Consiglio d'Ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per la redazione e l'aggiornamento del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato”: modifiche ed integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017”;
- la deliberazione n. 64 del 27 giugno 2022 inoltre dispone che:
  - entro il mese di maggio dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
  - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
  - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
  - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

**dato atto che:**

- il gestore Emiliambiente S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2022 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata ai Comuni interessati in allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale;

**rilevato** che i dati presentati relativi all'annualità 2022 sono stati analizzati e sintetizzati nell'Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:

- interventi non avviati;

- interventi anticipati/conclusi;
- interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 2020 - 2023 vigente - annualità 2022, autorizzati con nulla osta ai sensi della CAMB 75/2017 modificata ed integrata dalla CAMB 64/2022;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;

**rilevato che:**

- gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore, esclusi gli investimenti di struttura, rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 approvato per l'annualità 2022;
- è stata effettuata un'analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore del +/- 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

**ritenuto** pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022, come indicato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**posta** quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti favorevoli **palesi ed unanimi** resi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 per il gestore Emiliambiente S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

\*\*\*\*\*



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 3 del 28 marzo 2024

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore Emiliambiente S.p.A. Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2022.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Bologna, 28 marzo 2024

Il Dirigente  
Area Servizio idrico Integrato  
F.to Marialuisa Campani

## Allegato 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale

Servizio Idrico Integrato  
Gestore EMILIAMBIENTE S.p.A.  
Sotto Ambito Parma  
**CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2022**

## 1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2022

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2022, del Programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 9 del 06/03/2019, revisionato con Delibera n. 5 del 19/05/2020 e con Delibera n. 13 del 03/05/2022, che il gestore Emiliambiente ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 84/2022.

	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	CONS. VS PIAN.
GESTORE	2.640.000	3.110.741	470.741	118%
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	112.825	635.051	522.226	563%
<b>TOTALE</b>	<b>2.752.825</b>	<b>3.745.792</b>	<b>992.967</b>	<b>136%</b>

TAB.1 –Confronto tra pianificato e rendicontato nel 2022 (esclusi gli investimenti di struttura)

Gli investimenti di struttura pianificati per l'anno 2022 ammontano ad €. 400.289 e ne sono stati consuntivati €. 213.652. Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

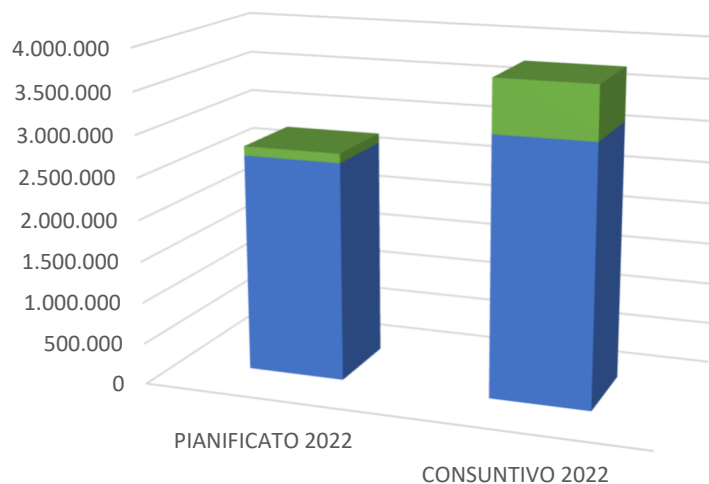


FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore Emiliambiente, abbia effettuato nel corso del 2022 investimenti superiori rispetto al pianificato attestandosi al 118% con riferimento a quelli direttamente finanziati. Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo perduto il totale consuntivato è molto superiore rispetto a quello pianificato e pari al 563%. Complessivamente la percentuale degli investimenti realizzati rispetto a quelli pianificati è pari al 136%.

I maggiori contributi incassati sono riferiti ai lavori afferenti ai titoli cumulativi di seguito elencati:



<b>Codice</b>	<b>Titolo</b>	<b>Maggiori contributi incassati</b>
2018PREA0033	Ricerca perdite acquedotto, contatori, pressioni e sostituzione contatori	121.656
2018PREA0035	Sostituzione reti e allacciamenti reti distributive dei comuni in gestione	247.764
2019PREA0036	Nuovi allacciamenti	241.314
2019PREA0043	Manutenzione straordinaria acquedotto	24.316
	<b>TOTALE</b>	<b>635.050</b>

TAB. 2– Interventi con maggiore incasso contributo

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

## 2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI


Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio.

	<b>PIANIFICATO 2022</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>CONS. VS PIAN.</b>
ACQUEDOTTO	2.372.825	3.097.399	724.574	131%
DEPURAZIONE	200.000	489.070	289.070	245%
FOGNATURA	160.000	157.395	-2.605	98%
STRUTTURA	400.289	213.652	-186.637	53%
TUTTI	20.000	1.929	-18.072	10%
<b>Totale complessivo</b>	<b>3.153.114</b>	<b>3.959.444</b>	<b>806.330</b>	<b>126%</b>

TAB.3 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2022 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

Suddivisione per categoria di investimenti pianificati

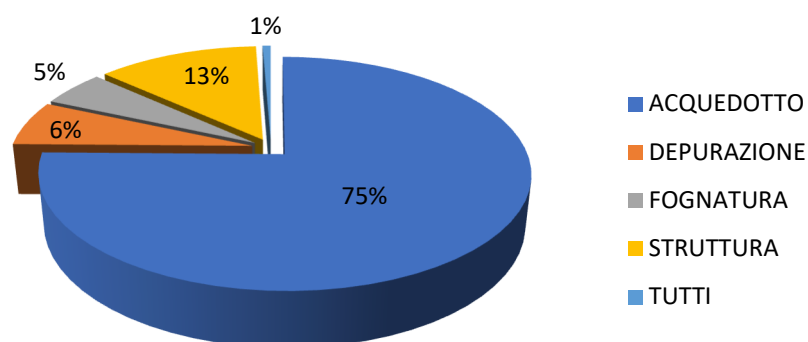

Suddivisione per categoria di investimenti a consuntivo

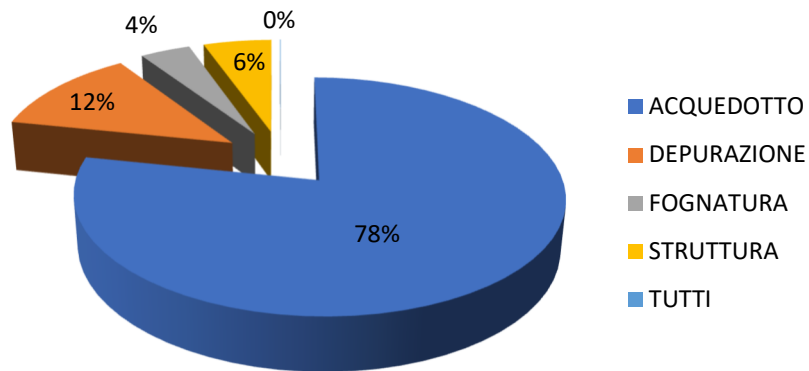


FIG.2 –Suddivisione investimenti 2022 per servizio

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	CONS. VS PIAN.
ACQUEDOTTO	935.000	2.080.821	1.145.821	223%
FOGNATURA	110.000	154.457	44.457	140%
DEPURAZIONE	200.000	462.993	262.993	231%
ACQUE METEORICHE	50.000	1.447	-48.553	3%
<b>TOTALE</b>	<b>1.295.000</b>	<b>2.699.718</b>	<b>1.404.718</b>	<b>208%</b>

TAB.4 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi puntuali che si rendono necessari durante l'anno.

Si specifica che, per quanto riguarda lo scostamento relativo alla tipologia "acque meteoriche" ovvero alla gestione delle acque meteoriche, lo scostamento 2022 è legato al fatto che si sono resi necessari minori interventi rispetto a quelli originariamente previsti.

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuali degli interventi.

	N.	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	CONS. VS PIAN.
Fino a 500.000	14	127.825	118.415	-9.410	93%
500.001-1.000.000	3	0	345.589	322.304	///
Oltre 1.000.000	1	0	0	0	///
Manutenzioni e titoli cumulativi	13	2.625.000	3.068.136	463.136	117%
<b>TOTALE</b>	<b>31</b>	<b>2.752.825</b>	<b>3.745.793</b>	<b>776.030</b>	<b>136%</b>
Investimenti di struttura	1	400.289	213.652	-186.637	53%
<b>TOTALE</b>	<b>32</b>	<b>3.153.114</b>	<b>3.959.445</b>	<b>589.393</b>	<b>126%</b>

TAB.5 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono riconducibili principalmente ai seguenti fattori:

- Ritardi dovuti alla necessità di acquisire aree o servitù, per le quali è necessario avviare il procedimento espropriativo;
- Ritardi dovuti alle difficoltà di acquisizione di autorizzazioni da altri Enti e nelle fasi di affidamento;
- Ritardi dovuti alla realizzazione di Interventi che presentavano maggiore urgenza;
- Non si sono resi necessari interventi relativi alle acque bianche;
- Necessità di revisione delle progettazioni.

Per quanto concerne gli interventi per i quali vi sono difficoltà legate all'acquisizione di aree e/o servitù, Atersir ha chiesto al Gestore di fornire un elenco dei procedimenti, al fine di poter calendarizzare le attività ed avviare le Conferenze dei servizi ai sensi dell'art. 158 bis del D.lgs 152/2006.

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o meno, esclusi gli investimenti di struttura.

Numero di interventi programmati nel 2022 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 16

Numero di interventi rendicontati (importo lordo consuntivo diverso da zero) nel 2022: 20.

	Numero Interventi	Importo Lordo Pianificato 2022	Importo Lordo Consuntivo 2022
<i>Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%)</i>	1	200.000	0
<i>Interventi con avvio anticipato nel 2022 e chiusure di interventi già avviati contenuti nel programma degli interventi o nel piano d'ambito (+100%)</i>	5	0	327.457
<i>Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%</i>	14	2.893.164	3.580.788
<i>Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%</i>	1	59.950	51.200

TAB.6 – Scostamenti tra il rendicontato e il preventivato dal gestore

Si può notare come la quasi totalità degli interventi che presentano importi rendicontati dal Gestore hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al + o - 20 %. Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

### 3. INTERVENTI NON AVVIATI

Nell'annualità 2022 l'unico intervento pianificato che non è stato avviato è il cod. 2019PREA0040 "Interventi di rinnovo reti" per un importo previsto pari ad €. 200.000.

## Gestore Emiliambiente S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

					Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA n. 9 del 06/03/2019, revisionato con Delibera n. 5 del 19/05/2020 e con Delibera n. 13 del 03/05/2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		Note giustificative
					Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale									
2014PREA0011	037-EA - Sostituzione condotta adduttrice interconnessione comuni della Bassa	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	1.567.100	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PREA0013	042-EA - Potenziamento telecontrollo rete idrica e fognaria	TUTTI	Opere pluricomunali	295.000	20.000	0	20.000	1.929	0	1.929	-18.072	-90%	Si è reso necessario eseguire solamente un modesto intervento di installazione di una nuova RTU.
2014PREA0016	054-EA - Realizzazione collettore fognario e aumento potenzialità del depuratore di Colorno sud (3° Livello).	DEPURAZIONE	Colorno	720.000	0	0	0	22.416	0	22.416	22.416	100%	Completamento lavori pianificati nell'anno precedente
2014PREA0020	060-EA - Bonifica c.le di Priorato ed efficientamento pozzi nelle c.li di captazione.	ACQUEDOTTO	Fontanellato, Fidenza	2.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PREA0032	Manutenzione straordinaria della centrale idrica di Parola (Fidenza) - FSC	ACQUEDOTTO	Fidenza	600.000	0	0	0	267.685	0	267.685	267.685	100%	Completamento lavori pianificati nell'anno precedente
2018PREA0033	Ricerca perdite acquedotto, contatori, pressioni e sostituzione contatori - FSC	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	400.000	0	0	0	-121.656	121.656	0	0	0%	Il progetto prevede la sostituzione massiva dei contatori nel comune di Colorno. Il termine delle lavorazioni è avvenuto nel 2021 mentre l'erogazione dei contributi nel 2022
2018PREA0034	Sostituzione condotta adduttrice nei Comuni di Parma e Fontanellato	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	2.852.900	20.000	0	20.000	14.600	0	14.600	-5.400	-27%	Economie di spese di progettazione
2018PREA0035	Sostituzione reti e allacciamenti reti distributive dei comuni in gestione - FSC	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	600.000	0	0	0	-215.561	247.764	32.203	32.203	100%	Completamento lavori pianificati nell'anno precedente
2019PREA0036	Nuovi allacciamenti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		200.000	0	200.000	58.806	241.314	300.119	100.119	50%	Andamento costi in funzione delle richieste pervenute

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	Note giustificative
2019PREA0037	Sostituzione contatori e Smart Metering	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		660.000	0	660.000	1.118	0	1.118	-658.882	-99%	Interventi rinviati, causa altre priorità di investimento dovute principalmente all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria necessari per l'esercizio degli impianti acquedottistici al fine di effettuare interventi per la riduzione delle perdite, ecc
2019PREA0038	Manutenzione Straordinaria Acque meteoriche	FOGNATURA	Opere pluricomunali		50.000	0	50.000	1.447	0	1.447	-48.553	-97%	Si è reso necessario eseguire solamente la sostituzione di alcune caditoie stradali
2019PREA0039	Cartografia	FOGNATURA	Opere pluricomunali	325.000	0	0	0	1.492	0	1.492	1.492	100%	Effettuati aggiornamenti cartografici di piccola entità
2019PREA0040	Interventi di rinnovo reti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		200.000	0	200.000		0	0	-200.000	-100%	Sono stati realizzati alcuni interventi di sostituzioni reti di modesta entità, rendicontati all'interno del cap. "manutenzione straord. Acquedotti".
2019PREA0041	Manutenzione straordinaria fognature	FOGNATURA	Opere pluricomunali		110.000	0	110.000	154.457	0	154.457	44.457	400%	Maggiori costi dovuti a: rifacimento di numerosi tratti fognari ammalorati collassati e fessurati che causavano infiltrazioni
2019PREA0042	Manutenzione straordinaria depurazione	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali		200.000	0	200.000	462.993	0	462.993	262.993	131%	Eseguiti diversi interventi urgenti per l'adeguamento degli impianti. Tra i principali interventi eseguiti vi sono: adeguamento dell'impianto di fitodepurazione di Torrile in cui è stato installato un impianto MBR, il revamping delle linee biologiche degli impianti di depurazione di Fidenza e Salsomaggiore, oltre a diversi interventi di modesta entità resisi necessari per il mantenimento funzionale degli impianti.

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	Note giustificative
2019PREA0043	Manutenzione straordinaria acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		935.000	0	935.000	2.056.505	24.316	2.080.821	1.145.821	122%	Interventi svolti al fine di risolvere situazioni di sistematiche rotture e perdite. L'andamento medio annuale richiede interventi sistematicamente superiori a quelli previsti a piano per contenere la riduzione delle perdite, ecc
2019PREA0044	Modellazione idraulica di acquedotti, distrettualizzazione della rete, analisi e ricerca delle perdite idriche, progetto generale acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	1.400.000	20.000	0	20.000	236.938	0	236.938	216.938	1084%	Completamento lavori pianificati nell'anno precedente
2019PREA0045	Investimenti di Struttura	STRUTTURA	Opere pluricomunali		400.289	0	400.289	213.652	0	213.652	-186.637	-46%	Economie di spesa e alcuni interventi sono stati posticipati per ritardi nella pianificazione/programmazione
2019PREA0046	Messa in sicurezza e opere accessorie di miglioramento al Depuratore di Fidenza	DEPURAZIONE	Fidenza	180.000	0	0	0	3.661	0	3.661	3.661	100%	Liquidate una parte delle spese progettuali le quali sono terminate nel 2022.
2019PREA0047	Rifacimento pozzo 3 di San Donato	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2019PREA0048	Ricostruzione cabina viale Battej, opere accessorie e demolizione pensile	ACQUEDOTTO	Sissa Trecasali	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2019PREA0049	Interventi Emergenza Idrica 2017 - OCDPC 468/2017	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PREA0050	Demolizione e ripristino pensile San Polo	ACQUEDOTTO	Torrile		200.000	0	200.000	8.695	0	8.695	-191.305	-95%	Intervento posticipato in quanto si rende prima necessario eseguire l'adeguamento della condotta adduttrice
2020PREA0051	WSP	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		20.000	0	20.000	38.197	0	38.197	18.197	90%	Effettuate integrazioni al progetto iniziale

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2020PREA0052	Sostituzione reti di adduzione	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PREA0053	Adeguamento sismico e messa in sicurezza serbatoi pensili	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PREA0054	Rifacimento pozzi c/o c.li idriche	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PREA0055	Realizzazione vasche/trattamenti per riduzione carico inquinante "prima pioggia"	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PREA0056	Realizzazione impianto ad osmosi presso Centrale idrica di San Donato	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2022PREA0057	Sostituzione e riduzione perdite commerciali acquedotto (sostituzione contatori e adeguamento allacci) - FSC	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	2.852.900	5.000	5.000	10.000	5.689	0	5.689	-4.311	-43%	Minori spese progettuali
2022PREA0058	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica	ACQUEDOTTO	Fidenza	59.950	0	59.950	59.950	51.200	0	51.200	-8.750	-14%	
2022PREA0059	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica ai fini idropotabili mediante rigenerazione di n.2 pozzi di captazione presso il campo pozzi di Priorato	ACQUEDOTTO	Fontanellato	47.875	0	47.875	47.875	60.134	0	60.134	12.259	25%	Effettuata variante lavori
					Investimenti gestore pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Importo lordo pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	PERCENTUALE INVESTIMENTI CONSUNTIVATI RISPETTO ALL'IMPORTO PIANIFICATO esclusi investimenti di struttura	
Importo Totale					3.040.289	112.825	3.153.114	3.324.394	635.051	3.959.444	806.330	136%	
Importo Totale - Esclusi gli Investimenti di Struttura					2.640.000	112.825	2.752.825	3.110.741	635.051	3.745.792	992.967		

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma

F.to Gianluca Borghi

Il segretario verbalizzante

F.to Marialuisa Campani

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 24 maggio 2024

Il Direttore  
F.to Vito Belladonna
