

CLPC/2020/4 del 25 novembre 2020

CONSIGLIO LOCALE di PIACENZA

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Approvazione Consuntivo 2019.
Programma Operativo Interventi 2015 – 2019**

IL COORDINATORE
F.to Raffaele Veneziani

CLPC/2020/4

CONSIGLIO LOCALE di PIACENZA

L'anno **2020** il giorno 25 del mese di novembre alle ore 10.00, si è riunito il Consiglio Locale di Piacenza convocato con lettera protocollo PG.AT/2020/0008498.

La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle “Linee Guida temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza dell'emergenza epidemiologica COVID 19”, approvate dal Consiglio di Ambito con deliberazione n.13 del 14/04/2020.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
AGAZZANO			NO	0,7848
ALSENO	Davide Zucchi	Sindaco	SI'	1,5682
ALTA VAL TIDONE	Franco Albertini	Sindaco	SI'	1,1488
BESENZONE	Carlo Filiberti	Sindaco	SI'	0,4734
BETTOLA	Paolo Negri	Sindaco	SI'	1,0491
BOBBIO			NO	1,2518
BORGONOVO	Pietro Mazzocchi	Sindaco	SI'	2,3674
CADEO			NO	1,9180
CALENDASCO	Filippo Zangrandi	Sindaco	SI'	0,8923
CAORSO	Roberta Battaglia	Sindaco	SI'	1,5702
CARPANETO	Andrea Arfani	Sindaco	SI'	2,3406
CASTELL'ARQUATO			NO	1,5367
CASTEL S. GIOVANNI	Massimo Bollati	Assessore	SI'	4,0744
CASTELVETRO	Luca Quintavalla	Sindaco	SI'	1,7848
CERIGNALE			NO	0,2398
COLI	Renato Torre	Sindaco	SI'	0,4674
CORTEBRUGNATELLA	Mauro Guarnieri	Sindaco	SI'	0,3866
CORTEMAGGIORE	Gabriele Girometta	Sindaco	SI'	1,4638
FARINI	Cristina Cordani	Assessore	SI'	0,6097
FERRIERE	Carlotta Opizzi	Sindaco	SI'	0,6012
FIORENZUOLA D'ARDA			NO	4,4321

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
GAZZOLA			NO	0,7646
GOSSOLENGO	Andrea Balestrieri	Sindaco	SI'	1,7413
GRAGNANO	Patrizia Calza	Sindaco	SI'	1,4439
GROPPARELLO			NO	0,8570
LUGAGNANO			NO	1,3781
MONTICELLI D'ONG.	Gimmi Distante	Sindaco	SI'	1,7404
MORFASSO	Paolo Calestani	Sindaco	SI'	0,5101
OTTONE	Maria Lucia Girometta	Vice Sindaco	SI'	0,3579
PIACENZA	Elena Baio	Assessore	SI'	28,7436
PIANELLO			NO	0,8474
PIOZZANO	Lorenzo Burgazzoli	Sindaco	SI'	0,3784
PODENZANO	Alessandro Piva	Sindaco	SI'	2,7542
PONTEDELL'OLIO	Alessandro Chiesa	Sindaco	SI'	1,6004
PONTENURE			NO	2,0094
RIVERGARO	Monica Rancati	Assessore	SI'	2,1460
ROTOFRENO	Raffaelel Veneziani	Sindaco	SI'	3,5086
S.GIORGIO P.NO	Donatella Alberoni	Sindaco	SI'	1,8514
S. PIETRO IN CERRO	Stefano Boselli	Sindaco	SI'	0,4592
SARMATO	Claudia Ferrari	Sindaco	SI'	1,0264
TRAVO	Roberta Valla	Assessore	SI'	0,7628
VERNASCA			NO	0,8334
VIGOLZONE			NO	1,4103
VILLANOVA			NO	0,7466
ZERBA	Pietro Rebolini	Sindaco	SI'	0,2218
ZIANO			NO	0,9456
PROVINCIA di PIACENZA	Franco Albertini	Vice Presidente	SI'	10,0000

Presenti n. 32 quote 80,04 Assenti n. 15 quote 19,96



Riconosciuta la validità della seduta Raffaele Veneziani, in qualità di Coordinatore, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Approvazione Consuntivo 2019. Programma Operativo Interventi 2015 - 2019

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'Ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 1 del 21 marzo 2016 del Consiglio Locale di Piacenza è stato approvato l'Aggiornamento del Programma degli Interventi per gli anni 2015-2019 e la Proposta di integrazione del Piano d'Ambito e di variazione del Piano economico-finanziario;
- con deliberazione n. 32 del 26 aprile 2016 del Consiglio d'Ambito è stata approvata l'Integrazione del Piano d'Ambito di Piacenza conseguentemente all'approvazione del consuntivo degli interventi 2014 e all'approvazione del programma degli interventi 2015-2019 di cui allo schema regolatorio AEEGSII;
- con deliberazione del Consiglio d'ambito n.3 del 15 marzo 2018 per il Gestore IRETI S.p.A. è stata approvata la revisione straordinaria annualità 2018-2019 Programma Operativo Interventi 2015-2019 ed il nuovo Programma Operativo Interventi 2020-2022 con conseguente Proposta di aggiornamento del Piano di Ambito;
- con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 26 del 19 aprile 2018 sono state approvate le Modifiche al Piano degli Interventi del Piano di Ambito del territorio di Piacenza a seguito della deliberazione del Consiglio Locale n. 3 del 15/03/2018;
- con deliberazione n.51 del Consiglio d'Ambito 28 giugno 2018 è stato approvato l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria vigente (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, per i bacini tariffari di Parma, Piacenza e Reggio Emilia gestiti da IREN S.p.A. e dalla partecipata IRETI S.p.A.;

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'Ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 inoltre dispone che:
 - entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all’anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che:

- il gestore Ireti S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2019 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata ai Comuni interessati in allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale;

rilevato che i dati presentati relativi all’annualità 2019 sono stati analizzati e sintetizzati nell’Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:

- interventi non avviati;
- interventi anticipati/conclusi;
- interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 2015 - 2019 vigente - annualità 2019, autorizzati con nulla osta ai sensi della CAMB 75/2017;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al +/- 20%;

rilevato inoltre che:

- gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore, per quanto riguarda il consuntivo netto, mentre leggermente inferiore per quanto riguarda l’importo lordo a fronte dei minori contributi incassati rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 approvato per l’annualità 2019;
- n. 11 interventi relativi all’adeguamento degli impianti ai valori limite del Cromo esavalente e n. 5 relativi alla riduzione della perdite, sono stati realizzati ma non sono stati incassati i relativi contributi FSC;

- è stata effettuata un'analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore del +/- 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva.

ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 come indicato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto,

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti;

posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti favorevoli 32 (quote 80,04), resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 per il gestore Ireti S.p.A. per il bacino tariffario di Piacenza come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2019
Gestore: IRETI S.p.A. (PC)**

25 novembre 2020

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2019, del Programma Operativo Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Piacenza n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera n. 3 del 15 marzo 2018 e Delibera del Consiglio d'Ambito n.51 del 28 giugno 2018, che il gestore IRETI S.p.A. ha presentato tramite il software ARSI.

PIANIFICATO 2019		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2019	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 23.339.713	- € 2.319.210	€ 21.020.503	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 5.639.535	-€ 4.783.919	€ 855.616	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 17.700.178	+ € 2.464.709	€ 20.164.887	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]

Tab.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IRETI S.p.A. abbia effettuato maggiori investimenti netti rispetto alla pianificazione approvata precisamente pari ad €. 2.464.709 a fronte dei minori contributi incassati pari a - € 4.783.919. I contributi non incassati si riferiscono in larga parte a quelli relativi ai fondi FSC per la riduzione delle perdite e per l'adeguamento ai valori limite del cromo esavalente, pianificati per complessivi €. 1.326.500 e non incassati.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

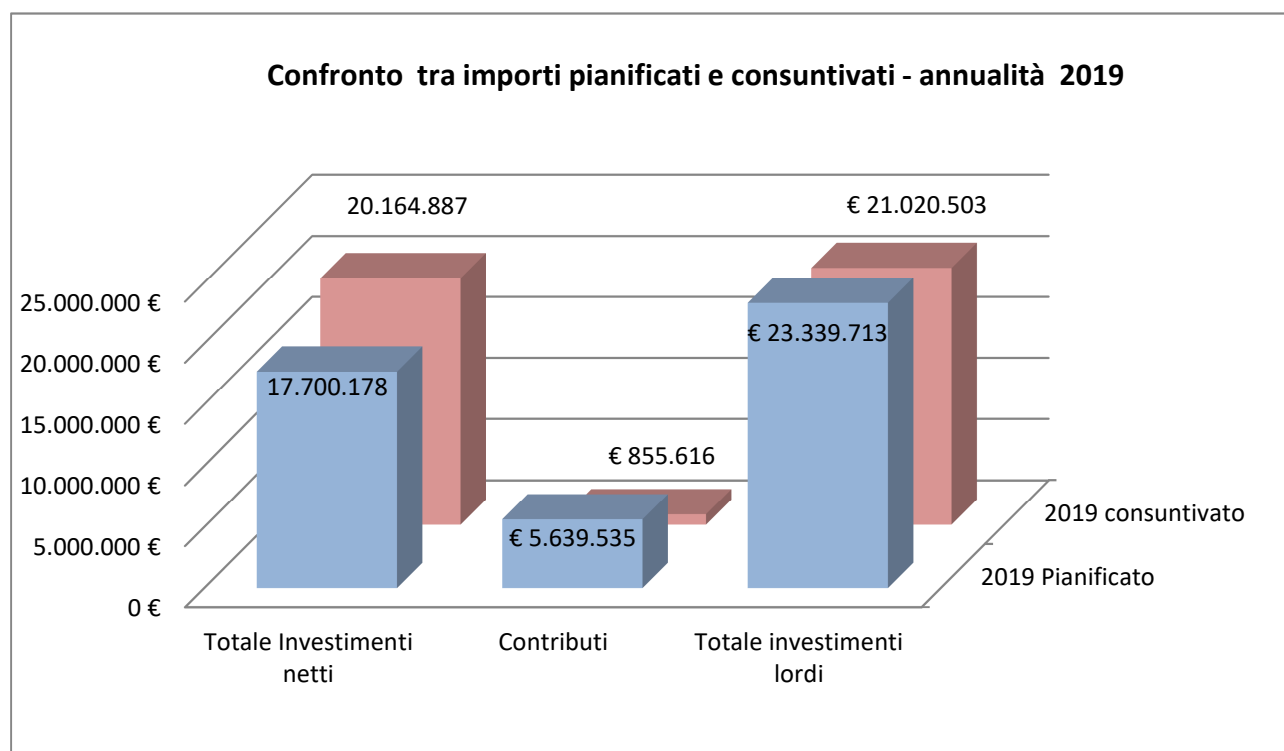


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2019 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

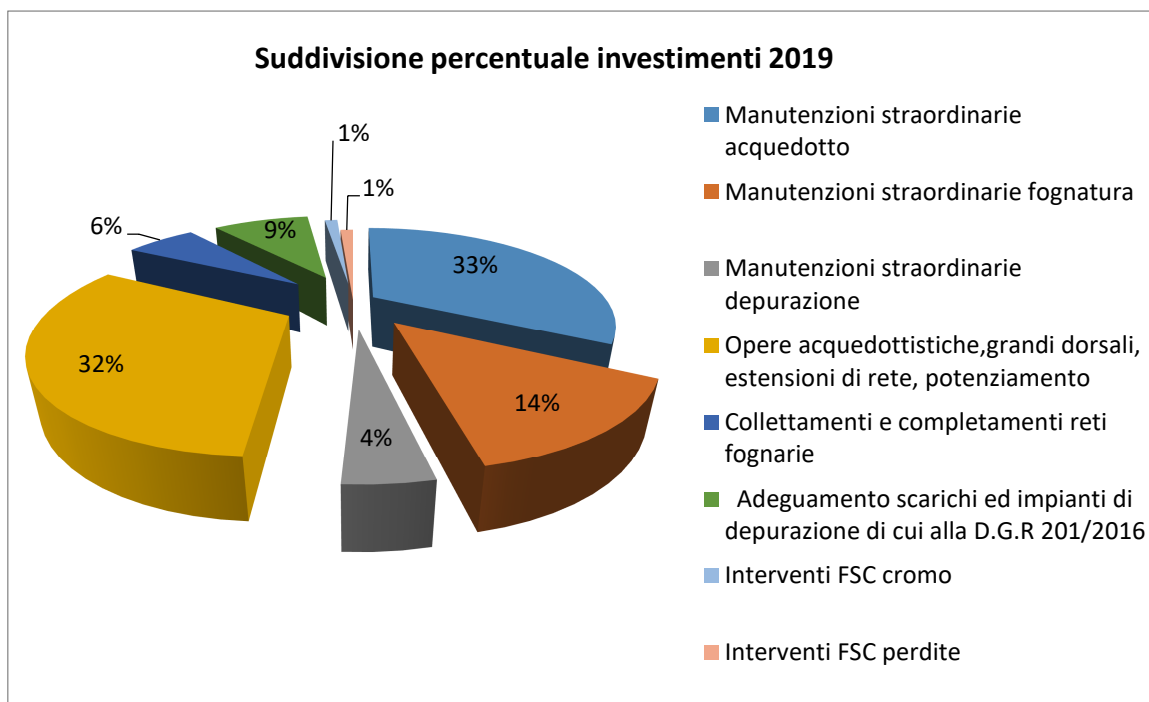


Fig.2 –Suddivisione investimenti 2019 per servizio

Nella tabella e nel grafico che seguono è riportato il numero degli interventi raggruppati sulla base degli scostamenti verificati e la rappresentazione grafica con indicazione della percentuale di ciascuna categoria rapportata al totale:

interventi non iniziati (-100%)	44
interventi eseguiti anticipatamente o code di interventi (+100%)	39
interventi con scostamento superiore a + o - 20%	67
interventi con scostamento inferiore a + o - 20%	4

Tab.2– Interventi che presentano scostamento tra pianificato e quanto rendicontato

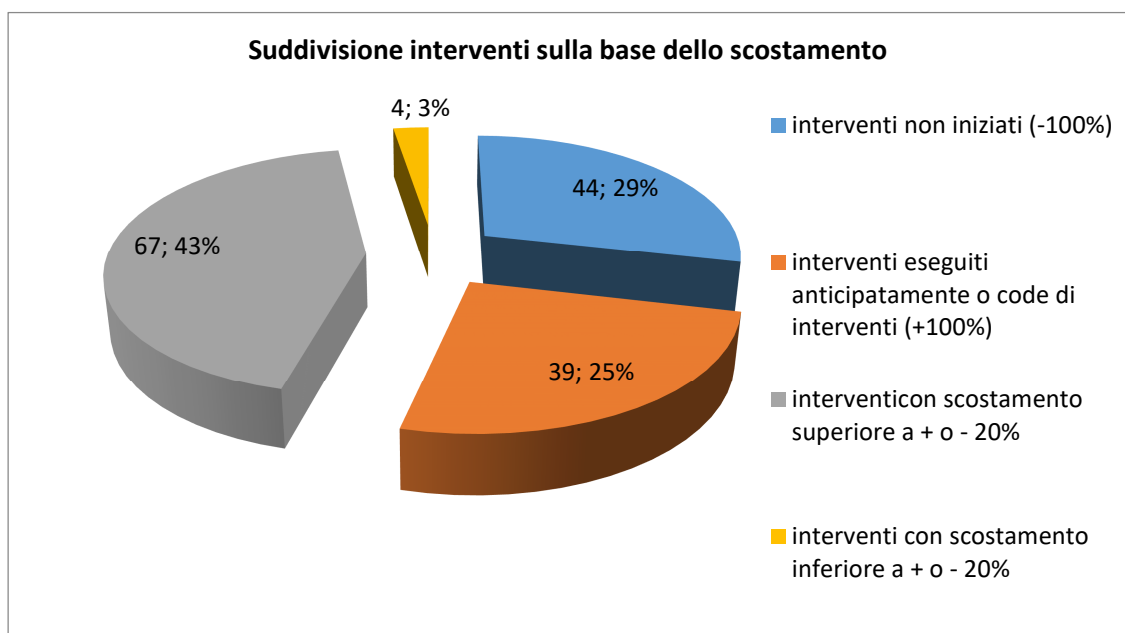


Fig.3 –Interventi realizzati nell'annualità 2019 suddivisi per scostamento

Dalla tabella sopra riportata e dal relativo grafico risulta che per l'annualità 2019, n.44 interventi, che erano stati programmati per complessivi €. 4.844.500, non sono stati avviati (scostamento pari a -100%), (per l'elenco si veda la Tab. 4), per i quali la giustificazione è risultata esaustiva (Allegato 1). Si precisa che n. 22 dei n. 44 interventi non avviati sono in attesa di revisione, da parte del Ministero della Salute, relativamente ai valori limite del cromo esavalente.

Il Gestore ha avviato anticipatamente oppure chiuso prima rispetto a quanto programmato n.39 interventi e n.67 interventi hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno, e per i quali la giustificazione fornita è risultata esaustiva. Per n.4 interventi lo scostamento è inferiore al +/- 20% e quindi non passibile di giustificazione.

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o meno e il relativo provvedimento che ATERSIR intende eventualmente adottare.

Numero di interventi programmati nel 2019 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 115

Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2019: 154

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2019	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2019	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	44	€ 0	€ 4.844.500	NO	Vedi TAB.L, 2 e 4 e Fig. 3. Vedi il dettaglio in ALLEGATO 1	
Interventi con avvio anticipato nel 2019 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito (+100%)	39	€ 3.644.539	€0	NO	2014PCIE0002 2014PCIE0004 2014PCIE0005 2014PCIE0009 2014PCIE0015 2014PCIE0019 2014PCIE0036 2014PCIE0040 2014PCIE0048 2014PCIE0056 2015PCIE0075 2015PCIE0091 2015PCIE0100 2015PCIE0105 2015PCIE0112 2015PCIE0115 2015PCIE0117 2015PCIE0118 2015PCIE0119 2015PCIE0124 2016PCIE0154 2016PCIE0155 2016PCIE0164 2016PCIE0175 2016PCIE0176 2016PCIE0186 2016PCIE0188 2016PCIE0195 2017PCIE0197 2017PCIE0198 2017PCIE0212 2018PCIE0259 2018PCIE0266 2018PCIE0267 2018PCIE0270 2018PCIE0273 2018PCIE0275 2018PCIE0286 2018PCIE0305	
Interventi avviati nel 2019 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	1				2018PCIE0308	

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2019	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2019	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	67	€ 15.463.714	€ 16.560.213	NO	2014PCIE0007 2014PCIE0008 2014PCIE0010 2014PCIE0013 2014PCIE0014 2014PCIE0016 2014PCIE0020 2014PCIE0021 2014PCIE0024 2014PCIE0030 2014PCIE0032 2014PCIE0033 2014PCIE0039 2014PCIE0041 2014PCIE0042 2014PCIE0047 2014PCIE0053 2014PCIE0059 2014PCIE0060 2014PCIE0063 2014PCIE0071 2014PCIE0072 2015PCIE0084 2015PCIE0087 2015PCIE0088 2015PCIE0092 2015PCIE0099 2015PCIE0101 2015PCIE0107 2015PCIE0111 2015PCIE0128 2015PCIE0139 2016PCIE0157 2016PCIE0163 2016PCIE0177 2016PCIE0184 2017PCIE0199 2017PCIE0210 2017PCIE0213 2018PCIE0027A 2018PCIE0027B 2018PCIE0227 2018PCIE0229 2018PCIE0240 2018PCIE0246 2018PCIE0248 2018PCIE0249 2018PCIE0250 2018PCIE0251 2018PCIE0253 2018PCIE0255 2018PCIE0256 2018PCIE0260 2018PCIE0261 2018PCIE0262 2018PCIE0265 2018PCIE0271 2018PCIE0280 2018PCIE0281 2018PCIE0287 2018PCIE0294 2018PCIE0296 2018PCIE0300 2018PCIE0304 2018PCIE0306 2018PCIE0307 2019PCIE0308	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	4	€ 1.912.250	€ 1.935.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

Tab.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Gli interventi pianificati e non realizzati, con scostamento -100% sono n. 44 e sintetizzati nella tabella che segue:

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019
2014PCIE0001	203 - Realizzazione nuovo impianto di depurazione (biodischi) per l'agglomerato Osteria Nuova 2 e relativi collegamenti fognari	DEPURAZIONE	Vernasca	115.000,00 €	85.000,00 €
2014PCIE0017	G20080019 - Adeguamento agglomerato Strà (NIBBIANO) mediante sistemazione delle fosse Imhoff.	DEPURAZIONE	Grandi opere, Nibbiano, Alta Val Tidone	120.000,00 €	60.000,00 €
2015PCIE0090	Rifacimento automazione e rifacimento decantatore secondario n.2. PIACENZA	DEPURAZIONE	Grandi opere, Piacenza	440.000,00 €	220.000,00 €
2015PCIE0108	Risoluzione criticità fognarie territorio comunale CASTELVETRO	FOGNATURA	Castelvetro Piacentino	700.000,00 €	100.000,00 €
2015PCIE0125	Rifacimento Fosse Imhoff loc. Fabbrica e Bertassi (frane)	DEPURAZIONE	Ottone	50.000,00 €	25.000,00 €
2015PCIE0126	Rifacimento rete fognaria capoluogo via Roma, 1° stralcio	FOGNATURA	Podenzano	1.200.000,00 €	200.000,00 €
2015PCIE0129	Studio preliminare per nuovo approvvigionamento idrico Capoluogo - studio fattibilità e avvio intervento	ACQUEDOTTO	Pontenure	110.000,00 €	110.000,00 €
2015PCIE0130	Rifacimento impianto elettrico impianto di depurazione e nuova linea pretrattamento liquami	DEPURAZIONE	Pontenure	190.000,00 €	70.000,00 €
2015PCIE0135	Sistemazione criticità fognarie loc. Case Marchesi. Studio di fattibilità	FOGNATURA	Travo	10.000,00 €	10.000,00 €
2016PCIE0153	Interventi di miglioramento della distribuzione idropotabile. 2° stralcio	ACQUEDOTTO	Podenzano	1.865.000,00 €	100.000,00 €

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019
2016PCIE0178	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure nel tratto ponte Cantoniera - Ponte Nano	ACQUEDOTTO	Grandi opere, Ferriere, Farini	1.145.000,00 €	567.500,00 €
2016PCIE0190	Manutenzione straordinaria digestore anaerobico depuratore di Piacenza.	DEPURAZIONE	Piacenza	400.000,00 €	400.000,00 €
2017PCIE0201	* Rifacimento attraversamento acquedottistico del Nure a Ponte dell'Olio	ACQUEDOTTO	Ponte dell'Olio	250.000,00 €	250.000,00 €
2017PCIE0208	* Rifacimento sorgente Lardana	ACQUEDOTTO	Ferriere	100.000,00 €	100.000,00 €
2018PCIE0230	Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di trattamento Serbatoio Caione	ACQUEDOTTO	Bobbio	190.000,00 €	76.000,00 €
2018PCIE0231	Acq Bobbio - Impianto di trattamento Serbatoio Piancasale	ACQUEDOTTO	Bobbio	170.000,00 €	68.000,00 €
2018PCIE0232	Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso località Roncoli	ACQUEDOTTO	Cortebrughnatella	215.000,00 €	86.000,00 €
2018PCIE0233	Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso località Fossoli	ACQUEDOTTO	Cortebrughnatella	135.000,00 €	54.000,00 €
2018PCIE0234	Acq Cerignale - Impianto di trattamento Serbatoio Cerignale 18	ACQUEDOTTO	Cerignale	210.000,00 €	84.000,00 €
2018PCIE0235	Acq Cerignale - Impianto di trattamento Serbatoio Cerignale 14 Le Piane	ACQUEDOTTO	Cerignale	165.000,00 €	66.000,00 €

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019
2018PCIE0236	Acq Cerignale-Carissasca - Impianto di trattamento Serbatoio Camminata	ACQUEDOTTO	Cerignale	215.000,00 €	86.000,00 €
2018PCIE0237	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio 16 Filippazzi	ACQUEDOTTO	Coli	210.000,00 €	84.000,00 €
2018PCIE0238	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Forno di Sopra	ACQUEDOTTO	Coli	150.000,00 €	60.000,00 €
2018PCIE0239	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Coste delle Guardie	ACQUEDOTTO	Coli	175.000,00 €	70.000,00 €
2018PCIE0241	Acq Farini-Ca' Gregorio-Boli - Impianto di trattamento Serbatoio Colletta	ACQUEDOTTO	Farini	160.000,00 €	64.000,00 €
2018PCIE0242	Acq Val Nure - Impianto di trattamento Serbatoio Toni	ACQUEDOTTO	Ferriere	925.000,00 €	370.000,00 €
2018PCIE0243	Acq Ferriere-Canafurone - Impianto di trattamento Serbatoio Castel Canafurone	ACQUEDOTTO	Ferriere	165.000,00 €	66.000,00 €
2018PCIE0244	Acq Ferriere-Rocconi - Impianto di trattamento Serbatoio Nuovo Carbonaie	ACQUEDOTTO	Ferriere	215.000,00 €	86.000,00 €
2018PCIE0245	Acq Ferriere - Impianto di trattamento Serbatoio Bardogna di Sopra	ACQUEDOTTO	Ferriere	175.000,00 €	70.000,00 €
2018PCIE0247	Acq Ferriere-Sarmadasco - Impianto di trattamento Serbatoio Sermadasco	ACQUEDOTTO	Ferriere	210.000,00 €	84.000,00 €

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019
2018PCIE0252	Acq Coli-Gavi- Impianto di trattamento Serbatoio Gavi o alimentazione da fonti alternative tramite realizzazione di opere di adduzione	ACQUEDOTTO	Coli	160.000,00 €	64.000,00 €
2018PCIE0254	Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Chiarabini o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione	ACQUEDOTTO	Farini	145.000,00 €	58.000,00 €
2018PCIE0257	Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Costiolo o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione	ACQUEDOTTO	Farini	165.000,00 €	66.000,00 €
2018PCIE0263	Potenziamento ed estendimento acquedotto loc. Genepreto (con contributo privati)	ACQUEDOTTO	Nibbiano, Alta Val Tidone	200.000,00 €	10.000,00 €
2018PCIE0268	Risoluzione criticità fognarie Capoluogo zona nord	FOGNATURA	Caorso	310.000,00 €	10.000,00 €
2018PCIE0269	Risoluzione criticità fognarie Capoluogo via Perotti-via Malvicino	FOGNATURA	Castel San Giovanni	225.000,00 €	10.000,00 €
2018PCIE0272	Risoluzione criticità fognarie Capoluogo e criticità acquedotto via San Rocco	ACQUEDOTTO	Fiorenzuola	1.000.000,00 €	10.000,00 €
2018PCIE0278	Rifacimento sottoservizi strada provinciale n.4 Bardi (via Piacenza) per rifacimento banchina	TUTTI	Lugagnano Val d'Arda	180.000,00 €	10.000,00 €
2018PCIE0292	CRISI IDRICA: studio per ricerca nuove fonti di approvvigionamento, interconnessioni sorgenti/pozzi	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	300.000,00 €	50.000,00 €
2018PCIE0293	Sostituzione contatori adempimento D.M. 93/2017	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		500.000,00 €

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019
2018PCIE0297	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Cerignale	ACQUEDOTTO	Cerignale	100.000,00 €	50.000,00 €
2018PCIE0298	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Coli - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Coli	175.000,00 €	87.500,00 €
2018PCIE0299	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti trattamento cromo nel comune di Cortebrugnatella	ACQUEDOTTO	Cortebrugnatella	75.000,00 €	37.500,00 €
2018PCIE0301	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Ferriere	ACQUEDOTTO	Ferriere	220.000,00 €	110.000,00 €

Tab.4 – Interventi pianificati ma non avviati

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL
C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera
n. 3 del 15 marzo 2018**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PCIE0001	203 - Realizzazione nuovo impianto di depurazione (biodischi) per l'agglomerato Osteria Nuova 2 e relativi collegamenti fognari	DEPURAZIONE	Vernasca	115.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	Effettuato sopralluogo ed avviata progettazione
2014PCIE0002	E2008001 - Potenziamento vasche dell'impianto di depurazione di Borgonovo e opere di collettamento della località Cà Verde al depuratore del capoluogo.	DEPURAZIONE	Borgonovo Val Tidone	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.847,13 €	0,00 €	7.847,13 €	100	In fase di progettazione Definitiva
2014PCIE0003	E2008005 - Sistemazioni delle inadeguatezze della rete fognaria del Capoluogo e limitrofe	FOGNATURA	Sarmato	551.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0004	G20080001 - Miglioramento della qualità dell'acqua nel comune di PIACENZA, 1° Stralcio: Impianto di produzione acqua potabile località Mortizza - Collegamento Piacenza -Mortizza - Collegamento pozzo esistente Mortizza-scuole - perforazione di tre nuovi pozzi	ACQUEDOTTO	Grandi opere, Piacenza	5.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	682.994,71 €	0,00 €	682.994,71 €	100	Realizzate opere di completamento, q.e. di comando e controllo, sistemazione aree di tutela assoluta, cablaggio pozzi, fornitura e installazione autoclavi, completamento locale tecnico e montaggio impianto clorazione, realizzata copertura pozzi
2014PCIE0005	G20080003-1 - Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 1° Stralcio: Adeguamento e automazione potabilizz. sino 140 l/s - Condotta Mignano-LUGAGNANO, adduttrice loc. MOCOMERO, potabilizzatore San Protaso. A servizio dei comuni FIORENZUOLA, CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO, VERNASCA, CARPANETO e GROPPARELLO	ACQUEDOTTO	Carpaneto, Castell'Arquato, Fiorenzuola, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Grandi opere, Gropparello	2.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.204,50 €	0,00 €	87.204,50 €	100	Coda intervento realizzato nell'annualità precedente.
2014PCIE0006	G20080007-1 -Acquedotto intercomunale Val Tidone, 1° Stralcio: collegamento CALENDASCO-SARMATO-CASTEL SAN GIOVANNI-BORGONOVO-PIACENZA. Potenziamento pozzi Mottaziana - collegamento BORGONOVO e ROTTOFRENO e PIACENZA.	ACQUEDOTTO	Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Rottofreno, Sarmato, Grandi opere, Calendasco	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0007	G20080008 - Acquedotto intercomunale Bassa Val Trebbia: TRAVO-GAZZOLA: Collegamenti acquedottistici Torrazzo Momeliano Pigazzano e collegamento a Rezzanello (BOFFALORA) (più collegamento Boffalora - Paderna)	ACQUEDOTTO	Gazzola, Travo, Grandi opere, Piozzano	1.180.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €	636.845,21 €	0,00 €	636.845,21 €	41	Intervento in corso da anni precedenti. Maggiori costi dovuti a ricollegamenti di tratti di rete non presenti in cartografia e modifiche funzionali dei serbatoi intermedi
2014PCIE0008	G20080009 - Razionalizzazione sistema sorgenti Alta Val Trebbia, Alta Val Nure, Alta Val d'Arda. Comuni Cerignale, Zerba, Ottone, Cortebrugnatella, Bobbio, Vernasca, Morfasso Lugagnano, Ferriere, Farini, Bettola, Gropparello, Caminata, Pecorara.	ACQUEDOTTO	Bettola, Bobbio, Caminata, Lugagnano Val d'Arda, Pecorara, Zerba, Vernasca, Grandi opere, Cerignale, Morfasso, Ottone, Cortebrugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Alta Val Tidone	1.000.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	143.635,85 €	0,00 €	143.635,85 €	378	Realizzati interventi in base alle necessità.

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL
C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera
n. 3 del 15 marzo 2018**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PCIE0009	G20080011 - Sistema depurativo intercomunale Bassa Ovest. 1° Stralcio: completamento collettamento di CALENDASCO	DEPURAZIONE	Calendasco, Grandi opere	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.865,33 €	0,00 €	25.865,33 €	100	completate opere che non è stato possibile realizzare nelle annualità precedente
2014PCIE0010	G20080012 -Sistema depurativo intercomunale Bassa Est: stralcio funzionale relativo al potenziamento sino a 10.000 AE dell'impianto di depurazione di S.Giuliano	DEPURAZIONE	Villanova sull'Arda, Castelvetro Piacentino, Grandi opere	1.740.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	5.631,12 €	0,00 €	5.631,12 €	-98	la conclusione dell'intervento è subordinata alla conclusione delle opere di potenziamento del depuratore di San Giuliano
2014PCIE0011	G20080013 - Sistema depurativo intercomunale Bassa Est: 1° stralcio collettamento Soarza + VILLANOVA(Est+Ovest) + Villanova zona artigianale + Cignano all'impianto di depurazione di S.Giuliano, e adeguamento scarichi loc. Cantarana mediante realizzazione di fossa Imhoff.	DEPURAZIONE	Castelvetro Piacentino, Villanova sull'Arda, Grandi opere	1.750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0012	G20080014 - Sistema depurativo PODENZANO-VIGOLZONE, 1° stralcio: collettamento di Vigolzone nel reticolo fognario di Podenzano.	FOGNATURA	Grandi opere, Podenzano, Vigolzone	160.851,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0013	G20080015 -Adeguamento scarichi dell'agglomerato di NIBBIANO mediante realizzazione nuovo impianto di depurazione a biodischi	DEPURAZIONE	Grandi opere, Nibbiano, Alta Val Tidone	1.000.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	14.296,91 €	0,00 €	14.296,91 €	-92	progettazione avviata ma occorre definire le modalità di realizzazione di alcune opere strutturali (muro di contenimento) necessarie per la realizzazione delle opere
2014PCIE0014	G20080016 - Sistemazione reticolo fognario di CAMINATA e Costiola e adeguamento scarichi dell'agglomerato mediante realizzazione nuovo impianto di depurazione a biodischi	DEPURAZIONE	Grandi opere, Caminata, Alta Val Tidone	800.000,00 €	207.000,00 €	0,00 €	207.000,00 €	19.954,41 €	0,00 €	19.954,41 €	-90	In fase di conferenza dei servizi
2014PCIE0015	G20080017 - Intervento di ristrutturazione dell'impianto di depurazione del capoluogo CASTEL SAN GIOVANNI, con adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006).	DEPURAZIONE	Grandi opere, Castel San Giovanni	3.512.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108.580,32 €	0,00 €	108.580,32 €	100	Eseguiti lavori che non è stato possibile realizzare nelle annualità precedenti
2014PCIE0016	G20080018 -Collettamento loc. Trevozzo (NIBBIANO) all'impianto di depurazione di Pianello V.T., potenziamento depuratore di PIANELLO e sistemazione strada di accesso	FOGNATURA	Grandi opere, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Alta Val Tidone	1.000.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	3.944,08 €	0,00 €	3.944,08 €	-98	Opere in parte eseguite ma da completare dopo il potenziamento del depuratore di Pianello
2014PCIE0017	G20080019 - Adeguamento agglomerato Strà (NIBBIANO) mediante sistemazione delle fosse Imhoff.	DEPURAZIONE	Grandi opere, Nibbiano, Alta Val Tidone	120.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	L'intervento ha incontrato difficoltà nell'individuazione di un sito adeguato per la realizzazione dell'impianto

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera n. 3 del 15 marzo 2018				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostament o	Note giustificative
2014PCIE0018	G20080020 - Adeguamento agglomerato Valconasso di Pontenure.	DEPURAZIONE	Grandi opere, Pontenure	847.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0019	G20080022 - Realizzazione tratti di fognatura e impianto di depurazione biologico per COLI, collettamento Coli Capoluogo (agglomerato: Coli, Baselica, Cerreto, Boioli, Peveri, Poggiolo, Corte, Pradaglione, Mazzucchi, Molino) ed estendimento rete loc.Caminata	FOGNATURA	Grandi opere, Coli	1.158.201,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.002,16 €	0,00 €	2.002,16 €	100	Le opere sono in fase finale, ma per portare a termine i lavori occorre risolvere alcuni problemi riscontrati in fase di collaudo
2014PCIE0020	G20080023 - Realizzazione impianto di depurazione e collettamenti fognari per agglomerato Vicobarone 3 e Case Pallaroni di ZIANO	DEPURAZIONE	Ziano Piacentino, Grandi opere	1.000.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	3.031,31 €	0,00 €	3.031,31 €	-98	L'intervento ha incontrato difficoltà nell'individuazione del sito su cui realizzare l'impianto e nella sottoscrizione degli accordi bonari per la cessione delle aree necessarie alla sua costruzione
2014PCIE0021	G20080026 - Impianto di depurazione di Mezzano Scotti.	DEPURAZIONE	Bobbio	980.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	8.472,67 €	0,00 €	8.472,67 €	-83	Il progetto è completato ma occorre perfezionare gli accordi bonari di cessione delle aree su cui realizzare l'impianto
2014PCIE0022	G2008025 - Adeguamento scarichi agglomerato Alseno Stazione mediante collettamento all'impianto di Alseno.	DEPURAZIONE	Alseno	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0023	G20090010 - Sistema fognario e depurativo a servizio del comune di GRAGNANO: 1°stralcio impianto di depurazione e sistemazione reticolo fognario capoluogo	DEPURAZIONE	Gragnano Trebbiense, Grandi opere	2.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0024	G20090011 -Sistema depurativo a servizio del comune di CALENDASCO - indennità servitù e danni - adeguamento e messa in sicurezza viabilità di accesso al nuovo depuratore	DEPURAZIONE	Rottofreno, Grandi opere, Calendasco	1.750.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	229,65 €	0,00 €	229,65 €	-99	Progettazione completata ma in attesa delle necessarie autorizzazioni
2014PCIE0025	Rifacimento allacci acquedotto extra-comparto PPIP Laura via Faggi	ACQUEDOTTO	San Giorgio Piacentino	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0026	Completamento ripristini asfalti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	

PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL
C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera
n. 3 del 15 marzo 2018

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PCIE0027	Manutenzioni straordinarie e interventi di emergenza	TUTTI	Opere pluricomunali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0028	P2008015 - Completamento fognatura via Torta	FOGNATURA	Caorso		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0029	P2008069 - Potenziamento acquedotto via XXV Aprile a San Nicolò (in sostituzione del pozzo Rivatrebbia).	ACQUEDOTTO	Rottofreno	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0030	P2008072 - Potenziamento depuratore capoluogo. 1° stralcio	DEPURAZIONE	San Giorgio Piacentino	1.300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	9.000,03 €	0,00 €	9.000,03 €	-96	In fase perfezionamento le trattative per raggiungere gli accordi bonari di cessione delle aree
2014PCIE0031	P2008081 - Rifacimento tratti rete acquedotto località Carmiano e Case Gatti.	ACQUEDOTTO	Vigolzone	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0032	P2010001 - Adeguamento impianto di depurazione per agglomerato Agazzano OVEST.	DEPURAZIONE	Agazzano	1.200.000,00 €	300.000,00 €	140.055,00 €	159.945,00 €	23.780,78 €	0,00 €	23.780,78 €	-92	Il progetto ha subito ritardi per motivi legati alla stipula degli accordi bonari per l'acquisizione delle aree destinate all'impianto di depurazione ed al passaggio delle opere di fognatura
2014PCIE0033	P2010004 - Ampliamento impianto di depurazione Cadeo Colombaia	DEPURAZIONE	Cadeo	1.100.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	5.539,59 €	0,00 €	5.539,59 €	-98	In attesa di rilascio autorizzazioni e Difficoltà nel raggiungimento degli accordi bonari
2014PCIE0034	P2010008 - Sistemazione Fognatura Chiaravalle basso paese	FOGNATURA	Alseno	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0035	P2010011 - Ristrutturazione sedimentatore.	DEPURAZIONE	Bobbio	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	

PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera n. 3 del 15 marzo 2018	CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019
--	---

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PCIE0036	P2010016 - Rifacimento impianti di sollevamento Ricetto e Fontana Fredda.	FOGNATURA	Cadeo	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.068,35 €	0,00 €	10.068,35 €	100	Anticipazione costi di progettazione sollevamento di Via Ricetto
2014PCIE0037	P2010022 - Adeguamento agglom. Muradolo e Zerbio: collettamento scarichi all'impianto di depurazione di Caorso (realizzato Muradolo, resta da collettare Zerbio)	DEPURAZIONE	Caorso	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0038	P2010024 - Estensione rete acquedotto località Ciriano-Caminata e collegamento a San Lazzaro	ACQUEDOTTO	Carpaneto	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0039	P2010049 - Adeguamento dell'impianto di depurazione agglomerato Capoluogo Ovest-Rio Gazzola e collettamento scarichi	DEPURAZIONE	Gazzola	1.040.000,00 €	229.000,00 €	90.154,00 €	138.846,00 €	10.487,74 €	0,00 €	10.487,74 €	-95	Lunga trattativa (12 mesi circa) perché dopo una prima condivisione con il Sindaco, la proprietà ha deciso di spostare l'impianto in altra area di sua proprietà
2014PCIE0040	P2010061 - Rifacimento impianto di potabilizzazione di San Pedretto.	ACQUEDOTTO	Monticelli d'Ognina	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.961,45 €	0,00 €	11.961,45 €	100	Code di lavori elettrici che non è stato possibile effettuare negli anni precedenti
2014PCIE0041	P2010067 - Realizzazione impianto di depurazione per adeguamento scarico agglomerato Pecorara e sistemazioni reti fognarie capoluogo	DEPURAZIONE	Pecorara, Alta Val Tidone	1.500.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	12.558,98 €	0,00 €	12.558,98 €	-87	Il progetto ha richiesto la verifica dei tracciati dei collettori fognari afferenti e lo svolgimento di approfondite indagini geologiche per caratterizzare ed individuare l'area da destinare alla realizzazione dell'impianto. Tali approfondimenti hanno di fatto rallentato la progettazione complessiva delle opere.
2014PCIE0042	P2010070 - Sistemazione del sistema di depurazione agglomerati Cicogni Nord, Centro e Sud	DEPURAZIONE	Pecorara, Alta Val Tidone	1.000.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	12.267,33 €	0,00 €	12.267,33 €	-75	Il progetto ha richiesto approfondite indagini per verificare i tracciati fognari afferenti l'impianto che hanno di fatto rallentato la progettazione complessiva delle opere.
2014PCIE0043	P2010074 - Revisione decantatore secondario depuratore di Piacenza.	DEPURAZIONE	Piacenza	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	

PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera n. 3 del 15 marzo 2018	CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019
--	---

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PCIE0044	P2010087 - Sistemazione acquedotto e fognatura in vicolo Nure e zona Ovest Capoluogo	ACQUEDOTTO	Pontenure	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0045	P2010110 - Rifacimento dorsale acquedottistica in sinistra Ongina tra il cimitero del Capoluogo di Vernasca e il serbatoio Coronini. 1° Stralcio (confluito in altro ID)	ACQUEDOTTO	Vernasca	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0046	P2010121 - Collegamento acquedotto in località Vitalta.	ACQUEDOTTO	Vernasca	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0047	P2010125 - Realizzazione di impianto per adeguamento scarico dell'agglomerato Bacedasco Alto	DEPURAZIONE	Castell'Arquato	100.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	4.372,62 €	0,00 €	4.372,62 €	-95	Avviata la progettazione e individuata l'area per la realizzazione dell'impianto
2014PCIE0048	P2010133 - Completamento rete fognaria località Case Gatti. 1° Stralcio: rete.	FOGNATURA	Podenzano	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.131,59 €	0,00 €	8.131,59 €	100	Costi di progettazione e materiali idraulici. Ancora in attesa di AUA. Ricontrata necessità di spostamento cavi aerei ENEL.
2014PCIE0049	P2010135 - Distributori di acqua pubblica.	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	480.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0050	P2010139 - Sostituzione tubo di collegamento Gusano-Monterosso per collegamento alla dorsale Val D'Arda.	ACQUEDOTTO	Gropparello	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0051	P2010174 - Nuovo serbatoio, impianto di rilancio e relativi collegamenti idraulici serbatoio. 1° Stralcio - Carpaneto	ACQUEDOTTO	Carpaneto	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0052	P2010239 - Nuovo pozzo Altoè.	ACQUEDOTTO	Podenzano	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL
C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera
n. 3 del 15 marzo 2018**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PCIE0053	P2011001 - Impianto di telegestione depuratori.	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali		50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	119,08 €	0,00 €	119,08 €	-99	Realizzati interventi in base alle necessità.
2014PCIE0054	P2011004 - Acquedotto zona Generesso 1° stralcio	ACQUEDOTTO	Bettola	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0055	P2011005 - Rifacimento acquedotto loc. Piancasale, Terme di Bobbio Progetto Asse 3.	ACQUEDOTTO	Bobbio	224.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0056	P2011007 - Ristrutturazione rilancio Campo Sportivo Castel San Giovanni e sostituzione tratti di adduttrice per serbatoio Ginestre	ACQUEDOTTO	Castel San Giovanni	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	853,17 €	0,00 €	853,17 €	100	Coda intervento realizzato nell'annualità precedente.
2014PCIE0057	P2011016 - Collettamento scarichi via Tinazzo.	FOGNATURA	Monticelli d'Ognina	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0058	P2011018 - Estendimento rete idrica loc. Spaneto e Verbeto.	ACQUEDOTTO	Nibbiano, Alta Val Tidone	237.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0059	P2011028 - Ristrutturazione impianto di depurazione di Travo capoluogo.	DEPURAZIONE	Travo	1.000.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	381,74 €	0,00 €	381,74 €	-99	Effettuato sopralluogo ed avviata progettazione
2014PCIE0060	P2011032 - Adeguamento degli scarichi fognari dell'agglomerato Ziano 3, Ziano 4 e Ziano 5	DEPURAZIONE	Ziano Piacentino	900.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	17.831,73 €	0,00 €	17.831,73 €	-87	Il progetto ha richiesto approfondite indagini per verificare lo stato e la consistenza del reticolo fognario e depurativo di Ziano al fine di predisporre un progetto che risolva in modo univoco le problematiche legate agli scarichi presenti nell'agglomerato
2014PCIE0061	P2011034 - Completamento fognatura zona artigianale e Roncovero.	FOGNATURA	Bettola	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	

PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera n. 3 del 15 marzo 2018	CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019
--	---

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PCIE0062	P2014001 - Collettamento scarichi in Via XXIV Maggio.	FOGNATURA	Cadeo	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0063	P2014003 - Ampliamento impianto di depurazione di Gossolengo.	DEPURAZIONE	Gossolengo	1.700.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	1.451,58 €	0,00 €	1.451,58 €	-98	progetto avviato in attesa di definire come spostare la stazione ecologica la cui area è necessaria per il potenziamento dell'impianto
2014PCIE0064	P2014005 - Rifacimento rete acquedotto via Dante per rifacimento pavimentazione	ACQUEDOTTO	Piacenza	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0065	P2014006 - Realizzazione tratto di fognatura in località La Verza.	FOGNATURA	Piacenza	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0066	P2014007 - Ampliamento impianto di depurazione di Pieve Dugliara, 1° stralcio: inserimento impianto ex Gragnanino e collegamenti	DEPURAZIONE	Rivergaro	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0067	P2014008 - Rifacimento sottoservizi piazza Paolo per rifacimento pavimentazione	ACQUEDOTTO	Rivergaro	290.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0068	P2014009 - Rifacimento caricamento e distribuzione acquedotto via Taccella Ca' Leone	ACQUEDOTTO	Rivergaro	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0069	P2014011 - Sostituzione tubazione acquedotto Mocomero per frana.	ACQUEDOTTO	Vernasca		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2014PCIE0070	P2014-ACQ/FOG/DEP - Serie di piccoli interventi approvati nel piano 2011-2012	FOGNATURA	Opere pluricomunali	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	

PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL
C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera
n. 3 del 15 marzo 2018

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PCIE0071	P2014012/P2014025 - CASTELL'ARQUATO - Realizzazione impianto depurazione S.Lorenzo (loc. Rastella); SAN GIORGIO - Realizzazione nuovo impianto di dep.di Centovera e adeguamento San Damiano tramite collettamento a Centovera; VILLANOVA - Realizzazione rete acquedotto via Stallone e Sant'Agata acquedotto e fognatura.	TUTTI	Caorso, Castell'Arquato, Gazzola, Lugagnano Val d'Arda, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Villanova sull'Arda, Coli, Farini, Ferriere, Pianello Val Tidone, Piozzano, Travo		350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	131.272,91 €	0,00 €	131.272,91 €	-62	Progettazione avviata, in fase di definizioni le trattative per la cessione bonaria delle aree
2014PCIE0072	Cartografia	TUTTI	Opere pluricomunali		200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	263.216,65 €	0,00 €	263.216,65 €	31	Maggiori risorse dedicate all'attività di aggiornamento della cartografia delle reti.
2015PCIE0073	G2008005 - Acquedotto intercomunale Val Nure - potenziamento; 1° STRALCIO Nuovo serbatoio Vigolzone e collegamento Podenzano - Manutenzione opere captazione	ACQUEDOTTO	Podenzano, Vigolzone, Opere pluricomunali, Grandi opere		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0074	P2011025 - Sistemazione acquedotto loc. Cattagnina	ACQUEDOTTO	Rottofreno	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0075	P2010063 - Ristrutturazione impianto Quattrocasse	ACQUEDOTTO	Monticelli d'Ognina	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	233.158,15 €	0,00 €	233.158,15 €	100	Intervento urgente per il quale è stato richiesto aumento del finanziamento con nulla-osta
2015PCIE0076	P2010009 - Completamento del reticolo fognario-depurativo della località Missano	FOGNATURA	Bettola	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0077	P2010064 - Sistema fognario depurativo loc.Solaro (confluito in altro ID)	FOGNATURA	Ferriere		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0078	Rifacimento reti acquedotto e fognatura in occasione del rifacimento della pavimentazione di via Roma	TUTTI	Agazzano	168.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0079	Revisione e potenziamento della rete acquedotto. Opere integrative	ACQUEDOTTO	Lugagnano Val d'Arda	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL
C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera
n. 3 del 15 marzo 2018**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2015PCIE0080	Realizzazione nuova fognatura per collettamento al depuratore della fognatura recapitante nella F.I. del Sacchello	FOGNATURA	Sarmato	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0081	Realizzazione impianto di sollevamento reflui loc. Due Case	FOGNATURA	Podenzano	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0082	Collettamento di S.Pedretto all'i.dep. di S.Giuliano	DEPURAZIONE	Castelvetro Piacentino	1.141.545,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0083	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI DI EMERGENZA - ALLUVIONE 2015	TUTTI	Opere pluricomunali	1.508.345,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0084	Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 2° Stralcio: Nuovo serbatoio diga di Mignano. A servizio dei comuni FIORENZUOLA, CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO, VERNASCA, CARPANETO e GROPPARELLO	ACQUEDOTTO	Carpaneto, Castell'Arquato, Fiorenzuola, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Grandi opere, Gropparello	800.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	6.533,40 €	0,00 €	6.533,40 €	-96	In corso trattativa con proprietario terreni
2015PCIE0085	Acquedotto intercomunale Val Tidone, 2° Stralcio: collegamento CALENDASCO-SARMATO-CASTEL SAN GIOVANNI-BORGONOVO-collegamento ROTTOFRENO-Cattagnina	ACQUEDOTTO	Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Rottofreno, Sarmato, Grandi opere, Calendasco	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0086	Acquedotto intercomunale Val Tidone, 3° Stralcio: Sistemazione criticità Trevozzo (NIBBIANO) mediante rifacimento captazione Molino Rizzo - Collegamento Trevozzo-PIANELLO (serbatoio Ca' dell'Alpe)	ACQUEDOTTO	Grandi opere, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Alta Val Tidone	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0087	Sistema depurativo PODENZANO-VIGOLZONE, 2° stralcio: ristrutturazione e ampliamento depuratore di Podenzano	DEPURAZIONE	Grandi opere, Podenzano, Vigolzone	1.742.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	28.464,47 €	0,00 €	28.464,47 €	-90	In attesa di rilascio autorizzazioni
2015PCIE0088	G20090010-2 - Sistema fognario e depurativo a servizio del comune di GRAGNANO e ROTTOFRENO: 2° stralcio collettamento loc. Campremoldo e Casaliggio e Centora	DEPURAZIONE	Gragnano Trebbiense, Rottofreno, Grandi opere	1.275.000,00 €	445.000,00 €	0,00 €	445.000,00 €	288.213,57 €	0,00 €	288.213,57 €	-35	Opere in fase di progettazione Campremoldo e Casaliggio

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL
C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera
n. 3 del 15 marzo 2018**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2015PCIE0089	Potenziamento impianto idrovoro di Piacenza Borgoforte	DEPURAZIONE	Grandi opere, Piacenza	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0090	Rifacimento automazione e rifacimento decantatore secondario n.2. PIACENZA	DEPURAZIONE	Grandi opere, Piacenza	440.000,00 €	220.000,00 €	0,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	Effettuato sopralluogo ed avviata progettazione
2015PCIE0091	Sistemazione rete acquedotto loc.Chiaravalle Carretto	ACQUEDOTTO	Alseno	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.209,10 €	0,00 €	40.209,10 €	100	Coda intervento realizzato nell'annualità precedente.
2015PCIE0092	Potenziamento impianto di depurazione di Cortina - con contributo	DEPURAZIONE	Alseno	500.000,00 €	162.000,00 €	0,00 €	162.000,00 €	5.346,84 €	0,00 €	5.346,84 €	-96	In fase di conferenza dei servizi
2015PCIE0093	Estendimento acquedotto capoluogo via Emilia est zona Rossetti	ACQUEDOTTO	Alseno	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0094	Rifacimento reti acquedotto via della Libertà e piazza Repubblica	ACQUEDOTTO	Besenzone	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0095	Sistemazione ed estendimento acquedotto loc. Ca' Rossa	ACQUEDOTTO	Bettola	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0096	Collegamento loc. Casarone all'i.d. di S.Maria	FOGNATURA	Bobbio	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0097	Sistemazione adduttrice da sorgente Arelli - studio preliminare	ACQUEDOTTO	Bobbio	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL
C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera
n. 3 del 15 marzo 2018**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2015PCIE0098	Sistemazione criticità fognarie Bobbio	FOGNATURA	Bobbio	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0099	Sistemazione criticità rete fognaria Mottaziana	FOGNATURA	Borgonovo Val Tidone	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	7.177,29 €	0,00 €	7.177,29 €	-89	Costi di progettazione. In attesa AUA
2015PCIE0100	Collettamento fognario Cadeo Sud (via Emilia)	FOGNATURA	Cadeo	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.260,88 €	0,00 €	13.260,88 €	100	In corso progettazione definitiva
2015PCIE0101	Collettamento loc. Malpaga all'impianto di depurazione di Calendasco	FOGNATURA	Calendasco	100.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	29.391,33 €	0,00 €	29.391,33 €	-67	Ritardo a causa ottenimento autorizzazioni da parte di privati. Opera in procinto di partire
2015PCIE0102	Rifacimento rete acquedotto e rete fognaria via Molinazzo	FOGNATURA	Caorso	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0103	Sistemazione rete fognaria via Marconi	FOGNATURA	Castell'Arquato	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0104	Estendimento rete acquedotto strada della Sforzesca progetto fattibilità per acquisizione contributi	ACQUEDOTTO	Castell'Arquato	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0105	Realizzazione collegamenti serbatoi Martani e Paolini a Castell'Arquato	ACQUEDOTTO	Castell'Arquato	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.350,50 €	0,00 €	77.350,50 €	100	Intervento posticipato al 2019 con costi superiori a quelli pianificati a causa di interventi di ripristino serb. Martani trasformato in camera di manovra.
2015PCIE0106	Rifacimento acquedotto e fognatura via Bixio, Mozza, Portone e Zilli	ACQUEDOTTO	Castel San Giovanni	335.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0107	Rifacimento rete fognaria via Simonetti	FOGNATURA	Castel San Giovanni	100.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	14.391,42 €	0,00 €	14.391,42 €	-71	Coda intervento realizzato nell'annualità precedente.

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera n. 3 del 15 marzo 2018				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostament o	Note giustificative
2015PCIE0108	Risoluzione criticità fognarie territorio comunale CASTELVETRO	FOGNATURA	Castelvetro Piacentino	700.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	Predisposta scheda di fattibilità dell'intervento.
2015PCIE0109	Recupero e consolidamento fognatura loc.Mezzano	FOGNATURA	Castelvetro Piacentino	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0110	Messa in sicurezza impianto di sollevamento loc. Ponte Trebbia Marsaglia	FOGNATURA	Cortebruggatella	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0111	Ristrutturazione e potenziamento impianto di depurazione	DEPURAZIONE	Cortemaggiore	700.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	1.220,23 €	0,00 €	1.220,23 €	-98	Avviata progettazione ed effettuato sopralluogo
2015PCIE0112	Realizzazione impianto depurazione di Chiavenna Landi	DEPURAZIONE	Cortemaggiore	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	238,09 €	0,00 €	238,09 €	100	Effettuato sopralluogo ed avviata progettazione
2015PCIE0113	Sistemazione reticolo fognario del Capoluogo zona Grondana (confluito negli interventi alluvione)	FOGNATURA	Ferriere	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0114	Rifacimento fognatura via Ugo Foscolo	FOGNATURA	Fiorenzuola	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0115	Rifacimento sottoservizi rotonda Via Illica	FOGNATURA	Fiorenzuola	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.875,46 €	0,00 €	89.875,46 €	100	Intervento anticipato in concomitanza con i lavori di competenza comunale di realizzazione della rotatoria
2015PCIE0116	Rifacimento rete acquedotto strada comunale per Olza	ACQUEDOTTO	Fiorenzuola	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0117	Potenziamento dell'impianto di depurazione agglomerato Canneto	DEPURAZIONE	Gazzola	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.601,83 €	0,00 €	9.601,83 €	100	Costi di progettazione. Il progetto ha subito ritardo a causa della difficoltà di concludere gli accordi bonari
2015PCIE0118	Sistemazione acquedotto e fognatura via dei Rivi	FOGNATURA	Gossolengo	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.016,77 €	0,00 €	60.016,77 €	100	Costi ripristini di Via dei Rivi e Via Matteotti

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera n. 3 del 15 marzo 2018				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostament o	Note giustificative
2015PCIE0119	Rifacimento rete acquedotto via Marconi	ACQUEDOTTO	Gossolengo	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.228,67 €	0,00 €	8.228,67 €	100	Costi relativi a ripristini definitivi.
2015PCIE0120	Sistemazione rete fognaria loc. Niviano di Sopra	FOGNATURA	Lugagnano Val d'Arda	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0121	Rifacimento rete acquedotto via Garibaldi-via Risorgimento	ACQUEDOTTO	Lugagnano Val d'Arda	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0122	Collegamento acquedotto San Nazzaro al serbatoio Quattro Case (Capoluogo)	ACQUEDOTTO	Monticelli d'Ognina	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0123	Realizzazione fognatura per sistemazione criticità via Breda	FOGNATURA	Monticelli d'Ognina	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0124	Rifacimento rete acquedotto loc. Colombello	ACQUEDOTTO	Morfasso	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.435,82 €	0,00 €	27.435,82 €	100	Coda intervento da anni precedenti
2015PCIE0125	Rifacimento Fosse Imhoff loc. Fabbrica e Bertassi (frane)	DEPURAZIONE	Ottone	50.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	In base alle autorizzazioni AUA in essere, risulta una sola fossa Imhoff regolarmente gestita da Ireti in loc. Bertassi. Si rende pertanto necessario un incontro con il privato che sollecita l'intervento in loc. Bertassi Superiore al fine di procedere alla risoluzione della problematica. Relativamente
2015PCIE0126	Rifacimento rete fognaria capoluogo via Roma, 1° stralcio	FOGNATURA	Podenzano	1.200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	Predisposta scheda di fattibilità dell'intervento. A breve verrà affidato l'incarico di progettazione a studio esterno.
2015PCIE0127	Studio sistemazione criticità fognarie San Polo e Turro	FOGNATURA	Podenzano	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0128	Ristrutturazione impianto di depurazione Ponte dell'Olio	DEPURAZIONE	Ponte dell'Olio	1.000.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	6.699,82 €	0,00 €	6.699,82 €	-93	Eseguito rilievo e avviata progettazione

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera n. 3 del 15 marzo 2018				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostament o	Note giustificative
2015PCIE0129	Studio preliminare per nuovo approvvigionamento idrico Capoluogo - studio fattibilità e avvio intervento	ACQUEDOTTO	Pontenure	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	Intervento non ancora avviato
2015PCIE0130	Rifacimento impianto elettrico impianto di depurazione e nuova linea pretrattamento liquami	DEPURAZIONE	Pontenure	190.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	Avviata progettazione ed effettuato sopralluogo
2015PCIE0131	Razionalizzazione reti acquedotto via Ungaretti e via Bruschi - studio fattibilità	ACQUEDOTTO	Rottofreno	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0132	Potenziamento depuratore capoluogo. 2° stralcio - San Giorgio	DEPURAZIONE	San Giorgio Piacentino	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0133	Rifacimento condotte idriche in loc. Poggio verso loc. Molza, nel tratto terminale via Poggio-via Sito Nuovo	ACQUEDOTTO	Sarmato	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0134	Estendimento acquedotto rete idrica su SPR10-via Emilia Est - verifica fattibilità per acquisizione	ACQUEDOTTO	Sarmato	61.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0135	Sistemazione criticità fognarie loc. Case Marchesi. Studio di fattibilità	FOGNATURA	Travo	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	In corso valutazioni di prefattibilità
2015PCIE0136	Collegamento Ponte Travo al serbatoio del Capoluogo	ACQUEDOTTO	Travo	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0137	Rifacimento rete acquedotto e fognatura loc. Bergonzi	ACQUEDOTTO	Travo	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0138	Rifacimento serbatoi loc. Vezzolacca	ACQUEDOTTO	Vernasca	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0139	Realizzazione nuovo impianto di depurazione (biodischi) per l'agglomerato Vernasca Rete1 e collegamenti fognar	DEPURAZIONE	Vernasca	800.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	18.178,18 €	0,00 €	18.178,18 €	-81	In attesa di indagini geognostiche del sito

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera n. 3 del 15 marzo 2018				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostament o	Note giustificative
2015PCIE0140	Collettamento rete fognaria da Albarola al depuratore di Ponte dell'Olio (confluito in altro ID alluvione)	FOGNATURA	Vigolzone	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0141	Struttura, studi e progettazioni. Progettazione dell'adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006) degli impianti di depurazione di Fiorenzuola e di Rottofreno.	STRUTTURA	Opere pluricomunali		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0142	Completamento collegamento frazione Basilica Duce all'imp.di depurazione di Fiorenzuola	FOGNATURA	Fiorenzuola	330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0143	Collettamento al depuratore di Borgoforte PC della località Ponte sul Nure	FOGNATURA	Grandi opere	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0144	Rifacimento rete acquedotto in loc. Boccacci	ACQUEDOTTO	Gropparello	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0145	Rifacimento fognatura in piazza Cittadella	FOGNATURA	Piacenza	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0146	Interventi di miglioramento della distribuzione idropotabile. 1° stralcio	ACQUEDOTTO	Podenzano	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0147	Interventi di miglioramento della distribuzione idropotabile. 2° stralcio	ACQUEDOTTO	Podenzano	1.865.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0148	Sistemazione rete fognaria loc. Farosa	FOGNATURA	Ponte dell'Olio	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0149	Fognatura di Bassano	FOGNATURA	Rivergaro	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2015PCIE0150	Interventi di completamento reti acquedottistiche	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	168.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	

PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL
C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera
n. 3 del 15 marzo 2018

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2015PCIE0151	Interventi di completamento reti fognarie 2013	FOGNATURA	Opere pluricomunali	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE00196	P2008001 - Contributi	DEPURAZIONE	Agazzano		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0152	Acquedotto zona Generesso 2° stralcio: studio di fattibilità	ACQUEDOTTO	Bettola	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0153	Interventi di miglioramento della distribuzione idropotabile. 2° stralcio	ACQUEDOTTO	Podenzano	1.865.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	Predisposta scheda di fattibilità dell'intervento
2016PCIE0154	Completamento rete fognaria in loc. Bassano.	FOGNATURA	Rivergaro	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	475,39 €	0,00 €	475,39 €	100	Problemi relativi all'acquisizione delle aree per il passaggio delle tubazioni
2016PCIE0155	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure: attraversamento Nure a Farini	ACQUEDOTTO	Grandi opere, Farini	216.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103.583,33 €	0,00 €	103.583,33 €	100	Lavori vincolati a quelli del rifacimento del Ponte da parte della Provincia di Piacenza e iniziati nel 2019.
2016PCIE0156	Dorsale acquedottistica della Val D'Arda: sistemazione briglia di Bardetti	ACQUEDOTTO	Grandi opere, Fiorenzuola, Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Carpaneto, Gropparello	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0157	Interventi straordinari sul pozzo Le Forche	ACQUEDOTTO	Bettola	110.000,00 €	110.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	168.643,13 €	0,00 €	168.643,13 €	53	I maggiori costi sono dovuti alla realizzazione delle opere accessorie non rientranti nel finanziamento regionale (opere elettriche, locale tecnico)
2016PCIE0158	Interventi straordinari sul pozzo Bussini	ACQUEDOTTO	Bettola	245.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0159	Interventi straordinari sull'impianto di sollevamento Auxilia	FOGNATURA	Bobbio	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0160	Interventi straordinari sull'impianto di sollevamento Dorbida	FOGNATURA	Bobbio	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	

PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera n. 3 del 15 marzo 2018	CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019
--	---

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostament o	Note giustificative
2016PCIE0161	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Marsaglia	DEPURAZIONE	Cortebrugnatella	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0162	Rifacimento tratti di fognatura nel capoluogo di Farini in fregio all'alveo del torrente Nure	FOGNATURA	Farini	223.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0163	Interventi straordinari sul pozzo Borcaglia	ACQUEDOTTO	Farini	110.000,00 €	110.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	75.124,54 €	0,00 €	75.124,54 €	-31	Lavori in corso
2016PCIE0164	Rifacimento tratti di fognatura nel capoluogo di Ferriere in fregio agli alvei dei torrenti Grondana e Nure	FOGNATURA	Ferriere	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.140,87 €	0,00 €	1.140,87 €	100	Completamento delle opere di messa in sicurezza e ripristino del sistema fognario di Ferriere
2016PCIE0165	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Ferriere capoluogo	DEPURAZIONE	Ferriere	1.145.000,00 €	635.000,00 €	317.500,00 €	317.500,00 €	592.391,73 €	0,00 €	592.391,73 €	-6	
2016PCIE0166	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Ottone	DEPURAZIONE	Ottone	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0167	Interventi straordinari sul pozzo Cisiano	ACQUEDOTTO	Rivergaro	245.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0168	Interventi straordinari sul pozzo Fabiano	ACQUEDOTTO	Rivergaro	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0169	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Pieve Dugliara	DEPURAZIONE	Rivergaro	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0170	Interventi straordinari sull'impianto di sollevamento Molinazzo	FOGNATURA	Rivergaro	314.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0171	Interventi straordinari sul pozzo Colombarola	ACQUEDOTTO	San Giorgio Piacentino	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera n. 3 del 15 marzo 2018				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostament o	Note giustificative
2016PCIE0172	Interventi straordinari sul pozzo Campo Sportivo (difesa spondale)	ACQUEDOTTO	Travo	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0173	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Bobbio capoluogo	DEPURAZIONE	Bobbio	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0174	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Case Trebbia	DEPURAZIONE	Coli	56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0175	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Travo	DEPURAZIONE	Travo	108.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.411,10 €	0,00 €	2.411,10 €	100	In attesa di autorizzazioni. Lavori in corso
2016PCIE0176	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Albarola	DEPURAZIONE	Vigolzone	351.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	439.884,29 €	0,00 €	439.884,29 €	100	Intervento in corso, i maggiori costi rispetto all'importo di progetto sono dovuti a migliorie progettuali (parte elettrica) e all'allacciamento alla rete idrica
2016PCIE0177	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure (Finanziamento RER Alluvione)	ACQUEDOTTO	Grandi opere, Ferriere, Farini	4.905.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	74.321,64 €	574.810,00 €	-500.488,36 €	-92	In attesa esito screening
2016PCIE0178	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure nel tratto ponte Cantoniera - Ponte Nano	ACQUEDOTTO	Grandi opere, Ferriere, Farini	1.145.000,00 €	567.500,00 €	283.750,00 €	283.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	Con l'ultima revisione di P.O.I. si è deciso di rendicontare l'intervento sotto un unico titolo con codice 2016PCIE 0177
2016PCIE0179	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure nel tratto Case Camia - Maioli	ACQUEDOTTO	Grandi opere, Bettola	745.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0180	Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 3° Stralcio: Interconnessione acquedottistica dei comuni CORTEMAGGIORE, SAN PIETRO IN CERRO, CAORSO. Studio di fattibilità.	ACQUEDOTTO	Grandi opere, Cortemaggiore, Caorso, San Pietro in Cerro	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0181	Rifacimento acquedotto V.le Matteotti e Bellini ad Alseno	ACQUEDOTTO	Alseno	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0182	Acquisizione Acquedotto in loc. Olmo - Studio di fattibilità	ACQUEDOTTO	Bettola	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	

PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera n. 3 del 15 marzo 2018	CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019
--	---

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostament o	Note giustificative
2016PCIE0183	Nuova rete fognaria in loc. Recesio - Studio di fattibilità	FOGNATURA	Bettola	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0184	Realizzazione rete idrica e fognaria in Via Toscanini a Muradolo.	ACQUEDOTTO	Caorso	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	1.180,55 €	0,00 €	1.180,55 €	-98	Intervento annullato dal comune
2016PCIE0185	Rifacimento sottoservizi in occasione degli interventi sulla viabilità comunale	ACQUEDOTTO	Fiorenzuola	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0186	* Raddoppio collegamento campo-pozzi di San Protaso al serbatoio pensile del Capoluogo	ACQUEDOTTO	Fiorenzuola	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	598.488,90 €	0,00 €	598.488,90 €	100	Lavori in corso dall'anno precedente
2016PCIE0187	Rifacimento fognatura in via Garibaldi	FOGNATURA	Lugagnano Val d'Arda	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0188	Realizzazione rete fognatura via Beati	FOGNATURA	Piacenza	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.333,61 €	0,00 €	145.333,61 €	100	Intervento posticipato al 2019 su richiesta del comune
2016PCIE0189	Realizzazione pozzo a Quarto. Cofinanziamento lottizzante.	ACQUEDOTTO	Piacenza	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0190	Manutenzione straordinaria digestore anaerobico depuratore di Piacenza.	DEPURAZIONE	Piacenza	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	Eseguito sopralluogo e avviata progettazione
2016PCIE0191	Realizzazione rete fognaria in loc. Cassino a Pontenure.	FOGNATURA	Pontenure	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0192	Realizzazione nuovo serbatoio in loc. Le Piane a Rivergaro e rifacimento tratti di rete idrica ed eliminazione di interferenze con proprietà private.	ACQUEDOTTO	Rivergaro	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0193	Collettamento scarichi zona produttiva di Via Piave a Rottofreno - Studio di fattibilità.	FOGNATURA	Rottofreno	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL
C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera
n. 3 del 15 marzo 2018**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2016PCIE0194	Rifacimento tratti di rete fognaria in Via Caorsana a Polignano	FOGNATURA	San Pietro in Cerro	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2016PCIE0195	* Estendimento reti con contributo a carico di privati	TUTTI	Opere pluricomunali		0,00 €	0,00 €	0,00 €	115.853,86 €	30.510,29 €	85.343,57 €	100	In questa voce vengono inseriti i contributi c/terzi per estendimenti rete acquedotto e fognatura.
2016PCIE0196	* Sistemazione del collettore fognario afferente l'impianto di depurazione di Gropparello	FOGNATURA	Gropparello	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2017PCIE0197	* Studio delle azioni di contenimento del CROMO VI	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.702,77 €	0,00 €	73.702,77 €	100	Confluiti costi progettazione preliminare e definitiva di tutti gli altri interventi nonché monitoraggi impianti pilota
2017PCIE0198	* Acquedotto Intercomunale Val Tidone 3° Stralcio Lotto d bis. Collegamento acquedottistico Calendasco Piacenza: Ponte Trebbia Calendasco.	ACQUEDOTTO	Piacenza, Calendasco, Rottofreno	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88.143,89 €	0,00 €	88.143,89 €	100	Coda intervento da anni precedenti
2017PCIE0199	* Acquedotto Intercomunale Val Tidone 3° Stralcio Lotto e. Collegamento acquedottistico Sant'Antonio - Via Primo Maggio - (lungo Via Einaudi)	ACQUEDOTTO	Piacenza, Calendasco, Rottofreno	690.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	79.659,15 €	0,00 €	79.659,15 €	-53	Intervento concluso con costi inferiori al previsto
2017PCIE0200	* Acquedotto Intercomunale Val Tidone 3° Stralcio Lotto e-1. Collegamento acquedottistico Calendasco Piacenza: Tubazione Ponte Trebbia	ACQUEDOTTO	Calendasco, Piacenza, Rottofreno	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2017PCIE0201	* Rifacimento attraversamento acquedottistico del Nure a Ponte dell'Olio	ACQUEDOTTO	Ponte dell'Olio	250.000,00 €	250.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	Con l'ultima revisione di P.O.I. si è deciso di rendicontare l'intervento sotto un unico titolo con codice 2016PCIE 0177
2017PCIE0202	* Rifacimento camera di riduzione pressione a Bettola	ACQUEDOTTO	Bettola	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2017PCIE0203	* Ripristino danni alluvione depuratore Pradella	DEPURAZIONE	Coli	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2017PCIE0204	* Ripristino danni alluvione fosse imhoff di Mareto	DEPURAZIONE	Farini	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL
C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera
n. 3 del 15 marzo 2018**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2017PCIE0205	* Ripristino danni alluvione depuratore Rompeggio	DEPURAZIONE	Ferriere	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2017PCIE0206	* Ripristino danni alluvione fosse imhoff	DEPURAZIONE	Ottone	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2017PCIE0207	* Ripristino danni alluvione depuratore Piancasale	DEPURAZIONE	Bobbio	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2017PCIE0208	* Rifacimento sorgente Lardana	ACQUEDOTTO	Ferriere	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	Intervento realizzato nell'ambito nell'emergenza idrica
2017PCIE0209	* Ripristino pozzo Trebbia	ACQUEDOTTO	Rivergaro	26.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2017PCIE0210	* Collegamento acquedottistico Cortemaggiore-Besenzone (e studio serbatoio Besenzone)	ACQUEDOTTO	Besenzone	290.000,00 €	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	51.627,48 €	0,00 €	51.627,48 €	-72	Intervento in continuazione dall'anno precedente
2017PCIE0211	* 2° stralcio: Collegamento pozzo zona artigianale Carpaneto con serbatoio	ACQUEDOTTO	Carpaneto	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2017PCIE0212	* Potenziamento pozzi esistenti	ACQUEDOTTO	Calendasco, Piacenza	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	189.328,72 €	0,00 €	189.328,72 €	100	Lavori iniziati a fine 2018. L'intervento ha comportato maggiori costi dovuti a: realizzazione camere di manovra e collegamenti idraulici per interconnessione futuro campo pozzi, interrimento linea elettrica aerea, potenziamento fornitura energia elettrica, pulizia pozzi e fornitura nuove colonne e pompe, rifacimento q.e., installazione gruppo pompaggio per località limitrofe
2017PCIE0213	* Realizzazione nuovi pozzi a Calendasco	ACQUEDOTTO	Calendasco, Piacenza	1.500.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	130.109,72 €	0,00 €	130.109,72 €	-67	Preparazione area per perforazione pozzo pilota e realizzazione strada di accesso

PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera n. 3 del 15 marzo 2018	CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019
--	---

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostament o	Note giustificative
2017PCIE0214	* Interconnessione acquedotto Fiorenzuola con acquedotto Castell'Arquato per alimentazione idrica di Castell'Arquato e Lugagnano con i pozzi di Fiorenzuola	ACQUEDOTTO	Fiorenzuola, Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Alseno, Carpaneto, Gropparello, Vernasca	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2017PCIE0215	* Interventi di ottimizzazione delle opere di presa delle sorgenti che alimentano la rete acquedottistica	ACQUEDOTTO	Cortebrugnatella	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2017PCIE0216	* Interconnessione tra serbatoio Scagliotti e la località Osera	ACQUEDOTTO	Coli	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2017PCIE0217	* Interconnessione tra serbatoio Bobbiano e la località Chiosi	ACQUEDOTTO	Travo	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2017PCIE0218	* Interconnessione tra pozzo Caminata e la località Trebecco	ACQUEDOTTO	Nibbiano, Alta Val Tidone	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2017PCIE0219	* 1° stralcio, interconnessione acquedotto intercomunale Castel San Giovanni - Sarmato - Borgonovo - Ziano con l'acquedotto di Pianello (tubazione provvisoria)	ACQUEDOTTO	Pianello Val Tidone	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2017PCIE0220	* Adeguamento rete idrica per potabilizzazione pozzo Sisco - collegamento pozzo Sisco al nuovo serbatoio Vezzeno	ACQUEDOTTO	Carpaneto	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2017PCIE0221	* Adeguamento rete idrica per potabilizzazione pozzo Piacentino - collegamento pozzo Piacentino al nuovo serbatoio Vezzeno	ACQUEDOTTO	Carpaneto	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2017PCIE0222	* 1° stralcio, interconnessione acquedotto Pianello con Trevozzo di Nibbiano (tubazione provvisoria)	ACQUEDOTTO	Nibbiano	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2017PCIE0223	* Tubazioni definitive relative alle interconnessioni idrauliche degli acquedotti di Bobbio con le loc. Cascina Ponte, Bellocchio, Calderola, Cascina Alpeggiani e altre minori	ACQUEDOTTO	Bobbio	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2017PCIE0224	* Interconnessione col serbatoio Ettoli e il serbatoio Penni per alimentare la località Case Ettoli	ACQUEDOTTO	Vernasca	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	

PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL
C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera
n. 3 del 15 marzo 2018

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2017PCIE0225	* 1° stralcio, interconnessione tra serbatoio Dobbio e serbatoio Roncaglie a beneficio di Pecorara (tubazione provvisoria)	ACQUEDOTTO	Pecorara, Alta Val Tidone	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2018PCIE0027A	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI DI EMERGENZA	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	6.801.617,49 €	0,00 €	6.801.617,49 €	240	Maggiori costi dovuti ad interventi di manutenzione non prevedibili legati a riqualificazioni urbane e/o ripavimentazioni stradali programmate da amministrazioni comunali, maggiori manutenzioni straordinarie e difese spondali a protezione dell'adduttrice Valnure, consistente aumento delle distrettualizzazioni di rete, razionalizzazione sistema sorgenti Alta Val Trebbia, Alta Val Nure, Alta Val d'Arda, adeguamento e automazione potabilizzatore di Mignano e di San Protaso a servizio dei comuni Fiorenzuola, Castell'Arquato, Lugagnano, Vernasca, Carpaneto e Gropparello
2018PCIE0027B	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED INTERVENTI DI EMERGENZA	FOGNATURA	Opere pluricomunali		800.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €	2.288.088,76 €	0,00 €	2.288.088,76 €	186	Maggiori costi per: sostituzione reti ammalorate Piacenza, Castel San Giovanni, Agazzano e Lugagnano; rinnovo impianti sollevamento (opere murarie, idrauliche ed elettromeccaniche) di Vigolzone, Rivergaro, San Pietro in Cerro; spostamento reti fognarie a causa lavori di amministrazioni comunali di Cadeo, Cerignale, Ottone; realizzazione difesa spondale necessaria per costruire strada di accesso a impianto di sollevamento Molinazzo di Rivergaro.
2018PCIE0027C	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED INTERVENTI DI EMERGENZA	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali		800.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €	871.348,16 €	0,00 €	871.348,16 €	8	
2018PCIE0227	Trattamento Pozzi Piacenza (Via Degani, Via XXIV Maggio)	ACQUEDOTTO	Piacenza	1.500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	828.210,68 €	0,00 €	828.210,68 €	65	Lavori in corso e in linea con quanto pianificato e non speso nell'anno precedente.
2018PCIE0228	Trattamento Pozzo Marchesana	ACQUEDOTTO	Gossolengo	500.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	282.967,42 €	0,00 €	282.967,42 €	-5	

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL
C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera
n. 3 del 15 marzo 2018**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2018PCIE0229	Acq Bobbio - Impianto di trattamento Serbatoio Arelli - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Bobbio	355.000,00 €	142.000,00 €	142.000,00 €	0,00 €	30.531,93 €	0,00 €	30.531,93 €	-78	Progettazione esecutiva in corso, i lavori verranno realizzati nel 2021 - BBT01
2018PCIE0230	Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di trattamento Serbatoio Caione	ACQUEDOTTO	Bobbio	190.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base nuovo limite - BBT02 SK15
2018PCIE0231	Acq Bobbio - Impianto di trattamento Serbatoio Piancasale	ACQUEDOTTO	Bobbio	170.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base nuovo limite - BBT06 SK 19
2018PCIE0232	Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso località Roncoli	ACQUEDOTTO	Cortebrugnatella	215.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base nuovo limite - CBT01 SK 21
2018PCIE0233	Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso località Fossoli	ACQUEDOTTO	Cortebrugnatella	135.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base nuovo limite - CBT02 SK20
2018PCIE0234	Acq Cerignale - Impianto di trattamento Serbatoio Cerignale 18	ACQUEDOTTO	Cerignale	210.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base nuovo limite-CGT01 - SK 22
2018PCIE0235	Acq Cerignale - Impianto di trattamento Serbatoio Cerignale 14 Le Piane	ACQUEDOTTO	Cerignale	165.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base nuovo limite-CGT02 SK 23
2018PCIE0236	Acq Cerignale-Carissasca - Impianto di trattamento Serbatoio Camminata	ACQUEDOTTO	Cerignale	215.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base nuovo limite - CGT07 SK 24
2018PCIE0237	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio 16 Filippazzi	ACQUEDOTTO	Coli	210.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base nuovo limite - COT04 SK 25
2018PCIE0238	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Forno di Sopra	ACQUEDOTTO	Coli	150.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base nuovo limite-COT05 SK 30
2018PCIE0239	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Coste delle Guardie	ACQUEDOTTO	Coli	175.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base nuovo limite-COT06 SK 26

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL
C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera
n. 3 del 15 marzo 2018**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2018PCIE0240	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Pellegrini (da realizzare)-FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Coli	175.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	31.806,32 €	0,00 €	31.806,32 €	-54	affidato, ritardo realizzazione a causa del fallimento di un componente del RTI affidataria, realizzazione 2021 - COT07
2018PCIE0241	Acq Farini-Ca' Gregorio-Boli - Impianto di trattamento Serbatoio Colletta	ACQUEDOTTO	Farini	160.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base nuovo limite-FAT 03 SK 30
2018PCIE0242	Acq Val Nure - Impianto di trattamento Serbatoio Toni	ACQUEDOTTO	Ferriere	925.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base nuovo limite-FET01 SK 37
2018PCIE0243	Acq Ferriere-Canafurone - Impianto di trattamento Serbatoio Castel Canafurone	ACQUEDOTTO	Ferriere	165.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base nuovo limite - FET02 SK 38
2018PCIE0244	Acq Ferriere-Rocconi - Impianto di trattamento Serbatoio Nuovo Carbonaie	ACQUEDOTTO	Ferriere	215.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base nuovo limite FET03 SK 39
2018PCIE0245	Acq Ferriere - Impianto di trattamento Serbatoio Bardogna di Sopra	ACQUEDOTTO	Ferriere	175.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base nuovo limite - FET04 SK 41
2018PCIE0246	Acq Morfasso - Impianto di trattamento Serbatoio Case Negri - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Morfasso	190.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	0,00 €	23.561,63 €	0,00 €	23.561,63 €	-68	Progettazione esecutiva in corso, i lavori verranno realizzati nel 2021 - MRT01
2018PCIE0247	Acq Ferriere-Sarmadasco - Impianto di trattamento Serbatoio Sarmadasco	ACQUEDOTTO	Ferriere	210.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base nuovo limite - FET06 SK 41
2018PCIE0248	Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di trattamento Serbatoio Mezzano o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Bobbio	145.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	0,00 €	25.450,86 €	0,00 €	25.450,86 €	-56	In corso progettazione da realizzare 2021 - BBT03
2018PCIE0249	Acq Bobbio-Cassolo-Cavarelli - Impianto di trattamento Serbatoio Cassolo o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Bobbio	185.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	0,00 €	38.371,82 €	0,00 €	38.371,82 €	-48	affidato, ritardo realizzazione a causa del fallimento di un componente del RTI affidataria, realizzazione 2021 - BBT04
2018PCIE0250	Acq Bobbio-Cassolo-Cavarelli- Impianto di trattamento Serbatoio Cavarelli-Bertuzzi o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Bobbio	185.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	0,00 €	38.053,82 €	0,00 €	38.053,82 €	-48	affidato, ritardo realizzazione a causa del fallimento di un componente del RTI affidataria, realizzazione 2021 - BBT05

PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL
C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera
n. 3 del 15 marzo 2018

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2018PCIE0251	Acq Coli-Perino- Impianto di trattamento Serbatoio Case Trebbia o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione - FS CROMOC	ACQUEDOTTO	Coli	135.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €	23.954,19 €	0,00 €	23.954,19 €	-55	Progettazione esecutiva in corso, i lavori verranno realizzati nel 2021 - COT02
2018PCIE0252	Acq Coli-Gavi- Impianto di trattamento Serbatoio Gavi o alimentazione da fonti alternative tramite realizzazione di opere di adduzione	ACQUEDOTTO	Coli	160.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base nuovo limite- COT03 SK 28
2018PCIE0253	Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Pastori o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Farini	145.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	0,00 €	15.078,52 €	0,00 €	15.078,52 €	-74	Cantiere avviato 2019 e completato 2020 - FAT02
2018PCIE0254	Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Chiarabini o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione	ACQUEDOTTO	Farini	145.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base nuovo limite - FAT03 SK 30
2018PCIE0255	Acq Farini-Groppallo-Impianto di trattamento Serbatoio Montalto o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione - FSC	ACQUEDOTTO	Farini	145.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	0,00 €	14.540,59 €	0,00 €	14.540,59 €	-74	Cantiere avviato 2019 e completato 2020-FAT05
2018PCIE0256	Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Grapazzuolo o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Farini	185.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	0,00 €	11.163,86 €	0,00 €	11.163,86 €	-84	Cantiere avviato 2019 e completato 2020 - FAT 90
2018PCIE0257	Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Costiolo o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione	ACQUEDOTTO	Farini	165.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base nuovo limite - FAT91 SK 35
2018PCIE0258	Intervento strutturale di ristrutturazione pozzi di alimentazione della rete idrica con installazione potabilizzatori per l'abbattimento dei nitrati	ACQUEDOTTO	Borgonovo Val Tidone, Carpaneto, Castel San Giovanni, Sarmato, Ziano Piacentino, Alseno		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2018PCIE0259	2° stralcio: interconnessione tra pozzo Barabasca e rete Fiorenzuola (attraversamento FFSS e torrente Arda) - con collegamento per Nuovo ospedale	ACQUEDOTTO	Fiorenzuola	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.018,38 €	0,00 €	11.018,38 €	100	Costi di progettazione. Ancora in attesa di autorizzazioni. I lavori sono in corso nel 2020.
2018PCIE0260	2° stralcio - Interconnessione acquedotto Pianello con Trevozzo di Nibbiano (nuova tubazione definitiva per collegamento degli acquedotti)	ACQUEDOTTO	Nibbiano, Alta Val Tidone	550.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	13.126,87 €	0,00 €	13.126,87 €	-95	progettazione definitiva in corso. Intervento da realizzare in modo unitario nell'ambito di una stessa annualità (non suddividibile in stralci funzionali). Progettazione esecutiva 2020, gara e lavori 2021

PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL
C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera
n. 3 del 15 marzo 2018

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2018PCIE0261	2° stralcio - Interconnessione tra serbatoio Dobbio e serbatoio Roncaglie a beneficio di Pecorara (posa tubazione definitiva)	ACQUEDOTTO	Pecorara, Alta Val Tidone	300.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	71.798,16 €	0,00 €	71.798,16 €	-28	Lavori in corso dall'anno precedente
2018PCIE0262	2° stralcio - Interconnessione acquedotto Intercomunale Castel San Giovanni-Sarmato-Borgonovo-Ziano con l'acquedotto di Pianello (nuova tubazione definitiva per collegamento degli acquedotti)	ACQUEDOTTO	Pianello Val Tidone	1.300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	22.592,81 €	0,00 €	22.592,81 €	-92	progettazione definitiva in corso. Intervento da realizzare in modo unitario nell'ambito di una stessa annualità (non suddividibile in stralci funzionali). Progettazione esecutiva 2020, gara e lavori 2021
2018PCIE0263	Potenziamento ed estendimento acquedotto loc. Genepreto (con contributo privati)	ACQUEDOTTO	Nibbiano, Alta Val Tidone	200.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	Siamo in attesa di avere l'impegno scritto dei privati che dichiarino la disponibilità di sostenere le spese di loro competenza
2018PCIE0264	Progetto riassetto alta Val Nure: razionalizzazione pozzi e sorgenti con ristrutturazione serbatoi, automazione sistema, sostituzione tratti di rete	ACQUEDOTTO	Bettola, Farini, Ferriere, Ponte dell'Olio	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2018PCIE0265	Rifacimento reti acquedotto a servizio di Bobbio capoluogo 1° stralcio: loc. Arelli di Bobbio per la sostituzione del sistema acquedottistico di carico dei serbatoi Casoni di Bobbio - FSC PERDITE	ACQUEDOTTO	Bobbio	380.000,00 €	190.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	30.603,56 €	0,00 €	30.603,56 €	-83	In corso la progettazione esecutiva
2018PCIE0266	Rifacimento reti acquedotto a servizio di Bobbio capoluogo 2° stralcio: rifacimento sistema sorgenti (serbatoio Casoni di Bobbio).	ACQUEDOTTO	Bobbio	133.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.024,63 €	0,00 €	10.024,63 €	100	Costi di progettazione
2018PCIE0267	Rifacimento rete adduzione acquedotto intercomunale Val Tidone 1° stralcio - caricamento Rio Frassinetti in loc. Breno soggetta a numerosi guasti che compromettono l'approvvigionamento di tutta l'Alta val Tidone	ACQUEDOTTO	Borgonovo Val Tidone, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino	540.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.782,45 €	0,00 €	72.782,45 €	100	Costi di progettazione e acquisto aree
2018PCIE0268	Risoluzione criticità fognarie Capoluogo zona nord	FOGNATURA	Caorso	310.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	Predisposta scheda di fattibilità dell'intervento
2018PCIE0269	Risoluzione criticità fognarie Capoluogo via Perotti-via Malvicino	FOGNATURA	Castel San Giovanni	225.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	Predisposta scheda di fattibilità dell'intervento
2018PCIE0270	Collegamento acquedottistico Saliceto di Cadeo - Chiavenna Landi	ACQUEDOTTO	Cortemaggiore	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.432,44 €	0,00 €	72.432,44 €	100	Anticipazione intervento richiesto con N.O.

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL
C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera
n. 3 del 15 marzo 2018**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2018PCIE0271	Adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006) e Revamping dell' impianto di depurazione di Fiorenzuola.	DEPURAZIONE	Fiorenzuola	3.500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	71.219,67 €	0,00 €	71.219,67 €	-85	Il ritardo è stato cagionato dalla complessità dell'iter approvativo del progetto
2018PCIE0272	Risoluzione criticità fognarie Capoluogo e criticità acquedotto via San Rocco	ACQUEDOTTO	Fiorenzuola	1.000.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	Predisposta scheda di fattibilità dell'intervento
2018PCIE0273	Rifacimento rete adduzione Boccine-Vergnano per approvvigionamento Gazzola Alta causa perdite, 1° stralcio - FSC PERDITE	ACQUEDOTTO	Gazzola	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.292,39 €	0,00 €	5.292,39 €	100	Anticipati costi di progettazione
2018PCIE0274	Rifacimento reti distribuzione acquedotto loc. Campremoldo causa perdite (eternit -intervento da realizzare con rete fognaria + I.Soll. cod.2015PCIE0088) - FSC PERDITE	TUTTI	Gragnano Trebbiense	400.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	165.542,40 €	0,00 €	165.542,40 €	-17	
2018PCIE0275	Rifacimento reti di distribuzione e ed automazione acquedotto Gropparello, 1° stralcio: collegamento tra serbatoi (Monte Falò - Gusano) per nuovo assetto acquedottistico e alimentazione territorio Gropparello da acquedotto Val d'Arda - FSC PERDITE	ACQUEDOTTO	Gropparello	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.426,16 €	0,00 €	2.426,16 €	100	Anticipati costi di progettazione
2018PCIE0276	Rifacimento reti di distribuzione e ed automazione acquedotto Gropparello capoluogo, 2° stralcio: nuovo assetto acquedottistico - alimentazione territorio Gropparello da acquedotto Val d'Arda	ACQUEDOTTO	Gropparello	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2018PCIE0277	Rifacimento rete loc. Case Magnani	ACQUEDOTTO	Gropparello	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2018PCIE0278	Rifacimento sottoservizi strada provinciale n.4 Bardi (via Piacenza) per rifacimento banchina	TUTTI	Lugagnano Val d'Arda	180.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	Predisposta scheda di fattibilità dell'intervento
2018PCIE0279	Sostituzione tubazione loc. Campostrino	ACQUEDOTTO	Lugagnano Val d'Arda, Vernasca	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2018PCIE0280	Estendimento rete fognaria da Via Bertè a Via Posta dei Cavalli	FOGNATURA	Piacenza	80.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	85.067,47 €	0,00 €	85.067,47 €	750	Intervento pianificato in annualità precedenti eseguito nel 2019

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL
C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera
n. 3 del 15 marzo 2018**

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2018PCIE0281	Rifacimento collettore via XXVI Aprile (sotto mura - lunghezza ca 1000 m)	FOGNATURA	Piacenza	1.500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	1.244.180,71 €	0,00 €	1.244.180,71 €	148	Intervento in corso dall'anno precedente. Maggiori costi dovuti a COSAP e al rifacimenti di circa 100 m di collettore non previsto e riscontrato ammalorato durante i lavori.
2018PCIE0282	Nuovo pozzo Polo Logistico Piacenza (contributo privati)	ACQUEDOTTO	Piacenza	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2018PCIE0283	Nuovo Serbatoio in località Rocca Pulzana con ricollegamenti e interconnessioni alla rete idrica esistente	ACQUEDOTTO	Pianello Val Tidone	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2018PCIE0284	Ampliamento impianto di depurazione di Pieve Dugliara, 2° stralcio - studio fattibilità	DEPURAZIONE	Rivergaro	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2018PCIE0285	Approvvigionamento e gestione pressioni: distrettualizzazione permanente e controllo pressioni	ACQUEDOTTO	Rivergaro	139.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2018PCIE0286	Adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006) e Revamping dell'impianto di depurazione di Rottofreno.	DEPURAZIONE	Rottofreno	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.682,33 €	0,00 €	16.682,33 €	100	conclusa progettazione e richiesta convocazione conferenza dei servizi per approvazione progetto
2018PCIE0287	Rifacimento reti acquedotto collinare loc. Ronco Centovera, tratti di tubazione Godi e Iustino - FSC PERDITE	ACQUEDOTTO	San Giorgio Piacentino	300.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	24.150,36 €	0,00 €	24.150,36 €	-87	Ritardo a causa ottenimento autorizzazioni negate dal comune di Ponte. Progetto vincolato all'ottenimento dello screening Val Nure
2018PCIE0288	Qualità della risorsa e valutazioni impiantistiche: nuovo pozzo Ronco, eventuale potabilizzazione/tratti di tubazione Godi e Iustino/ telecontrollo sistema	ACQUEDOTTO	San Giorgio Piacentino	231.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2018PCIE0289	Rifacimento acquedotto da Piazza Roma a loc. Bettola	ACQUEDOTTO	Sarmato	185.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2018PCIE0290	Potenziamento rete e serbatoio per loc. Case Marchesi, Poggiarello, Belvedere	ACQUEDOTTO	Travo	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2018PCIE0291	Riduzione pressioni e distrettualizzazione Vigolzone	ACQUEDOTTO	Vigolzone	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	

PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera n. 3 del 15 marzo 2018

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2018PCIE0292	CRISI IDRICA: studio per ricerca nuove fonti di approvvigionamento, interconnessioni sorgenti/pozzi	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	300.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	Sul 2019 sono stati utilizzati i codici specifici interventi già individuati.
2018PCIE0293	Sostituzione contatori adempimento D.M. 93/2017	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	Le attività sono partite alla fine del 2019 e saranno rendicontate nel 2020
2018PCIE0294	Studi e attività relative a procedura accorpamenti concessioni derivazione	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	200.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	39.003,01 €	0,00 €	39.003,01 €	-21	CAMB 75 Franchigia < 20.000- Scostamento < 100%
2018PCIE0295	Contributi interventi acquedottistici Dolgo e Pillerone - comune di Travo (rif. 2014PCIE0071)	ACQUEDOTTO	Travo		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	
2018PCIE0296	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Bobbio FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Bobbio	350.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	22.244,69 €	0,00 €	22.244,69 €	-87	In corso progettazione da realizzare 2021
2018PCIE0297	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Cerignale	ACQUEDOTTO	Cerignale	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base nuovo limite-FET03 SK 18
2018PCIE0298	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Coli - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Coli	175.000,00 €	87.500,00 €	87.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	In corso progettazione da realizzare 2021
2018PCIE0299	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti trattamento cromo nel comune di Cortebrugnatella	ACQUEDOTTO	Cortebrugnatella	75.000,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base nuovo limite-SK 47
2018PCIE0300	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Farini - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Farini	170.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	1.180,06 €	0,00 €	1.180,06 €	-98	In corso progettazione da realizzare 2021
2018PCIE0301	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Ferriere	ACQUEDOTTO	Ferriere	220.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100	< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base nuovo limite - SK 49
2018PCIE0302	Ulteriori interventi di adeguamento a cromo - allineamento a POI	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	2.950.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PIACENZA n.1 del 21 marzo 2016, revisionato con delibera n. 3 del 15 marzo 2018				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostament o	Note giustificative
2018PCIE0304	Potenziamento sistema acquedottistico della località Merlera, La Costa, Cappiano e Bicchignano	ACQUEDOTTO	Vigolzone	1.010.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	79.349,55 €	0,00 €	79.349,55 €	-73	Ritardi nella predisposizione del progetto per modifiche progettuali dovute ad imprevisti. Opera prossima a partire
2018PCIE0305	Sistema acquedottistico della località San Michele di Morfasso	ACQUEDOTTO	Morfasso	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.649,91 €	0,00 €	190.649,91 €	100	Intervento in corso nel 2019 con costi maggiori rispetto al preventivo causa richieste amministrazione comunale
2018PCIE0306	Nuovi allacci	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		1.139.213,01 €	433.076,00 €	706.137,01 €	851.182,41 €	250.296,04 €	600.886,37 €	-25	Realizzati interventi in base alle richieste
2018PCIE0307	Rifacimento e potenziamento della rete di distribuzione acquedotto a servizio della località Chiaravalle della Colomba	ACQUEDOTTO	Alseno	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	176.195,39 €	0,00 €	176.195,39 €	-41	Intervento in corso. Manca stralcio attraversamento FFSS e SS9 in attesa di autorizzazioni
2019PCIE0308	Rifacimento potabilizzatore di Caorso	ACQUEDOTTO	Caorso	455.000,00 €	320.000,00 €	0,00 €	320.000,00 €	246.784,30 €	0,00 €	246.784,30 €	-22	Intervento in corso nel 2019 che terminerà presumibilmente nel 2020
IMPORTO TOTALE:					23.339.713 €	5.639.535 €	17.700.178 €	21.020.503 €	855.616 €	20.164.887 €		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza n. 4 del 25 novembre 2020

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Approvazione Consuntivo 2019.
Programma Operativo Interventi –2015-2019**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Bologna, 25 novembre 2020

Il Direttore
Responsabile ad interim
Area Servizio idrico Integrato
F.to Ing. Vito Belladonna

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Piacenza
F.to Raffaele Veneziani

Il segretario verbalizzante
F.to Mario Ori

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 6 maggio 2021

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna
