

**CLBO/2022/16 del 24 novembre 2022**

**CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA**

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2021 - Gestore Sorgeacqua s.r.l.**

**IL COORDINATORE**

F.to Michele Giovannini

CLBO/2022/16

## CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

L'anno 2022 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 13:00 si è riunito in seduta telematica il Consiglio Locale di Bologna, convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/011539 del 16/11/2022.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
Città metropolitana di Bologna	Lepore Matteo	Presidente	no	
Alto Reno Terme	Nanni Giuseppe	Sindaco	no	
Anzola dell'Emilia	Veronesi Giampiero	Sindaco	no	
Argelato	Zoboli Laura	Assessore	si	0,9235
Baricella	Bedeschi Gloria	Assessore	no	
Bentivoglio	Ferranti Erika	Sindaco	no	
Bologna	Borsari Simone	Assessore	si	31,1752
Borgo Tossignano	Ghini Mauro	Sindaco	no	
Budrio	Pezzi Stefano	Assessore	si	1,6033
Calderara di Reno	Bordenga Clelia	Assessore	si	1,2191
Camugnano	Grandi Massimo	Consigliere	si	0,2982
Casalecchio di Reno	Negrone Barbara	Assessore	si	2,9927
Casalfiumanese	Casella Silvano	Assessore	si	0,4210
Castel d'Aiano	Nasci Alberto	Sindaco	no	
Castel del Rio	Baldazzi Alberto	Sindaco	no	
Castel di Casio	Aldrovandi Marco	Sindaco	no	
Castel Guelfo di Bologna	Franceschi Claudio	Sindaco	no	
Castel Maggiore	De Paoli Luca	Assessore	si	1,6218
Castel San Pietro Terme	Bondi Andrea	Assessore	si	1,7903
Castello d'Argile	Giovannini Michele	Assessore	si	0,6738
Castenaso	Scalambra Elisabetta	Assessore	si	1,4199
Castiglione dei Pepoli	Fabrizi Maurizio	Sindaco	no	
Crevalcore	Martelli Marco	Sindaco	si	1,2281
Dozza	Pezzi Barbara	Assessore	si	0,6743
Firenzuola	Buti Giampaolo	Sindaco	no	
Fontanelice	Meluzzi Gabriele	Sindaco	no	
Gaggio Montano	Pucci Giuseppe	Sindaco	si	0,5352
Galliera	Zanni Stefano	Sindaco	si	0,5933
Granarolo dell'Emilia	Ricci Alessandro	Sindaco	si	1,1566
Grizzana Morandi	Testoni Giulia	Assessore	si	0,4622
Imola	Spada Elisa	Assessore	si	5,6593
Lizzano in Belvedere	Polmonari Sergio	Sindaco	no	
Loiano	Morganti Fabrizio	Sindaco	si	0,5004

<b>Comune</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenti</b>	<b>Quote</b>
Malalbergo	Dalle Donne Fabio	Assessore	si	0,8713
Marradi	Triberti Tommaso	Sindaco	no	
Marzabotto	Cuppi Valentina	Sindaco	no	
Medicina	Bonetti Massimo	Assessore	si	1,4741
Minerbio	Bonori Roberta	Sindaco	no	
Molinella	Righetti Gianni	Assessore	si	1,3937
Monghidoro	Maestrami Giovanni	Assessore	si	0,4503
Monte San Pietro	Fabbri Barbara	Assessore	si	1,0055
Monterenzio	Mantovani Ivan	Sindaco	no	
Monzuno	Pasquini Bruno	Sindaco	si	0,6564
Mordano	Tassinari Nicola	Sindaco	si	0,5188
Ozzano dell'Emilia	Lelli Luca	Sindaco	no	
Palazzuolo sul Senio	Moschetti Gian Piero	Sindaco	no	
Pianoro	Buganè Stefano	Assessore	si	1,5425
Pieve di Cento	Borsari Luca	Sindaco	si	0,7209
Sala Bolognese	Trapella Ornella	Assessore	si	0,8259
San Benedetto Val di Sambro	Santoni Alessandro	Sindaco	no	
San Giorgio di Piano	Crescimbeni Paolo	Sindaco	no	
San Giovanni in Persiceto	Pellegatti Lorenzo	Sindaco	si	2,3572
San Lazzaro di Savena	Grasselli Beatrice	Assessore	si	2,7366
San Pietro in Casale	Pezzoli Claudio	Sindaco	si	1,1597
Sant'Agata Bolognese	Vicinelli Giuseppe	Sindaco	no	
Sasso Marconi	Bernabei Irene	Assessore	no	
Valsamoggia	Soverini Christian	Assessore	si	2,6561
Vergato	Argentieri Giuseppe	Sindaco	si	0,7486
Zola Predosa	Dall'Omo Davide	Sindaco	no	
Totale				74,0659

Presenti n. 34 pari a quote 74,0659

Assenti n. 25 pari a quote 25,9341

Riconosciuta la validità della seduta Michele Giovannini, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2021 - Gestore Sorgeacqua s.r.l.**

**Vista** la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato** che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresses forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

**considerato** che:

- con deliberazione 34/2019/R/IDR, l'Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr;
- con deliberazione n. 6 del 2 marzo 2020 il Consiglio locale di Modena ha approvato il programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-2023 del Gestore Sorgeacqua s.r.l.;

**considerato** altresì che:

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
  - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti significativi dal programma approvato;
  - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
  - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
  - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

**dato atto** che il gestore Sorgeacqua s.r.l. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2020 attraverso il software ARSI;

**dato atto** altresì che l'istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla rendicontazione degli investimenti 2021 è sintetizzata nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

**rilevato** che:

- nell'annualità 2021 non sono stati rilasciati dalla struttura tecnica di ATERSIR nulla osta ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017 relativi ad interventi del bacino di Modena, e pertanto non sono presenti interventi che necessitino di ratifica da parte del Consiglio locale;
- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di investimenti realizzati superiore di 638.982,61 € rispetto a quanto previsto nell'annualità 2021 dal Programma degli interventi 2020-2023 approvato, valore corrispondente ad uno scostamento percentuale pari al +52%;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal Gestore del servizio idrico integrato;

**ritenuto** pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**con voti** resi nelle forme di legge: favorevoli n. 34 per quote 74,0659, astenuti n. 0, contrari n. 0;

## **DELIBERA**

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua s.rl. come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Bologna n. 16 del 24 novembre 2022

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2021 - Gestore Sorgeacqua s.r.l.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato  
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 24 novembre 2022

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
CONSUNTIVO INVESTIMENTI  
ANNO 2021**

**GESTORE: SORGEAQUA s.r.l.**

**BACINO PROVINCIALE DI: BOLOGNA e MODENA**

## 1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2021, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.6 del 2 marzo 2020, che il gestore SORGEAQUA s.r.l. ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	<b>PIANIFICATO 2021</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>DIFF%</b>
<b>GESTORE</b>	944.500,00 €	1.722.183,11 €	777.683,11 €	82%
<b>SOCIETA' TERZE</b>	- €	- €	- €	0%
<b>FONDO PERDUTO</b>	289.500,00 €	150.799,50 €	-138.700,50 €	-48%
<b>TOTALE</b>	<b>1.234.000,00 €</b>	<b>1.872.982,61 €</b>	<b>638.982,61 €</b>	<b>52%</b>

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021

Gli investimenti di struttura per l'anno 2021 rendicontati ammontano a 94.675,13 euro (max. 20.000 euro). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2021 investimenti superiore rispetto al pianificato per circa il 52% .

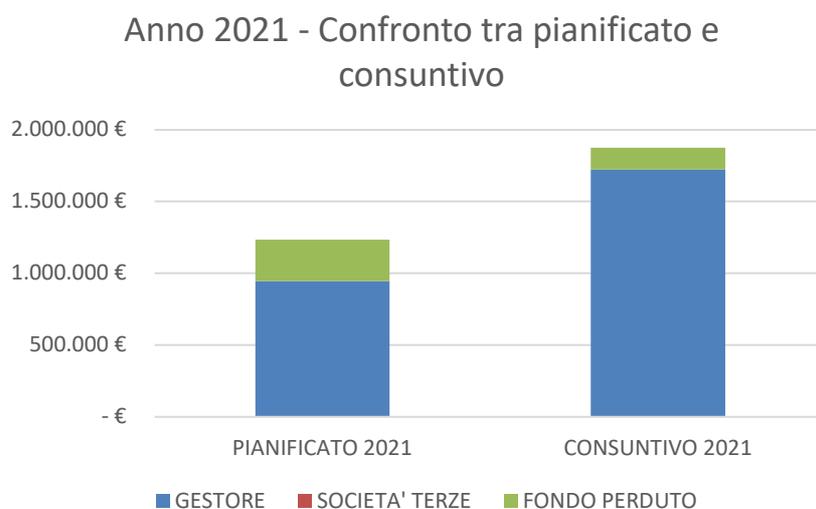


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

## 2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si nota maggiori investimenti nel comparto acquedottistico rispetto al comparto fognario-depurativo. Si registrano maggiori investimenti rispetto al pianificato soprattutto a seguito di maggiori necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Non si rilevano ritardi particolari sugli interventi; l'unico intervento non avviato è un intervento oggetto di rimodulazione nel programma di finanziamento FSC 2014-2020 che è stato cancellato e le risorse trasferite sull'intervento di rinnovo delle reti su tutti i comuni gestiti.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF %
<b>ACQUEDOTTO</b>	849.000,00 €	1.387.671,15 €	538.671,15 €	63%
<b>DEPURAZIONE</b>	320.000,00 €	347.445,91 €	27.445,91 €	9%
<b>FOGNATURA</b>	65.000,00 €	136.849,71 €	71.849,71 €	111%
<b>TUTTI</b>		1.015,84 €	1.015,84 €	0%
<b>Totale</b>	<b>1.234.000,00 €</b>	<b>1.872.982,61 €</b>	<b>638.982,61 €</b>	<b>52%</b>

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2021 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

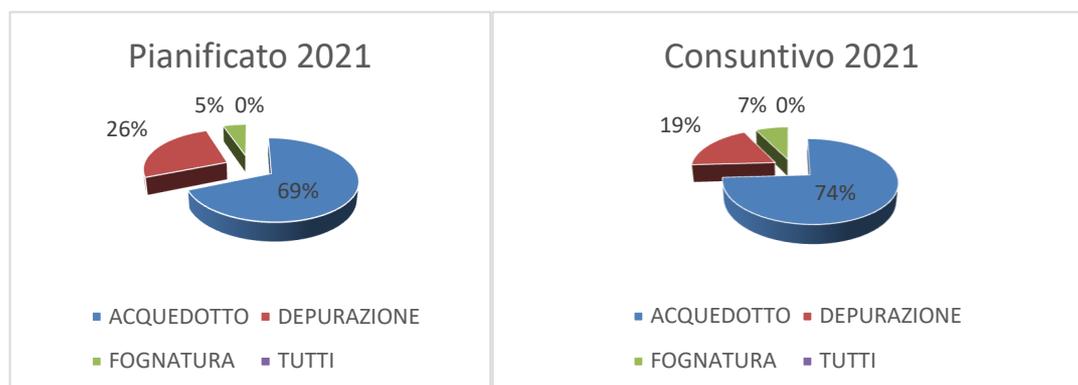


FIG.2 – Suddivisione investimenti 2021 per servizio

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

	<b>PIANIFICATO 2021</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>DIFF %</b>
<b>ACQUEDOTTO</b>	285.000,00 €	396.258,46 €	111.258,46 €	39,04%
<b>FOGNATURA</b>	65.000,00 €	136.849,71 €	71.849,71 €	110,54%
<b>DEPURAZIONE</b>	50.000,00 €	102.281,34 €	52.281,34 €	104,56%
<b>TOTALE</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>635.389,51 €</b>	<b>235.389,51 €</b>	<b>58,85%</b>

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante l'anno. Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale degli interventi (sono esclusi gli interventi tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che non hanno importi nell'anno in analisi e gli investimenti di struttura).

<b>.Classi d'importo</b>	<b>Numero</b>	<b>PIANIFICATO 2021</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>DIFF. %</b>
<b>Fino a 500.000 €</b>	20	834.000,00 €	1.237.593,10 €	403.593,10 €	48%
<b>500.001- 1.000.000 €</b>	-	- €	- €	- €	0%
<b>1.000.001- 2.000.000 €</b>	-	- €	- €	- €	0%
<b>2.000.001- 5.000.000 €</b>	-	- €	- €	- €	0%
<b>Oltre 5.000.000 €</b>	-	- €	- €	- €	0%
<b>Manutenzioni</b>	7	400.000,00 €	635.389,51 €	235.389,51 €	59%
<b>TOTALE</b>	<b>27</b>	<b>1.234.000,00 €</b>	<b>1.872.982,61 €</b>	<b>638.982,61 €</b>	<b>52%</b>

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato, sono esclusi gli investimenti di struttura.

- Numero di interventi programmati nel 2021 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 34
- Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2021: 51.

	NUMERO INTERVENTI	IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2021	IMPORTO LORDO CONSUNTIVO 2021
Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%)	1	239.000,00 €	- €
Interventi con avvio anticipato nel 2021 e chiusure di interventi già avviati contenuti nel programma degli interventi o nel piano d'ambito (+100%)	3	- €	556.789,17 €
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%	31	964.000,00 €	1.687.665,19 €
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%	21	290.000,00 €	279.992,55 €

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

**INTERVENTI NON AVVIATI**

	<b>ID ATERSIR</b>	<b>TITOLO ID ATERSIR</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>COMUNE</b>	<b>SOGGETTO INVESTITORE</b>	<b>Importo progettuale</b>	<b>Importo lordo pianificato 2021</b>
1	2017BOSA0001	Nuovi impianti di rilancio a servizio di Caselle e Palata Pepoli - FSC SCHEDA 33	A	Crevalcore	Gestore	280.000,00	239.000,00

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Modena N. 6 del 2 marzo 2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Colonna4
							€	€	€	€	€	€	€	€	€		
1	2014BOSA0001	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	A	Crevalcore	Gestore	- €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	50.285,82 €	- €	- €	50.285,82 €	9.714,18 €	-16	minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2	2014BOSA0002	Rifacimento allacci utenza	A	Crevalcore	Gestore	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	85.719,26 €	- €	- €	85.719,26 €	- 65.719,26 €	328	maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
3	2014BOSA0003	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	F	Crevalcore	Gestore	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	44.054,21 €	- €	- €	44.054,21 €	- 29.054,21 €	193	maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
4	2014BOSA0004	Sostituzione contatori d'utenza	A	Crevalcore	Gestore	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	29.243,13 €	- €	- €	29.243,13 €	- 14.243,13 €	94	maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
5	2014BOSA0005	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	D	Crevalcore	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	15.976,52 €	- €	- €	15.976,52 €	- 5.976,52 €	59	necessità imprevista di manutenzioni straordinarie
6	2014BOSA0006	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	F	Sant'Agata Bolognese	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	26.765,64 €	- €	- €	26.765,64 €	- 16.765,64 €	167	maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
7	2014BOSA0007	Rifacimento allacci di utenza	A	Sant'Agata Bolognese	Gestore	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	35.529,80 €	- €	- €	35.529,80 €	- 20.529,80 €	136	maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
8	2014BOSA0008	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	D	Sant'Agata Bolognese	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	14.371,54 €	- €	- €	14.371,54 €	- 4.371,54 €	43	necessità imprevista di manutenzioni straordinarie
9	2014BOSA0009	Sostituzione contatori di utenza	A	Sant'Agata Bolognese	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	8.536,63 €	- €	- €	8.536,63 €	1.463,37 €	-14	minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
10	2014BOSA0010	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti acquedotto	A	Sant'Agata Bolognese	Gestore	- €	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	43.936,78 €	4.224,00 €	- €	39.712,78 €	- 3.936,78 €	9	
11	2014BOSA0011	Adeguamento scarichi fognari (2 stralci funzionali)	F	Sant'Agata Bolognese	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
12	2014BOSA0012	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	A	Crevalcore	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
13	2014MOSA0001	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	A	Finale Emilia	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	20.405,38 €	- €	- €	20.405,38 €	29.594,62 €	-59	minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
14	2014MOSA0002	Rifacimento allacci di utenza	A	Finale Emilia	Gestore	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	81.913,56 €	- €	- €	81.913,56 €	- 61.913,56 €	309	maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
15	2014MOSA0003	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	D	Finale Emilia	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	31.772,26 €	- €	- €	31.772,26 €	- 21.772,26 €	217	necessità imprevista di manutenzioni straordinarie
16	2014MOSA0004	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	F	Finale Emilia	Gestore	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	18.165,13 €	- €	- €	18.165,13 €	- 3.165,13 €	21	
17	2014MOSA0005	Sostituzione contatori di utenza	A	Finale Emilia	Gestore	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	55.000,66 €	- €	- €	55.000,66 €	- 35.000,66 €	175	maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
18	2014MOSA0008	Rifacimento allacci di utenza	A	Nonantola	Gestore	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	51.548,53 €	- €	- €	51.548,53 €	- 31.548,53 €	157	maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
19	2014MOSA0009	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	F	Nonantola	Gestore	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	31.011,44 €	6.450,00 €	- €	24.561,44 €	- 16.011,44 €	106	necessità imprevista di manutenzioni straordinarie
20	2014MOSA0010	Sostituzione contatori di utenza	A	Nonantola	Gestore	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	17.163,33 €	- €	- €	17.163,33 €	2.836,67 €	-14	minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
21	2014MOSA0011	Realizzazione rete fognaria e depuratore a servizio dell'agglomerato di Campazzo, di Case Ponte Fossa e della zona di via Giordina	D	Nonantola	Gestore	- €	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	15.160,95 €	- €	- €	15.160,95 €	54.839,05 €	-78	realizzazione ultimo stralcio rinviato al 1° trim. 2023
22	2014MOSA0012	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti acquedotto	A	Nonantola	Gestore	- €	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	27.751,09 €	1.425,00 €	- €	26.326,09 €	12.248,91 €	-30	minor necessità di manutenzioni rilevata in fase esecutiva
23	2014MOSA0013	Collegamento rete fognaria di Gazzate col depuratore del capoluogo	F	Nonantola	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
24	2014MOSA0014	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	D	Nonantola	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	34.001,24 €	- €	- €	34.001,24 €	- 24.001,24 €	240	necessità imprevista di manutenzioni straordinarie
25	2014MOSA0015	Rifacimento allacci di utenza	A	Ravarino	Gestore	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	40.662,70 €	- €	- €	40.662,70 €	- 25.662,70 €	171	maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
26	2014MOSA0016	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	F	Ravarino	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	16.853,29 €	- €	- €	16.853,29 €	- 6.853,29 €	68	maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
27	2014MOSA0017	Sostituzione contatori di utenza	A	Ravarino	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	8.768,67 €	- €	- €	8.768,67 €	1.231,33 €	-12	minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
28	2014MOSA0018	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	D	Ravarino	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	6.159,78 €	- €	- €	6.159,78 €	3.840,22 €	-38	minor necessità di manutenzioni rilevata in fase esecutiva
29	2014MOSA0019	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	A	Ravarino	Gestore	- €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	6.118,35 €	- €	- €	6.118,35 €	23.881,65 €	-79	minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
30	2014MOSA0020	Manutenzione straordinaria e spurgo pozzi	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	30.832,13 €	- €	- €	30.832,13 €	- 832,13 €	2	
31	2014MOSA0021	Altri interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo reti	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €	216.928,91 €	- €	- €	216.928,91 €	- 181.928,91 €	519	maggiori lavorazioni impreviste per rotture su condotte adduttrici
32	2014MOSA0022	Nuovi allacci all'utenza	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	120.469,19 €	103.700,50 €	- €	16.768,69 €	- 469,19 €	0	
33	2014MOSA0023	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	A	Finale Emilia	Gestore	1.350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
34	2014MOSA0024	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	A	Nonantola	Gestore	950.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
35	2014MOSA0025	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	A	Ravarino	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
36	2016BOSA0001	Adeguamento depuratore di Bevilacqua	D	Crevalcore	Gestore	372.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	1.507,80 €	- €	- €	1.507,80 €	198.492,20 €	-99	intervento posticipato al 2022
37	2017BOSA0001	Nuovi impianti di rilancio a servizio di Caselle e Palata Pepoli - FSC SCHEDA 33	A	Crevalcore	Gestore	280.000,00 €	239.000,00 €	169.500,00 €	- €	69.500,00 €	- €	- €	- €	- €	239.000,00 €		id cancellato e rimodulato su id 2019MOSA0001
38	2018MOSA0001	Nuovo gestionale per monitoraggio e raccolta dati di qualità tecnica	TT	Opere Pluricomunali	Gestore	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.015,84 €	- €	- €	1.015,84 €	1.015,84 €		
39	2018MOSA0002	Sostituzione contatori di processo	A	Opere Pluricomunali	Gestore	65.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	186,48 €	- €	- €	186,48 €	9.813,52 €		intervento concluso nel corso del 2020
40	2018MOSA0003	Investimenti di struttura	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	94.675,13 €	- €	- €	94.675,13 €	74.675,13 €		conclusione redazione SIT reti SII ed acquisto strumentazione per rilevazione perdite idriche
41	2019MOSA0001	Sostituzione di reti idriche nei comuni gestiti da Sorgeaqua	A	Opere Pluricomunali	Gestore	423.700,00 €	- €	- €	- €	- €	327.277,51 €	35.000,00 €	- €	292.277,51 €	327.277,51 €		interventi di sostituzione reti realizzati con contributo del fondo FSC e precedentemente previsti con ID specifici per Comune (ex 2014MOSA0001, 2014MOSA0012, 2014BOSA0010)
42	2020BOSA0001	Adeguamento funzionale depuratore capoluogo	D	Sant'Agata Bolognese	Gestore	460.000,00 €	- €	- €	- €	- €	228.495,82 €	- €	- €	228.495,82 €	228.495,82 €		conclusione intervento posticipata dal 2020 al 2021
43	2020BOSA0002	Ristrutturazione serbatoio pensile di Sant'Agata B.se	A	Sant'Agata Bolognese	Gestore	950.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
44	2020MOSA0001	Ristrutturazione centrale acquedottistica di Finale Emilia	A	Finale Emilia	Gestore	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
45	2020MOSA0002	Ristrutturazione serbatoio pensile di via Respighi Nonantola	A	Nonantola	Gestore	950.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
46	2020MOSA0003	Adeguamento distretti di rete	A	Opere Pluricomunali	Gestore	40.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	88.569,38 €	- €	- €	88.569,38 €	73.569,38 €		maggior necessità di lavorazioni rilevata in fase esecutiva
47	2020MOSA0004	Adeguamento sistema di telecontrollo	A	Opere Pluricomunali	Gestore	55.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	40.823,86 €	- €	- €	40.823,86 €	25.823,86 €		maggior necessità di lavorazioni rilevata in fase esecutiva
48	2020MOSA0005	Ristrutturazione serbatoio pensile di Crevalcore	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
49	2020MOSA0006	Ristrutturazione serbatoio pensile di Ravarino	A	Ravarino	Gestore	950.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
50	2020MOSA0007	Adeguamento funzionale depuratore capoluogo	D	Ravarino	Gestore	170.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Modena N. 6 del 2 marzo 2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Colonna4
51	2020MOSA0008	Adeguamento funzionale depuratore Casoni	D	Ravarino	Gestore	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
52	2022MOSA0001	Perforazione nuovo pozzo 16 e chiusura pozzo 5, Castelfranco Emilia	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
<b>Totale</b>						<b>1.254.000,00 €</b>	<b>289.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>964.500,00 €</b>	<b>1.967.657,74 €</b>	<b>150.799,50 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.816.858,24 €</b>	<b>250.430,30 €</b>			

	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura
<b>Importo Totale</b>	1.254.000,00	289.500,00	-	964.500,00	1.967.657,74	150.799,50	-	1.816.858,24	151,8%
<b>Importo Totale - esclusi investimenti di struttura</b>	1.234.000,00	289.500,00	-	944.500,00	1.872.982,61	150.799,50	-	1.722.183,11	

Legenda: A = acquedotto D = depurazione  
F = fognatura AB = acque bianche TT=tutti  
ST=struttura

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore  
F.to Michele Giovannini

Il segretario verbalizzante  
F.to Pier Luigi Maschietto

---

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La sujestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 maggio 2023
