

CLFE/2019/3 del 1 marzo 2019

**CONSIGLIO LOCALE di FERRARA**

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2017**

IL COORDINATORE  
F.to Andrea Marchi

## CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

**CLFE/2019/3**

L'anno **2019** il giorno uno del mese di marzo alle ore 10,30 presso la Sala Torre San Paolo della Provincia di Ferrara, si è riunito il Consiglio Locale di Ferrara convocato con lettera PG/AT/2019/1391 del 25/02/2019.

Risultano presenti all'appello:

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI FERRARA	Paron Barbara	Presidente	SI'	10,0000
COMUNE DI ARGENTA	Chiarini Marco	Assessore	SI'	5,4468
COMUNE DI BONDENO	Vincenzi Marco	Assessore	SI'	3,8388
COMUNE DI CENTO	Toselli Fabrizio	Sindaco	SI'	8,3318
COMUNE DI CODIGORO				3,2139
COMUNE DI COMACCHIO	Fantinuoli Denis	Vice-sindaco	SI'	5,5648
COMUNE DI COPPARO				4,2744
COMUNE DI FERRARA	Ferri Caterina	Assessore	SI'	30,7476
COMUNE DI FISCAGLIA				2,5563
COMUNE DI GORO				1,2675
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA				1,0631
COMUNE DI LAGOSANTO				1,5097
COMUNE DI MASI TORELLO				0,9176
COMUNE DI MESOLA				2,0111
COMUNE DI OSTELLATO	Marchi Andrea	Sindaco	SI'	1,8537
COMUNE DI POGGIO RENATICO	Fini Serena	Assessore	SI'	2,5918
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Vacchi Alessandro	Assessore	SI'	3,1672
COMUNE DI RIVA DEL PO				2,6996
COMUNE DI TERRE DEL RENO	Lodi Roberto	Sindaco	SI'	3,1723
COMUNE DI TRESIGNANA				2,4375
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	Paron Barbara	Sindaco	SI'	2,0778
COMUNE DI VOGHIERA	Bandiera Dante	Assessore	SI'	1,2565

Presenti n. 12      pari a quote      78,0491  
 Assenti n. 12      pari a quote      21,9509

Riconosciuta la validità della seduta Andrea Marchi, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2017**

**Visti:**

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- l'art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

**premesse che:**

- l'art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio d'Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
- l'art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

**considerato che:**

- con deliberazione n.6 del 16 dicembre 2015 del Consiglio locale di Ferrara è stato approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 41 del 26 luglio 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Ferrara, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr;
- con deliberazione n.6 del 14 giugno 2017 del Consiglio locale di Ferrara è stata approvata la revisione, per gli anni 2016-2019 del programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale ultima deliberazione inoltre dispone che:
  - o entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
  - o il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
  - o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
  - o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

**dato atto** che:

- il gestore HERA S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2017 attraverso il software ARSI;

**rilevato** che:

- durante il 2017 non è stato proposto alcun nuovo intervento che necessiti di ratifica da parte del Consiglio locale ai sensi della delibera CAMB 75/2017;
- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell'anno 2017 risultano essere inferiori di 714.365 euro rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 vigente;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che le motivazioni fornite dal gestore in merito agli scostamenti segnalati sono risultate ammissibili tranne che per cinque interventi;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ritenuto** pertanto:

- di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**a voti** resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 12 (quote 78,0491), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

## **DELIBERA**

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 per il gestore HERA S.p.A. per il bacino tariffario di Ferrara come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA  
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

---

**Servizio Idrico Integrato  
Consuntivo investimenti annualità 2017  
Gestore: HERA s.p.a.  
Sottoambito: Ferrara**

22 ottobre 2018

## RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2017

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2017, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Ferrara n. 6 del 16 Dicembre 2015, aggiornato con Delibera del Consiglio locale di Ferrara n. 6 del 14 Giugno 2017, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI.

		PIANIFICATO 2017		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2017	
HERA	Importo Lordo Pianificato dal soggetto investitore HERA esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 10.324.000	-€ 714.635	€ 9.609.365	Importo Lordo a Consuntivo del soggetto investitore HERA esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	
	Importo Contributo a fondo perduto Pianificato [B]	€ 0	€ 0	€ 0	Importo Contributo a Consuntivo [B]	
	Importo Netto Pianificato [A]-[B]	<b>€ 10.324.000</b>	<b>-€ 714.635</b>	<b>€ 9.609.365</b>	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]	
CONTO TERZI	Importo Lordo Pianificato da soggetto investitore diverso da HERA [C]	€ 0	€ 0	€ 0	Importo Lordo a Consuntivo da soggetto investitore diverso da HERA	
TOTALE	Totale netto pianificato	€ 10.324.000	<b>-€ 714.365</b>	€ 9.609.365	Totale netto consuntivato	

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2017 investimenti inferiori per un importo complessivo pari a € 714.635 rispetto a quanto era stato preventivato; nel caso specifico, come si vede anche dalla tabella 2 tale scostamento è da attribuire parzialmente agli interventi non avviati nel 2017 e a quelli che hanno subito uno scostamento superiore al 20% tra quanto preventivato e quanto rendicontato.

Gli interventi non avviati nel 2017 sono stati 14 per un ammontare complessivo pari a € 689.000 ma di contro sono stati avviati nel 2017 anche 6 interventi non programmati per un importo complessivo pari a € 396.307. Gli interventi che hanno subito uno scostamento superiore al 20% sono stati invece 34 (56% degli interventi programmati).

Per avere comunque un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

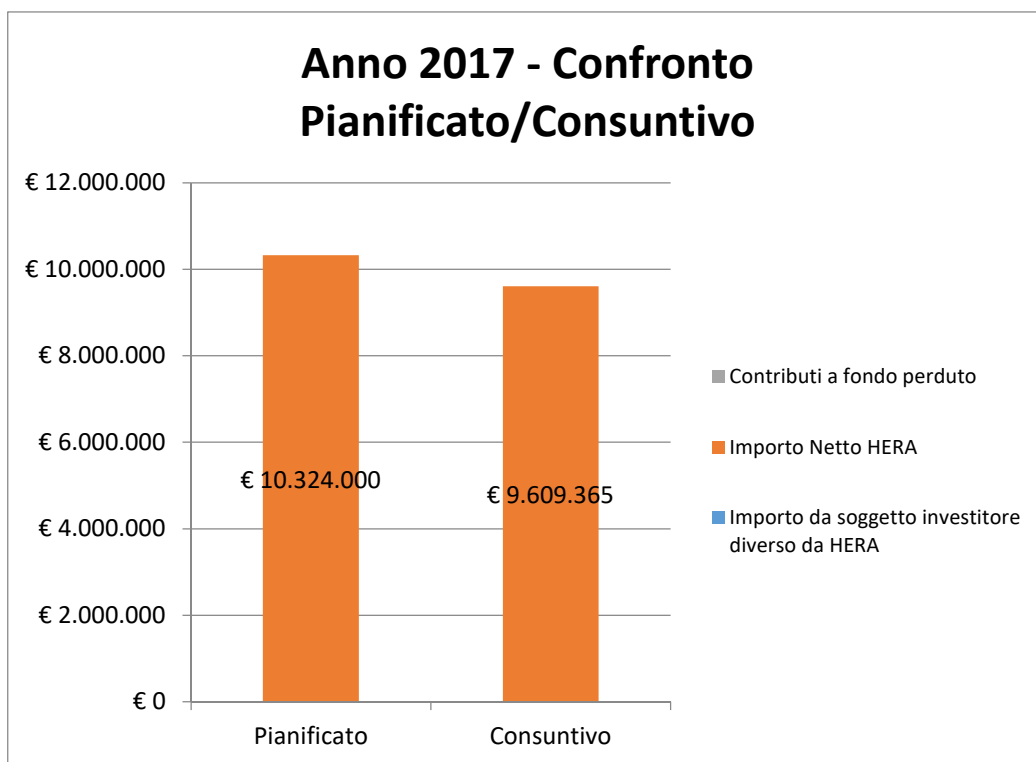


Fig.1 – Istogramma di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2017

#### RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva.

Numero di voci nel programma approvato per il 2017: 60

Numero di voci rendicontate nel 2017: 49

	Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2017	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2017	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati o conclusi contabilmente nell'anno 2016 (% di scostamento pari al -100%)	14	€ 0	€ 689.000			
<i>di cui interventi conclusi contabilmente anticipatamente nell'anno precedente</i>	1	€ 0	€ 10.000	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		
Interventi con avvio anticipato nel 2017 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	6	€ 396.307	€ 0			
Interventi avviati nel 2017 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0			
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	34	€ 6.181.434	€ 6.745.000			
<i>di cui interventi con scostamento inferiore al limite di franchigia (€ 20.000) come riportato nella Delibera del Consiglio d'Ambito n. 12/2017</i>	3	€ 49.372	€ 47.000	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	9	€ 3.031.625	€ 2.890.000	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Sebbene il gestore abbia nel complesso rendicontato un importo inferiore a quello preventivato (cfr. Tab 1) e non abbia avviato 14 interventi (per l'elenco si veda la Tabella 3) dei 60 programmati,



le verifiche effettuate sulle giustificazioni addotte dal gestore hanno ritenuto esaustive tutte le motivazioni che il gestore ha fornito.

Per il 56% delle voci previste in programma (34) gli importi previsti hanno registrato uno scostamento oltre il  $\pm 20\%$ , mentre per 9 interventi gli importi previsti dalla programmazione sono stati in linea di massima rispettati, con uno scostamento tra quanto programmato e quanto rendicontato al di sotto del 20%

Il gestore ha inoltre avviato anticipatamente rispetto a quanto programmato 6 interventi previsti nella pianificazione d'ambito e nei programmi dell'ex ATO 6.

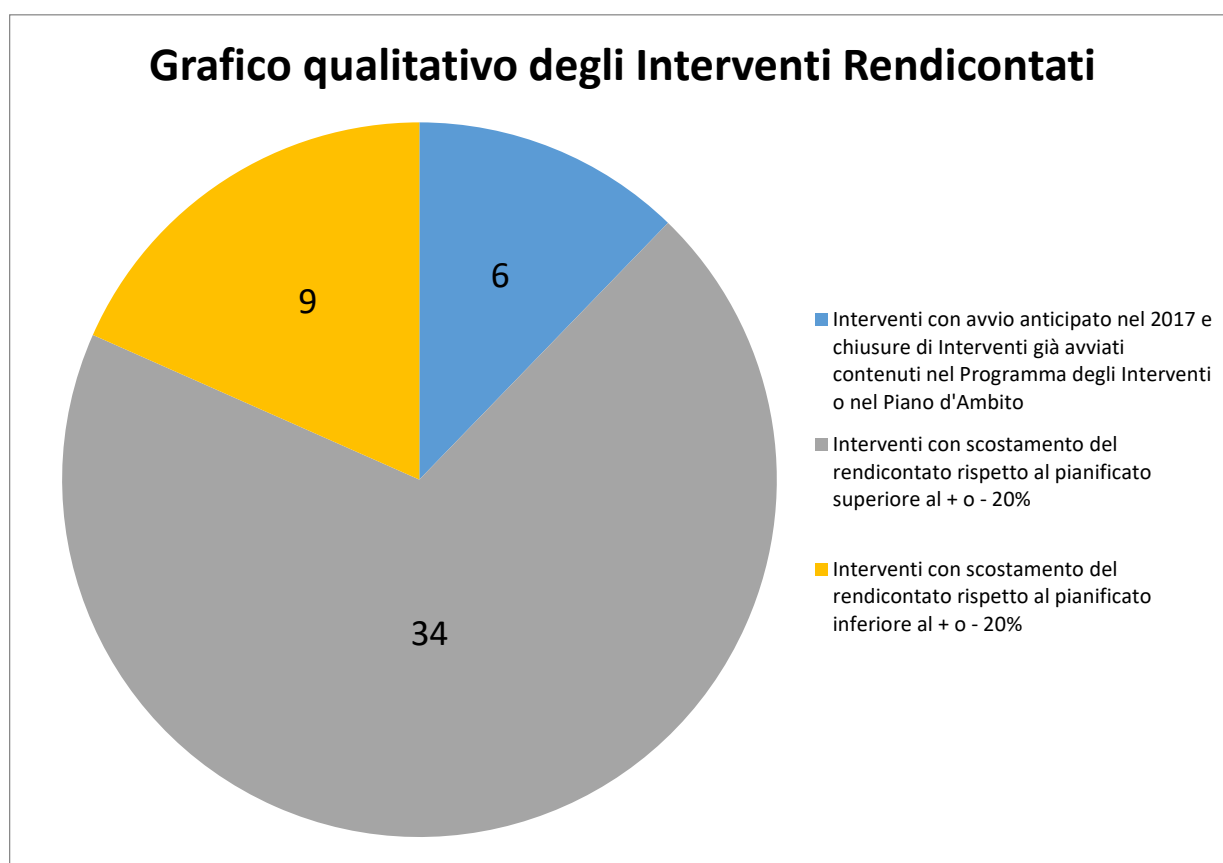


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2017 da Piano approvato
2014FEHA0018	SOLLEVAMENTO PIAZZALE BONZAGNI	FOGNATURA	Cento	95.000
2014FEHA0023	COLL. FOG DI VIA GAZZINELLA A CASUMARO	FOGNATURA	Cento	140.000
2014FEHA0027	SUBURBANA - INTERFERENZE RETE IDRICA	ACQUEDOTTO	Ferrara	139.000
2014FEHA0035	REVAMPING IMPIANTO OZONO PONTELAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara	8.000
2014FEHA0038	ELIMINAZIONE DEPURATORE DI FOCOMORTO E COLLEGAMENTI	DEPURAZIONE	Ferrara	187.000
2014FEHA0043	COLLEGAMENTO BAURA A IMP.CONTRAPO'- ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO	FOGNATURA	Ferrara	10.000
2014FEHA0064	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	10.000
2014FEHA0070	MODELLAZIONE FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	10.000
2014FEHA0073	COLLEGAMENTO SCARICHI NON DEPURATI DI QUARTIERE	FOGNATURA	Portomaggiore	50.000
2015FEHA0009	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MONESTIROLO	FOGNATURA	Ferrara	10.000
2015FEHA0012	COLLEGAMENTO V.CIPRESSINA E PANIGALLI-DENORE	FOGNATURA	Ferrara	5.000
2017FEHA0001	COLLETTAMENTO SCARICO "SCUOLE" VIA SOSTEGNO A CONA	FOGNATURA	Ferrara	5.000
2017FEHA0006	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SANT'AGOSTINO I STRALCIO	FOGNATURA	Sant'Agostino	10.000
2017FEHA0012	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA LONGASTRINO	FOGNATURA	Argenta	10.000
			<b>TOTALE</b>	<b>689.000</b>

TAB.3 Interventi previsti nel 2017 e non realizzati o terminati contabilmente nell'anno 2016 (Percentuale di scostamento pari a -100%)

HERA s.p.a.  
Consuntivo Investimenti anno 2017 bacino Ex - ATO 6 Ferrara

					STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				
ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014FEHA0001	RIFAC. TRATTO RETE ARGENTA-FILO- MENATE 3	ACQUEDOTTO	Argenta	Gestore		0	0	0	246.119,44	0	246.119,44	100%	INTERVENTO REALIZZATO E TERMINATO NEL 2017. SCOSTAMENTO CONSEQUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL'ANNO 2016 GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DEL 2016
2014FEHA0002	BONIFICA VIA ANIME A SAN NICOL?- ASSE3	ACQUEDOTTO	Argenta	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0003	POTENZIAMENTO IN VIA ROSSINI- ASSE3	ACQUEDOTTO	Argenta	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0004	RIFAC. TRATTO RETE ARGENTA-FILO- MENATE 2 (via Parata)	ACQUEDOTTO	Argenta	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0005	POT. ACQ FRAZIONE S.M. CODIFUME - 1ø STR	ACQUEDOTTO	Argenta	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0006	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI LONGASTRINO	DEPURAZIONE	Argenta	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0007	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI FILO	DEPURAZIONE	Argenta	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0008	NUOVO ATTRAV FERROV FOG AD ARGENTA	FOGNATURA	Argenta	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0009	DISMISSIONE IMPIANTO BOCCALONE- COLLETTAMENTO DEP.ARGENTA	FOGNATURA	Argenta	Gestore		315.000,00	0	315000	17.582,54	0	17.582,54	-94%	PROLUNGAMENTO TEMPSTICHE PER ACCORDI BONARI.
2014FEHA0010	DISM.IMP.CONSANDOLO- COLLETT.DEP.ARGENTA	FOGNATURA	Argenta	Gestore		329.000,00	0	329000	13.556,72	0	13.556,72	-96%	RIPROGRAMMAZIONE PARZIALE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE PER OVVIARE AD UN NUMERO ELEVATO DI PROPRIETA' DISSENZIENTI CHE AVREBBE GENERATO UN PROLUNGATO ITER ESPROPRIATIVO
2014FEHA0011	ADEGUAMENTO FOG SAN BIAGIO	FOGNATURA	Argenta	Gestore		230.000,00	0	230000	4.941,67	0	4.941,67	-98%	SLITTAMENTO PROGETTAZIONE IN ATTESA DEGLI ACCORDI PER LA SOLUZIONE PROGETTUALE CON CONSORZIO DELLA BONIFICA
2015FEHA0001	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO BANDO ARGENTA	FOGNATURA	Argenta	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2015FEHA0002	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA S.MARIA CODIFIUME	FOGNATURA	Argenta	Gestore		120.000,00	0	120000	236.196,12	0	236.196,12	97%	IN ACCORDO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANTICIPATI LAVORI ORIGINARIAMENTE PREVISTI PER IL 2018. INTERVENTO CONCLUSO.
2015FEHA0003	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZIONE BANDO	FOGNATURA	Argenta	Gestore		50.000,00	0	50000	187.561,21	0	187.561,21	275%	IN ACCORDO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANTICIPATI LAVORI ORIGINARIAMENTE PREVISTI PER IL 2018. INTERVENTO CONCLUSO.
2015FEHA0004	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO S.BIAGIO ARGENTA	FOGNATURA	Argenta	Gestore		0	0	0	0	0	0		

HERA s.p.a.  
Consuntivo Investimenti anno 2017 bacino Ex - ATO 6 Ferrara

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento	
2017FEHA0012	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA LONGASTRINO	FOGNATURA	Argenta	Gestore	210.000,00	10.000,00	0	10000	0	0	0	-100%	POSTICIPATI PROGETTAZIONE E INIZIO LAVORI AL 2018 PER NECESSITA' DI INDAGINI PIU' APPROFONDITE ED ATTIVITA' DI RILIEVO SULLA RETE ESISTENTE.
2014FEHA0012	NUOVI POZZI E INCREMENTO CONCESSIONE CENTRALE STELLATA	ACQUEDOTTO	Bondeno	Gestore		145.000,00	0	145000	626,23	0	626,23	-99,57%	RITARDI CAUSATI DA LUNGO ITER AUTORIZZATIVO (PRIMA RICHIESTA DEL 25/11/2015 PROT. 138582, FATTI INCONTRI E INVIATI VARI SOLLECITI DA HERA AD ATERSIR (TITOLARE DELLA CONCESSIONE POZZI) E DA ATERSIR AD ARPAE. ANCORA IN ATTESA DI RISPOSTA DA ARPAE)
2014FEHA0013	COLLET SCARICHI V.PIRONI ALFIERI RENO	DEPURAZIONE	Bondeno	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0014	SCARICHI NON DEP L 152-VIA MATTEOTTI	FOGNATURA	Bondeno	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2015FEHA0005	SOSTITUZIONE POZZI GOLENALI STELLATA	ACQUEDOTTO	Bondeno	Gestore		65.000,00	0	65000	23.079,83	0	23.079,83	-64%	NEL 2016 E' STATA COMPLETATA LA SOSTITUZIONE DI UN POZZO CROLLATO. NEL 2017 SONO STATE ESEGUITE LE ATTIVITA' DI MESSA IN ESERCIZIO. ATTUALMENTE E' PREVISTO IL RECUPERO DI UN 'ULTERIORE INFRASTRUTTURA, NON INIZIALMENTE PREVISTA NELLA PIANIFICAZIONE IN QUANTO TRATTASI SOSTANZIALMENTE DI ATTIVITA' MANUTENTIVE.
2017FEHA0004	REVAMPING IMPIANTISTICO CENTRALE STELLATA	ACQUEDOTTO	Bondeno	Gestore	250.000,00	0	0	0	0	0	0		
2017FEHA0013	COLLEGAMENTO FOGNARIO BORGO SCALA ALLA RETE DEL DEPURATORE SANTISSIMO	FOGNATURA	Bondeno	Gestore	120.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0015	REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE BUONACOMPRA	DEPURAZIONE	Cento	Gestore		485.000,00	0	485000	58.000,00	0	58.000,00	-88%	RITARDI CAUSATI DA LUNGO ITER AUTORIZZATIVO GIA' SEGNALATO NEL 2016 - 15/06/2015 AD ATERSIR - RICHIESTA APPROVAZIONE PROGETTO - 07/11/2017 DA ATERSIR - APPROVAZIONE PROGETTO
2014FEHA0016	SISTEMA CASUMARO (Amplimento del depuratore di Casumaro-nuovo impianto)	DEPURAZIONE	Cento	Gestore		350.000,00	0	350000	522.696,94	0	522.696,94	49%	INTERVENTO IN REALIZZAZIONE. COSTI 2017 COERENTI CON L'AVANZAMENTO DEL CANTIERE. LO SCOSTAMENTO E' LEGATO ALLA RIPIANIFICAZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI, GIA' MOTIVATA NELLE NOTE 2016
2014FEHA0017	SOLLEVAMENTO VIA XX SETTEMBRE	FOGNATURA	Cento	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0018	SOLLEVAMENTO PIAZZALE BONZAGNI	FOGNATURA	Cento	Gestore		95.000,00	0	95000	0	0	0	-100%	INTERVENTO RIPIANIFICATO A VALLE DEGLI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEGLI ALLAGAMENTI IN CARICO AL CONSORZIO DI BONIFICA, CHE NE HANNO CONSEGUENTEMENTE MODIFICATO LA PRIORITA' IN QUANTO SI SONO RIDOTTE LE CARENZE ALL'ORIGINE DELL'APERTURA DELL'ID. VERRA' AGGIORNATA LA MODELLAZIONE DEL SISTEMA AL FINE DI INDIVIDUARE L'INTERVENTO CHE PRODUCA I MAGGIORI BENEFICI IN TERMINI DI DIMINUZIONE DEGLI ALLAGAMENTI
2014FEHA0019	COLLETTAMENTO ALBERONE A DEPURATORE BUONACOMPRA	FOGNATURA	Cento	Gestore		180.000,00	0	180000	22.543,24	0	22.543,24	-87%	SLITTAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER SEGUIRE LE TEMPISTICHE DEL DEPURATORE BUONACOMPRA ID 2014FEHA0015 (VEDI RELATIVA NOTA DI SCOSTAMENTO LEGATO AD UN ITER APPROVATIVO LUNGO)
2014FEHA0020	COLLETTAMENTO PILASTRELLO A BUONACOMPRA	FOGNATURA	Cento	Gestore		300.000,00	0	300000	18.653,77	0	18.653,77	-94%	MINORI ONERI IN QUANTO L' INTERVENTO E' STATO OGGETTO DI RIVISITAZIONE PROGETTUALE E CONSEGUENTEMENTE SUDDIVISO IN 2 STRALCI CHE FANNO RIFERIMENTO AD ADEGUAMENTI DI 2 AGGLOMERATI DI DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA (DIVERSAMENTE PRIORITARI SECONDO LE NUOVE TEMPISTICHE DETTATE DA DGR 201/2016). IN QUESTO ID SI REALIZZA L'INTERVENTO DI COLLEGAMENTO PILASTRELLO A BUONACOMPRA. IL SECONDO TRALCIO SI REALIZZA CON ID 2017FEHA0008.

HERA s.p.a.  
Consuntivo Investimenti anno 2017 bacino Ex - ATO 6 Ferrara

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento	
2014FEHA0021	COLLEGAMENTO DI RENO C. A NUOVO DEPURATORE DI CASUMARO	FOGNATURA	Cento	Gestore		0	0	0	28.979,06	0	28.979,06	100%	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE E PIANIFICATO IN COERENZA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DEPURATORE DI CASUMARO (ID 2014FEHA0016) IL CUI CANTIERE E' STATO AVVIATO NEL 2017.
2014FEHA0022	COLL. FOG DI VIA ROSSINI AD ALBERONE	FOGNATURA	Cento	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0023	COLL. FOG DI VIA GAZZINELLA A CASUMARO	FOGNATURA	Cento	Gestore		140.000,00	0	140000	0	0	0	-100%	SLITTAMENTO DELLA PROGETTAZIONE CAUSA RIPIANIFICAZIONE IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITA' E ALL'URGENZA DELL'INTERVENTO.
2015FEHA0006	RISANAMENTO AMBIENTALE SCOLO CANALAZZO	FOGNATURA	Cento	Gestore		60.000,00	0	60000	1.500,00	0	1.500,00	-98%	PROGETTAZIONE SOSPESA PER NECESSITA' DI CONCORDARE COL CONSORZIO DI BONIFICA LE MODALITA' REALIZZATIVE DEGLI ALLACCIAMENTI DELLE UTENZE PRIVATE CHE ATTUALMENTE RECAPITANO NEL TRATTO DI CANALE OGGETTO DEL RISANAMENTO.
2017FEHA0008	COLLETTAMENTO MOLINO ALBERGATI A BUONACOMPRA	FOGNATURA	Cento	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0024	MANUT.GIUNTI BACINILAGUNAGGIO E DRENAGGI	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		10.000,00	0	10000	11.268,46	0	11.268,46	13%	
2014FEHA0025	RIFACIMENTO RETE IDRICA VIA LAVEZZOLA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0026	IMPLEMENTAZIONE AUTOMAZIONE PONTELAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		50.000,00	0	50000	108.621,49	0	108.621,49	117%	INTERVENTO CONCLUSO. ANTICIPATI INTERVENTI PREVISTI NELLE ANNUALITA' SUCCESSIVE.
2014FEHA0027	SUBURBANA - INTERFERENZE RETE IDRICA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		139.000,00	0	139000	0	0	0	-100%	IN ATTESA DELLA REVISIONE DEL PROGETTO DELLA SUB-URBANA DA PARTE DI FER.
2014FEHA0028	DEMOLIZIONE PENSILE S.MARTINO, FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0029	NUOVI POZZI ED INCREMENTO CONCESSIONE POZZI ESISTENTI A PONTELAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	2.890,00	0	2.890,00	100%	ONERI DOVUTI AD INDAGINI PRELIMINARI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE VERA E PROPRIA E REALIZZAZIONE A PARTIRE DAL 2018 COME DA PIANO
2014FEHA0030	RINN.RETE IDRICA V. SALINGUERRA FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0031	RINN.RETE DN250-VIA VIAZZA BOARA FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0032	MAGLIATURA RETE - VIA LADINO-VIA FONDO RENO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0033	RINN.DN160 VIA PALMIRANO-FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		

HERA s.p.a.  
Consuntivo Investimenti anno 2017 bacino Ex - ATO 6 Ferrara

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento	
2014FEHA0034	RINN.RETE DN400 E DN250 VVIVALDI FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0035	REVAMPING IMPIANTO OZONO PONTELAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		8.000,00	0	8000	0	0	0	-100%	TRATTASI DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPIANIFICATO IN FUNZIONE DELLE EFFETTIVE NECESSITÀ IMPIANTISTICHE DELLA GESTIONE E DELLA TEMPISTICHE UTILI PER INTERVENIRE
2014FEHA0036	POTENZIAMENTO RETE ACQ. VIA ERCOLE DE ROBERTI	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0037	ADEG E POTENZ DEP DI GAIBANELLA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0038	ELIMINAZIONE DEPURATORE DI FOCOMORTO E COLLEGAMENTI	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore		187.000,00	0	187000	0	0	0	-100%	RALLENTAMENTO DELL'ATTIVITÀ PROGETTUALE PER NECESSITÀ DI RILIEVI INTEGRATIVI SULLA RETE FOGNARIA PER CORRETTA DEFINIZIONE DELLO STATO DI FATTO, DATA LA COMPLESSITA' DELL'INTERVENTO
2014FEHA0039	MANUTENZIONE A DUE SEDIMENTATORI SECONDARI DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0040	REVAMPING DIGESTORE ANAEROBICO DEPURATORE GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore		425.000,00	0	425000	105.900,92	0	105.900,92	-75%	DIVERSA DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEI COSTI LEGATA ALLA DIVERSA SOLUZIONE PROGETTUALE (DA REVAMPING A RICOSTRUZIONE)
2014FEHA0041	COLLEG A DEP DI V. VESCOVO E FORNO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0042	DISMISSIONE DEPURATORE DI BOARA E COLLEGAMENTO A FERRARA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	33.000,00	0	33.000,00	100%	MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI A RIPROGETTAZIONE OPERE NON CONCLUSE DA DITTA FALLITA. SLITTAMENTO ITER PER ATTESA PARERI SU OPERE DI VARIANTE
2014FEHA0043	COLLEGAMENTO BAURA A IMP.CONTRAPO'-ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		10.000,00	0	10000	0	0	0	-100%	SLITTAMENTO PER ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE DATI IN CORSO.
2014FEHA0044	COLLEGAMENTO DI CORLO E MALBORGHETTO DI CORREGGIO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0045	COLLETTORE DI VIA CERVELLA VIA CAVO DUCALE	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0046	SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA AEROPORTO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0047	MANUT IMP DI SOLL IN VIA COMACCHIO (S6)	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		

HERA s.p.a.  
Consuntivo Investimenti anno 2017 bacino Ex - ATO 6 Ferrara

					STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				
ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014FEHA0048	COLLEGAMENTO A POGGIO E ELIMINAZIONE IMP. DI MONTALBANO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		200.000,00	0	200000	62.350,41	0	62.350,41	-69%	SLITTAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA A CAUSA DELLA COMPLESSITÀ DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEGLI ACCORDI CON LE PROPRIETÀ INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA TUBAZIONE DI PROGETTO E DELL'ITER AUTORIZZATIVO, ATTIVATI NEL MAGGIO 2018.
2014FEHA0049	REVAMPING SOLLEVAMENTO VOLANO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0050	ADEGUAMENTO SIST FOG IN VIA POLLINA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0051	SUBURBANA-POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIA AEROPORTO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0052	COLLEGAMENTO ZONA STAZIONE-CONA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		152.000,00	0	152000	27.844,82	0	27.844,82	-82%	COME DA ACCORDI CON ARPAE (INCONTRO 29.08.2017), LA PROGETTAZIONE RIMANE SOSPESA IN ATTESA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DEP. GUALDO. SI PREVEDE AVVIO ITER AUTORIZZATIVO NEL 2019-2020, PROGETTO ESECUTIVO NEL 2020 ED ESECUZIONE NEL 2021.
2014FEHA0053	RINNOVO RETE VIA VOLANO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0054	POT. RETE FOGN. VIA ERCOLE DE ROBERTI	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0055	Realizzazione di un canale scolmatore delle acque meteoriche dal bacino di drenaggio urbano afferente alla via Aeroporto	FOGNATURA	Ferrara	ACOSEA Impianti		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0083	SUBURBANA-INTERFERENZE RETE FOGNARIA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0085	SOSTITUZIONE POZZO 21 CON NUOVO POZZO 21A	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0088	POTENZIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO S10 VIA FABBRI-VIA EVA E ADAMO	FOGNATURA	Ferrara	ACOSEA Impianti		0	0	0	0	0	0		
2015FEHA0007	SOSTITUZIONE POZZO GOLENALE PONTE LAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	84.991,02	0	84.991,02	100%	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLE MOTIVAZIONI GIÀ FORNITE NEL 2016. A CAUSA DI UN CROLLO CHE HA INTERESSATO UN POZZO LIMITROFO ALL'AREA DI INTERVENTO, SI È PROCEDUTO ALLA PERFORAZIONE DI N.2 NUOVI POZZI.
2015FEHA0008	REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA VIA PENAVERA - SAN MARTINO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	327,59	0	327,59	100%	INTERVENTO TECNICAMENTE TERMINATO. MANCANO ASFALTI E A SEGUIRE LA SEGNALETICA CHE VERRANNO REALIZZATI NEL 2018.
2015FEHA0009	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MONESTIROLO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		10.000,00	0	10000	0	0	0	-100%	POSTICIPATA PROGETTAZIONE IN ATTESA DI INDICAZIONI PUNTUALI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SULLE UTENZE DA SERVIRE.

HERA s.p.a.  
Consuntivo Investimenti anno 2017 bacino Ex - ATO 6 Ferrara

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento	
2015FEHA0010	DISCONNESSIONE COLLETTORE FOGNARIO V. BOLOGNA E SCOLO MAMBRO	FOGNATURA	Ferrara	ACOSEA Impianti		0	0	0	0	0	0		
2015FEHA0011	NUOVA ADDUTTRICE SUD - FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2015FEHA0012	COLLEGAMENTO V.CIPRESSINA E PANIGALLI-DENORE	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		5.000,00	0	5000	0	0	0	-100%	SLITTAMENTO PER ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE DATI IN CORSO
2017FEHA0001	COLLETTAMENTO SCARICO "SCUOLE" VIA SOSTEGNO A CONA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		5.000,00	0	5000	0	0	0	-100%	SLITTAMENTO PER ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE DATI IN CORSO
2017FEHA0003	REVAMPING IMPIANTISTICO CENTRALE MONESTIROLO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	120.000,00	0	0	0	0	0	0		
2017FEHA0005	REVAMPING LINEA OSSIDAZIONE 1 DEP.GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	450.000,00	450.000,00	0	450000	541.886,51	0	541.886,51	20%	MAGGIORI ONERI PER IMPREVISTI SORTI IN FASE DI INSTALLAZIONE DEI NUOVI COMPRESSORI CHE HANNO COMPORTATO LAVORI EDILI E PARZIALE RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE, INIZIALMENTE NON PROGRAMMATI.
2017FEHA0010	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA POROTTO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	100.000,00	10.000,00	0	10000	468,1	0	468,1	-95%	
2017FEHA0014	REALIZZAZIONE FOGNATURA VIA COPPARO - VIA DEI MORARI E COLLEGAMENTO AL DEPURATORE DI VIA GRAMICIA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	350.000,00	10.000,00	0	10000	5.887,37	0	5.887,37	-41%	
2017FEHA0015	COLLETTAMENTO DEGLI SCARICHI DI VIA MONTALE ALLA FOGNATURA DI VIA C. DIANA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	75.000,00	75.000,00	0	75000	3.911,74	0	3.911,74	-95%	POSTICIPATO INIZIO DEI LAVORI IN ATTESA DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE (SERVITU').
2017FEHA0016	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA PIAZZA ARIOSTEA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	60.000,00	0	0	0	0	0	0		
2017FEHA0017	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA VIA PORTA SAN PIETRO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	150.000,00	0	0	0	0	0	0		
2017FEHA0018	RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO VIA PORTA SAN PIETRO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	100.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0056	RINNOVO CONDOTTA - VADRIATICO-MASI TORELLO	ACQUEDOTTO	Masi Torello	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2015FEHA0013	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO MASI TORELLO	FOGNATURA	Masi Torello	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0057	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PRONTO INTERVENTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		1.000.000,00	0	1000000	1.093.322,46	0	1.093.322,46	9%	
2014FEHA0058	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		670.000,00	0	670000	987.871,74	0	987.871,74	47%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0059	RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		180.000,00	0	180000	217.614,53	0	217.614,53	21%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0060	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		80.000,00	0	80000	96.355,20	0	96.355,20	20%	



HERA s.p.a.  
Consuntivo Investimenti anno 2017 bacino Ex - ATO 6 Ferrara

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento	
2014FEHA0061	RINNOVO RETI PROGRAMMATO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		1.020.000,00	0	1020000	937.742,57	0	937.742,57	-8%	
2014FEHA0062	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		100.000,00	0	100000	107.168,28	0	107.168,28	7%	
2014FEHA0063	VERIFICHE SISMICHE IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		40.000,00	0	40000	151.470,89	0	151.470,89	279%	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L'ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 6. GLI IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL'ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. TERMINATI NEL 2017 L'ADEGUAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO FILTRI PONTELAGOSCURO E L'AGIBILITA' FABBRICATO POMPE PONTELAGOSCURO. IN AVVIO LA PROGETTAZIONE PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA TORRE DI ARGENTA
2014FEHA0064	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		10.000,00	0	10000	0	0	0	-100%	ID RICORSIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE. CREAZIONE NUOVI DISTRETTI, REALIZZAZIONE CAMERETTE PER L'INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO. L'AVANZAMENTO ANNUALE E' IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI DEI DISTRETTI GIA' ESISTENTI E ALL'OPPORTUNITA' DI IMPLEMENTARE ULTERIORI SVILUPPI; LA PIANIFICAZIONE IPOTIZZATA ANNUALMENTE E' DI LARGA MASSIMA
2014FEHA0065	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		720.000,00	0	720000	1.019.029,57	0	1.019.029,57	42%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0066	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		100.000,00	0	100000	104.079,84	0	104.079,84	4%	
2014FEHA0067	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALLACCI FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		350.000,00	0	350000	706.784,69	0	706.784,69	102%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0068	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		328.000,00	0	328000	396.743,39	0	396.743,39	21%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0069	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		50.000,00	0	50000	101.651,28	0	101.651,28	103%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0070	MODELLAZIONE FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		10.000,00	0	10000	0	0	0	-100%	INTERVENTO CONCLUSO. IMPORTO 2017 NON NECESSARIO
2014FEHA0071	RILIEVO RETI FOGNARIE	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		20.000,00	0	20000	23.984,46	0	23.984,46	20%	
2014FEHA0082	SOSTITUZIONE CONTATORI PARI CALIBRO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		60.000,00	0	60000	103.065,15	0	103.065,15	72%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CONTATORI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0086	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PRONTO INTERVENTO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		250.000,00	0	250000	327.012,47	0	327.012,47	31%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

HERA s.p.a.  
Consuntivo Investimenti anno 2017 bacino Ex - ATO 6 Ferrara

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento	
2014FEHA0087	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		50.000,00	0	50000	109.828,91	0	109.828,91	120%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2015FEHA0014	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.DEPURAZIONE-FE-ATO6	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		27.000,00	0	27000	43.016,27	0	43.016,27	59%	
2015FEHA0015	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.FOGNARI-FE-ATO6	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		72.000,00	0	72000	106.061,11	0	106.061,11	47%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2015FEHA0016	RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI FE-ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		100.000,00	0	100000	201.498,80	0	201.498,80	101%	QUESTO ID RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PENSILI. LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA PER SINGOLO ANNO INSERITA NEL PIANO E' DI LARGA MASSIMA; OGNI ANNO VENGONO ATTIVATE LE ATTIVITA RITENUTE NECESSARIE DAL SERVIZIO, TENENDO CONTO DELLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA DI TALI INTERVENTI. NEL 2017 SONO STATI AVVIATI I LAVORI PREVISTI NEL 2016 (VEDI NOTA ANNO PRECEDENTE) RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE AREA PENSILE QUARTESANA. NEL 2017 SONO ANCHE STATE AVVIATE LA ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE AREA PENSILE CASAGLIA.
2017FEHA0002	ADEGUAMENTO RETI DORSALI STELLATA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	400.000,00	0	0	0	0	0	0		
2017FEHA0009	INTERCONNESSIONE SISTEMA BOLOGNESE-FERRARESE-ATO 6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	290.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0072	POTENZIAMENTO IN VIA PONTE ROSSO-ASSE3	ACQUEDOTTO	Poggio Renatico	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0073	COLLEGAMENTO SCARICHI NON DEPURATI DI QUARTIERE	FOGNATURA	Portomaggiore	Gestore		50.000,00	0	50000	0	0	0	-100%	SLITTAMENTO PER ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE DATI IN CORSO
2014FEHA0074	SCARICHI NON DEPURATI DI RUNCO E COLLEGAMENTO A GAMBU	FOGNATURA	Portomaggiore	Gestore		0,00	0	0	0	0	0		
2014FEHA0075	RIN.RETE IDRICA V.MATTEOTTI-S.AGOSTINO	ACQUEDOTTO	Sant'Agostino	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0076	COLLEGAMENTO VIA MONTECASSINO E LIMITROFI A DOSSO	FOGNATURA	Sant'Agostino	Gestore		110.000,00	0	110000	115.816,94	0	115.816,94	5%	
2014FEHA0084	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO SAN CARLO	FOGNATURA	Sant'Agostino	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0089	POTENZIAMENTO RETE IDRICA S.AGOSTINO	ACQUEDOTTO	Sant'Agostino	ACOSEA Impianti		0	0	0	0	0	0		
2015FEHA0017	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA VIA MAZZINI-PONTE TUBO CER	FOGNATURA	Sant'Agostino	Gestore		50.000,00	0	50000	206.558,03	0	206.558,03	313%	IN ACCORDO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANTICIPATI LAVORI ORIGINARIAMENTE PREVISTI PER IL 2018. INTERVENTO CONCLUSO. MAGGIORI ONERI DOVUTI ALLE PRESCRIZIONI DI ARPAE, CHE HA IMPOSTO LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI BY-PASS DELLE ACQUE REFLUE ATTIVO H24.

HERA s.p.a.  
Consuntivo Investimenti anno 2017 bacino Ex - ATO 6 Ferrara

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento	
2017FEHA0006	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SANT'AGOSTINO I STRALCIO	FOGNATURA	Sant'Agostino	Gestore	200.000,00	10.000,00	0	10000	0	0	0	-100%	ALLUNGAMENTO DELLE TEMPISTICHE CON I PRIVATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI ACCORDI BONARI CON CONSEGUENTE RALLENTAMENTO DELL'ATTIVITÀ PROGETTUALE.
2017FEHA0007	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SANT'AGOSTINO II STRALCIO	FOGNATURA	Sant'Agostino	Gestore	50.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0077	ESTENSIONE IN VIA MANTOVA-ASSE3	ACQUEDOTTO	Vigarano Mainarda	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0078	POTENZIAMENTO RETE VIA RONDONA ASSE3	ACQUEDOTTO	Vigarano Mainarda	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0079	POTENZIAMENTO A VIGARANO PIEVE- ASSE3	ACQUEDOTTO	Vigarano Mainarda	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0080	COLLETTORE VIGARANO PIEVE AL DEPURATORE FERRARA I STRALCIO	FOGNATURA	Vigarano Mainarda	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0081	COLLETTORE VIGARANO PIEVE AL DEPURATORE FERRARA II STRALCIO	FOGNATURA	Vigarano Mainarda	Gestore		247.000,00	0	247000	81.303,71	0	81.303,71	-67%	LAVORI AVVIATI. LO SCOSTAMENTO 2017 E' CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE GIÀ MOTIVATA NELLE NOTE DELL' ANNUALITA' PRECEDENTE
2017FEHA0011	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA QUARTIERE VIA ARIOSTO	FOGNATURA	Vigarano Mainarda	Gestore	20.000,00	0	0	0	0	0	0		
2015FEHA0018	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO GUALDO	FOGNATURA	Voghiera	Gestore		0	0	0	0	0	0		
						<b>10.324.000</b>	<b>0</b>	<b>10.324.000</b>	<b>9.609.365</b>	<b>0</b>	<b>9.609.365</b>		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 3 del 1 marzo 2019

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2017.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato  
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 1 marzo 2019

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ferrara  
F.to Andrea Marchi

Il segretario verbalizzante  
F.to Pier Luigi Maschietto

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 11 luglio 2019
