

CLFE/2019/4 del 1 marzo 2019

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore CADF S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2017**

IL COORDINATORE
F.to Andrea Marchi

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

CLFE/2019/4

L'anno **2019** il giorno uno del mese di marzo alle ore 10,30 presso la Sala Torre San Paolo della Provincia di Ferrara, si è riunito il Consiglio Locale di Ferrara convocato con lettera PG.AT/2019/1391 del 25/02/2019.

Risultano presenti all'appello:

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI FERRARA	Paron Barbara	Presidente	SI'	10,0000
COMUNE DI ARGENTA	Chiarini Marco	Assessore	SI'	5,4468
COMUNE DI BONDENO	Vincenzi Marco	Assessore	SI'	3,8388
COMUNE DI CENTO	Toselli Fabrizio	Sindaco	SI'	8,3318
COMUNE DI CODIGORO				3,2139
COMUNE DI COMACCHIO	Fantinuoli Denis	Vice-sindaco	SI'	5,5648
COMUNE DI COPPARO				4,2744
COMUNE DI FERRARA	Ferri Caterina	Assessore	SI'	30,7476
COMUNE DI FISCAGLIA				2,5563
COMUNE DI GORO				1,2675
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA				1,0631
COMUNE DI LAGOSANTO				1,5097
COMUNE DI MASI TORELLO				0,9176
COMUNE DI MESOLA				2,0111
COMUNE DI OSTELLATO	Marchi Andrea	Sindaco	SI'	1,8537
COMUNE DI POGGIO RENATICO	Fini Serena	Assessore	SI'	2,5918
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Vacchi Alessandro	Assessore	SI'	3,1672
COMUNE DI RIVA DEL PO				2,6996
COMUNE DI TERRE DEL RENO	Lodi Roberto	Sindaco	SI'	3,1723
COMUNE DI TRESIGNANA				2,4375
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	Paron Barbara	Sindaco	SI'	2,0778
COMUNE DI VOGHIERA	Bandiera Dante	Assessore	SI'	1,2565

Presenti n. 12	pari a quote	78,0491
Assenti n. 12	pari a quote	21,9509

Riconosciuta la validità della seduta Andrea Marchi, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore CADF S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2017

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- l'art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”;

premessso che:

- l'art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio d'Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
- l'art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

considerato che:

- con deliberazione n.5 del 16 dicembre 2015 del Consiglio locale di Ferrara è stato approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore CADF S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 44 del 26 luglio 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Ferrara, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- tale ultima deliberazione inoltre dispone che:
 - o entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - o il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che:

- il gestore CADF S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2017 attraverso il software ARSI;

rilevato che:

- durante il 2017 non è stato proposto alcun nuovo intervento che necessiti di ratifica da parte del Consiglio locale ai sensi della delibera CAMB 75/2017;
- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell'anno 2017 risultano essere inferiori di 1.519.217 euro rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 vigente;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che le motivazioni fornite dal gestore in merito agli scostamenti segnalati sono risultate ammissibili tranne che per cinque interventi;
- che per cinque interventi per i quali le motivazioni non sono state ritenute esaustive l'Agenzia ha diffidato il gestore a fornire maggiori elementi a giustificazione dei ritardi evidenziati nella realizzazione;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto pertanto:

- di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di riservarsi di procedere nei confronti del gestore CADF s.p.a. qualora lo stesso non fornisca le informazioni richieste o nel caso si rilevi una responsabilità del gestore nel ritardo sulla realizzazione degli investimenti;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 12 (quote 78,0491), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 per il gestore CADF S.p.A. per il bacino tariffario di Ferrara come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di riservarsi di procedere nei confronti del gestore CADF s.p.a. qualora lo stesso non fornisca le informazioni richieste tramite diffida scritta o nel caso si rilevi una responsabilità del gestore nel ritardo sulla realizzazione degli investimenti;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2017
Gestore: CADF s.p.a.**

12 novembre 2018

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2017

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2017, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Ferrara n.5 del 16 Dicembre 2015, che il gestore CADF ha trasmesso tramite il portale di rendicontazione denominato ARSI.

PIANIFICATO 2017		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2017	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 6.348.000	-€ 3.859.217	€ 2.488.783	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contribuito Pianificato [B]	€ 2.340.000	-€ 2.340.000	€ 0	Importo Contribuito a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 4.008.000	-€ 1.519.217	€ 2.488.783	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore CADF in termini economici abbia effettuato nel corso del 2017 investimenti netti inferiori rispetto a quanto era stato preventivato per un importo di € 1.519.217; come si vedrà meglio in seguito a dare un certo contributo in uno scostamento di tale entità è stato il mancato avvio di 6 interventi pianificati (cfr. Tab. 2) per un importo programmato complessivo pari a € 1.285.000.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

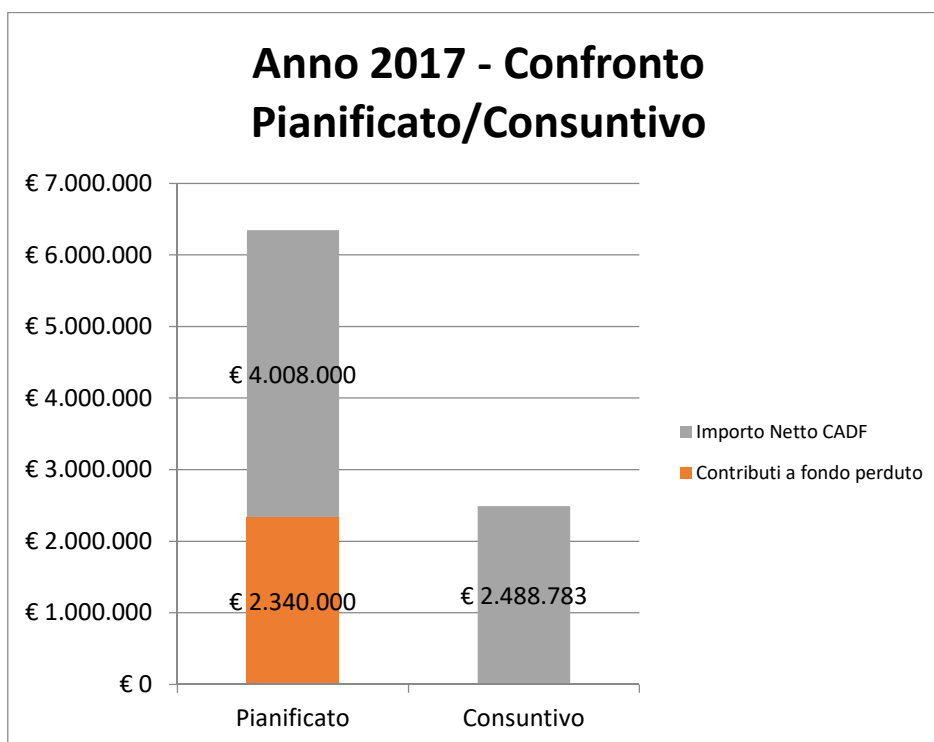


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e tra tutti gli interventi per i quali era richiesta una nota giustificativa sullo scostamento il gestore per cinque di essi ha fornito una motivazione che non è stata ritenuta esaustiva e nella tabella sono stati riportati gli identificativi di tali interventi.

Numero di interventi programmati nel 2017: 20

Numero di interventi rendicontati nel 2017: 20

	Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2017	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2017	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati o conclusi contabilmente nell'anno 2016 (% di scostamento pari al -100%)	6	€ 0	€ 1.285.000	3	2014FECEF0017; 2014FECEF0018; 2015FECEF0002	
<i>di cui interventi conclusi contabilmente anticipatamente nell'anno precedente</i>	0	€ 0	€ 0	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		
Interventi con avvio anticipato nel 2017 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	6	€ 408.255	€ 0	0		
Interventi avviati nel 2017 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0	0		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	12	€ 1.358.010	€ 4.273.000	2	2014FECEF0010; 2014FECEF0013	
<i>di cui interventi con scostamento inferiore al limite di franchigia (€ 20.000) come riportato nella Delibera del Consiglio d'Ambito n. 12/2017</i>	0	€ 0	€ 0	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		

Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	2	€ 722.517	€ 790.000	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		
--	---	-----------	-----------	-----------------------------------	--	--

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che gli interventi non avviati, per il cui dettaglio si veda la Tabella 3, sono stati 6 per un importo complessivo pari a € 1.285.000 e che inoltre rispetto ai 20 interventi totali per i quali è stata presentata la rendicontazione, per un 60% di essi lo scostamento tra quanto preventivato e quanto rendicontato è stato superiore al + o – 20% e nel complesso quanto rendicontato per tali interventi (€ 1.358.010) è molto inferiore a ciò che era stato preventivato (€ 4.273.000), anche se la maggior parte di essi erano interventi quasi interamente coperti da contributo a fondo perduto.

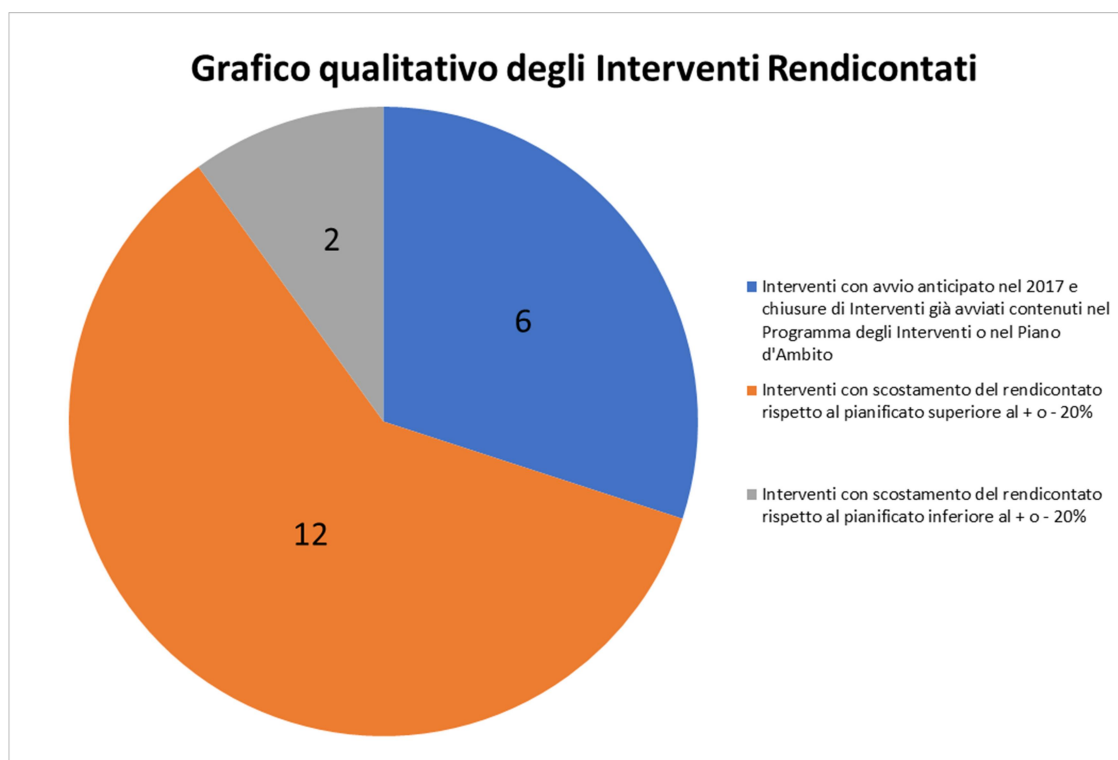


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2017 da Piano approvato
2014FECEF0004	Ristrutturazione del pensile di Comacchio	ACQUEDOTTO	Comacchio	100.000,00
2014FECEF0017	Potenziamento depuratore di Ambrogio-Via Bonfieni ai sensi del p.to 7 - tab. 3 del D.G.R. 1053/03	DEPURAZIONE	Copparo	122.500,00
2014FECEF0018	Potenziamento depuratore di Ambrogio-Via Vallazza ai sensi del p.to 7 - tab. 3 del D.G.R. 1053/04	DEPURAZIONE	Copparo	122.500,00
2015FECEF0002	Riparazione DN 600 sotto S.P. Granlinea a Corte Schiavina	ACQUEDOTTO	Codigoro	170.000,00
2015FECEF0010	Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - Intervento S5 Loc. Porto Garibaldi Nord	DEPURAZIONE	Comacchio	720.000,00
2015FECEF0020	Verifiche sismiche centrali di potabilizzazione	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	50.000,00
			TOTALE	1.285.000

TAB.3 Interventi previsti nel 2017 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014FEFC0001	Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie nella centrale di potabilizzazione di Serravalle	ACQUEDOTTO	Berra	Gestore	788.967,00	115.000,00		115.000,00	32.663,09		32.663,09	-72%	Codice contenitore. Nel piano investimenti aziendale 2017 risultano programmati con codice specifico due interventi per € 65.000, che sono stati realizzati per € 32.663,09 con uno scostamento del 50%. Lo scostamento si è verificato per il mancato completamento del programma di verifiche per l'adeguamento degli impianti elettrici per difficoltà organizzative interne. Le opere di adeguamento sono in corso di realizzazione nel corrente anno.
2015FEFC0001	Serravalle: revisione rete scolante del Consorzio di Bonifica, parte CADF fornitura e posa scatolare	FOGNATURA	Berra	Gestore	307.000,00	0,00		0,00	305.846,99		305.846,99	100%	opera pianificata nel 2016 e realizzata nel 2017
2014FEFC0022	Impianto sperimentale; recupero vecchia stazione presso depuratore Codigoro	DEPURAZIONE	Codigoro	Gestore	80.000,00	0,00		0,00	12.260,27		12.260,27	100%	Intervento eseguito nel 2016 con alcune code di lavorazione eseguite in modo imprevisto nel 2017
2015FEFC0002	Riparazione DN 600 sotto S.P. Granlinea a Corte Schiavina	ACQUEDOTTO	Codigoro	Gestore	180.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00		0,00	-100%	opera pianificata nel 2017 ed in corso di realizzazione nel 2018
2015FEFC0003	Ricostruzione condotta di via Pambianco	FOGNATURA	Codigoro	Gestore	100.000,00			0,00			0,00		
2014FEFC0004	Ristrutturazione del pensile di Comacchio	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	250.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00		0,00	-100%	Opera posticipata ed in corso di progettazione, per valutazioni in merito alla sua necessità riferita anche all'entità delle opere di adeguamento sismico in relazione al rapporto costi/benefici della funzionalità della struttura per la rete idrica.
2014FEFC0011	Comacchio-Lido Pomposa, via Marfisa d'Este, sostituzione condotta m 650	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	190.000,00			0,00			0,00		
2014FEFC0015	Comacchio-Lido degli Scacchi, via Plutone, rifacimento di condotta fognaria (cofinanziamento con Comune)	FOGNATURA	Comacchio	Gestore	100.000,00			0,00			0,00		
2015FEFC0004	Volania via Valmana - sostituzione DN 60 in c.am. Con PVC DE 75 ml 3.000	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	110.000,00			0,00			0,00		
2015FEFC0005	Porto Garibaldi: sostituzione tronco di condotta DN 700 in acciaio inox ancorato al ponte della S.S. Romea sul Canale Navigabile	FOGNATURA	Comacchio	Gestore	200.000,00			0,00			0,00		
2015FEFC0006	Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - Intervento S1 Lido Nazioni - Via Nazioni Unite	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	1.200.000,00	250.000,00	230.000,00	20.000,00	217.682,18		217.682,18	-13%	
2015FEFC0007	Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	1.650.000,00	1.330.000,00	1.030.000,00	300.000,00	441,96		441,96	-99,97%	Intervento riprogrammato con l'ente finanziatore E-R in successive annualità, rimodulando il cronoprogramma delle erogazioni finanziarie, in corso di progettazione
2015FEFC0008	Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - Intervento S3 Loc. Lido Pomposa	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	770.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	121.274,46		121.274,46	21%	Invervento a sviluppo pluriennale. Il cantiere si è sviluppato con una progressione leggermente superiore alle previsioni
2015FEFC0009	Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - Intervento S4 Loc. San Giuseppe	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	950.000,00	640.000,00	560.000,00	80.000,00	12,72		12,72	-99,998%	Intervento riprogrammato con l'ente finanziatore E-R in successive annualità, rimodulando il cronoprogramma delle erogazioni finanziarie, in corso di progettazione
2015FEFC0010	Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - Intervento S5 Loc. Porto Garibaldi Nord	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	1.770.000,00	720.000,00	420.000,00	300.000,00	0,00		0,00	-100%	Intervento riprogrammato con l'ente finanziatore E-R in successive annualità, rimodulando il cronoprogramma delle erogazioni finanziarie, in corso di progettazione
2015FEFC0011	Depuratore di Comacchio: realizzazione scolmatore di prima pioggia nel canale collettore Adige	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	335.000,00	150.000,00		150.000,00	355.774,13		355.774,13	137%	Opera realizzata in termini più complessi di quanto inizialmente previsto per varie problematiche, tra cui la presenza di una discarica di inerti non pericolosi nel sito, affinamento dei sistemi di disinfezione e potenziamento delle linee elettriche e dati interne del depuratore . In corso 2017 il budget del centro di costo è stato aggiornato a € 365,000.
2017FEFC0001	Capoluogo: depuratore: rifacimento ed efficientamento pretrattamenti e sed. primaria	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	660.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2017FEFC0002	Capoluogo: depuratore: quinta linea trattamento da 40.000 AE	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	2.900.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2014FEFC0008	Sostituzione ml 1.500 acquedotto Copparo-Ambrogio	ACQUEDOTTO	Copparo	Gestore	2.288,00			0,00			0,00		
2014FEFC0017	Potenziamento depuratore di Ambrogio-Via Bonfieni ai sensi del p.to 7 - tab. 3 del D.G.R. 1053/03	DEPURAZIONE	Copparo	Gestore	252.500,00	122.500,00		122.500,00	0,00		0,00	-100%	opera riprogrammata nel 2018
2014FEFC0018	Potenziamento depuratore di Ambrogio-Via Vallazza ai sensi del p.to 7 - tab. 3 del D.G.R. 1053/04	DEPURAZIONE	Copparo	Gestore	252.500,00	122.500,00		122.500,00	0,00		0,00	-100%	opera riprogrammata nel 2018
2015FEFC0012	Costruzione condotte di sfioro acque bianche - Canali Naviglio e Brusabb	FOGNATURA	Copparo	Gestore	350.000,00			0,00			0,00		
2014FEFC0009	Formignana, via Prov.le Copparo-Migliarino, sostituzione condotta	ACQUEDOTTO	Formignana	Gestore	288.000,00			0,00	27.848,68		27.848,68	100%	Intervento eseguito nel 2016 con alcune code di lavorazione eseguite in modo imprevisto nel 2017
2015FEFC0014	Rifacimento e razionalizzazione del sistema fognario della Zona Industriale	FOGNATURA	Goro	Gestore	350.000,00			0,00			0,00		
2015FEFC0015	Sostituzione m. 1200 condotta idrica via De Bernardi e via Bonaglia 5° traversa	ACQUEDOTTO	Jolanda di Savoia	Gestore	296.000,00	148.000,00		148.000,00	80.019,09		80.019,09	-46%	Intervento concluso nel 2017 con un costo di € 99.639,39, conseguendo notevoli economie grazie alla progettazione e direzione lavori interna ed esecuzione diretta.

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014FECE0010	Massafiscaglia, via Castagnina, sostituzione condotta m 2550	ACQUEDOTTO	Massa Fiscaglia	Gestore	430.000,00	170.000,00		170.000,00	1.477,07		1.477,07	-99%	Opera pianificata nel 2017 ed in corso di realizzazione nel 2018
2015FECE0013	Modifica e potenziamento del sistema di scolo acque meteoriche - Canale Madonna a Migliarino (CADF/Consorzio Bonifica/Comune)	FOGNATURA	Massa Fiscaglia	Gestore	150.000,00			0,00			0,00		
2015FECE0016	Via Nuova Corriera - sostituzione DN 125 in c.am. Con PVC DE 140 ml 2.900	ACQUEDOTTO	Mesola	Gestore	170.000,00			0,00			0,00		
2015FECE0017	Adeguamento funzionale di due tratti fognari nell'abitato di Mesola e di Ariano	FOGNATURA	Mesola	Gestore	55.000,00	0,00		0,00	54.951,10		54.951,10	100%	Opera pianificata nel 2016 e realizzata nel 2017
2014FECE0005	Realizzazione punti di dosaggio del passivante Alifos LCZ sul DN 800 Ro-Collinara	ACQUEDOTTO	Migliarino	Gestore				0,00			0,00		
2014FECE0003	Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie negli impianti di accumulo e sollevamento esistenti della rete idropotabile	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.097.672,00	180.000,00		180.000,00	134.697,59		134.697,59	-25%	Codice contenitore. Nel piano investimenti aziendale 2017 risultano programmati con codice specifico interventi per € 143.000, che sono stati realizzati per € 134.697,59 con uno scostamento del 5,6%
2014FECE0006	Manutenzioni straordinarie, piccoli estendimenti e sostituzioni nella rete primaria	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	4.629.477,00	540.000,00		540.000,00	504.835,27		504.835,27	-7%	
2014FECE0007	Interventi di dettaglio sulla rete secondaria	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	40.000,00			0,00			0,00		
2014FECE0012	Ricerca perdite nella rete idropotabile	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.648.775,00	300.000,00		300.000,00	178.116,64		178.116,64	-41%	Contatori ed altre componenti da approvvigionare direttamente e mettere in opera con personale interno. Per esigenze organizzative interne la posa è stata differita nel 2018. Nel 2017 acquistati i contatori ed effettuate attività preliminari per la ricerca perdite.
2014FECE0013	Manutenzioni straordinarie, piccoli estendimenti e sostituzioni nelle reti fognarie	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	1.118.708,00	190.000,00		190.000,00	89.350,97		89.350,97	-53%	Interventi in gran parte programmati in esecuzione diretta con personale che è addetto anche alla conduzione delle reti e pronto intervento. Non è stato possibile realizzare interamente il programma di attività previsto a seguito di problematiche organizzative interne aziendali.
2014FECE0014	Adeguamento funzionale e potenziamento della rete scolante delle acque bianche nell'abitato di Mesola	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	151.673,00			0,00			0,00		
2014FECE0016	Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie negli impianti di depurazione e sollevamenti fognari	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	6.163.758,00	895.000,00		895.000,00	362.832,56		362.832,56	-59%	Codice contenitore di numerosi interventi. Sostanzialmente lo scostamento negativo si può ascrivere alla complessità di alcuni interventi significativi che non è stato possibile realizzare nell'anno di previsione ma che sono stati poi eseguiti o sono in corso di esecuzione nel 2018. I motivi sono ascrivibili in parte a problematiche organizzative interne nei confronti delle quali l'Azienda ha risposto con una riorganizzazione del Servizio Appalti e con un potenziamento di organico dell'Ufficio Tecnico ed in parte per cause specifiche variabili di caso in caso riguardanti necessità di revisioni progettuali, difficoltà nel completamento dell'iter approvativo o di acquisizione aree, e così via.
2014FECE0019	Altri interventi di adeguamento scarichi urbani ai sensi del p.to 7 - tab. 3 del D.G.R. 1053/03	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore				0,00			0,00		
2014FECE0021	Realizzazione del nuovo depuratore intercomunale di Migliarino e sistema di collettamento dei reflui di Migliaro e Ostellato (*)	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	535.872,00			0,00			0,00		
2014FECE0023	Realizzazione del nuovo depuratore intercomunale di Rovereto	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore				0,00			0,00		
2015FECE0020	Verifiche sismiche centrali di potabilizzazione	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	150.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00	-100%	Verifiche traslate nell'annualità 2018 per ridefinizione degli obiettivi. La risorsa risulta implementata e ridefinita nel 2018 con un fondo di € 100.000 sul codice 2014FECE0001 e due CDC P31A e P31B ed altre € 50.000 sul codice 2014FECE0016 e CDC P31C. Ne consegue che il codice 2015FECE0020 non ha più ragione di essere
2017FECE0003	Acquisto di mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori	TUTTI	Opere Pluricomunali	Gestore	240.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2017FECE0004	Laboratorio analisi: ammodernamento e nuove apparecchiature	TUTTI	Opere Pluricomunali	Gestore	120.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2017FECE0005	Adeguamenti normativi e verifiche impianti elettrici	TUTTI	Opere Pluricomunali	Gestore	120.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2014FECE0002	Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie nella centrale di potabilizzazione di Ro Ferrarese	ACQUEDOTTO	Ro Ferrarese	Gestore	603.123,00	55.000,00		55.000,00	1.350,00		1.350,00	-98%	Codice contenitore. Nel piano investimenti aziendale 2017 risulta programmato con codice specifico un solo intervento per € 38.000, progettato per € 30.000 e realizzato in gran parte nel 2018
2014FECE0020	Ro-Ruina, potenziamento sistema fognario e nuovo depuratore	DEPURAZIONE	Ro Ferrarese	Gestore	253.092,00			0,00			0,00		
2015FECE0018	Recupero con riperforazione pozzo n° 2	ACQUEDOTTO	Ro Ferrarese	Gestore	90.000,00	0,00		0,00	12		12,00	100%	Irrilevante: minime spese propedeutiche alla progettazione di un'opera programmata nel 2018

CADF s.p.a.
Consuntivo Investimenti annualità 2017

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2015FECF0019	Ro-Ruina, potenziamento sistema fognario - 2° stralcio	FOGNATURA	Ro Ferrarese	Gestore	150.000,00	0,00		0,00	7.335,88		7.335,88	100%	alcune spese tecniche propedeutiche alla esecuzione dell'intervento avvenuta nel 2018
					6.348.000	2.340.000		4.008.000	2.488.783	0	2.488.783		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 4 del 1 marzo 2019

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore CADF S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2017

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 1 marzo 2019

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ferrara
F.to Andrea Marchi

Il segretario verbalizzante
F.to Pier Luigi Maschietto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 11 luglio 2019
