

CLMO/2020/1 del 2 marzo 2020

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Approvazione del consuntivo degli investimenti 2018
per il gestore AIMAG S.p.A.**

IL COORDINATORE

F.to Enrico Diacci

CLMO/2020/1

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

L'anno **2020** il giorno 2 del mese di marzo alle ore 9.30 presso la sede della Provincia di Modena, si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato con lettera protocollo PG.AT/2020/0001773 del 25/02/2020.

Assume la presidenza il Coordinatore del Consiglio Locale che chiama Pier Luigi Maschietto, funzionario di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretario verbalizzante.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
BASTIGLIA	Elena Amaduzzi	Sindaco	SI	0,6622
BOMPORTO	Marcello Mandrioli	Assessore	SI	1,3444
CAMPOGALLIANO	Marcello Messori	Assessore	SI	1,1971
CAMPOSANTO	Giacomo Vincenzi	Assessore	SI	0,5660
CARPI	Riccardo Righi	Assessore	SI	8,1368
CASTELFRANCO EMILIA	Denis Bertoncelli	Assessore	SI	3,9305
CASTELNUOVO RANGONE			NO	1,8588
CASTELVETRO DI MODENA			NO	1,4922
CAVEZZO	Fabrizio Trevisi	Assessore	SI	1,0414
CONCORDIA SULLA SECCHIA			NO	1,2507
FANANO			NO	0,5491
FINALE EMILIA	Beatrice Ferrarini	Assessore	SI	2,0474
FIORANO MODENESE	Davide Branduzzi	Assessore	SI	2,1929
FIUMALBO			NO	0,3455
FORMIGINE	Martina Giulia Bosi	Assessore	SI	4,1680
FRASSINORO	Giancarlo Palandri	Assessore	SI	0,4274
GUIGLIA	Giancarlo Zini	Assessore	SI	0,6638
LAMA MOCOGNO	Gian Battista Pasini	Sindaco	SI	0,5274
MARANELLO	Elisabetta Marisgliante	Assessore	SI	2,1548
MARANO SUL PANARO	Giovanni Galli	Sindaco	SI	0,7569
MEDOLLA	Patrizia Sgarbi	Assessore	SI	0,9382

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
MIRANDOLA	Giuseppe Forte	Assessore	SI	3,0215
MODENA	Alessandra Filippi	Assessore	SI	21,3515
MONTECRETO	Leandro Bonucchi	Sindaco	SI	0,3096
MONTEFIORINO	Maurizio Paladini	Sindaco	SI	0,4576
MONTESE	Paolo Monari	Assessore	SI	0,5880
NONANTOLA	Federica Nannetti	Sindaco	SI	1,9843
NOVI DI MODENA	Enrico Diacci	Sindaco	SI	1,4874
PALAGANO			NO	0,4695
PAVULLO NEL FRIGNANO	Gian Luca Muzzarelli	Assessore	SI	2,2228
PIEVEPELAGO			NO	0,4562
POLINAGO	Gian Domenico Tomei	Sindaco	SI	0,3972
PRIGNANO SULLA SECCHIA	Mauro Fantini	Sindaco	SI	0,6371
RAVARINO	Maurizia Rebecchi	Sindaco	SI	0,9197
RIOLUNATO			NO	0,2811
S.CESARIO SUL PANARO	Fabrizio Pancaldi	Assessore	SI	0,9140
S.FELICE SUL PANARO	Michele Goldoni	Sindaco	SI	1,4938
S.POSSIDONIO	Carlo Casari	Sindaco	SI	0,6192
S.PROSPERO			NO	0,8814
SASSUOLO	Ugo Liberi	Assessore	SI	4,9025
SAVIGNANO SUL PANARO			NO	1,2871
SERRAMAZZONI	Daniele Gorrieri	Assessore	SI	1,1381
SESTOLA			NO	0,4988
SOLIERA	Katia Mazzoni	Assessore	SI	1,9704
SPILAMBERTO	Umberto Costantini	Sindaco	SI	1,6242
VIGNOLA	Angelo Pasini	Assessore	SI	3,0669
ZOCCA	Gianfranco Tanari	Sindaco	SI	0,7682
PROVINCIA DI MODENA	Gian Domenico Tomei	Presidente	SI	10,0000

Presenti n. 37 pari a quote 90.6295

Assenti n. 11 pari a quote 9.3705

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Approvazione del consuntivo degli investimenti 2018 per il gestore AIMAG S.p.A.

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- l’art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

premesse che:

- l’art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio d’Ambito l’approvazione del Piano d’Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
- l’art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale la competenza di proporre al Consiglio d’Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

considerato che:

- con deliberazione n. 12 del 3 dicembre 2015 del Consiglio locale di Modena è stato approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore AIMAG s.p.a. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito;
- con deliberazione n. 47 del 26 luglio 2016 del Consiglio d’ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Modena, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr
- con deliberazione n.7 del 21 luglio 2017 del Consiglio locale di Modena è stata approvata la revisione, per gli anni 2017-2019 del programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore AIMAG S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- tale ultima deliberazione inoltre dispone che:
 - entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all’anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;
- con deliberazione n.4 del 14 maggio 2018 del Consiglio locale di Modena è stata approvata la revisione, per gli anni 2018-2019 del programma degli interventi 2015-2019

del servizio idrico integrato per il gestore AIMAG S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;

dato atto che il gestore AIMAG S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2018 attraverso il software ARSI;

rilevato che:

- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell'anno 2018 risultano essere inferiori rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 vigente;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che le motivazioni fornite dal gestore in merito agli scostamenti segnalati sono risultate tutte ammissibili;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2018 come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 37 (quote 90.6295), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2018 per il gestore AIMAG S.p.A. come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2018
Gestore: AIMAG s.p.a.**

20 novembre 2019

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2018

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2018, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.12 del 3 Dicembre 2015, aggiornato poi con Delibera del Consiglio Locale di Modena n. 7 del 21 Luglio 2017, che il gestore AIMAG ha trasmesso tramite il portale di rendicontazione denominato ARSI.

PIANIFICATO 2018		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2018	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A] e gli Investimenti post terremoto 2012	€ 19.604.400	-€ 3.817.973	€ 15.786.427	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A] e gli Investimenti post terremoto 2012
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 1.376.300	-€ 604.276	€ 772.024	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Lordo Pianificato per TERREMOTO 2012 [C]	€ 0	€ 841.449	€ 841.449	Importo Lordo a Consuntivo per TERREMOTO 2012 [C]
Importo Contributo Pianificato per TERREMOTO 2012 [D]	€ 0	€ 8.500	€ 8.500	Importo Contributo a Consuntivo per TERREMOTO 2012 [D]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]+[C]-[D]	€ 18.228.100	-€ 2.380.748	€ 15.847.352	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]+[C]-[D]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore AIMAG in termini economici abbia effettuato nel corso del 2018 investimenti netti inferiori rispetto a quanto era stato preventivato per un importo di € 2.380.748; per un dettaglio e un quadro complessivo delle macrovoci che hanno contribuito al raggiungimento di tale scostamento si veda la Tabella 2 e per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si veda l'Allegato 1 alla presente relazione.

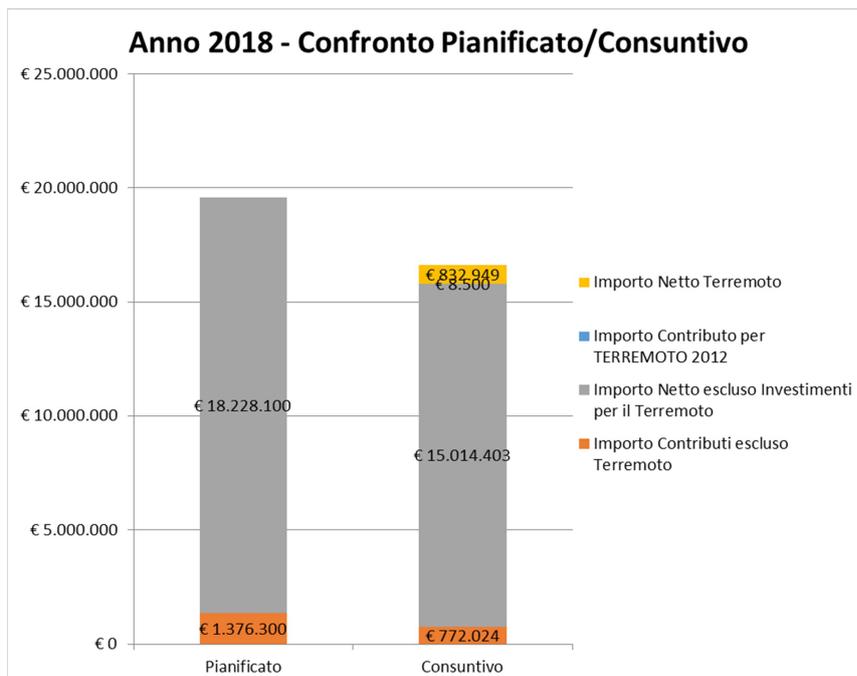


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva. In sede di rendicontazione infatti, secondo quanto disposto dalla CAMB n. 75/2017, il gestore del servizio idrico è tenuto a giustificare per ogni singolo intervento eventuali scostamenti significativi (+/- 20% con una franchigia pari a 20.000 euro) rispetto all'importo previsto per l'anno in esame nel POI (Programma Operativo degli Interventi) approvato.

Numero di interventi programmati nel 2018: 58

Numero di interventi rendicontati nel 2018: 65

	Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2018	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2018	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	15	€ 0	€ 2.182.900	0		
di cui interventi conclusi contabilmente anticipatamente nell'anno precedente	5	€ 0	€ 318.500	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		
Interventi con avvio anticipato nel 2018 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	22	€ 2.269.960	€ 0	0		
Interventi avviati nel 2018 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0	0		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	30	€ 11.498.921	€ 14.643.500	0		
di cui interventi con scostamento inferiore al limite di franchigia (€ 20.000) come riportato nella Delibera del Consiglio d'Ambito n. 12/2017	1	€ 9.887	€ 25.000	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	13	€ 2.858.995	€ 2.778.000	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che gli interventi non avviati, per il cui dettaglio si veda la Tabella 3, sono stati 15 per un importo programmato complessivo pari a € 2.182.900 mentre quelli avviati in anticipo sono stati 22 per un

importo a consuntivo pari a € 2.269.960; inoltre rispetto ai 65 interventi totali per i quali è stata presentata la rendicontazione, per un 46% di essi lo scostamento tra quanto preventivato e quanto rendicontato è stato superiore al + o - 20% e nel complesso quanto rendicontato per tali interventi (€ 11.498.921) è inferiore a ciò che era stato preventivato (€ 14.643.500), a dimostrazione che il gestore non è stato in grado di seguire quanto programmato.

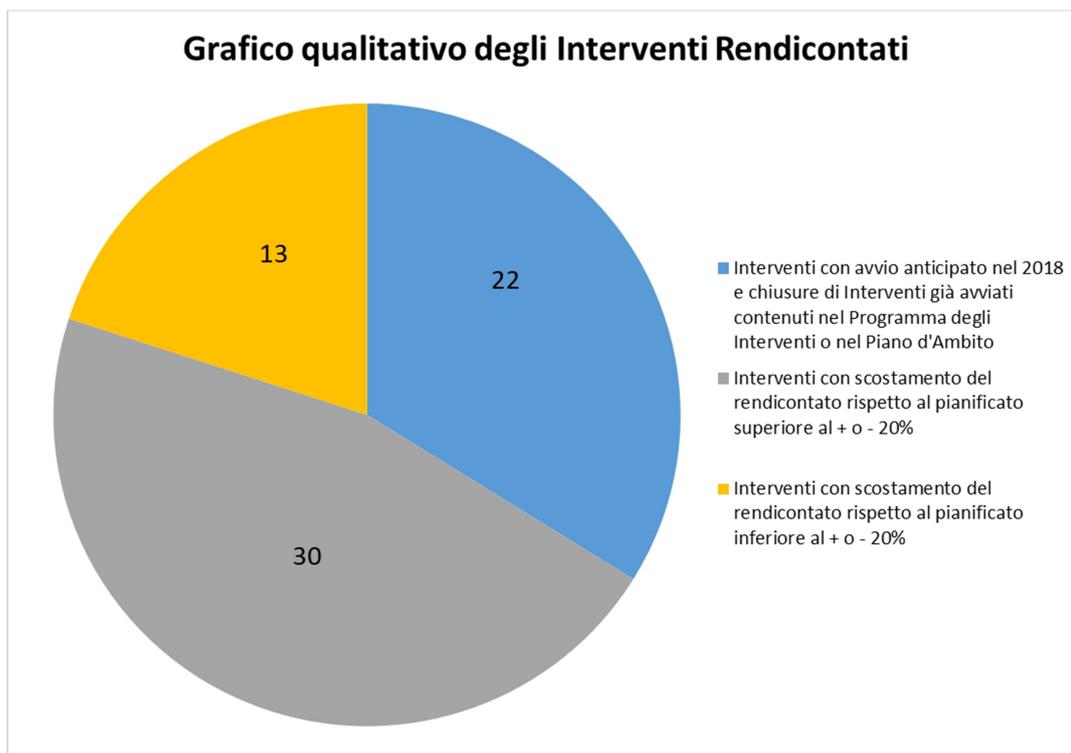


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2018 da Piano approvato
2014MOAG0023	2202-Adeguamento del Depuratore di San Felice (Sollevamento, laminazione, seconda linea acque, viabilità, disinfezione)	DEPURAZIONE	San Felice sul Panaro	400.000
2014MOAG0087	Acquisto autobotte	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	190.000
2015MOAG0003	Rifacimento acquedotto piazza Garibaldi a Mirandola - FSC scheda 1	ACQUEDOTTO	Mirandola	33.600
2015MOAG0004	Realizzazione della nuova Piazza Garibaldi a Concordia-Acqua - FSC scheda 2	ACQUEDOTTO	Concordia sulla Secchia	39.000
2015MOAG0009	Rifacimento acqua del centro storico di Soliera (via Matteotti, via Garibaldi) - FSC scheda 5	ACQUEDOTTO	Soliera	36.800
2015MOAG0021	Nuova fognatura e scolmatore in via Del Bramante a Carpi	FOGNATURA	Carpi	480.000
2015MOAG0026	Rifacimento fognatura mista via Giovanni XXIII a Carpi	FOGNATURA	Carpi	240.000
2015MOAG0028	Rifacimento fognature piazza Garibaldi a Mirandola	FOGNATURA	Mirandola	125.000
2015MOAG0032	Rifacimento fognature del centro storico di Soliera (via Matteotti, via Garibaldi)	FOGNATURA	Soliera	120.000
2015MOAG0033*	Rifacimento acqua centro storico Cavezzo (via Alighieri, via Volturmo, piazza Martiri della Libertà)	ACQUEDOTTO	Cavezzo	25.000
2015MOAG0036*	Rifacimento fogna centro storico Cavezzo (via Alighieri, via Volturmo, piazza Martiri della Libertà)	FOGNATURA	Cavezzo	50.000
2015MOAG0040	Adeguamento QE Cavezzo	DEPURAZIONE	Cavezzo	200.000
2015MOAG0044*	Realizzazione di stazioni di monitoraggio dei parametri chimico-fisici dell'acqua potabile prodotta nei campi pozzi di Cognento, Fontana di Rubiera e Campogalliano	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	81.000
2015MOAG0045*	Adeguamento impianti di produzione e dosaggio biossido di cloro	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	75.000
2018MOAG0003*	Rifacimento fognatura in Torricelli a Carpi	FOGNATURA	Carpi	87.500
			TOTALE	2.182.900

*interventi conclusi contabilmente nell'anno precedente

TAB.3 Interventi previsti nel 2018 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

AIMAG s.p.a.
Consuntivo Investimenti annualità 2018

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2018 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2018 al 31-12-2018				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2018 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Scostamento	
2014MOAG0001	4047-Interventi per il ripristino della funzionalità delle componenti elettromeccaniche ed elettriche degli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Bastiglia	80.307,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0002	2924-Risanamento superfici calcestruzzo ammalorate nel depuratore	DEPURAZIONE	Bomporto		0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0003	4026-Estendimento fognatura in aree da servire in Via Gementina	FOGNATURA	Bomporto	120.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0004	4046-Interventi per il ripristino della funzionalità del reticolo fognario	FOGNATURA	Bomporto	101.297,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0005	2926-Rifacimento fognatura via Canale di Carpi a Panzano	FOGNATURA	Campogalliano		0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0006	2207-Potenziamento del sistema di drenaggio del quartiere di Via Lama e scolmatore nella Cavata Orientale	FOGNATURA	Carpi	1.800.000,00	920.000,00	460.000,00	460.000,00	608.137,48	306.216,88	301.920,60	-34%	Rimodulata in accordo con l'amministrazione comunale e con Bonifica Emilia Centrale in relazione alle pianificazioni di bilancio
2014MOAG0007	2700-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DISIDRATAZIONE FANGHI PRESSO L'IMPIANTO DI CARPI CAPOLUOGO	DEPURAZIONE	Carpi		0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0008	2931-Sostituzione deflettori e coperture antispruzzo vasche di ossidazione nel depuratore del capoluogo	DEPURAZIONE	Carpi		0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0009	2932-Installazione strumentazione di misura consumo elettrico delle diverse sezioni impiantistiche ed integrazione sistema di supervisione impianto nel depuratore del capoluogo	DEPURAZIONE	Carpi		0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0010	4027-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Carpi	80.000,00	0	0	0	607.808,06	0	607.808,06	100%	INTERVENTO ESEGUITO CON URGENZA PER GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DEPURATORE DI CARPI. LE OPERE SARANNO COMPLETATE A GIUGNO 2019.
2014MOAG0011	4028-Collettamento fognario Via Remesina	FOGNATURA	Carpi		0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0012	4029-Interventi su fabbricati accessori l'impianto di depurazione	DEPURAZIONE	Carpi		0	0	0	28.756,60	0	28.756,60	100%	NECESSITÀ STRAORDINARIE SU OPERE EDILI
2014MOAG0013	2936-Sostituzione quadri elettrici, consolidamento opere civili e sistema di insufflazione sistema a bolle fini nel depuratore del capoluogo	DEPURAZIONE	Cavezzo	279.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0014	2654-COLLETTAMENTO DI VIA TINTORI AL DEPURATORE COMUNALE	FOGNATURA	Concordia sulla Secchia	800.000,00	0	0	0	1.346,14	1.697,75	-351,61	100%	ESPLETAMENTO ATTO NOTARILE LEGATO A SERVITU' DI PASSAGGIO
2014MOAG0015	2743-Estendimento fognario Via Capo di Sopra in località Palazzo Taccoli	FOGNATURA	Concordia sulla Secchia	120.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0016	2937-Collettore fognario via Grande a Concordia	FOGNATURA	Concordia sulla Secchia	287.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0017	4030-Spostamento sollevamento CON 01 via per Concordia interno impianto di depurazione con funzionalità di alimentazione processo e rifacimento pretrattamenti	DEPURAZIONE	Concordia sulla Secchia	380.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0018	4031-Collettamento di Via Trinca alla fognatura di Vallalta	FOGNATURA	Concordia sulla Secchia	360.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0019	2721-Collettamento fognario della frazione di Camurana al depuratore di Medolla	FOGNATURA	Medolla	170.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0020	2447-Collettamento al depuratore di Rovereto della zona non servita di Via Candia	FOGNATURA	Novi di Modena	400.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0021	2942-Potenziamento sistema di adduzione alla vasca Sacchella	ACQUEDOTTO	Novi di Modena	3.631.678,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0022	449-Costruzione fognatura a Ponte S.Pellegrino e collettamento a Mortizzuolo	FOGNATURA	San Felice sul Panaro	1.629.744,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0023	2202-Adeguamento del Depuratore di San Felice (Sollevamento, laminazione, seconda linea acque, viabilità, disinfezione)	DEPURAZIONE	San Felice sul Panaro	1.500.000,00	400.000,00	275.000,00	125.000,00	0	0	0	-100%	Vincolato ad ottenimento di finanziamento da parte della regione mai concretizzato. In fase di definizione per successivi investimenti per razionalizzazione del comparto
2014MOAG0024	2214-Chiusura del Depuratore di Rivara e collettamento al depuratore capoluogo	FOGNATURA	San Felice sul Panaro	500.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0025	2216-Collettamento fognario di Via Villa Gardè	FOGNATURA	San Felice sul Panaro	880.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0026	4033-Collettamento di Camposanto al depuratore di San Felice	FOGNATURA	San Felice sul Panaro	900.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0027	2945-Potenziamento del sistema di adduzione di Staggia e San martino secchia	ACQUEDOTTO	San Prospero	348.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0028	2905-Collettamento località Grande Rosa a Soliera	FOGNATURA	Soliera	110.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0029	2948-Rifacimento fognatura via Ravarino Carpi a Limidi	FOGNATURA	Soliera		0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0030	4034-Estendimento fognature aree da servire in via Martiri Partigiani a Limidi di Soliera	FOGNATURA	Soliera	110.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0031	13-Rinnovo allacciamenti, nuovi allacciamenti e installazione contatori	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		820.000,00	350.000,00	470.000,00	971.761,26	416.035,56	555.725,70	19%	

AIMAG s.p.a.
Consuntivo Investimenti annualità 2018

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2018 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2018 al 31-12-2018				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2018 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Scostamento	
2014MOAG0032	2106-Manutenzione straordinaria impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Tutto il sottoambito AIMAG		320.000,00	0	320.000,00	453.875,31	0	453.875,31	42%	Aspetti strutturali sulla sicurezza sul lavoro non prorogabili
2014MOAG0033	2108-Manutenzione straordinaria sollevamenti fognari	FOGNATURA	Tutto il sottoambito AIMAG		250.000,00	0	250.000,00	189.358,95	0	189.358,95	-24%	MINORI MANUTENZIONI STRAORDINARIE RISPETTO AL PREVISTO
2014MOAG0034	2114-INVESTIMENTI ACQUEDOTTO COGNENTO	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		118.000,00	0	118.000,00	195.980,34	0	195.980,34	66%	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO QUADRI ELETTRICI
2014MOAG0035	2116-INVESTIMENTI ACQUEDOTTO CAMPOGALLIANO	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		68.000,00	0	68.000,00	170.949,98	0	170.949,98	151%	MANUTENZIONI STRAORDINARIA URGENTE PER IMPERMEABILIZZAZIONE INVASO ROVERETO S/S E ONERI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEI POZZI N.5,7 E 8 DI CAMPOGALLIANO, ALLAGATI IN SEGUITO AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL DIC.2018
2014MOAG0036	2118-INVESTIMENTI ACQUEDOTTO FONTANA (CARPI)	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		66.000,00	0	66.000,00	63.711,50	0	63.711,50	-3%	
2014MOAG0038	2221-AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	196.693,00	25.000,00	0	25.000,00	9.886,90	0	9.886,90	-60%	COSTI DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA INFERIORI RISPETTO A PIANIFICATO
2014MOAG0039	2222-AGGIORNAMENTO RETI, ALLACCIAMENTI E LOTTIZZAZIONI	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	222.565,00	35.000,00	15.000,00	20.000,00	78.954,96	3.594,11	75.360,85	126%	MAGGIORI COSTI DOVUTI A NUOVA ATTIVITÀ DI RILIEVO PDC ACQUA, AGGIORNAMENTO RETI, COMPLETAMENTO ATTIVITÀ INSERIMENTO ANNO POSA RETE ACQUA
2014MOAG0040	2459-Progettazioni, permessi, indagini e rilievi, espropriazioni e altre attività necessarie all'avvio dei lavori	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00	97.995,88	0	97.995,88	63%	REALIZZATI MAGGIORI STUDI DI FATTIBILITA' IN PREVISIONE DI NUOVI INTERVENTI FUTURI ED IMPLEMENTAZIONE NUOVE METODOLOGIE PROGETTUALI
2014MOAG0041	2704-Manutenzione straordinaria adduttrici	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		190.000,00	0	190.000,00	401.665,74	0	401.665,74	111%	INTERVENTO URGENTE E NON PROCRASTINABILE DI SOSTITUZIONE CONDOTTA DI MANDATA DELLA CENTRALE IDRICA DI COGNENTO
2014MOAG0042	2705-Monitoraggio reti idriche /Distrettualizzazioni	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	570.000,00	80.000,00	0	80.000,00	92.994,50	0	92.994,50	16%	
2014MOAG0043	2707-Protezione catodica adduttrici	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		30.000,00	0	30.000,00	192,95	0	192,95	-99%	Valutazione interne legate alla protezione catodica, ed alla pianificazione di concomitanti lavori complementari alla posa della protezione
2014MOAG0044	2919-Contributo per l'elaborazione di un modello matematico degli acquiferi modenesi e prime simulazioni.	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	20.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0045	2949-Adeguamento e potenziamento sistema centrale telecontrollo	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	145.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0046	2953-Costruzione di un sistema automatico di monitoraggio dei reagenti	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0047	2957-Realizzazione deposito terre e rocce di scavo Via Bertuzza e via Maestri del Lavoro	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0048	2958-Potenziamento della dotazione del laboratorio	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		20.000,00	0	20.000,00	78.372,87	0	78.372,87	292%	Implementazione strumentale al potenziamento del piano controlli acque reflue e potabili anche in relazione alla qualità tecnica. Nella fattispecie è stato eseguito un maggior numero di analisi in ambito acque reflue e acque potabili in proiezione al processo di accreditamento del laboratorio, in corso nel 2019
2014MOAG0049	2959-Interventi da piano di miglioramento sicurezza (esclusi grigliati)	DEPURAZIONE	Tutto il sottoambito AIMAG		0	0	0	251.694,07	0	251.694,07	100%	INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DI VARI COMPARTI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN GESTIONE
2014MOAG0050	2960-Manutenzioni Straordinarie Telecontrollo	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		52.000,00	0	52.000,00	51.665,60	0	51.665,60	-1%	

AIMAG s.p.a.
Consuntivo Investimenti annualità 2018

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2018 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2018 al 31-12-2018				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2018 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Scostamento	
2014MOAG0051	2961-RINNOVO RETI, ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONE STROARDINARIA RETI ACQUA	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		3.700.000,00	0	3.700.000,00	1.717.109,76	0	1.717.109,76	-54%	MINORI MANUTENZIONI STRAORDINARIE RISPETTO AL PREVISTO
2014MOAG0052	2962-Ripristino di asfalti	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		305.000,00	0	305.000,00	146.991,17	0	146.991,17	-52%	EFFICIENTAMENTO SUGLI APPROVVIGIONAMENTI E CONTESTUALI MINORI ESIDEGENZE DEL PIANIFICATO
2014MOAG0053	2963-Manutenzione straordinaria rete fognaria	FOGNATURA	Tutto il sottoambito AIMAG		395.000,00	0	395.000,00	1.355.026,76	0	1.355.026,76	243%	MAGGIORI INTERVENTI CON CARATTERE D'URGENZA, NON PROROGABILI. La pianificazione delle attività di videoispezioni hanno evidenziato delle criticità strutturali improrogbilidal punto di vista della sicurezza stradale e ambientale
2014MOAG0054	2965-INTERVENTI PER MITIGAZIONE RILASCIO FIBRE DI AMIANTO NELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI CARPI	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0055	4035-Adeguamento e installazione nuovi impianti di videosorveglianza e antintrusione presso gli impianti acquedottistici	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		30.000,00	0	30.000,00	69.537,80	0	69.537,80	132%	ANTICIPO LAVORI DA ANNUALITA' SUCCESSIVE
2014MOAG0056	4036-Installazione di un campionatore automatico refrigerato autosvuotante come da protocollo di intesa con enti di controllo	DEPURAZIONE	Tutto il sottoambito AIMAG		0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0057	4038-Acquisto terreno adiacente centrale acquedottistica di Cognento e realizzazione della viabilità.	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0058	4039-Progetto Smart metering	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		100.000,00	0	100.000,00	81.786,69	0	81.786,69	-18%	
2014MOAG0059	4040Sviluppo sistema di monitoraggio quali-quantitativo dei reflui fognari (Progetto Sentinella)	FOGNATURA	Tutto il sottoambito AIMAG	350.000,00	100.000,00	0	100.000,00	78.923,92	0	78.923,92	-21%	EFFICIENTAMENTO SUGLI APPROVVIGIONAMENTI
2014MOAG0060	4041-Ristrutturazione del locale officina a servizio della centrale acquedottistica di Fontana di Rubiera e Costruzione di una linea fissa dei lavaggi adiacente l'argine del fiume	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0061	4042-Installazione strumentazione di misura consumo elettrico delle diverse sezioni impiantistiche ed integrazione sistema di supervisione impianto	DEPURAZIONE	Tutto il sottoambito AIMAG	86.000,00	50.000,00	0	50.000,00	45.386,01	0	45.386,01	-9%	
2014MOAG0062	4043-Efficientamento energetico impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Tutto il sottoambito AIMAG	215.000,00	50.000,00	0	50.000,00	426,6	0	426,6	-99%	INTERVENTO POSTICIPATO AI FINI DELLA RICERCA DELLE MIGLIORI SOLUZIONI APPLICABILI
2014MOAG0063	4044-Controllo Impianti	DEPURAZIONE	Tutto il sottoambito AIMAG		0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0064	4001-Adeguamento strutturale impianti di depurazione e sollevamenti fognari	DEPURAZIONE	Tutto il sottoambito AIMAG	580.000,00	0	0	0	1.504,00	0	1.504,00	100%	SPESE TECNICHE SOSTENUTE A CHIUSURA DELL'INTERVENTO
2014MOAG0065	4012-Adeguamento sismico Torre Piezometrica Di Rovereto S/S e installazione sistema di automazione	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	279.230,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0066	4013-Adeguamento sismico Torre Piezometrica Campogalliano	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	270.679,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0067	4017-Nuova rete DN 700 in Ghisa che tra la Torre di Mirandola e la rete DN 700 esistente, all'altezza del by-pass posto a nord di Camurana	ACQUEDOTTO	Mirandola	2.120.622,00	0	0	0	21.835,24	0	21.835,24	100%	SPESE TECNICHE SOSTENUTE A CHIUSURA DELL' INTERVENTO
2014MOAG0068	4018-Adeguamento centrale di Campogalliano	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	815.754,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0069	4019-Adeguamento centrale acquedottistica di Cognento	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		0	0	0	21.157,54	0	21.157,54	100%	ANTICIPAZIONE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE CENTRALE IDRICA DI COGNENTO (NTC2008 E LR 19/2008)

AIMAG s.p.a.
Consuntivo Investimenti annualità 2018

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2018 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2018 al 31-12-2018				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2018 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Scostamento	
2014MOAG0070	4020-Perforazione nuovi pozzi a servizio della centrale acquedottistica di Cognento	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	1.500.580,00	0	0	0	757.310,21	34,43	757.275,78	100%	CONCLUSIONE LAVORI PREVISTI NEL 2016 E PROGETTO DI FATTIBILITA' PER IMPERMEABILIZZAZIONI CANALI SCOLO INFRASTRUTTURE STRADALI TANGENZIALE MODENA NUOVO CAMPO POZZI (PRESCRIZIONE DELIBERA GIUNTA REGIONALE 1165/2016)
2014MOAG0071	4021-Nuova rete DN 300 in Ghisa che collega la Torre di Rovereto e l'adduttrice DN 350 di Via Faiani, nel Comune di Novi di Modena	ACQUEDOTTO	Novi di Modena		0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0072	4022-By-pass fra le condotte DN 500 e DN 700 a Modena in via De André - Canale dei Montanari	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	246.922,00	0	0	0	1.736,80	0	1.736,80	100%	SPESE TECNICHE SOSTENUTE A CHIUSURA DELL' INTERVENTO
2014MOAG0073	4023-Nuova rete DN 500 in Ghisa per realizzare l'interconnessione tra la condotta DN 700 in C.A. e la DN450 (Bonna) in Via Cavezzo Camposanto	ACQUEDOTTO	Medolla	600.358,00	0	0	0	6.070,01	0	6.070,01	100%	SPESE NOTARILI TRASCRIZIONE SERVITU'
2014MOAG0074	4024-Nuova rete DN 600 in Ghisa per realizzare l'interconnessione tra il DN 700 in C.A. all'altezza della Via Ponte Nuovo in Comune di Modena (Passo Uccellino) e la rete DN 500 esistente in Via Morello Sud Località Limidi in Comune di Soliera	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	3.776.450,00	0	0	0	31.835,10	0	31.835,10	100%	SPESE TECNICHE DI CHIUSURA INTERVENTO
2014MOAG0075	4025-Nuova rete DN 500 in Ghisa per realizzare l'interconnessione tra condotta in DN 700 sulla Via Ravarino Carpi Località Cristo ed il DN 500 (Bonna) in Via Verdeta Località Sorbara in Comune di Bomporto	ACQUEDOTTO	Bomporto	445.428,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0076	4016-Demolizione torre piezometrica di Camposanto e conseguente adeguamento di rete e impianti	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	926.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0077	4045-Rifacimento fognature	FOGNATURA	Tutto il sottoambito AIMAG	371.374,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0078	Rinnovo e potenziamento rete distribuzione e rifacimento allacci acqua "ZONA BOSCO"	ACQUEDOTTO	Camposanto	350.000,00	0	0	0	0	0,00	0,00		
2014MOAG0079	Rifacimento fognatura via Leopardi a Carpi	FOGNATURA	Carpi	110.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0080	Rifacimento fognatura via Fornaciari a Carpi	FOGNATURA	Carpi	135.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0081	Potenziamento del sistema fognario via Belgio a Carpi	FOGNATURA	Carpi	375.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0082	Rinnovo e potenziamento rete distribuzione e rifacimento allacci acqua Via Tintori	ACQUEDOTTO	Concordia sulla Secchia	250.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0083	Potenziamento rete di adduzione alla rete di distribuzione alla frazione di Rovereto	ACQUEDOTTO	Novi di Modena		0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0084	Rinnovo e potenziamento rete distribuzione e rifacimento allacci acqua Via Villanova	ACQUEDOTTO	San Felice sul Panaro	345.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0085	San Prospero - intervento di adeguamento funzionale impianto	DEPURAZIONE	San Prospero	345.000,00	0	0	0	0	30.000,00	-30.000,00	100%	
2014MOAG0086	Rifacimento di fognatura in via Roma incrocio Matteotti a Soliera	FOGNATURA	Soliera	50.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0087	Acquisto autobotte	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	340.000,00	190.000,00	0	190.000,00	0	0	0	-100%	PROGETTO POSTICIPATO AD ANNUALITÀ SUCCESSIVE
2014MOAG0088	Miglioramenti e manutenzioni varie Acquedotto Industriale	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		50.000,00	0	50.000,00	22.340,14	0	22.340,14	-55%	MINORI MANUTENZIONI STRAORDINARIE RISPETTO AL PREVISTO
2014MOAG0089	Costi residui servitù per interventi ultimanti	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0090	2940 - Potenziamento della capacità idraulica e dei pretrattamenti	DEPURAZIONE	Mirandola		100.000,00	0	100.000,00	2.175,77	0	2.175,77	-98%	INTERVENTO POSTICIPATO ALLE ANNUALITÀ SUCCESSIVE PER PERMETTERE L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE
2014MOAG0091	4003 - Adeguamento magazzino presso depuratore di Carpi	TUTTI	Carpi	90.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0092	4006 - Adeguamento strutturale Torre Mirandola	ACQUEDOTTO	Mirandola	1.750.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0093	4011 - Ripristino palazzina uffici via Bertuzza	TUTTI	Tutto il sottoambito AIMAG	332.460,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOAG0094	4015 - Demolizioni Torri (3° Stralcio -Bomporto, San Prospero, Lesignana,Soliera, Torre Sacchella) e impianti in sostituzione	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	600.000,00	0	0	0	0	0	0		
2015MOAG0001	Insacchettatrice acqua potabile gestione crisi idriche	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		0	0	0	0	0	0		

AIMAG s.p.a.
Consuntivo Investimenti annualità 2018

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2018 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2018 al 31-12-2018				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2018 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Scostamento	
2015MOAG0002	Rifacimento acquedotto via Pico a Mirandola	ACQUEDOTTO	Mirandola		0	0	0	42.163,53	0	42.163,53	100%	INTERVENTO POSTICIPATO DAL 2017 AL 2018 PER RINVIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.LAVORO COMPLETATO NEL 2018
2015MOAG0003	Rifacimento acquedotto piazza Garibaldi a Mirandola - FSC scheda 1	ACQUEDOTTO	Mirandola	33.600,00	33.600,00	16.800,00	16.800,00	0	0	0	-100%	POSTICIPO PROGETTO DA PARTE DEL COMUNE
2015MOAG0004	Realizzazione della nuova Piazza Garibaldi a Concordia-Acqua - FSC scheda 2	ACQUEDOTTO	Concordia sulla Secchia	39.000,00	39.000,00	19.500,00	19.500,00	0	0	0	-100%	Posticipazione al 2019 stabilita dal comune di riferimento in base alla propria pianificazione del lavoro
2015MOAG0005	Rifacimento acquedotto centro storico Novi - FSC scheda 3	ACQUEDOTTO	Novi di Modena	30.000,00	0	0	0	0	0	0		
2015MOAG0006	Rifacimento acqua del centro storico di Soliera (via Grandi, via IV Novembre, piazza Sassi) - FSC scheda 4	ACQUEDOTTO	Soliera	63.500,00	0	0	0	0	0	0		
2015MOAG0007	Rifacimento acquedotto centro storico San Felice (via Fossetta, via Don Minzoni, largo Posta, piazza Matteotti, via Roma, via Marconi)	ACQUEDOTTO	San Felice sul Panaro		0	0	0	14.859,51	0	14.859,51	100%	RINVIO NEL 2017 DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.LAVORO COMPLETATO NEL 2018.
2015MOAG0008	Rifacimento fognatura centro storico San Felice (via Fossetta, via Don Minzoni, largo Posta, piazza Matteotti, via Roma, via Marconi)	FOGNATURA	San Felice sul Panaro		0	0	0	143.362,54	0	143.362,54	100%	RINVIO NEL 2017 DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.LAVORO COMPLETATO NEL 2018
2015MOAG0009	Rifacimento acqua del centro storico di Soliera (via Matteotti, via Garibaldi) - FSC scheda 5	ACQUEDOTTO	Soliera	36.800,00	36.800,00	0	36.800,00	0	0	0	-100%	PROCEDURE DI GARA NON ESPERITE DAL COMUNE
2015MOAG0010	Rifacimento acqua Solara di Bomporto (via Pasubio, via Fiume, piazza Marconi, via I Maggio)	ACQUEDOTTO	Bomporto		0	0	0	0	0	0		
2015MOAG0011	Rifacimento fogna Solara di Bomporto (via Pasubio, via Fiume, piazza Marconi, via I Maggio)	FOGNATURA	Bomporto		0	0	0	103.851,83	0	103.851,83	100%	Lavoro anticipato rispetto al pianificato poiché trattasi di interventi funzionali al piano organico comune di Bomporto
2015MOAG0012	Rifacimento adduttrici sistema idrico	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	13.185.000,00	0	0	0	0	0	0		
2015MOAG0013	Rifacimento fognatura via Bulgarelli a Carpi	FOGNATURA	Carpi		0	0	0	0	0	0		
2015MOAG0014	Rifacimento fognatura via Ponte Catena a Novi	FOGNATURA	Novi di Modena		0	0	0	0	0	0		
2015MOAG0015	Rifacimento fognatura via Romana a Novi	FOGNATURA	Novi di Modena		0	0	0	0	0	0		
2015MOAG0016	Rifacimento fognatura via Galilei a Sorbara di Bomporto	FOGNATURA	Bomporto		0	0	0	0	0	0		
2015MOAG0017	Rifacimento fognatura di via Mazzone a Mortizzuolo di Mirandola	FOGNATURA	Mirandola		0	0	0	0	0	0		
2015MOAG0018	Collettamento fognario area ex Covalpa al depuratore di Medolla	FOGNATURA	Medolla		0	0	0	0	0	0		
2015MOAG0019	Rifacimento fognatura di via Don Minzoni a Medolla	FOGNATURA	Medolla		0	0	0	0	0	0		
2015MOAG0020	Manutenzione straordinaria rete fognaria acque meteoriche	FOGNATURA	Tutto il sottoambito AIMAG		50.000,00	0	50.000,00	3.143,27	0	3.143,27	-94%	MINORI MANUTENZIONI STRAORDINARIE RISPETTO AL PREVISTO
2015MOAG0021	Nuova fognatura e scolmatore in via Del Bramante a Carpi	FOGNATURA	Carpi		480.000,00	240.000,00	240.000,00	0	0	0	-100%	Intervento annullato per riscontri da videospesione che hanno sposato l'obiettivo su altro tratto fognario
2015MOAG0022	Nuova fognatura nera di via Gambisa a Soliera	FOGNATURA	Soliera		0	0	0	0	0	0		
2015MOAG0023	Rifacimento fognatura via Bortolomasi a Carpi	FOGNATURA	Carpi	100.000,00	0	0	0	0	0	0		
2015MOAG0024	Rifacimento fognatura mista via Volta a Carpi	FOGNATURA	Carpi	105.000,00	0	0	0	0	0	0		
2015MOAG0025	Rifacimento fognatura via San Bernardino da Siena a Carpi	FOGNATURA	Carpi	175.000,00	0	0	0	0	0	0		
2015MOAG0026	Rifacimento fognatura mista via Giovanni XXIII a Carpi	FOGNATURA	Carpi		240.000,00	0	240.000,00	0	0	0	-100%	Intervento annullato per riscontri da videospesione che hanno sposato l'obiettivo su altro tratto fognario
2015MOAG0027	Rifacimento fognature via Pico a Mirandola	FOGNATURA	Mirandola	220.000,00	0	0	0	189.021,81	0	189.021,81	100%	INTERVENTO POSTICIPATO DAL 2017 AL 2018 PER RINVIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.LAVORO COMPLETATO NEL 2018
2015MOAG0028	Rifacimento fognature piazza Garibaldi a Mirandola	FOGNATURA	Mirandola	125.000,00	125.000,00	0	125.000,00	0	0	0	-100%	Posticipo stabilito dal Comune di riferimento in base alla propria pianificazione del lavoro
2015MOAG0029	Rifacimento della nuova Piazza Garibaldi a Concordia - fogna	FOGNATURA	Concordia sulla Secchia	205.000,00	0	0	0	5.646,83	0	5.646,83	100%	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PROPEDEUTICHE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE NEL 2019
2015MOAG0030	Rifacimento fognature del centro storico di Novi	FOGNATURA	Novi di Modena	245.000,00	0	0	0	0	0	0		
2015MOAG0031	Rifacimento fognature del centro storico di Soliera (via Grandi, via IV Novembre, piazza Sassi)	FOGNATURA	Soliera	255.000,00	0	0	0	0	0	0		
2015MOAG0032	Rifacimento fognature del centro storico di Soliera (via Matteotti, via Garibaldi)	FOGNATURA	Soliera	120.000,00	120.000,00	0	120.000,00	0	0	0	-100%	PROCEDURE DI GARA NON ESPERITE DAL COMUNE
2015MOAG0033	Rifacimento acqua centro storico Cavezzo (via Alighieri, via Volturmo, piazza Martiri della Libertà)	ACQUEDOTTO	Cavezzo	55.800,00	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0	-100%	INTERVENTO ESEGUITO NEL 2017
2015MOAG0034	Rifacimento centro storico San Possidonio (piazza Andreoli)	ACQUEDOTTO	San Possidonio	40.000,00	0	0	0	995,34	0	995,34	100%	COMPLETAMENTO LAVORI
2015MOAG0035	Consolidamento fogna centro storico Carpi (piazza Martiri)	FOGNATURA	Carpi	145.000,00	0	0	0	0	0	0		
2015MOAG0036	Rifacimento fogna centro storico Cavezzo (via Alighieri, via Volturmo, piazza Martiri della Libertà)	FOGNATURA	Cavezzo	115.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	-100%	INTERVENTO ESEGUITO NEL 2017

AIMAG s.p.a.
Consuntivo Investimenti annualità 2018

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2018 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2018 al 31-12-2018				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2018 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Scostamento	
2015MOAG0037	Adeguamento comparto ossidativo depuratore SanFelice - intervento tampona	DEPURAZIONE	San Felice sul Panaro	100.000,00	0	0	0	0	0	0		
2015MOAG0038	Adeguamento sistema fognario interno al depuratore di Carpi	DEPURAZIONE	Carpi		0	0	0	640,65	0	640,65	100%	
2015MOAG0039	Adeguamento comparto ossidativo depuratore San Prospero	DEPURAZIONE	San Prospero	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	171.841,81	0	171.841,81	15%	
2015MOAG0040	Adeguamento QE Cavezzo	DEPURAZIONE	Cavezzo	300.000,00	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO IN ATTESA DI ANALISI TECNICHE E APPROFONDIMENTI DI CARATTERE ECONOMICO
2015MOAG0041	Adeguamento comparto ossidativo depuratore Bomporto	DEPURAZIONE	Bomporto	250.000,00	250.000,00	0	250.000,00	260.176,29	0	260.176,29	4%	
2015MOAG0042	Adeguamento strutturale e funzionale sfiati su condotte fognarie prementi	FOGNATURA	Tutto il sottoambito AIMAG	40.000,00	0	0	0	0	0	0		
2015MOAG0043	Adeguamento normativo emissioni	DEPURAZIONE	Tutto il sottoambito AIMAG		0	0	0	0	0	0		
2015MOAG0044	Realizzazione di stazioni di monitoraggio dei parametri chimico-fisici dell'acqua potabile prodotta nei campi pozzi di Cognento, Fontana di Rubiera e Campogalliano	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		81.000,00	0	81.000,00	0	0	0	-100%	PROGETTO REALIZZATO INTERAMENTE NEL 2016
2015MOAG0045	Adeguamento impianti di produzione e dosaggio biossido di cloro	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		75.000,00	0	75.000,00	0	0	0	-100%	PROGETTO REALIZZATO INTERAMENTE NEL 2016
2015MOAG0046	Adeguamento hardware a servizio del Telecontrollo	TUTTI	Tutto il sottoambito AIMAG	400.000,00	200.000,00	0	200.000,00	198.884,39	0	198.884,39	-1%	
2015MOAG0047	Contributo POST SISMA DSII per intero progetto demolizione torri e realizzazione impianti sostitutivi	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG		0	0	0	0	8.465,60	-8.465,60	100%	
2017MOAG0001	Sostituzione adduttrice dall'attraversamento stradale A1 (escl. attraversamento) alla via Cicerone nei Comuni di Rubiera e Campogalliano	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	6.000.000,00	1.670.000,00	0	1.670.000,00	3.409.373,25	12.789,60	3.396.583,65	104%	SLITTAMENTO ATTIVITA' DAL 2017 AL 2018 IN VIRTU' DEL RITARDO NELL'ESECUZIONE GARA DI APPALTO FORNITURA TUBI GHISA
2017MOAG0002	Sostituzione dell'adduttrice dal Campo Pozzi Fontana all'attraversamento stradale A1 (incl. attraversamento) nel Comuni di Rubiera	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	1.700.000,00	1.700.000,00	0	1.700.000,00	20.329,15	0	20.329,15	-99%	POSTICIPO INIZIO ATTIVITA' PER AVVIO PROCEDURE ESPROPRIATIVE
2017MOAG0003	Sostituzione dell'adduttrice da via Cicerone a Campogalliano sino a Carpi e parte dell'anello di distribuzione principale	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	5.485.000,00	1.080.000,00	0	1.080.000,00	689.654,27	0	689.654,27	-36%	POSTICIPO INIZIO ATTIVITA' DI POSA PER RITARDO SULLA PROCEDURA DI APPALTO (CONSEGNA MATERIALE)
2017MOAG0004	2117 - Altri interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo reti e impianti	TUTTI	Tutto il sottoambito AIMAG		0	0	0	0	0	0		
2017MOAG0005	Oneri per adeguamento sistemi informativi in seguito a delibera AEEGSI 655/2015	TUTTI	Tutto il sottoambito AIMAG		0	0	0	38.364,39	0	38.364,39	100%	ESIGENZE COMPLETAMENTO ARCHITETTURA INFORMATICA
2018MOAG0001	Rifacimento fognatura in viale Biondo a Carpi	FOGNATURA	Carpi	960.000,00	480.000,00	0	480.000,00	89.421,66	0	89.421,66	-81%	POSTICIPO INIZIO LAVORI 2018 CON COMPLETAMENTO NEL 2019 IN ACCORDO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
2018MOAG0002	Rifacimento fognatura in via Fassi a Carpi	FOGNATURA	Carpi	480.000,00	240.000,00	0	240.000,00	9.010,75	0	9.010,75	-96%	INTERVENTO POSTICIPATO AL 2019, IN ACCORDO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN ATTESA DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO
2018MOAG0003	Rifacimento fognatura in Torricelli a Carpi	FOGNATURA	Carpi	87.500,00	87.500,00	0	87.500,00	0	0	0	-100%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2017
2018MOAG0004	Rifacimento fognatura in via Meucci a Carpi	FOGNATURA	Carpi	87.500,00	87.500,00	0	87.500,00	56.243,98	0	56.243,98	-36%	EFFICIENTAMENTO SUGLI APPROVVIGIONAMENTI
2018MOAG0005	Realizzazione nuovo attraversamento interrato Fiume Secchia (PE355 adduzione) in sostituzione di tratto aereo esistente, località Sozzigalli (Soliera) e Sorbara (Bomporto)	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	700.000,00	450.000,00	0	450.000,00	403.229,13	0	403.229,13	-10%	
2018MOAG0006	Ammodernamento centrale idrica di Cognento	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	250.000,00	250.000,00	0	250.000,00	215.331,78	0	215.331,78	-14%	
2018MOAG0007	Sostituzione massiva contatori	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	1.750.000,00	800.000,00	0	800.000,00	462.864,00	140	462.724,00	-42%	DILAZIONE DEI TEMPI DI INIZIO LAVORI A SEGUITO DI VERIFICHE AMMINISTRATIVE CON L'IMPRESA AGGIUDICATARIA LAVORI DI POSA E VERIFICHE TECNICHE SU FORNITURA CONTATORI
2018MOAG0008	Rifacimento allacciamenti acquedotto	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	3.000.000,00	1.500.000,00	0	1.500.000,00	1.056.602,00	0	0	-30%	Scostamento dovuto a ritardo di esecuzione di n.2 cantieri ultimati nel 2019 invece che nel 2018
2018MOAG0009	Creazione nodi di monitoraggio	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	400.000,00	200.000,00	0	200.000,00	20.088,48	0	20.088,48	-90%	Spostamento del progetto per sinergie con altri interventi ripianificati.

AIMAG s.p.a.
Consuntivo Investimenti annualità 2018

ID ATERSIR	DESCRIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2018 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2018 al 31-12-2018				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2018 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				IMPORTO PROGETTUALE	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Scostamento	
2018MOAG0010	Installazione nuove apparecchiature depuratori	DEPURAZIONE	Tutto il sottoambito AIMAG	280.000,00	150.000,00	0	150.000,00	146.425,46	1.550,01	144.875,45	-2%	
2018MOAG0011	Adeguamenti informatici qualità tecnica	TUTTI	Tutto il sottoambito AIMAG	200.000,00	70.000,00	0	70.000,00	4.286,49	0	4.286,49	-94%	ANALISI DEI PROCESSI INFORMATIVI ALLA BASE DELLA STRUTTURA DEI DATI PROPEDEUTICA ALL'ARCHITETTURA INFORMATICA
2018MOAG0012	MESSA IN SICUREZZA DA ALLAGAMENTI LOCALE TECNICO E CABINA MT POZZO 5 CAMPOGALLIANO	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	300.000,00	0	0	0	0	0	0		
2018MOAG0013	RIFACIMENTO CONDOTTA VTR CARPI	ACQUEDOTTO	Carpi	160.000,00	160.000,00	0	160.000,00	155.800,67	0	155.800,67	-3%	
2019MOAG0001	Rifacimento collettore fognario 800 in tangenziale Losi	FOGNATURA	Carpi	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0		
					19.604.400	1.376.300	18.228.100	16.627.876	780.524	14.790.750		

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 1 del 2 marzo 2020

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore AIMAG S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2018.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 2 marzo 2020

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena
F.to Enrico Diacci

Il segretario verbalizzante
F.to Pier Luigi Maschietto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 21 luglio 2020
