

CLPC/2018/2 del 15/03/2018

CONSIGLIO LOCALE di PIACENZA

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore IRETI S.p.A. Programma Operativo
Interventi 2015-2019: approvazione consuntivo 2016.**

IL COORDINATORE

F.to Dott. Giuseppe Sidoli

CONSIGLIO LOCALE di PIACENZA

CLPC/2018/2

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di marzo alle ore 10,30 presso la Sala Consiglio della Provincia di Piacenza – Via Garibaldi n. 50 -, si è riunito il Consiglio Locale di Piacenza convocato con lettera PG/AT/2018/1508 del 5 marzo 2018.

Assume la presidenza il Coordinatore Giuseppe Sidoli, che chiama la signora Fausta Pizzaghi, funzionaria di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretaria verbalizzante.

Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
AGAZZANO			NO	0,7848
ALSENO	Zucchi Davide	Sindaco	SI'	1,5682
ALTA VAL TIDONE			NO	1,1488
BESENZONE	Garavelli Luigi	Sindaco	SI'	0,4734
BETTOLA			NO	1,0491
BOBBIO			NO	1,2518
BORGONOVO	Sogni Nicola	Consigliere	SI'	2,3674
CADEO	Dosi Massimiliano	Assessore	SI'	1,9180
CALENDASCO	Zangrandi Francesco	Sindaco	SI'	0,8923
CAORSO	Battaglia Roberta	Sindaco	SI'	1,5702
CARPANETO			NO	2,3406
CASTELL'ARQUATO	Rocchetta Ivano	Sindaco	SI'	1,5367
CASTEL S. GIOVANNI	Fontana Lucia	Sindaco	SI'	4,0744
CASTELVETRO			NO	1,7848
CERIGNALE			NO	0,2398
COLI			NO	0,4674
CORTEBRUGNATELLA			NO	0,3866
CORTEMAGGIORE	Zilli Maria Rosa	Assessore	SI'	1,4638
FARINI			NO	0,6097
FERRIERE			NO	0,6012
FIORENZUOLA D'ARDA	Brauner Franco	Assessore	SI'	4,4321

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
GAZZOLA	Maserati Simone	Sindaco	SI'	0,7646
GOSSOLENGO			NO	1,7413
GRAGNANO			NO	1,4439
GROPPARELLO			NO	0,8570
LUGAGNANO			NO	1,3781
MONTICELLI D'ONG.			NO	1,7404
MORFASSO	Calestani Paolo	Sindaco	SI'	0,5101
OTTONE			NO	0,3579
PIACENZA	Barbieri Patrizia	Sindaco	SI'	28,7436
PIANELLO			NO	0,8474
PIOZZANO	Burgazzoli Lorenzo	Sindaco	SI'	0,3784
PODENZANO			NO	2,7542
PONTEDELL'OLIO			NO	1,6004
PONTENURE			NO	2,0094
RIVERGARO			NO	2,1460
ROTOFRENO	Veneziani Raffaele	Sindaco	SI'	3,5086
S.GIORGIO P.NO	Saltarelli Massimo	Assessore	SI'	1,8514
S. PIETRO IN CERRO	Sogni Manuela	Sindaco	SI'	0,4592
SARMATO	Tanzi Anna	Sindaco	SI'	1,0264
TRAVO			NO	0,7628
VERNASCA	Sidoli Giuseppe	Sindaco	SI'	0,8334
VIGOLZONE	Ghetti Beatrice	Consigliere	SI'	1,4103
VILLANOVA			NO	0,7466
ZERBA			NO	0,2218
ZIANO			NO	0,9456
PROVINCIA di PIACENZA			NO	10,0000

Presenti n. 20 quote 59,78 Assenti n. 27 quote 40,22

Riconosciuta la validità della seduta, il Dott. Giuseppe Sidoli, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore IRETI S.p.A. Programma Operativo
Interventi 2015-2019: approvazione consuntivo 2016.**

Vista la L.R. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 1 del 21 marzo 2016 del Consiglio Locale di Piacenza è stato approvato l'Aggiornamento del Programma degli Interventi per gli anni 2015-2019 e la Proposta di integrazione del Piano di Ambito e di variazione del Piano economico-finanziario;
- con deliberazione n. 32 del 26 aprile 2016 del Consiglio d'Ambito è stata approvata l'Integrazione del Piano d'Ambito di Piacenza conseguentemente all'approvazione del consuntivo degli interventi 2014 e all'approvazione del programma degli interventi 2015-2019 di cui alla schema regolatorio AEEGSI;
- con deliberazione n. 54 del 07 ottobre 2016 del Consiglio d'Ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Piacenza, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'Ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano degli Interventi e del Programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato"; tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);

- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore IRETI S.p.A. ha effettuato la rendicontazione degli investimenti 2016 attraverso il software ARSI;

rilevato che:

- dai dati presentati è emerso che non sono stati eseguiti interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal programma operativo degli interventi 2015-19, approvato con deliberazione n.1 del 21 marzo 2015 del Consiglio Locale di Piacenza;
- sono presenti sedici interventi nel programma operativo interventi 2015-2019 che hanno avuto avvio anticipato nel 2016 o chiusura, sempre nel 2016, di interventi programmati nelle precedenti annualità, per un importo complessivo di €61.258;
- non sono stati avviati n.35 interventi, per un'importo complessivo di €1.001.593;
- dai dati presentati si evince che gli investimenti totali netti a tariffa realizzati risultano essere superiori, rispetto a quanto previsto dal programma operativo, per un importo di € 1.476.394; gli investimenti totali lordi risultano invece inferiori, rispetto a quanto programmato, per un importo di € 2.130.546 (differenza dovuta soprattutto alla mancata erogazione dei contributi pianificati a favore degli interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali del 2015);
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- per ventisette interventi, in caso di scostamento, le note giustificative del Gestore non sono state ritenute esaustive;

ritenuto pertanto

- di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di avviare un supplemento istruttorio relativo agli interventi per i quali le motivazioni fornite non sono state ritenute soddisfacenti;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n. 20 (quote 59,78), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 per il gestore IRETI S.p.A. per il bacino tariffario di Piacenza come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare alla struttura tecnica di ATERSIR l'incarico di svolgere un supplemento di istruttoria sugli interventi identificati dalla TAB.2 della relazione allegata, per i quali non sono state giudicate esaustive le motivazioni addotte dal gestore a giustificazione dei ritardi rilevati rispetto al cronoprogramma di pianificazione, finalizzato alla valutazione delle azioni da intraprendere nei confronti del gestore ai sensi della vigente convenzione di regolazione del Servizio Idrico;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2016
Piacenza Gestore: IRETI S.p.A.

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016

La tabella di seguito riportata è una sintesi per l'annualità 2016 degli investimenti pianificati nel Piano Operativo degli Interventi del Servizio Idrico Integrato - approvato con Delibera del Consiglio Locale di Piacenza n.1 del 21 Marzo 2016 – e degli interventi realizzati che il gestore IRETI ha rendicontato a consuntivo attraverso il sistema ARSI.

PIANIFICATO 2016		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2016	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 14.941.285	-€ 2.130.536	€ 12.810.749	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 3.619.393	-€ 3.606.930	€ 12.463	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 11.321.892	+ € 1.476.394	€ 12.798.286	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]
TOTALE	€ 11.321.892	+ € 1.476.394	€ 12.798.286	

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IRETI abbia effettuato nel corso del 2016 investimenti netti (a tariffa) superiori, rispetto a quanto pianificato, per un importo di € 1.476.394; ed investimenti lordi inferiori, rispetto a quanto pianificato, per un importo di € 2.130.536. La differenza sostanziale riguarda i contributi regionali che erano stati previsti (e pianificati) a favore degli interventi necessari al ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali del 2015, che però non risultano ancora stati erogati.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

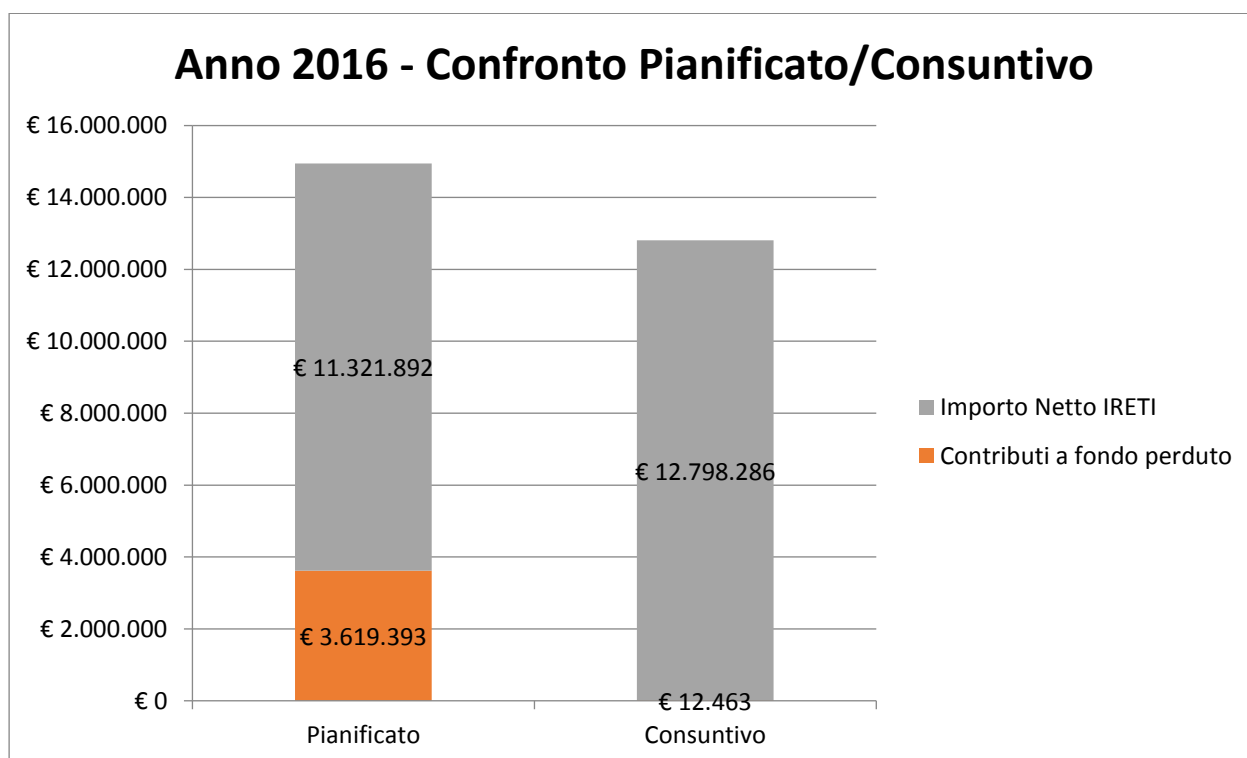


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato programmato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento, che il gestore ha fornito, non risulta esaustiva.

Numero di interventi programmati nel 2016: n.109

Numero di interventi rendicontati nel 2016: n.90

	Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo 2016	Importo Lordo [€] pianificato 2016	Interventi con nota giustificativa non esaustiva
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	35	€ 0	€ 1.001.593	2016PCIE0183 2015PCIE0100 2015PCIE0104 2015PCIE0105 2015PCIE0109 2016PCIE0180 2015PCIE0087 2015PCIE0120 2014PCIE0041 2016PCIE0190 2015PCIE0129 2015PCIE0130 2016PCIE0193 2014PCIE0030 2014PCIE0059 2015PCIE0135
<i>di cui interventi conclusi contabilmente anticipatamente nell'anno precedente</i>	1	€ 0	€ 32.546	
Interventi con avvio anticipato nel 2016 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma Interventi o nel Piano d'Ambito	16	€ 61.258	€ 0	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	64	€ 11.568.841	€ 12.641.984	2014PCIE0032 2016PCIE0165 2014PCIE0014 2014PCIE0013 2014PCIE0040 2014PCIE0027 2014PCIE0053 2014PCIE0072 2014PCIE0042 2014PCIE0024 2014PCIE0020
<i>di cui interventi con scostamento inferiore al limite di franchigia (€ 20.000) come riportato nella Delibera del Consiglio d'Ambito n. 12/2017</i>	9	€ 138.881	€ 154.000	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	10	€ 1.180.649	€ 1.297.708	

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla Tabella 2 sopra riportata si nota come l'attività del gestore IRETI abbia avuto scostamenti nella realizzazione degli interventi rispetto alla pianificazione 2016 approvata. La mancata erogazione dei contributi relativi agli interventi dovuti agli eventi alluvionali (del 2015) ha causato una parziale modifica delle attività del gestore.

Nello specifico dei 109 interventi pianificati nel 2016 solo 90 sono stati avviati e la maggior parte di questi (64) presenta uno scostamento $> \pm 20\%$ tra pianificato e consuntivo investimenti. Il gestore ha prodotto chiarimenti rispetto agli scostamenti effettuati e in diversi casi sono state richieste ulteriori spiegazioni e sono stati attuati controlli specifici.

Per avere però un quadro di maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

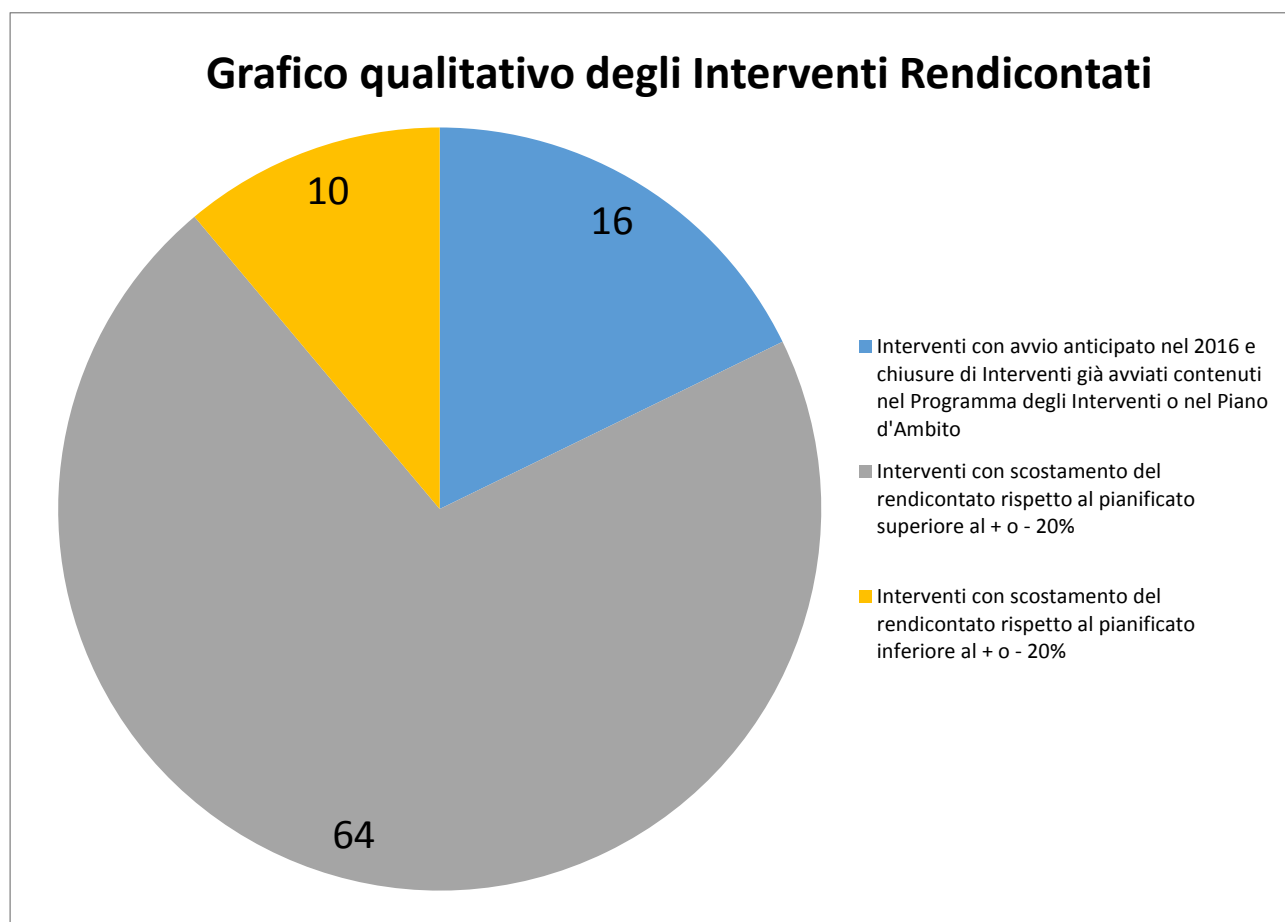


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ELENCO INTERVENTI NON AVVIATI - 2016

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Investimenti Lordi pianificati P.O.I. 2016
2015PCIE0091	Sistemazione rete acquedotto loc. Chiaravalle Carretto	ACQUEDOTTO	Alseno	70.000
2016PCIE0152	Acquedotto zona Generesso 2° stralcio: studio di fattibilità	ACQUEDOTTO	Bettola	10.000
2016PCIE0182	Acquisizione Acquedotto in loc. Olmo - Studio di fattibilità	ACQUEDOTTO	Bettola	10.000
2016PCIE0183	Nuova rete fognaria in loc. Recesio - Studio di fattibilità	FOGNATURA	Bettola	10.000
2015PCIE0096	Collegamento loc. Casarone all'i.d. di S.Maria	FOGNATURA	Bobbio	50.000
2015PCIE0098	Sistemazione criticità fognarie Bobbio	FOGNATURA	Bobbio	25.000
2015PCIE0099	Sistemazione criticità rete fognaria Mottaziana	FOGNATURA	Borgonovo Val Tidone	70.000
2014PCIE0033	P2010004 - Ampliamento impianto di depurazione Cadeo Colombaia	DEPURAZIONE	Cadeo	10.000
2015PCIE0100	Collettamento fognario Cadeo Sud (via Emilia) - progetto e avvio sistemazione generale fognatura	FOGNATURA	Cadeo	10.000
2015PCIE0104	Estendimento rete acquedotto strada della Sforzesca progetto fattibilità per acquisizione contributi	ACQUEDOTTO	Castell'Arquato	10.000
2015PCIE0105	Realizzazione collegamenti serbatoi Martani e Paolini a Castell'Arquato	ACQUEDOTTO	Castell'Arquato	40.000
2015PCIE0108	Studio fattibilità criticità fognarie territorio comunale	FOGNATURA	Castelvetro Piacentino	10.000
2015PCIE0109	Recupero e consolidamento fognatura loc.Mezzano	FOGNATURA	Castelvetro Piacentino	10.000
2015PCIE0111	Ristrutturazione e potenziamento impianto di depurazione	DEPURAZIONE	Cortemaggiore	10.000
2015PCIE0088	G20090010-2 - Sistema fognario e depurativo a servizio del comune di GRAGNANO e ROTTOFRENO: 2° stralcio collettamento loc. Campremoldo e Casaliggio e Centora	DEPURAZIONE	Gragnano Trebbiense, Rottofreno	10.000
2016PCIE0155	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure: attraversamento Nure a Farini	ACQUEDOTTO	Grandi opere	120.000
2016PCIE0180	Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 3° Stralcio: Interconnessione acquedottistica dei comuni CORTEMAGGIORE, SAN PIETRO IN CERRO, CAORSO. Studio di fattibilità.	ACQUEDOTTO	Grandi opere	10.000
2015PCIE0087	Sistema depurativo PODENZANO-VIGOLZONE, 2° stralcio: ristrutturazione e ampliamento depuratore di Podenzano	DEPURAZIONE	Podenzano, Vigolzone	10.000
2015PCIE0120	Sistemazione rete fognaria loc. Niviano di Sopra	FOGNATURA	Lugagnano Val d'Arda	35.000
2015PCIE0124	Rifacimento rete acquedotto loc. Colombello	ACQUEDOTTO	Morfasso	60.000
2014PCIE0041	P2010067 - Realizzazione impianto di depurazione per adeguamento scarico agglomerato Pecorara e sistemazioni reti fognarie capoluogo	DEPURAZIONE	Pecorara	50.000
2016PCIE0188	Realizzazione rete fognatura via Beati	FOGNATURA	Piacenza	10.000
2016PCIE0189	Realizzazione pozzo a Quarto. Cofinanziamento lottizzante.	ACQUEDOTTO	Piacenza	160.000
2016PCIE0190	Manutenzione straordinaria digestore anaerobico depuratore di Piacenza.	DEPURAZIONE	Piacenza	10.000

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Investimenti Lordi pianificati P.O.I. 2016
2015PCIE0126	Rifacimento rete fognaria capoluogo via Roma, 1° stralcio: studio di fattibilità	FOGNATURA	Podenzano	10.000
2014PCIE0044	P2010087 - Sistemazione acquedotto e fognatura in vicolo Nure e zona Ovest Capoluogo	ACQUEDOTTO	Pontenure	40.000
2015PCIE0129	Studio preliminare per nuovo approvvigionamento idrico Capoluogo	ACQUEDOTTO	Pontenure	10.000
2015PCIE0130	Rifacimento impianto elettrico impianto di depurazione e nuova linea pretrattamento liquami	DEPURAZIONE	Pontenure	10.000
2016PCIE0168	Interventi straordinari sul pozzo Fabiano	ACQUEDOTTO	Rivergaro	29.047
2016PCIE0193	Collettamento scarichi zona produttiva di Via Piave a Rottofreno - Studio di fattibilità.	FOGNATURA	Rottofreno	10.000
2014PCIE0030	P2008072 - Potenziamento depuratore capoluogo. 1° stralcio	DEPURAZIONE	San Giorgio Piacentino	10.000
2016PCIE0194	Rifacimento tratti di rete fognaria in Via Caorsana a Polignano	FOGNATURA	San Pietro in Cerro	10.000
2014PCIE0059	P2011028 - Ristrutturazione impianto di depurazione di Travo capoluogo.	DEPURAZIONE	Travo	10.000
2015PCIE0135	Sistemazione criticità fognarie loc. Case Marchesi. Studio di fattibilità	FOGNATURA	Travo	10.000
	TOTALE			969.047

TAB.3 Interventi previsti nel 2016 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

ALLEGATO 1
IRETI PIACENZA - CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNUALITA' 2016

ID ATERSIR (codice)	COMUNI	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2016	Contributi pianificati 2016	Importo netto pianificato 2016	Importo lordo consuntivo 2016	Contributi consuntivo 2016	Importo netto consuntivo 2016	SCOSTAMENTO %	Note gestore in caso di scostamento >±20% del consuntivo rispetto al pianificato, e in caso di interventi non previsti, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PCIE0004	GRANDI OPERE	G20080001 - Miglioramento della qualità dell'acqua nel comune di PIACENZA, 1° Stralcio: Impianto di produzione acqua potabile località Mortizza - Collegamento Piacenza -Mortizza - Collegamento pozzo esistente Mortizza-scuole - perforazione di tre nuovi pozzi	acq	5.300.000	450.000	708.368	-258.368	559.154	0	559.154	24	Superamento del finanziato sulla annualità 2016 in quanto sono state realizzate più opere di quelle pianificate. Il totale rimane entro il 20% dell'importo di progetto.
2014PCIE0005	GRANDI OPERE	G20080003-1 - Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 1° Stralcio: Adeguamento e automazione potabilizz. sino 140 l/s - Condotta Mignano-LUGAGNANO, dorsale sinistra Ongina, adduttrice loc. MOCOMERO, potabilizzatore San Protaso. A servizio dei comuni FIORENZUOLA, CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO, VERNASCA, CARPANETO e GROPPARELLO	acq	2.600.000	400.000	0	400.000	481.227	0	481.227	20	Superamento del finanziato sulla annualità 2016 in quanto sono state realizzate più opere di quelle pianificate. Il totale rimane entro il 20% dell'importo di progetto.
2014PCIE0006	GRANDI OPERE	G20080007-1 -Acquedotto intercomunale Val Tidone, 1° Stralcio: collegamento CALENDASCO-SARMATO-CASTEL SAN GIOVANNI-BORGONOVO-PIACENZA. Potenziamento pozzi Mottaziana - collegamento BORGONOVO e ROTTOFRENO e PIACENZA.	acq	1.100.000	400.000	0	400.000	333.385	0	333.385	-16	
2014PCIE0007	GRANDI OPERE	G20080008 - Acquedotto intercomunale Bassa Val Trebbia: Collegamenti acquedottistici Torrazzo Momeliano Pigazzano.	acq	1.180.000	100.000	0	100.000	116.549	0	116.549	16	
2014PCIE0008	GRANDI OPERE	G20080009 - Razionalizzazione sistema sorgenti Alta Val Trebbia, Alta Val Nure, Alta Val d'Arda. Comuni Cerignale, Zerba, Ottone, Cortebrugnatella, Bobbio, Vernasca, Morfasso Lugagnano, Ferriere, Farini, Bettola, Gropparello, Caminata,	acq	300.000	50.000	0	50.000	568	0	568	-98	Nel 2016 data priorità a interventi relativi all'alluvione. Nel 2017 prevista sistemazione sorgenti Val d'Arda.
2014PCIE0009	GRANDI OPERE	G20080011 - Sistema depurativo intercomunale Bassa Ovest. 1° Stralcio: completamento collettamento di CALENDASCO	dep	500.000	100.000	0	100.000	16.008	0	16.008	-83	L'intervento è terminato ma i tempi si sono protratti per il completamento iter servitù.
2014PCIE0010	GRANDI OPERE	G20080012 -Sistema depurativo intercomunale Bassa Est: stralcio funzionale relativo al potenziamento sino a 10.000 AE dell'impianto di depurazione di S.Giuliano	dep	1.200.000	0	0	0	9.215	0	9.215	100	Intervento pianificato in annualità successive. Anticipate alcune attività di progettazione.
2014PCIE0011	GRANDI OPERE	G20080013 - Sistema depurativo intercomunale Bassa Est: 1° stralcio collettamento Soarza + VILLANOVA(Est+Ovest) + Villanova zona artigianale + Cignano all'impianto di depurazione di S.Giuliano, e adeguamento scarichi loc. Cantarana mediante realizzazione di fossa Imhoff.	dep	1.700.000	100.000	0	100.000	263.329	0	263.329	100	Superamento del finanziato sulla annualità 2016 in quanto sono state realizzate più opere di quelle pianificate. Il totale rimane entro il 20% dell'importo di progetto.
2014PCIE0012	GRANDI OPERE	G20080014 - Sistema depurativo PODENZANO-VIGOLZONE, 1° stralcio: collettamento di Vigolzone nel reticolo fognario di Podenzano.	fog	160.851	0	0	0	5.622	0	5.622	100	Nel 2016 sono stati conclusi alcuni interventi minori.
2014PCIE0013	GRANDI OPERE	G20080015 -Adeguamento scarichi dell'agglomerato di NIBBIANO mediante realizzazione nuovo impianto di depurazione a biodischi	dep	500.000	50.000	0	50.000	1.972	0	1.972	-96	Nel corso dell'anno 2016, in accordo con gli uffici tecnici comunali, è stata comunque definita l'area da destinare alla costruzione dell'impianto e sono state fornite indicazioni affinché tale area fosse inserita negli strumenti urbanistici in fase di approvazione. Contestualmente sono stati presi i contatti con la proprietà dei terreni interessati dall'intervento che in seguito a numerosi contatti intercorsi, ha manifestato verbalmente la disponibilità alla cessione bonaria del terreno. Considerato che nel 2016 era ancora in fase di definizione una soluzione progettuale idonea a soddisfare in modo univoco i molteplici vincoli progettuali, si è ritenuto di non portare a conclusione la pratica di acquisizione dell'area da destinare alla costruzione dell'impianto dando la priorità alla progettazione definitiva determinando lo scostamento degli investimenti previsti.
2014PCIE0014	GRANDI OPERE	G20080016 - Sistemazione reticolo fognario di CAMINATA e Costiola e adeguamento scarichi dell'agglomerato mediante realizzazione nuovo impianto di depurazione a biodischi	dep	500.000	100.000	0	100.000	41.918	0	41.918	-58	Nel 2016 realizzati interventi di adeguamento su parte del reticolo fognario. Rallentamenti nello sviluppo progettuale e nell'acquisizione dell'area. Nel 2017 in corso la progettazione definitiva del depuratore di Caminata e studio per la sistemazione dell'agglomerato Costiola.
2014PCIE0015	GRANDI OPERE	G20080017 - Intervento di ristrutturazione dell'impianto di depurazione del capoluogo CASTEL SAN GIOVANNI, con adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006).	dep	3.600.000	1.200.000	0	1.200.000	677.730	0	677.730	-43	La modifica del progetto del comparto filtrazione ha avuto come conseguenza la necessità di una gara con evidenza europea e l'adeguamento dei documenti di gara in base a quanto richiesto dal nuovo Codice Appalti. L'intervento terminerà definitivamente entro primavera 2018.
2014PCIE0016	GRANDI OPERE	G20080018 -Collettamento loc. Trevozzo (NIBBIANO) all'impianto di depurazione di Pianello V.T., potenziamento depuratore di PIANELLO e sistemazione strada di accesso	fog	700.000	10.000	0	10.000	3.960	0	3.960	-60	Nel 2016 approntato lo studio di fattibilità. Lavori di collegamento di Trevozzo in corso nel 2017.
2014PCIE0018	GRANDI OPERE	G20080020 - Adeguamento agglomerato Valconasso di Pontenure.	dep	629.000	473.000	388.025	84.975	360.066	0	360.066	-23	Lavori in corso con difficoltà di avanzamento per mancata fornitura elettrica. L'intervento è terminato nel 2017.
2014PCIE0019	GRANDI OPERE	G20080022 - Realizzazione tratti di fognatura e impianto di depurazione biologico per COLI, collettamento Coli Capoluogo (agglomerato: Coli, Baselica, Cerreto, Boioli, Peveri, Poggiolo, Corte, Pradaglione, Mazzucchi, Molino) ed estendimento rete loc.Caminata	fog	950.000	230.000	0	230.000	208.622	0	208.622	-9	
2014PCIE0020	GRANDI OPERE	G20080023 - Realizzazione impianto di depurazione e collettamenti fognari per agglomerato Vicobarone 3 e Case Pallaroni di ZIANO	dep	650.000	50.000	0	50.000	1.776	0	1.776	-96	Difficoltà nel raggiungimento degli accordi bonari. Nel 2017 trovato accordo con proprietà privata per posizione impianto ed in corso aggiornamento del progetto con la nuova posizione.
2014PCIE0023	GRANDI OPERE	G20090010 - Sistema fognario e depurativo a servizio del comune di GRAGNANO: 1°stralcio impianto di depurazione e sistemazione reticolo fognario capoluogo	dep	2.600.000	30.000	0	30.000	33.894	0	33.894	12	
2014PCIE0024	GRANDI OPERE	G20090011 -Sistema depurativo a servizio del comune di CALENDASCO - indennità servitù e danni - adeguamento e messa in sicurezza viabilità di accesso al nuovo depuratore	dep	1.750.000	124.000	0	124.000	14.253	0	14.253	-88	Prolungamento tempi causa iter servitù che risultano in fase di completamento.
2015PCIE0084	GRANDI OPERE	Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 2° Stralcio: Nuovo serbatoio diga di Mignano. A servizio dei comuni FIORENZUOLA, CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO, VERNASCA, CARPANETO e GROPPARELLO	acq	1.000.000	50.000	0	50.000	1.437	0	1.437	-97	Progettazione preliminare iniziata a fine 2016 e in corso nel 2017. Rilevate alcune difficoltà nel raggiungimento degli accordi per acquisizione area che si sono risolte nel corso del 2017 dando così inizio alle indagini geologiche.

ALLEGATO 1
IRETI PIACENZA - CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNUALITA' 2016

ID ATERSIR (codice)	COMUNI	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2016	Contributi pianificati 2016	Importo netto pianificato 2016	Importo lordo consuntivo 2016	Contributi consuntivo 2016	Importo netto consuntivo 2016	SCOSTAMENTO %	Note gestore in caso di scostamento >±20% del consuntivo rispetto al pianificato, e in caso di interventi non previsti, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2015PCIE0085	GRANDI OPERE	Acquedotto intercomunale Val Tidone, 2° Stralcio: collegamento CALENDASCO-SARMATO-CASTEL SAN GIOVANNI-BORGONOVO-collegamento ROTTOFRENO-Cattagnina	acq	900.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0086	GRANDI OPERE	Acquedotto intercomunale Val Tidone, 3° Stralcio: Sistemazione criticità Trevozzo (NIBBIANO) mediante rifacimento captazione Molino Rizzo - Collegamento Trevozzo-PIANELLO (serbatoio Ca' dell'Alpe)	acq	800.000	20.000	0	20.000	27.644	0	27.644	38	Avviate le indagini per la caratterizzazione dell'acquifero che hanno comportato una maggiore spesa rispetto a quella pianificata.
2015PCIE0087	GRANDI OPERE	Sistema depurativo PODENZANO-VIGOLZONE, 2° stralcio: ristrutturazione e ampliamento depuratore di Podenzano	dep	1.340.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	Nel corso dell'anno 2016 le attività previste su tale intervento hanno subito un rallentamento per consentire lo svolgimento delle attività legate al ripristino degli impianti danneggiati dagli eventi alluvionali che si sono verificati nel settembre 2015. Nel 2016 è stato comunque approntato uno studio preliminare e nel 2017 è in corso la progettazione definitiva dell'opera.
2015PCIE0088	GRANDI OPERE	G20090010-2 - Sistema fognario e depurativo a servizio del comune di GRAGNANO e ROTTOFRENO: 2° stralcio collettamento loc. Campremoldo e Casaliggio e Centora	dep	1.275.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	Progettazione definitiva e lavori posticipati nel 2017 per poter realizzare la fognatura di Centora nel suo complesso.
2015PCIE0089	GRANDI OPERE	Potenziamento impianto idrovoro di Piacenza Borgoforte	dep	1.800.000	10.000	0	10.000	3.617	0	3.617	-63	Iniziata la fase progettuale che proseguirà nel 2017.
2015PCIE0090	GRANDI OPERE	Rifacimento automazione e rifacimento decantatore secondario n.2.	dep	440.000	0	0	0	0	0	0	0	
2016PCIE0155	GRANDI OPERE	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure: attraversamento Nure a Farini	acq	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	-100	L'intervento in oggetto è stato sviluppato per procedere alla posa di tubazioni definitive congiuntamente ai lavori di consolidamento e ampliamento del ponte sul Nure previsti dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza. IRETI è pertanto in attesa che la predetta Amministrazione metta in opera il cantiere nell'ambito del quale verranno predisposte delle mensole adibite alla posa dei sotto servizi, e sulle quali verranno installate le tubazioni in progetto.
2016PCIE0156	GRANDI OPERE	Dorsale acquedottistica della Val D'Arda: sistemazione briglia di Bardetti	acq	80.000	67.507	0	67.507	239	0	239	-99	Una parte dei costi di questo intervento è stato rendicontato in MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI DI EMERGENZA-ALLUVIONE 2015 in quanto precedenti alla creazione del titolo dedicato.
2016PCIE0177	GRANDI OPERE	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure nel tratto ponte Farini - ponte Cantoniera.	acq	2.035.000	2.035.000	2.035.000	0	3.762	0	3.762	-99	Intervento complesso e posticipato in attesa di contributo. In corso la progettazione preliminare.
2016PCIE0178	GRANDI OPERE	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure nel tratto ponte Cantoniera - Ponte Nano	acq	1.145.000	0	0	0	0	0	0	0	
2016PCIE0179	GRANDI OPERE	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure nel tratto Case Camia - Maioli	acq	745.000	0	0	0	0	0	0	0	
2016PCIE0180	GRANDI OPERE	Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 3° Stralcio: Interconnessione acquedottistica dei comuni CORTEMAGGIORE, SAN PIETRO IN CERRO, CAORSO. Studio di fattibilità.	acq	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	In corso valutazioni per poter dare inizio allo studio di fattibilità.
2014PCIE0032	Agazzano	P2010001 - Adeguamento impianto di depurazione per agglomerato Agazzano OVEST.	dep	800.000	45.000	0	45.000	6.277	0	6.277	-86	L'area destinata alla costruzione del nuovo depuratore, anche se ritenuta la più idonea, presenta elevati dislivelli altimetrici che hanno fortemente rallentato l'individuazione di una soluzione progettuale adeguata. Sono state avviate le procedure per raggiungere gli accordi bonari con i proprietari dei terreni interessati dalla nuove opere ed in alcuni casi sono state firmate le bozze di compromesso di vendita nelle quali però la sottoscrizione del rogito è previsto solo dopo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni all'esecuzione delle opere. Nel corso del 2016 la progettazione definitiva dell'impianto e della strada di accesso non era ancora del tutto conclusa si è ritenuto opportuno procedere con l'acquisizione delle aree destinate all'impianto.
2015PCIE0078	Agazzano	Rifacimento reti acquedotto e fognatura in occasione del rifacimento della pavimentazione di via Roma	acq/fog	168.000	8.000	0	8.000	15.362	0	15.362	92	L'intervento è terminato. Durante le lavorazioni sono emerse criticità che hanno comportato un aumento dei costi.
2016PCIE0196	Agazzano	P2008001 - Contributi	dep		0	0	0	0	0	0	0	
2014PCIE0022	Alseno	G2008025 - Adeguamento scarichi agglomerato Alseno Stazione mediante collettamento all'impianto di Alseno.	dep	270.000	60.000	0	60.000	20.078	0	20.078	-66	L'acquisto del quadro elettrico definitivo è slittato al 2017 e si è concluso l'intervento.
2014PCIE0034	Alseno	P2010008 - Sistemazione Fognatura Chiaravalle basso paese	fog	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0091	Alseno	Sistemazione rete acquedotto loc. Chiaravalle Carretto	acq	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	-100	L'intervento è stato posticipato in attesa di ricevere il contributo previsto per i lavori di via Matteotti/Bellini.
2015PCIE0092	Alseno	Potenziamento impianto di depurazione di Cortina - con contributo	dep	250.000	0	0	0	2.683	0	2.683	100	Intervento pianificato in annualità successive. Anticipate alcune attività di progettazione.
2015PCIE0093	Alseno	Estendimento acquedotto capoluogo via Emilia est zona Rossetti	acq	35.000	35.000	10.000	25.000	19.828	0	19.828	-43	L'intervento è terminato ed il tratto di acquedotto da estendere è stato ridotto in accordo con Amministrazione Comunale e privati interessati.
2016PCIE0181	Alseno	Rifacimento acquedotto V.le Matteotti e Bellini ad Alseno	acq	170.000	170.000	70.000	100.000	151.039	0	151.039	-11	
2015PCIE0094	Besenzone	Rifacimento reti acquedotto via della Libertà e piazza Repubblica	acq	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PCIE0054	Bettola	P2011004 - Acquedotto zona Generesso 1° stralcio	acq	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PCIE0061	Bettola	P2011034 - Completamento fognatura zona artigianale e Roncovero.	fog	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0076	Bettola	P2010009 - Completamento del reticolo fognario-depurativo della località Missano	fog	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0095	Bettola	Sistemazione ed estendimento acquedotto loc. Ca' Rossa	acq	60.000	22.000	3.000	19.000	36.572	0	36.572	66	Intervento terminato. I lavori da realizzare sono risultati superiori rispetto a quelli inizialmente preventivati.
2016PCIE0152	Bettola	Acquedotto zona Generesso 2° stralcio: studio di fattibilità	acq	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	Approntato studio preliminare di fattibilità.
2016PCIE0157	Bettola	Interventi straordinari sul pozzo Le Forche	acq	60.000	60.000	0	60.000	6.422	0	6.422	-89	Le verifiche post alluvione hanno evidenziato la necessità di riprofilare il pozzo dilatando pertanto i tempi di realizzazione. Possibilità di contributo regionale.
2016PCIE0158	Bettola	Interventi straordinari sul pozzo Bussini	acq	150.000	111.235	0	111.235	3.295	0	3.295	-97	In attesa del completamento dei lavori da parte di STB per decidere come procedere.
2016PCIE0182	Bettola	Acquisizione Acquedotto in loc. Olmo - Studio di fattibilità	acq	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	In corso valutazioni per poter dare inizio allo studio di fattibilità.
2016PCIE0183	Bettola	Nuova rete fognaria in loc. Recesio - Studio di fattibilità	fog	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	In corso valutazioni per poter dare inizio allo studio di fattibilità.

ALLEGATO 1
IRETI PIACENZA - CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNUALITA' 2016

ID ATERSIR (codice)	COMUNI	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2016	Contributi pianificati 2016	Importo netto pianificato 2016	Importo lordo consuntivo 2016	Contributi consuntivo 2016	Importo netto consuntivo 2016	SCOSTAMENTO %	Note gestore in caso di scostamento >±20% del consuntivo rispetto al pianificato, e in caso di interventi non previsti, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PCIE0021	Bobbio	G20080026 - Impianto di depurazione di Mezzano Scotti.	dep	500.000	50.000	0	50.000	2.423	0	2.423	-95	Definita nuova posizione dell'impianto in accordo con Amministrazione Comunale. Completati nel 2017 i rilievi topografici.
2014PCIE0035	Bobbio	P2010011 - Ristrutturazione sedimentatore.	dep	60.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PCIE0055	Bobbio	P2011005 - Rifacimento acquedotto loc. Piancasale, Terme di Bobbio Progetto Asse 3.	acq	224.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0096	Bobbio	Collegamento loc. Casarone all'i.d. di S.Maria	fog	100.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100	Lavori realizzati e terminati nel 2017 per poterli realizzare in tutto il loro complesso.
2015PCIE0097	Bobbio	Sistemazione adduttrice da sorgente Arelli - studio preliminare	acq	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0098	Bobbio	Sistemazione criticità fognarie Bobbio	fog	50.000	25.000	0	25.000	0	0	0	-100	Lavori in corso nel 2017 per poterli realizzare in tutto il loro complesso.
2016PCIE0159	Bobbio	Interventi straordinari sull'impianto di sollevamento Auxilia	fog	50.000	34.083	0	34.083	5.267	0	5.267	-84	Lavori iniziati a dicembre 2016 e conclusi a marzo 2017.
2016PCIE0160	Bobbio	Interventi straordinari sull'impianto di sollevamento Dorbida	fog	73.000	58.425	0	58.425	55.575	0	55.575	-4	
2016PCIE0173	Bobbio	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Bobbio capoluogo	dep	200.000	0	0	0	5.453	0	5.453	100	Intervento terminato. Nel 2016 sono stati conclusi alcuni interventi minori.
2014PCIE0002	Borgonovo Val Tidone	E2008001 - Potenziamento vasche dell'impianto di depurazione di Borgonovo, e progetto di adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006).	dep	650.000	0	0	0	667	0	667	100	Intervento pianificato in annualità successive. Anticipate alcune attività di progettazione.
2015PCIE0099	Borgonovo Val Tidone	Sistemazione criticità rete fognaria Mottaziana	fog	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	-100	I lavori di competenza IRETI potranno avere inizio solo dopo la realizzazione delle opere in carico al Consorzio di Bonifica di Piacenza. IRETI ha messo al corrente della situazione l'Amministrazione Comunale di Borgonovo che provvederà a sollecitare il Consorzio sull'inizio delle lavorazioni.
2014PCIE0033	Cadeo	P2010004 - Ampliamento impianto di depurazione Cadeo Colombaia	dep	650.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	Perfezionato progetto preliminare nel 2016. Nel 2017 completato il progetto definitivo e consegnato al comune per l'autorizzazione.
2014PCIE0036	Cadeo	P2010016 - Rifacimento impianti di sollevamento Ricetto e Fontana Fredda.	fog	200.000	5.000	0	5.000	27.492	0	27.492	100	Durante le lavorazioni sono emerse criticità che hanno comportato un aumento dei costi. Terminato nel 2017 il lavoro su Impianto Fontana Fredda, da realizzare quello di Ricetto.
2014PCIE0062	Cadeo	P2014001 - Collettamento scarichi in Via XXIV Maggio.	fog	30.000	26.000	0	26.000	5.760	0	5.760	-77	Fatta progettazione nel 2016 e lavori realizzati e conclusi nel 2017.
2015PCIE0100	Cadeo	Collettamento fognario Cadeo Sud (via Emilia) - progetto e avvio sistemazione generale fognatura	fog	110.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	Fatte verifiche sulla situazione esistente per dare inizio allo studio di fattibilità.
2015PCIE0101	Calendasco	Collettamento loc. Malpaga all'impianto di depurazione di Calendasco	fog	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PCIE0028	Caorso	P2008015 - Completamento fognatura via Torta	fog		0	0	0	0	0	0	0	
2014PCIE0037	Caorso	P2010022 - Adeguamento agglom. Muradolo e Zerbio: collettamento scarichi all'impianto di depurazione di Caorso (realizzato Muradolo, resta da collettare Zerbio)	dep	350.000	120.000	0	120.000	171.644	0	171.644	43	L'intervento risulta composto da due lavori (di cui Zerbio in fase di completamento nel 2017) che pur superando il pianificato del 2016 rientreranno nel costo complessivo dell'opera.
2015PCIE0102	Caorso	Rifacimento rete acquedotto e rete fognaria via Molinazzo	fog	150.000	100.000	0	100.000	60.333	0	60.333	-39	Si sono riscontrati meno imprevisti sui rifacimenti degli allacci ed è stato possibile ridurre dei tratti di tubazione.
2016PCIE0184	Caorso	Realizzazione rete idrica e fognaria in Via Toscanini a Muradolo.	acq	60.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PCIE0038	Carpaneto	P2010024 - Estensione rete acquedotto località Ciriano-Caminata e collegamento a San Lazzaro	acq	280.000	78.000	0	78.000	108.141	0	108.141	38	Anticipato lavori previsti nel 2017 nel corso del quale sono terminati.
2014PCIE0051	Carpaneto	P2010174 - Nuovo serbatoio, impianto di rilancio e relativi collegamenti idraulici serbatoio. 1° Stralcio - Carpaneto	acq	800.000	200.000	0	200.000	367.912	0	367.912	83	Sforamento sulla annualità 2016 in quanto sono state realizzate più opere di quelle pianificate. Il totale rimane entro il 20% dell'importo di progetto.
2014PCIE0056	Castel San Giovanni	P2011007 - Ristrutturazione rilancio Campo Sportivo Castel San Giovanni e sostituzione tratti di adduttrice per serbatoio Ginestre	acq	450.000	20.000	0	20.000	47.037	0	47.037	100	Si è reso necessario realizzare opere aggiuntive rispetto a quanto pianificato. Opere elettriche più onerose del previsto.
2015PCIE0106	Castel San Giovanni	Rifacimento acquedotto e fognatura via Bixio, Mozza, Portone e Zilli	acq	335.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0107	Castel San Giovanni	Rifacimento rete fognaria via Simonetti	fog	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PCIE0047	Castell'Arquato	P2010125 - Realizzazione di impianto per adeguamento scarico dell'agglomerato Bacedasco Alto	dep	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0103	Castell'Arquato	Sistemazione rete fognaria via Marconi	fog	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0104	Castell'Arquato	Estendimento rete acquedotto strada della Sforzesca progetto fattibilità per acquisizione contributi	acq	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	In corso valutazioni per poter dare inizio allo studio di fattibilità.
2015PCIE0105	Castell'Arquato	Realizzazione collegamenti serbatoi Martani e Paolini a Castell'Arquato	acq	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	-100	Primo tratto di collegamento Paolini già realizzato in manutenzione. Iniziate indagini e verifiche per la predisposizione del progetto del collegamento Martani.
2015PCIE0082	Castelvetro Piacentino	Collettamento di S.Pedretto all'i.dep. di S.Giuliano	dep	1.141.545	0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0108	Castelvetro Piacentino	Studio fattibilità criticità fognarie territorio comunale	fog	20.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	Fatte prime verifiche e definito che lo studio deve essere predisposto insieme al Consorzio di Bonifica di Piacenza vista la presenza di numerosi condotti in loro gestione.
2015PCIE0109	Castelvetro Piacentino	Recupero e consolidamento fognatura loc.Mezzano	fog	300.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	Lavori posticipati e in corso nel 2017 per poterli realizzare in tutto il loro complesso
2016PCIE0174	Coli	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Case Trebbia	dep	56.000	46.084	0	46.084	5.409	0	5.409	-88	Le verifiche post alluvione hanno evidenziato la necessità di interventi per un costo inferiore a quello pianificato. L'intervento alluvione è terminato ma sarà necessario realizzare una strada per l'accesso alle vasche.
2015PCIE0110	Cortebruggnatella	Messa in sicurezza impianto di sollevamento loc. Ponte Trebbia Marsaglia	fog	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
2016PCIE0161	Cortebruggnatella	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Marsaglia	dep	160.000	101.547	0	101.547	49.126	0	49.126	-51	Le verifiche post alluvione hanno evidenziato la necessità di interventi per un costo inferiore a quello pianificato. L'intervento è terminato.

ALLEGATO 1
IRETI PIACENZA - CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNUALITA' 2016

ID ATERSIR (codice)	COMUNI	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2016	Contributi pianificati 2016	Importo netto pianificato 2016	Importo lordo consuntivo 2016	Contributi consuntivo 2016	Importo netto consuntivo 2016	SCOSTAMENTO %	Note gestore in caso di scostamento >±20% del consuntivo rispetto al pianificato, e in caso di interventi non previsti, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2015PCIE0111	Cortemaggiore	Ristrutturazione e potenziamento impianto di depurazione	dep	700.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	Nel corso dell'anno 2016 le attività previste su tale intervento hanno subito un rallentamento per consentire lo svolgimento delle attività legate al ripristino degli impianti danneggiati dagli eventi alluvionali che si sono verificati nel settembre 2015. Nel 2016 è stato comunque approntato uno studio di fattibilità per le valutazioni necessarie ad avviare il progetto preliminare.
2015PCIE0112	Cortemaggiore	Progettazione impianto depurazione di Chiavenna Landi - studio di fattibilità	dep	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
2016PCIE0162	Farini	Rifacimento tratti di fognatura nel capoluogo di Farini in fregio all'alveo del torrente Nure	fog	250.000	250.000	0	250.000	72.697	0	72.697	-70	Lavori in parte realizzati. Per concluderli è necessario attendere i lavori dell'Amministrazione Provinciale.
2016PCIE0163	Farini	Interventi straordinari sul pozzo Borcaglia	acq	50.000	50.000	0	50.000	9.037	0	9.037	-81	Le verifiche post alluvione hanno evidenziato la necessità di riprofondire il pozzo dilatando pertanto i tempi di realizzazione. Intervento posticipato in attesa di contributo.
2015PCIE0077	Ferriere	P2010064 - Sistema fognario depurativo loc.Solaro (confluito in altro ID)	fog		0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0113	Ferriere	Sistemazione reticolo fognario del Capoluogo zona Grondana (confluito negli interventi alluvione)	fog	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
2016PCIE0164	Ferriere	Rifacimento tratti di fognatura nel capoluogo di Ferriere in fregio agli alvei dei torrenti Grondana e Nure	fog	180.000	180.000	0	180.000	42.844	0	42.844	-76	Lavori in corso nel 2017 in quanto si è dovuto attendere la conclusione dei lavori di difesa spondale effettuati dal STB. Realizzati tratti fognari e in fase di realizzazione impianto di sollevamento.
2016PCIE0165	Ferriere	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Ferriere capoluogo	dep	840.000	288.386	0	288.386	34.421	0	34.421	-88	Avviata progettazione e opere di completamento fognatura. A causa della complessità dell'intervento non è stato possibile procedere all'investimento dell'importo pianificato nel 2016. Lavori in corso nel 2017.
2015PCIE0114	Fiorenzuola	Rifacimento fognatura via Ugo Foscolo	fog	25.000	0	0	0	3.407	0	3.407	100	Il primo intervento è stato effettuato per dare una risposta immediata ai problemi di allagamento. Verifiche più approfondite effettuate nel 2016 hanno evidenziato la necessità di intervenire sul nodo tra Via Foscolo e Viale Illica. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale verrà fatto uno studio per risolvere le problematiche idrauliche dell'intero quartiere.
2015PCIE0115	Fiorenzuola	Rifacimento sottoservizi rotonda Via Illica	fog	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0116	Fiorenzuola	Rifacimento rete acquedotto strada comunale per Olza	acq	50.000	50.000	0	50.000	51.118	0	51.118	2	
2015PCIE0142	Fiorenzuola	Completamento collegamento frazione Basilica Duce all'imp.di depurazione di Fiorenzuola	fog	330.000	0	0	0	0	0	0	0	
2016PCIE0185	Fiorenzuola	Rifacimento sottoservizi in occasione degli interventi sulla viabilità comunale	acq	190.000	190.000	0	190.000	122.858	0	122.858	-35	Lavori da realizzare in concomitanza a quelli comunali. Previste nel 2017 ulteriori 2 rotatorie.
2016PCIE0186	Fiorenzuola	Raddoppio collegamento campo-pozzi di San Protaso al serbatoio pensile del Capoluogo	acq	500.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PCIE0039	Gazzola	P2010049 - Adeguamento dell'impianto di depurazione agglomerato Capoluogo Ovest-Rio Gazzola e collettamento scarichi	dep	500.000	10.000	0	10.000	11.442	0	11.442	14	
2015PCIE0117	Gazzola	Potenziamento dell'impianto di depurazione agglomerato Canneto - Studio di fattibilità	dep	5.000	5.000	0	5.000	3.842	0	3.842	-23	Iniziata la fase progettuale che proseguirà nel 2017.
2014PCIE0063	Gossolengo	P2014003 - Ampliamento impianto di depurazione di Gossolengo.	dep	500.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0118	Gossolengo	Sistemazione acquedotto e fognatura via dei Rivi	fog	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0119	Gossolengo	Rifacimento rete acquedotto via Marconi	acq	46.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PCIE0050	Gropparello	P2010139 - Sostituzione tubo di collegamento Gusano-Monterosso per collegamento alla dorsale Val D'Arda.	acq	205.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0144	Gropparello	Rifacimento rete acquedotto in loc. Boccacci	acq	65.000	0	0	0	0	0	0	0	
2016PCIE0196	Gropparello	Sistemazione del collettore fognario afferente l'impianto di depurazione di Gropparello	fog	60.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0079	Lugagnano Val d'Arda	Revisione e potenziamento della rete acquedotto. Opere integrative	acq	900.000	0	0	0	1.671	0	1.671	100	Completamento di intervento relativo ad annualità precedente.
2015PCIE0120	Lugagnano Val d'Arda	Sistemazione rete fognaria loc. Niviano di Sopra	fog	70.000	35.000	0	35.000	0	0	0	-100	Lavori posticipati e in corso nel 2017 per poterli realizzare in tutto il loro complesso.
2015PCIE0121	Lugagnano Val d'Arda	Rifacimento rete acquedotto via Garibaldi-via Risorgimento	acq	70.000	50.000	0	50.000	100.322	0	100.322	100	Intervento realizzato insieme a quello di fognatura ID 2015PCIE0187. Il totale dell'opera rispetta il pianificato.
2016PCIE0187	Lugagnano Val d'Arda	Rifacimento fognatura in via Garibaldi	fog	100.000	100.000	0	100.000	37.395	0	37.395	-62	Intervento realizzato insieme a quello di acquedotto ID 2015PCIE0121. Il totale dell'opera rispetta il pianificato.
2014PCIE0040	Monticelli d'Ognina	P2010061 - Rifacimento impianto di potabilizzazione di San Pedretto.	acq	240.000	185.000	0	185.000	557	0	557	-99	Nel 2016 sono state messe in atto opere propedeutiche alla realizzazione dell'intervento che è proseguita nel 2017.
2014PCIE0057	Monticelli d'Ognina	P2011016 - Collettamento scarichi via Tinazzo.	fog	160.000	0	0	0	2.390	0	2.390	100	Intervento pianificato in annualità successive. Anticipate alcune attività di progettazione.
2015PCIE0075	Monticelli d'Ognina	P2010063 - Ristrutturazione impianto Quattrocasse	acq	60.000	60.000	0	60.000	197	0	197	-99	Intervento in ritardo rispetto alla pianificazione per problemi di tipo autorizzativo. Presi contatti con la soprintendenza in quanto l'edificio è vincolato. In corso valutazioni sulla soluzione progettuale da porre in atto.
2015PCIE0122	Monticelli d'Ognina	Collegamento acquedotto San Nazzaro al serbatoio Quattro Case (Capoluogo)	acq	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0123	Monticelli d'Ognina	Realizzazione fognatura per sistemazione criticità via Breda - studio fattibilità	fog	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0124	Morfasso	Rifacimento rete acquedotto loc. Colombello	acq	120.000	60.000	0	60.000	0	0	0	-100	I lavori non sono stati eseguiti in attesa di capire i movimenti franosi della zona ed intervenire nel momento più opportuno. Progettazione definitiva conclusa nel 2017.
2014PCIE0017	NIBBIANO	G20080019 - Adeguamento agglomerato Strà (NIBBIANO) mediante sistemazione delle fosse Imhoff.	dep	120.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PCIE0058	Nibbiano	P2011018 - Estensione rete idrica loc. Spaneto e Verbetto.	acq	237.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PCIE0026	OPERE PLURICOMUNALI	Completamento ripristini asfalti	acq	75.000	0	0	0	24	0	24	100	Errore di imputazione ore di personale.
2014PCIE0027	OPERE PLURICOMUNALI	Manutenzioni straordinarie e interventi di emergenza	acq/fog/dep	0	3.000.000	0	3.000.000	5.416.560	0	5.416.560	80	La maggior spesa è dovuta sia a lavori legati ad emergenza alluvione richiesti dai Comuni sia a diverse manutenzioni reti e sostituzioni tubazioni legate ad interventi di ripavimentazione stradale.

ALLEGATO 1
IRETI PIACENZA - CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNUALITA' 2016

ID ATERSIR (codice)	COMUNI	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2016	Contributi pianificati 2016	Importo netto pianificato 2016	Importo lordo consuntivo 2016	Contributi consuntivo 2016	Importo netto consuntivo 2016	SCOSTAMENTO %	Note gestore in caso di scostamento >±20% del consuntivo rispetto al pianificato, e in caso di interventi non previsti, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PCIE0049	OPERE PLURICOMUNALI	P2010135 - Distributori di acqua pubblica.	acq	480.000	0	0	0	465	0	465	100	Completamento di intervento relativo ad annualità precedente.
2014PCIE0053	OPERE PLURICOMUNALI	P2011001 - Impianti di telegestione depuratori.	dep	450.000	50.000	0	50.000	12.926	0	12.926	-74	Minor spesa a causa dell'allungamento del tempo d'acquisto del materiale che ha impedito la realizzazione dei lavori.
2014PCIE0071	OPERE PLURICOMUNALI	CAORSO-Acquedotto strada Chiavenna; CASTELL'ARQUATO-Realizzazione impianto depurazione S.Lorenzo; COLI-Realizzazione impianto depurazione Aglio; FARINI-Sistemazione fognatura Montereleggio; FERRIERE-Sistem. fognatura e acquedotto Castelcanafurone, Solaro, Noce e Brugneto; GAZZOLA-Interventi acquedottistici cofinanziati; PIANELLO-Potenziamento acquedotto Gabbiano Poggiolo; PIOZZANO-Fognatura Montecanino; PONTE DELL'OLIO-Collegamenti fognari Zaffignano, Caneva e La Fratta all'impianto di dep. del Capoluogo; RIVERGARO-Rifacimento rete acquedotto Niviano-Roveleto Landi; SAN GIORGIO-Realizzazione nuovo impianto di dep.di Centovera e adeguamento San Damiano tramite collettamento a Centovera; TRAVO - Acquedotto località Pillerone e acquedotto località Dolgo (interventi cofinanziati); VILLANOVA-Realizzazione rete acquedotto via Stallone e Sant'Agata acquedotto e fognatura.	acq/fog/dep	3.120.000	300.000	0	300.000	112.075	0	112.075	-62	In corso di realizzazione una parte degli interventi in elenco. Si è data priorità alla conclusione di alcune opere derivanti dall'emergenza alluvione.
2014PCIE0072	OPERE PLURICOMUNALI	Cartografia	acq/fog/dep		200.000	0	200.000	281.375	0	281.375	40	Maggiori risorse dedicate all'attività di aggiornamento della cartografia delle reti.
2015PCIE0083	OPERE PLURICOMUNALI	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI DI EMERGENZA - ALLUVIONE 2015	acq/fog/dep	1.508.345	145.502	0	145.502	1.228.884	0	1.228.884	100	Nel corso del 2016 si è provveduto al rifacimento completo o parziale di impianti (acquedotto, fognatura e depurazione) e alla sostituzione di tratti di rete (acquedotto e fognatura) provvisoriamente messi in opera nei giorni successivi all'alluvione. In sostanza nell'autunno 2015 si è provveduto alle emergenze e all'esecuzione di interventi provvisori per garantire il servizio
2015PCIE0141	OPERE PLURICOMUNALI	Struttura, studi e progettazioni. Progettazione dell'adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006) degli impianti di depurazione di Fiorenzuola e di Rottofreno.	struttura		100.000	0	100.000	9.764	0	9.764	-90	Approntato studio di fattibilità per i due impianti.
2016PCIE0195	OPERE PLURICOMUNALI	Estendimento reti a carico di privati	acq/fog		0	0	0	20.544	12.463	8.081	100	In questa voce vengono inseriti i contributi c/terzi per estendimenti rete acquedotto e fognatura.
2015PCIE0125	Ottone	Rifacimento Fosse Imhoff loc. Fabbrica e Bertassi (frane)	dep	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
2016PCIE0166	Ottone	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Ottone	dep	130.000	110.593	0	110.593	648	0	648	-99	L'intervento, iniziato nel 2016, si è protratto e concluso nel 2017 con una spesa inferiore a quella pianificata.
2014PCIE0041	Pecorara	P2010067 - Realizzazione impianto di depurazione per adeguamento scarico agglomerato Pecorara e sistemazioni reti fognarie capoluogo	dep	300.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100	Approntato studio preliminare di fattibilità. Sono in corso le valutazioni riguardo i collettamenti degli scarichi esistenti al nuovo impianto depurazione in quanto ricadono in proprietà privata.
2014PCIE0042	Pecorara	P2010070 - Sistemazione del sistema di depurazione agglomerati Cicogni Nord, Centro e Sud	dep	100.000	50.000	0	50.000	5.131	0	5.131	-89	Approntato studio di fattibilità che ha evidenziato la necessità di realizzare nuovi tratti di fognatura per il collettamento degli scarichi al nuovo impianto. Il tracciato dei nuovi collettori interessa numerose proprietà private e ciò richiede tempistiche elevate per il raggiungimento degli accordi.
2014PCIE0043	Piacenza	P2010074 - Revisione decantatore secondario depuratore di Piacenza.	dep	230.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PCIE0064	Piacenza	P2014005 - Rifacimento rete acquedotto via Dante per rifacimento pavimentazione	acq	380.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PCIE0065	Piacenza	P2014006 - Realizzazione tratto di fognatura in località La Verza.	fog	800.000	200.000	0	200.000	241.728	0	241.728	20	Superamento del finanziato sulla annualità 2016 in quanto sono state realizzate più opere di quelle pianificate. Il totale rimane entro il 20% dell'importo di progetto.
2016PCIE0188	Piacenza	Realizzazione rete fognatura via Beati	fog	120.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	Lavori cantierabili ma posticipati ad agosto 2018 in accordo con Amministratore Comunale in quanto sulla Via insistono molte attività.
2016PCIE0189	Piacenza	Realizzazione pozzo a Quarto. Cofinanziamento lottizzante.	acq	350.000	160.000	160.000	0	0	0	0	-100	In attesa del contributo da parte della Ditta Lottizzante.
2016PCIE0190	Piacenza	Manutenzione straordinaria digestore anaerobico depuratore di Piacenza.	dep	400.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	Approntato studio di fattibilità.
2014PCIE0048	Podenzano	P2010133 - Completamento rete fognaria località Case Gatti. 1° Stralcio: rete.	fog	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PCIE0052	Podenzano	P2010239 - Nuovo pozzo Altoè.	acq	300.000	5.000	0	5.000	30.235	0	30.235	100	Realizzazione opere complementari di telecontrollo per gestione in rete del nuovo pozzo. Lavori elettrici terminati nel 2017.
2015PCIE0081	Podenzano	Realizzazione impianto di sollevamento reflui loc. Due Case	fog	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0126	Podenzano	Rifacimento rete fognaria capoluogo via Roma, 1° stralcio: studio di fattibilità	fog	1.200.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	Approntato studio preliminare di fattibilità.
2015PCIE0127	Podenzano	Studio sistemazione criticità fognarie San Polo e Turro	fog	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
2016PCIE0153	Podenzano	Interventi di miglioramento della distribuzione idropotabile. 2° stralcio	acq	1.865.000	200.000	0	200.000	163.076	0	163.076	-18	
2015PCIE0128	Ponte dell'Olio	Ristrutturazione impianto di depurazione Capoluogo - studio fattibilità	dep	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PCIE0044	Pontenure	P2010087 - Sistemazione acquedotto e fognatura in vicolo Nure e zona Ovest Capoluogo	acq	100.000	40.000	0	40.000	0	0	0	-100	Anas chiede posa fognatura mediante trivellazione orizzontale teleguidata che risulta non realizzabile dal momento che è necessaria la posa di una tubazione in PVC De 250 mm.
2015PCIE0129	Pontenure	Studio preliminare per nuovo approvvigionamento idrico Capoluogo	acq	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	In corso valutazioni per poter dare inizio allo studio di fattibilità.
2015PCIE0130	Pontenure	Rifacimento impianto elettrico impianto di depurazione e nuova linea pretrattamento liquami	dep	190.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	In corso progettazione preliminare. Progettazione elettrica in corso nel 2017.
2016PCIE0191	Pontenure	Realizzazione rete fognaria in loc. Cassino a Pontenure.	fog	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PCIE0066	Rivergaro	P2014007 - Ampliamento impianto di depurazione di Pieve Dugliara, 1° stralcio: inserimento impianto ex Gragnano e collegamenti	dep	100.000	9.000	0	9.000	11.417	0	11.417	26	Durante le lavorazioni sono emerse criticità che hanno comportato un aumento dei costi.

ALLEGATO 1

IRETI PIACENZA - CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNUALITA' 2016

ID ATERSIR (codice)	COMUNI	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2016	Contributi pianificati 2016	Importo netto pianificato 2016	Importo lordo consuntivo 2016	Contributi consuntivo 2016	Importo netto consuntivo 2016	SCOSTAMENTO %	Note gestore in caso di scostamento >±20% del consuntivo rispetto al pianificato, e in caso di interventi non previsti, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PCIE0067	Rivergaro	P2014008 - Rifacimento sottoservizi piazza Paolo per rifacimento pavimentazione	acq	290.000	0	0	0	2.564	0	2.564	100	Completamento di intervento relativo ad annualità precedente.
2014PCIE0068	Rivergaro	P2014009 - Rifacimento caricamento e distribuzione acquedotto via Taccella Ca' Leone	acq	165.000	35.000	0	35.000	16.639	0	16.639	-52	Intervento terminato. Ci sono state economie sui ripristini stradali.
2016PCIE0154	Rivergaro	Completamento rete fognaria in loc. Bassano.	fog	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
2016PCIE0167	Rivergaro	Interventi straordinari sul pozzo Cisiano	acq	40.000	39.301	0	39.301	223.697	0	223.697	100	Maggiori costi dovuti a rifacimento e potenziamento della difesa spondale. Il lavoro è terminato nel 2017.
2016PCIE0168	Rivergaro	Interventi straordinari sul pozzo Fabiano	acq	30.000	29.047	0	29.047	0	0	0	-100	Intervento in ritardo rispetto alla pianificazione in quanto sono necessari accordi con STB per la realizzazione della difesa spondale.
2016PCIE0169	Rivergaro	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Pieve Dugliara	dep	190.000	129.416	0	129.416	16.573	0	16.573	-87	L'intervento è terminato e la maggior parte dei costi ha inciso sul 2015.
2016PCIE0170	Rivergaro	Interventi straordinari sull'impianto di sollevamento Molinazzo	fog	314.000	40.892	0	40.892	17.923	0	17.923	-56	Terminati i lavori all'impianto, nel 2017 sono in corso quelli di realizzazione della difesa spondale.
2016PCIE0192	Rivergaro	Realizzazione nuovo serbatoio in loc. Le Piane a Rivergaro e rifacimento tratti di rete idrica ed eliminazione di interferenze con proprietà private.	acq	250.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0131	Rottofreno	Razionalizzazione reti acquedotto via Ungaretti e via Bruschi - studio fattibilità	acq	120.000	120.000	0	120.000	91.257	0	91.257	-23	Intervento terminato. E' stato possibile ridurre alcuni tratti di tubazione per ricollegare gli allacci esistenti.
2016PCIE0193	Rottofreno	Collettamento scarichi zona produttiva di Via Piave a Rottofreno - Studio di fattibilità.	fog	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	Presenza visione della situazione degli scarichi della zona per dare avvio allo studio di fattibilità nel 2017.
2014PCIE0030	San Giorgio Piacentino	P2008072 - Potenziamento depuratore capoluogo. 1° stralcio	dep	800.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	Approntato studio di fattibilità. Nel 2017 in corso progettazione definitiva per richiesta autorizzazioni.
2015PCIE0132	San Giorgio Piacentino	Potenziamento depuratore capoluogo. 2° stralcio	dep	500.000	0	0	0	0	0	0	0	
2016PCIE0171	San Giorgio Piacentino	Interventi straordinari sul pozzo Colombarola	fog	50.000	49.283	0	49.283	55.948	0	55.948	13	
2016PCIE0194	San Pietro in Cerro	Rifacimento tratti di rete fognaria in Via Caorsana a Polignano	fog	100.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	Nel 2016 è stata fatta la pulizia di alcuni tratti di fognatura per rilevare le criticità. L'intervento è stato realizzato e concluso nel 2017.
2015PCIE0133	Sarmato	Rifacimento condotte idriche in loc. Poggio verso loc. Molza, nel tratto terminale via Poggio-via Sito Nuovo	acq	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0134	Sarmato	Estensione acquedotto rete idrica su SPR10-via Emilia Est - verifica fattibilità per acquisizione	acq	61.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PCIE0059	Travo	P2011028 - Ristrutturazione impianto di depurazione di Travo capoluogo.	dep	1.000.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	Approntato studio preliminare di fattibilità.
2015PCIE0135	Travo	Sistemazione criticità fognarie loc. Case Marchesi. Studio di fattibilità	fog	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	Verifiche in corso sulla fattibilità e sull'utilità dell'intervento.
2015PCIE0136	Travo	Collegamento Ponte Travo al serbatoio del Capoluogo	acq	90.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0137	Travo	Rifacimento rete acquedotto e fognatura loc. Bergonzi	acq	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
2016PCIE0172	Travo	Interventi straordinari sul pozzo Campo Sportivo	acq	150.000	32.546	0	32.546	0	0	0	-100	Intervento concluso. Le verifiche post alluvione hanno evidenziato la necessità di una minor spesa rispetto a quella prevista. Alcuni interventi di manutenzione straordinaria sono ricaduti nell' ID 2015PCIE0083. La difesa spondale sarà realizzata da STB.
2016PCIE0175	Travo	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Travo	dep	66.000	42.438	0	42.438	4.001	0	4.001	-90	E' stata verificata la necessità di un intervento più consistente che riguarda la predisposizione di una difesa all'impianto la cui progettazione è prevista nel 2017.
2014PCIE0001	Vernasca	203 - Realizzazione nuovo impianto di depurazione (biodischi) per l'agglomerato Osteria Nuova 2 e relativi collegamenti fognari (studio fattibilità NUOVA SOLUZIONE)	dep	115.000	0	0	0	4.173	0	4.173	100	Intervento pianificato in annualità successive. Anticipate alcune attività di progettazione.
2014PCIE0045	Vernasca	P2010110 - Rifacimento dorsale acquedottistica in sinistra Ongina tra il cimitero del Capoluogo di Vernasca e il serbatoio Coronini. 1° Stralcio (confluito in altro ID)	acq	300.000	0	0	0	102	0	102	100	Intervento confluito in 2014PCIE0005
2014PCIE0046	Vernasca	P2010121 - Collegamento acquedotto in località Vitalta.	acq	130.000	50.000	0	50.000	6.247	0	6.247	-87	Il cantiere è partito alla fine del 2016 e si è concluso nel 2017.
2015PCIE0138	Vernasca	Rifacimento serbatoi loc. Vezzolacca	acq	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PCIE0139	Vernasca	Realizzazione nuovo impianto di depurazione (biodischi) per l'agglomerato Vernasca Rete1 e collegamenti fognari	dep	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PCIE0031	Vigolzone	P2008081 - Rifacimento tratti rete acquedotto località Carmiano e Case Gatti.	acq	300.000	0	0	0	1.520	0	1.520	100	Completamento di intervento relativo ad annualità precedente.
2015PCIE0140	Vigolzone	Collettamento rete fognaria da Albarola al depuratore di Ponte dell'Olio (confluito in altro ID alluvione)	fog	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
2016PCIE0176	Vigolzone	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Albarola	dep	245.000	245.000	245.000	0	550	0	550	-99	Avviata la progettazione e le opere di completamento fognatura. A causa della complessità dell'intervento non è stato possibile procedere all'investimento dell'importo pianificato nel 2016. Acquisite le aree nel corso del 2017. Possibile contributo regionale.
2014PCIE0060	Ziano Piacentino	P2011032 - Adeguamento degli scarichi fognari dell'agglomerato Ziano 5.	dep	250.000	0	0	0	758	0	758	100	Intervento pianificato in annualità successive. Anticipate alcune attività di progettazione.
TOTALE INVESTIMENTI 2016					14.941.285	3.619.393	11.321.892	12.810.749	12.463	12.798.286		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza n. 2 del 15 marzo 2018

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore IRETI S.p.A. Programma Operativo
Interventi 2015-2019: approvazione consuntivo 2016.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

15 marzo 2018

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Piacenza

F.to Giuseppe Sidoli

Il segretario verbalizzante

F.to Fausta Pizzaghi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 26 marzo 2018
