

**CLRN/2020/8 del 18 dicembre 2020**

**CONSIGLIO LOCALE DI RIMINI**

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2018 - Gestore HERA S.p.A.**

**IL COORDINATORE**

**F.to Rizio Santi**

**CLRN/2020/8**

**CONSIGLIO LOCALE di RIMINI**

L'anno **2020** il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 11.30, si è riunito il Consiglio Locale di Rimini, convocato con lettera protocollo PG.AT/2020/0009026 del 14/12/2020, in seduta telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Riziero Santi.

Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI RIMINI	Santi Riziero	Presidente	sì	10,0000
BELLARIA IGEA MARINA	Ceccarelli Adele	Assessore	sì	5,0261
CASTELDELICI				0,4582
CATTOLICA	Gennari Mariano	Sindaco	sì	4,5123
CORIANO	Pazzaglia Anna	Assessore	sì	2,8705
GEMMANO	Santi Riziero	Sindaco	sì	0,6362
MAIOLO				0,5596
MISANO ADRIATICO	Piccioni Fabrizio	Sindaco	sì	3,4304
MONDAINO				0,7089
MONTEFIORE CONCA				0,8987
MONTEGRIDOLFO				0,6052
MONTESCUDO - MONTE COLOMBO				2,3552
MORCIANO DI ROMAGNA				2,0811
NOVAFELTRIA				2,1793
PENNABILLI				1,1056
POGGIO TORRIANA	Antonini Franco	Vicesindaco	sì	1,5948
RICCIONE	Galassi Gabriele	Assessore	sì	9,0400
RIMINI	Brasini Gianluca	Assessore	sì	35,4884
SALUDECIO				1,1084
SAN CLEMENTE	Cecchini Mirna	Sindaco	sì	1,6637
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	Gabellini Nicola	Assessore	sì	2,6050
SAN LEO				1,0938
SANT'AGATA FELTRIA				0,9201
SANTARCANGELO DI ROMAGNA	Garattoni Angela	Assessore	sì	5,5920
TALAMELLO				0,6130
VERUCCHIO				2,8534

Presenti n. 12, quote 82,4594

Assenti n. 14, quote 17,5406

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2018 - Gestore HERA S.p.A.**

**Vista** la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato** che:

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di approvazione dei piani d’ambito;

**considerato** che:

- con deliberazione n. 4 del 18 dicembre 2015 del Consiglio locale di Rimini è stato approvato il programma operativo degli interventi 2015-19 del servizio idrico integrato (POI), proponendo al Consiglio d’ambito la conseguente revisione del programma degli interventi di cui al Piano d’Ambito approvato con deliberazione n. 47 del 29 settembre 2015 del Consiglio d’ambito;
- con deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2016 del Consiglio d’ambito è stata approvata l’integrazione dei Piani di Ambito vigenti nei territori delle ex Province di Modena, Forlì Cesena, Ferrara e Rimini conseguentemente all’approvazione del consuntivo degli interventi anno 2014 e all’approvazione del programma degli interventi 2015-2019 di cui alla schema regolatorio AEEGSII;
- con deliberazione n. 5 del 1 febbraio 2017 del Consiglio Locale di Rimini è stata approvata una revisione straordinaria del Programma degli interventi 2016-2019, mantenendo invariate le previsioni di pianificazione dell’annualità 2016 ed introducendo per il triennio 2017-2019 alcune variazioni proposte dal gestore e condivise con le amministrazioni comunali variazioni;
- con deliberazione del Consiglio Locale n. 2 del 15 giugno 2018 il Consiglio Locale di Rimini ha approvato la revisione straordinaria del Programma Operativo degli Interventi 2016-19 per il territorio della provincia di Rimini relativamente alle annualità 2018 e 2019, e contestualmente è stata integrata ed aggiornata la pianificazione d’Ambito per il periodo 2016-2039.
- con deliberazione n. 50 del 28 giugno 2018 il Consiglio d’Ambito ha approvato l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria allora vigente (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione tariffaria per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, anche per il bacino di Rimini. Con tale deliberazione, fra l’altro, si è dato atto che il PdI-cronoprogramma degli investimenti,

redatto secondo lo schema previsto dall'Autorità di Regolazione, era stato predisposto modificando alcuni importi di interventi già esistenti e/o introducendo nuovi interventi al fine di rispettare gli adempimenti richiesti per l'adeguamento agli standard della RQTI (deliberazione ARERA n. 917/2017/R/idr) e che pertanto l'approvazione dell'atto di ATERSIR ha costituito modifica e integrazione dei POI approvati dai Consigli Locali;

- con deliberazione di Consiglio d'ambito n. 76 del 10/12/2018 è stato approvato l'aggiornamento complessivo del Piano d'ambito, compresa la parte B –Programma degli Interventi, documento ricompreso nella documentazione di gara per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo;

**considerato** altresì che:

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
  - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti significativi dal programma approvato;
  - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
  - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
  - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

**dato atto** che il gestore HERA s.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2018 attraverso il software ARSI;

**dato atto** altresì che la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**rilevato** che dai dati presentati è emerso quanto segue:

- il gestore non ha avviato n. 23 interventi che invece erano stati programmati come da tabella 2 della relazione allegata;
- vi sono stati 14 interventi con avvio anticipato o chiusure di interventi già avviati contenuti nel POI;
- vi è 1 intervento oggetto di nulla osta della struttura tecnica di ATERSIR rilasciato nella annualità 2018 ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017, identificato con il seguente ID: 2018RNHA0012 (nulla osta PG.AT/2018/0006121 del 19/09/2018)

**ritenuto** pertanto di prendere atto:

- delle modifiche al programma degli interventi che non necessitano di approvazione preventiva ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017 per l'annualità 2018;
- di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2018 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**a voti** resi nelle forme di legge, con voti favorevoli **n.11**, quote **73,4194**, astenuti n.0, contrari n.1 (Comune di Riccione), quote 9,0400;

### **DELIBERA**

1. di prendere atto delle modifiche al programma degli interventi che non necessitano di approvazione preventiva ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017 per l'annualità 2018;
2. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2018 dal gestore HERA S.p.A. come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2018**

**GESTORE: HERA S.P.A.  
BACINO TARIFFARIO: RIMINI**

## RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2018

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2018, del Programma operativo degli interventi (POI) e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Rimini n. 05 del 01 Febbraio 2017, successivamente modificato con la delibera n.ro 2 del 15 giugno 2018, che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015

	PIANIFICATO 2018		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2018	
GESTORE HERA	Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 29.398.250	-€ 8.070.681	€ 21.327.569	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
	Importo Contributo Pianificato [B]	€ 7.705.250	€ 3.945.931	€ 11.651.181	Importo Contributo a Consuntivo [B]
	Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 21.693.000	-€ 12.016.613	€ 9.676.387	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]
CONTO TERZI	Importo pianificato da soggetto investitore diverso da Hera	€ 20.963.721	-€ 15.365.676	€ 5.598.045	Importo a consuntivo da soggetto investitore diverso da Hera
TOTALE	Totale pianificato	€ 50.361.971	-€ 23.436.357	€ 26.925.614	Totale consuntivato

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, considerando sia gli interventi da esso finanziati che quelli finanziati da terzi, abbia effettuato nel corso del 2018 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un 46 %, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato.

Per quanto riguarda invece la quota parte di interventi finanziati direttamente (importo netto A-B) il gestore HERA ha eseguito investimenti superiori per circa il 27,5 % rispetto al pianificato.

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato alla presente relazione.

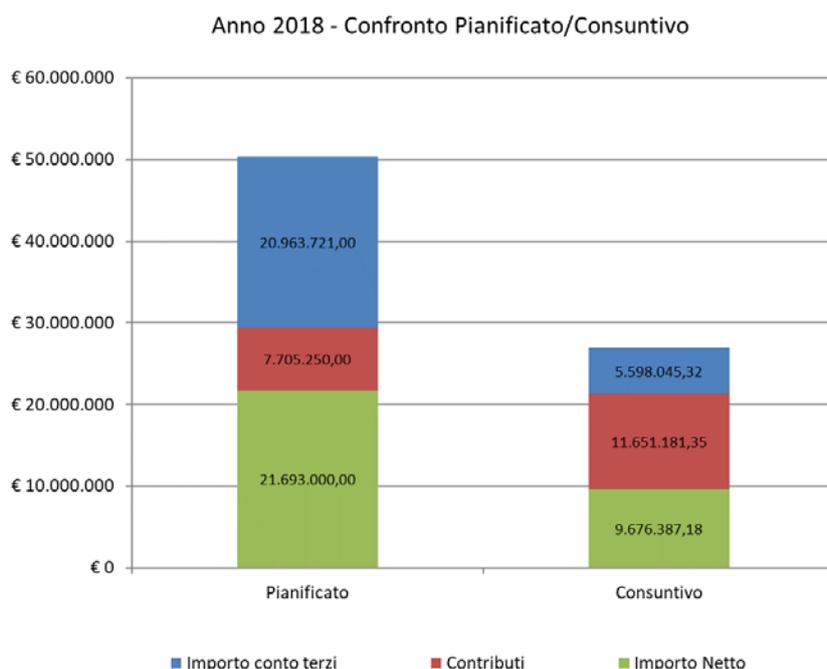


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018

## RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo eventuale provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2018 (*interventi per i quali era programmato un importo diverso da zero nell'annualità 2018*): 68

Numero di interventi rendicontati nel 2018: 58

		Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2018	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2018	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR
1	Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	23	€ 0	€ 5.309.619	0	0
2	Interventi con avvio anticipato nel 2018 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	14	€ 2.158.924	€ 50.000	0	
3	Interventi avviati nel 2018 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0	0	
4	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	35	€ 12.178.871	€ 32.767.745	0	
5	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato	10	€ 12.587.819	€ 12.234.607	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA	

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta quanto segue:

- il gestore non ha avviato nel 2018 n.ro 23 interventi che invece erano stati programmati;
- vi sono n.ro 14 interventi con avvio anticipato o con chiusure di interventi già avviati rispetto a quanto contenuto nel Programma operativo degli interventi; in particolare si rileva che di questi, n.ro 3 interventi sono caratterizzati da avvio anticipato di attività e n.ro 12 da completamento di attività precedentemente iniziate;
- Vi sono n.ro 5 interventi per i quali il gestore ha indicato come motivazione "ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO". Nello specifico trattasi di: 2014RNHA0057 PSB-REAL. VASCA COLONNELLA in relazione al quale è stato successivamente rilasciato un nulla osta per cambio soggetto finanziatore con PG.AT/2020/0002591 del 19/03/2020 e al quale è stato assegnato il nuovo ID2020RNHA0001; 2014RNHA0075 POTENZIAMENTO RETE IDRICA DI SANTARCANGELO e 2015RNHA0001 RIORDINO SCHEMA IDRICO DEL CONCA in relazione ai quali è stato successivamente sottoscritto in data 30/12/2019 il terzo accordo attuativo dell'accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini tra ATERSIR , Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ed Hera S.p.A.; 2017RNHA004 INTERVENTI

SULLE CONDOTTE DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO "VIENNA" e 2017RNHA0022 COLLEG. PREMENTE DEL SOLL. 2C CON DORSALE SUD (EX INTERVENTO RICOSTR. PREMENTE DN 700 V.FLAMINIA-V.FADA) per i quali l'accordo attuativo non è stato effettivamente sottoscritto.

Inoltre si può notare come rispetto ai 58 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 60 % di questi (35 interventi) ha avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno, con una riduzione degli importi lordi relativi a questa categoria pari al 63 % rispetto al pianificato.

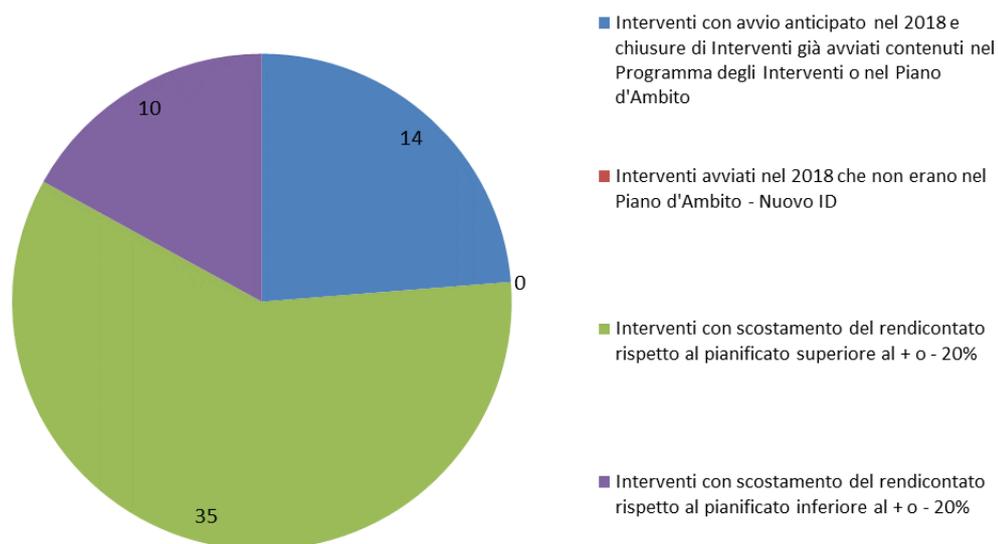


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

## ALLEGATO

HERA SpA

Consuntivo investimenti annualità 2018 Bacino tariffario di Rimini

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2018			CONSUNTIVO HERA 2018					
						PIANO ATERSIR 2018 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2018 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2018 INV. NETTI	CONS 2018 INV. LORDI	CONS 2018 CONTRIBUTI	CONS 2018 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2018
2015RNHA0020	COLLETTAMENTO VIA MELITO, SIRTORI, TEANO	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Bellaria Igea Marina	165.000,00	60.000,00	105.000,00	0	0	0	-165.000,00	-100	0
2018RNHA0012	Realizzazione di nuova fognatura nera in zona Rio Pircio	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Bellaria Igea Marina	15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00	-100	
2015RNHA0022	ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEP. CATTOLICA - SIS	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	SIS	Cattolica	0	0	0	44.647,56	0	0	44.647,56	100	STATO TECNICAMENTE CONCLUSO NEL 2015
2014RNHA0002	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOG. CATTOLICA	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Cattolica	0	0	0	114.103,97	0	114.103,97	114.103,97	100	INTERVENTO CONCLUSO. COMPLETAMENTO LAVORI.
2014RNHA0003	REALIZZ. FOGNATURA COMPARTO VENTENA	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Cattolica	190.000,00	0	190.000,00	0	0	0	-190.000,00	-100	SI CONFERMA, COME GIA' VERIFICATO DAGLI APPROFONDIMENTI TECNICI DEL 2017, CHE L'INTERVENTO NON RISULTA PRIORITARIO PER IL SERVIZIO E SONO PRESENTI COGENTI PROBLEMATICHE. L'INTERVENTO RESTA COMUNQUE NECESSARIO MA AL MOMENTO LA PROGETTAZIONE È PREVISTA PER LE PROSSIME ANNUALITÀ.
2017RNHA0004	INTERVENTI SULLE CONDOTTE DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO "VIENNA"	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Cattolica	100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO
2014RNHA0005	COSTR. DI FOGNATURA LUNGO VIA MULAZZANO	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Coriano	0	362.000,00	-362.000,00	179.999,97	0	179.999,97		100	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2018. LO SCOSTAMENTO 2018 E' CONSEGUENZIALE ALLA RIPIANIFICAZIONE DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI GIA' MOTIVATA NELLE NOTE PRECEDENTI
2017RNHA0005	COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA LIMITROFA A VIA DI VITTORIO - II STRALCIO - (Lotto2)	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Coriano	140.000,00	0	140.000,00	0	0	0	-140.000,00	-100	NEL 2018 E' STATA AVVIATA LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PORTATO AVANTI L'ITER AUTORIZZATIVO DEL LOTTO 1, CON OTTENIMENTO DEL PARERE ARCHEOLOGICO (PR.HERA SPA N.42780 DEL 03-05-2018) E DEL NULLA OSTA SCAVO IN SEDE PROVINCIALE SP 031 (PR.HERA SPA N.58191 DEL 19-06-2018). ITER NON COMPLETATO PER MANCANZA DI TITOLO ABILITATIVO; RICHIESTA DI APPROVAZIONE IN DELIBERA DI GIUNTA COMUNE DI CORIANO IN DATA 02-07-2019 ((PR.HERA SPA N.58881 DEL 20-06-2018).
2017RNHA0006	NUOVA RETE FOGNARIA IN LOCALITA' PASSANO TRA VIA FLAMINIA CONCA E VIA STRACCIARINO	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Coriano	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	-50.000,00	-100	L' ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE È STATA POSTICIPATA IN QUANTO NEL CORSO DEL 2017 SONO STATI EFFETTUATI INCONTRI PRESSO LA SEDE DEL COMUNE ALLA PRESENZA DI VICESINDACO E ASSESSORE PER VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI FAR FINANZIARE IL 50% DELLE OPERE AI PRIVATI. NEL CORSO DEL 2018 LA SITUAZIONE E' RIMASTA INVARIATA
2017RNHA0008	REVAMPING DEPURATORE DI MISANO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SU LINEA ACQUE	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Misano Adriatico	270.000,00	0	270.000,00	10.949,72	0	10.949,72	-259.050,28	-95	SCOSTAMENTO LEGATO AI RITARDI NELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE CHE HANNO RICHIESTO TEMPISTICHE MAGGIORI DI QUELLE INSERITE A PIANO (ECESSIVAMENTE OTTIMISTICHE). LA PROGETTAZIONE SARA' COMPLETATA NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2019. INIZIO LAVORI PREVISTO A LUGLIO 2019 CON COMPLETAMENTO ENTRO L'ANNO. SI IPOTIZZA, A SEGUITO DELLE EVIDENZE PROGETTUALI, UN CONSUNTIVO FINALE INFERIORE RISPETTO ALL'IMPORTO DI MASSIMA CHE ERA STATO INSERITO A PIANO
2017RNHA0009	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO S.P. TAVOLETO (LOCALITA' CELLA )	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Misano Adriatico	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	-10.000,00	-100	L'INTERVENTO RISULTA MAGGIORMENTE COMPLESSO RISPETTO ALLE IPOTESI INIZIALI. E' STATO NECESSARIO RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI RFI (13-03-2018)/SISMICA (23/05/2018). INIZIO LAVORI A FINE 2018 CON CONSEGUENTE SCOSTAMENTO SUL PIANIFICATO
2017RNHA0010	OTTIMIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO V.ALBERELLO	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Misano Adriatico	0	0	0	3.340,34	0	3.340,34	3.340,34	100	
2015RNHA0010	ADEGUAMENTO SC.3 LOC.S.MARCO-MONTE COLOMBO	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Monte Colombo	40.000,00	0	40.000,00	933,47	0	933,47	-39.066,53	-97	SI CONFERMA UNA SITUAZIONE INVARIATA RISPETTO A QUANTO GIA' RIPORTATO NELLE NOTE 2017. INTERVENTO POSTICIPATO IN QUANTO NON VI ERANO I PRESUPPOSTI PER LO SVILUPPO URBANISTICO INIZIALMENTE IPOTIZZATO; LO SCARICO 3 SARA' ADEGUATO CON UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN LOCO DI CIRCA 80 AE, RIMANDANDO SE NECESSARIO L'EVENTUALE COLLETTAMENTO IN FUNZIONE DELL'ESITO DELLO SVILUPPO URBANISTICO. QUESTA NUOVA SCELTA PROGETTUALE E' STATA GIA' CONDIVISA CON ATERSIR.
2014RNHA0009	ADEG.SCARICHI 3-5 TREBBIO MONTEGRIDOLFO	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Montegridolfo	0	0	0	0	-4.580,85	4.580,85	0,00	0	SCOSTAMENTO LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLA PRATICA DI INCASSO DEL CONTRIBUTO PUBBLICO A FONDO PERDUTO
2014RNHA0010	ADEGUAMENTO SCARICHI N.4-5-6-7-13 MONTESCUDO	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Montescudo	0	324.000,00	-324.000,00	85.422,84	0	85.422,84	85.422,84	100	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2018. LO SCOSTAMENTO 2018 E' CONSEGUENZIALE ALLA RIPIANIFICAZIONE DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI GIA' MOTIVATA NELLE NOTE PRECEDENTI
2015RNHA0011	MONTESCUDO ADEG SCARICO N.RO 2	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Montescudo	70.000,00	0	70.000,00	0	0	0	-70.000,00	-100	INTERVENTO SU AGGLOMERATO <200 AE, POSTICIPATO IN RELAZIONE ALLE TEMPISTICHE DETTATE DALLA DGR 201/2016
2018RNHA0008	Rinnovo rete idrica di adduzione via Ca' Ventura - FSC	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Montescudo-Monte Coli	0	0	0	285,86	0	285,86	285,86	100	SCOSTAMENTO LEGATO ALL'AVVIO DI ATTIVITA' DI VALUTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE, LO SCOSTAMENTO 2018 E' CONSEGUENZIALE ALLA RIPIANIFICAZIONE DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI GIA'
2014RNHA0044	COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA ABBAZIA-MORCIANO	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Morciano di Romagna	40.000,00	0	0	0	0	0	-40.000,00	-100	MOTIVATA NELLE NOTE
2014RNHA0012	PERF.E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Novafeltria	0	0	0	16.377,33	0	16.377,33	16.377,33	100	RITARDO DOVUTO ALL' EFFETTO DEL LUNGO ITER AUTORIZZATIVO FINALIZZATO ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO E ALL'ESPROPRIO
2014RNHA0011	COMPLETAMENTO RETE FOG. AL COLL. NOVAFELTRIA	FOGNATURA		Gestore	Novafeltria	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0		-100	SCOSTAMENTO LEGATO ALLA DIFFICOLTÀ A REPERIRE ACCORDI BONARI/SERVITÙ, CHE HANNO RESO NECESSARIO VALUTARE NUOVE SOLUZIONI PROGETTUALI E CONSEGUENTEMENTE RIVEDERE LA PIANIFICAZIONE TEMPORALE CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
2014RNHA0014	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	1.365.000,00	0	1.365.000,00	1.759.083,66	0	1.759.083,66	394.083,66	28	RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RNHA0015	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	1.250.000,00	0	1.250.000,00	1.416.697,00	0	1.416.697,00	166.697,00	13	

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2018			CONSUNTIVO HERA 2018					NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2018
						PIANO ATERSIR 2018 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2018 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2018 INV. NETTI	CONS 2018 INV. LORDI	CONS 2018 CONTRIBUTI	CONS 2018 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTA MENTO	
2014RNHA0016	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	420.000,00	0	420.000,00	725.873,24	0	725.873,24	305.873,24		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RNHA0017	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	200.000,00	0	200.000,00	310.002,39	0	310.002,39	110.002,39		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI CONSEQUENTE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI
2014RNHA0018	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-RN-ATO9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	100.000,00	0	100.000,00	123.324,35	0	123.324,35	23.324,35		CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA
2014RNHA0019	DISTRETT. RETI ACQUA - RN ATO 9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	20.000,00	0	20.000,00	5.919,78	0	5.919,78	-14.080,22		RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RNHA0081	Sostituzione contatori pari calibro	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	107.000,00	0	107.000,00	139.928,83	0	139.928,83	32.928,83		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI
2014RNHA0083	Adeguamenti attraversamenti ferroviari	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	-10.000,00		CONTATORI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RNHA0084	Telecontrollo e automazione impianti acquedotto	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	90.000,00	0	90.000,00	43.919,27	0	43.919,27	-46.080,73		CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI
2015RNHA0001	Riordino dello schema idrico del Conca	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Romagna Acque	Opere Pluricomunali	800.000,00	0	0	0	0	0	-800.000,00		TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2015RNHA0004	RAZIONALIZZAZIONE SIST. ACQ.SENATELLO	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	100.000,00	0	100.000,00	93.053,86	0	93.053,86	-6.946,14		ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI
2015RNHA0024	RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI RN ATO9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	170.000,00	0	170.000,00	140.740,85	0	140.740,85	-29.259,15		VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO
2015RNHA0025	VERIFICA E ADEGUAMENTI SISMICI IMP. ACQ. RN ATO9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	280.000,00	0	280.000,00	2.925,96	0	2.925,96	-277.074,04		ATTUATIVO. NEL 2018 E' STATA COMPLETATA LA PROGETTAZIONE E A FINE 2018 E'
2014RNHA0020	ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - RN	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	100.000,00	0	100.000,00	10.785,48	0	10.785,48	-89.214,52		-100 STATA AVVIATA LA FASE GARA
2014RNHA0021	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.373.172,80	0	1.373.172,80	373.172,80		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
2015RNHA0023	Telecontrollo e automazione imp. dep. RN	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0	10.000,00	99.725,36	0	99.725,36	89.725,36		RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RNHA0022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL.FOGNATURA - RN	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	715.000,00	0	715.000,00	871.938,00	0	871.938,00	156.938,00		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
2014RNHA0023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.FOGNATURA - RN	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	465.000,00	0	465.000,00	512.839,08	0	512.839,08	47.839,08		RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RNHA0024	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - RN	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	75.000,00	0	75.000,00	134.521,26	0	134.521,26	59.521,26		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA
2014RNHA0025	RILIEVO RETI FOGNARIE - RN - ATO 9	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	50.000,00	0	50.000,00	381,16	0	381,16	-49.618,84		INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E PIANIFICATO IN MODO
2014RNHA0085	RINNOVO RETI/ALL. FOGNATURA DA PI	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	450.000,00	0	450.000,00	652.754,18	0	652.754,18	202.754,18		OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE ATTIVITÀ ANNUALI SVOLTE SONO LEGATE
2015RNHA0009	Telecontrollo e automazione impianti fog. RN	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	50.000,00	0	50.000,00	210.499,76	0	210.499,76	160.499,76		-99 ALLE ESIGENZE MANIFESTATESI NELL'ANNUALITA' STESSA.
2018RNHA0002	Dismissione dep.Ponte S.M.Maddalena e coll.fognario	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Opere Pluricomunali	446.356,00	0	0	86.313,46	0	0	-360.042,54		CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI
2017RNHA0030	ADEGUAMENTO DEPURATORE PENNABILLI LOCALITA' PONTE MESSA	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Pennabilli	0	0	0	168.884,82	0	168.884,82	168.884,82		320 TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2015RNHA0015	ADEGUAMENTO SCARICO V.FONTANE(N.3)-CA'MAGRINO(N.9)	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Poggio Torriana	130.000,00	0	130.000,00	1.462,68	0	1.462,68	-128.537,32		SCOSTAMENTO 2018 RISPETTO AGLI IMPORTI PIANIFICATI DOVUTO AL FATTO CHE SI
2014RNHA0047	REAL. VASCA TESTA IMPIANTO DEP RICCIONE - I STRALCIO	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Riccione	0	0	0	153.453,33	0	153.453,33	153.453,33		TRATTA DI UN NUOVO ID GENERATO NEL 2017 IN QUANTO L'INTERVENTO
2015RNHA0008	REAL. VASCA TESTA IMPIANTO DEP. RICCIONE - II STRALCIO	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Riccione	62.000,00	0	62.000,00	0	0	0	-62.000,00		2014RNHA0013 E' STATO STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE COME
2014RNHA0048	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOG. RICCIONE	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Riccione	150.000,00	0	150.000,00	44.911,42	0	44.911,42	-105.088,58		DA NULLA OSTA ATERSIR. PEC DEL 18-12-2017. RICHIESTA HERA DEL 29-11-2017 PROT.
2015RNHA0005	STUDIO E PRIMI INTERVENTI RISAN. RIO DELL'ASSE	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Riccione	170.000,00	0	170.000,00	0	0	0	-170.000,00		115133, VS PROT. AT/2017/7726. DOPO IL CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE L'ITER DI
2017RNHA0017	ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA NERA (PONTE DI VIALE VENEZIA)	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Riccione	80.000,00	0	80.000,00	0	0	0	-80.000,00		-80 AVANZAMENTO NON PRESENTA PARTICOLARI RITARDI. ATTUALMENTE IN FASE GARA
2017RNHA0018	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA LOMBARDIA	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Riccione	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	-50.000,00		ANTICIPATO PRIMO STRALCIO IN QUANTO RISULTA NECESSARIO INTERVENIRE

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2018			CONSUNTIVO HERA 2018					NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2018
						PIANO ATERSIR 2018 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2018 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2018 INV. NETTI	CONS 2018 INV. LORDI	CONS 2018 CONTRIBUTI	CONS 2018 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTA MENTO	
2014RNHA0049	RETE DI COLLEGAMENTO SERBATOIO COVIGNANO	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Romagna Acque	Rimini	1.204.139,00	0	0	371.365,39	0	0	-832.773,61	-69	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2018 E' CONSEQUENZIALE AI RITARDI 2017 LEGATI ALLE TEMPISTICHE DI GARA, GIA' MOTIVATE NELLE NOTE DELL'ANNO PRECEDENTE. L'INTERVENTO E' PERTANTO IN LINEA CON QUANTO COMUNICATO NELLE NOTE 2017.
2017RNHA0020	ADEGUAMENTO CENTRALE ACQUEDOTTO CA BEZZI	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	90.000,00	0	90.000,00	159.011,41	0	159.011,41	69.011,41	76	INTERVENTO IN REGOLARE CORSO DI REALIZZAZIONE. MAGGIORI ONERI LEGATI ALL'ELEVATO GRADO DI DETERIORAMENTO DELLA STRUTTURA CON CONSEGUENTI MAGGIORI COSTI PER IL RIPRISTINO
2014RNHA0052	PSB - RADDOPPIO DEPURATORE DI S. GIUSTINA	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Romagna Acque	Rimini	1.102.619,00	0	0	0	0	0	-1.102.619,00	-100	IMPORTO PREVISTO PER INTERVENTO DI COMPLETAMENTO LEGATO A COMPARTO CADITOIE FINALIZZATO ALLA COMPLETA DISMISSIONE DEL DEPURATORE MARECCHIESE. RITARDI LEGATI A SCREENING, IN DATA 17/05/2016 E STATO CHIESTO DA PARTE DI HERA UN PARERE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN MERITO ALL'ASSOGGETTABILITÀ A SCREENING DELL'INTERVENTO LEGATO ALLE CADITOIE E, CON LETTERA DEL 19/07/2016 PROT. PG. 2016.0536708, LA REGIONE HA STABILITO CHE L'INTERVENTO DOVEVA ESSERE ASSOGGETTATO A VERIFICA DI SCREENING AI SENSI DELLA L.R. 9/1999. SI È QUINDI PREDISPOSTA LA PRATICA PER LO SCREENING CHE È STATA DEPOSITATA AD INIZIO 2017. GLI ELABORATI SONO STATI PUBBLICATI SUL BURER DAL 31/05/2017. CON LETTERA DEL 14/07/2017 PROTOCOLLO N. PG 0177036 IL COMUNE DI RIMINI HA RICHiesto ALCUNI CHIARIMENTI/INTEGRAZIONI. CON DETERMINA N.8008 DEL 29/05/2018 LA REGIONE EMILIA ROMAGNA HA RITENUTO DI NON ASSOGGETTARE IL PROGETTO AD ULTERIORE PROCEDURA DI VIA. SUCCESSIVAMENTE È STATA AVVIATA LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
2014RNHA0055	PSB-CONDOTTA SOTTOMARINA AUSA	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Romagna Acque	Rimini	11.200.000,00	0	0	4.223.162,30	0	0	-6.976.837,70	-62	LO SCOSTAMENTO RISCONTRATO DIPENDE DAL RITARDO ACCUMULATO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI NEL TRATTO IN MARE. QUESTO RITARDO E' ESSENZIALMENTE DOVUTO A DUE MOTIVI:- PROLUNGATA ATTESA NELL'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE PER OCCUPAZIONE SPECCHIO ACQUE, GIA' PREVISTA DALLA DETERMINA ATERSIR CON CUI SONO STATE AUTORIZZATE LE OPERE, CHE HA VISTO LA RICHIESTA AVVIATA AD INIZIO DICEMBRE 2017 CON RILASCIO DELLA STESSA DA PARTE DEL COMUNE IL 30/05/2018, CON PRESCRIZIONE DI INIZIO LAVORI AD OTTOBRE 2018 (SOSTANZIALMENTE QUASI UN ANNO DOPO). - CONDIZIONI METEO MARINE AVVERSE CON INCIDENZA DELLE GIORNATE DI MALTEMPO PARTICOLARMENTE RILEVANTE (SUPERIORE ALLA STATISTICA DEGLI ULTIMI 15 ANNI). QUESTE CONDIZIONI METEO PARTICOLARMENTE GRAVOSE HANNO IMPEDITO DI AVANZARE CON LA VELOCITA' PREVISTA.
2014RNHA0057	PSB-REAL. VASCA COLONNELLA I	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Romagna Acque	Rimini	500.000,00	0	0	0	0	0	-500.000,00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO. INOLTRE: SOTTOPOSTA AL COMUNE NEL 2016 UNA PROPOSTA DI REVISIONE DEL SISTEMA "VASCHE SUD" RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL PSBO APPROVATO, AGGIORNATO NEL 2017 PER TENER CONTO NON SOLO DEL PROBLEMA BALNEAZIONE MA ANCHE DELLA SALVAGUARDIA IDRAULICA.
2014RNHA0058	PSB-REALIZZAZIONE VASCA RODELLA	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	2.100.000,00	0	2.100.000,00	5.762,20	0	5.762,20	-2.094.237,80	-99	SOTTOPOSTA AL COMUNE NEL 2016 UNA PROPOSTA DI REVISIONE DEL SISTEMA "VASCHE SUD" RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL PSBO APPROVATO, AGGIORNATO NEL 2017 PER TENER CONTO NON SOLO DEL PROBLEMA BALNEAZIONE MA ANCHE DELLA SALVAGUARDIA IDRAULICA: IN ATTESA DI DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER POTER POI AVVIARE LA PROGETTAZIONE
2014RNHA0059	PSB - REALIZZAZIONE DORSALE SUD RN - PREMENTE	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Romagna Acque	Rimini	3.500.000,00	0	0	367.915,51	0	0	-3.132.084,49	-89	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. SCOSTAMENTO DOVUTO AI TEMPI LUNGI PER L'ITER ESPROPRIATIVO (IMMISSIONE IN POSSESSO AVVENUTA IL 27/03/18 - DETERMINAZIONE ATERSIR N. 29 DEL 22/02/18) E ALLA NECESSITA' DI SVILUPPARE UNA VARIANTE RICHIESTA DAL COMUNE PER RIDURRE GLI ABBATTIMENTI DI ALBERI NEI PARCHI CITTADINI
2014RNHA0061	PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN - I Stralcio - Il Lotto	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	0	0	0	222.821,16	0	222.821,16	222.821,16	100	INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2018 E' LEGATO AD UN TRASCINAMENTO LAVORI E CONTABILIZZAZIONE
2014RNHA0063	PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN - II Stralcio (Lotti 1-2-4-5-6-7)	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	4.732.000,00	0	4.732.000,00	354.865,33	0	354.865,33	-4.377.134,67	-92	CRITICITA' OPERATIVE DOVUTE ALLA GESTIONE DEI TRANSITORI LEGATI A IMPIANTI E RETI ESISTENTI (1"LOTTO). FORMALIZZATO DAL COMUNE DINIEGO CHIUSURA VIABILITA' COMUNALE CHE HA PROTRATTO LE TEMPISTICHE DI AFFIDAMENTO LAVORI (3"LOTTO).
2014RNHA0066	PSB-COMPL. SEP. RETI RONCASSO E PRADELLA	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	2.400.000,00	0	2.400.000,00	511.872,06	0	511.872,06	-1.888.127,94	-78	SCOSTAMENTO CONSEGUENTE AD ATTIVITA' DI RILIEVO DELLA RETE ESISTENTE
2014RNHA0067	PSB-REAL. VASCA AUSA I STRALCIO (Piazzale Kennedy)	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	9.000.000,00	5.919.000,00	3.081.000,00	9.031.768,69	11.655.762,20	-2.623.993,51	31.768,69	0	INDICATE IN MOTIVAZIONE 2017.
2014RNHA0068	PSB-REAL. VASCA COLONNELLA II	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	1.000.000,00	0	1.000.000,00	103.352,20	0	103.352,20	-896.647,80	-89	SOTTOPOSTA AL COMUNE NEL 2016 UNA PROPOSTA DI REVISIONE DEL SISTEMA "VASCHE SUD" RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL PSBO APPROVATO, AGGIORNATO NEL 2017 PER TENER CONTO NON SOLO DEL PROBLEMA BALNEAZIONE MA ANCHE DELLA SALVAGUARDIA IDRAULICA: IN ATTESA DI DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER POTER POI AVVIARE LA PROGETTAZIONE
2014RNHA0072	PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN II STRALCIO	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	0	650.000,00	-650.000,00	281.654,56	0	281.654,56	281.654,56	100	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2018.
2014RNHA0073	PSB-REAL.VASCA AUSA II STRALCIO (Dorsale Ausa)	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	390.250,00	390.250,00	0	68.872,04	0	68.872,04	-321.377,96	-82	SCOSTAMENTO DOVUTO AL RALLENTAMENTO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI PER NECESSITÀ DI APPROFONDIMENTI DI NATURA GEOTECNICA PER LA REALIZZAZIONE DEL SOLLEVAMENTO
2015RNHA0002	PSB - RICONVERSIONE DEP. MARECCHIESE	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Romagna Acque	Rimini	334.607,00	0	0	323.074,03	0	0	-11.532,97	-3	
2014RNHA0069	NUOVO SCOLMATORE MAVONE V.COVIGNANO RN	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	100.000,00	0	100.000,00	82.120,37	0	82.120,37	-17.879,63	-17	L'INTERVENTO E' STATO INSERITO NELLA PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DEL PIANO ATERSIR DEGLI INTERVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2016-2018 APPROVATO DAL CONSIGLIO LOCALE DI RIMINI IL 15/06/2018, DA CUI VIENE DETERMINATO IL SOGGETTO ATTUATORE COME HERA SPA.
2014RNHA0070	ADEG RETE FOG V.S.CHIARA-VICOLO CIMA RN	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	138.000,00	0	138.000,00	27.163,79	0	27.163,79	-110.836,21	-80	CONSECUTIVAMENTE E' STATA CONTRATTUALIZZATA L'IMPRESA PER LE OPERE CON BANDO DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2018			CONSUNTIVO HERA 2018					
						PIANO ATERSIR 2018 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2018 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2018 INV. NETTI	CONS 2018 INV. LORDI	CONS 2018 CONTRIBUTI	CONS 2018 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2018
2015RNHA0006	RICOSTR. PREMENTE DN700 V. FLAMINIA V. FADA	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	115.000,00	0	115.000,00	0	0	0	-115.000,00	-100	
2015RNHA0016	SCARICO N.94 LOCALITA' GROTTA ROSSA - RIMINI	FOGNATURA		Gestore	Rimini	60.000,00	0	60.000,00	8.422,15	0	8.422,15			LAVORI ESEGUITI NEL 2019 E IN FASE DI ULTIMAZIONE. LO SCOSTAMENTO E' LEGATO AD UN RITARDO DELL'AVVIO LAVORI A CAUSA DEL PERFEZIONAMENTO DELLE SERVITÙ ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO
2017RNHA0022	COLLEG. PREMENTE DEL SOLL. 2C CON DORSALE SUD (EX INTERVENTO RICOSTR. PREMENTE DN 700 V.FLAMINIA-V.FADA)	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Rimini	300.000,00	0	0	0	0	0	-300.000,00	-100	ATTUATIVO.
2017RNHA0024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTO 1B	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Rimini	220.000,00	0	0	0	0	0	-220.000,00	-100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE COME DA NULLA OSTA ATERSIR. PEC DEL 18-12-2017. RICHIESTA HERA DEL 29-11-2017 PROT. 115133, VS PROT. AT/2017/7726 MINORI COSTI SOSTENUTI (EFFICIENZE DOVUTE ALLA PROGETTAZIONE CONGIUNTA ALL'INTERVENTO SUI SOLLEVAMENTI 2B E 3B). AVANZAMENTO IN LINEA CON
2018RNHA0003	Manutenzione straordinaria Sollevamento 1B	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	64.000,00	0	64.000,00	41.770,12	0	41.770,12	-22.229,88	-34	PIANIFICAZIONE
2015RNHA0019	ADEG. SCARICO(4,18) - STRALCIO ACQUEDOTTO V.MONTE DEL PRETE BASSO	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	AMIR	Saludecio	10.000,00	0	0	40.000,00	0	0	30.000,00	300	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE NEL 2018. LO SCOSTAMENTO RISPETTO ALL'IMPORTO DI PIANO E' CONSEGUENZIALE ALLO SCOSTAMENTO DEL 2017, GIA MOTIVATO (RITARDI DOVUTI A FORTE ALLUNGAMENTO TEMPI AUTORIZZATIVI (COMUNE): RICHIESTA DI APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 15/2013 DEL 25/05/2017 PROT. 52164, APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 25 DEL
2014RNHA0045	COMPLETAMENTO COLLETTAMENTO SCARICO 18 CON NUOVO DEPURATORE A SANT'ANSOVINO - STRALCIO FOGNATURA	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	AMIR	Saludecio	30.000,00	0	0	71.369,98	0	0	41.369,98	137	12/03/2018)
2017RNHA0031	Prolungamento condotta di scarico del Depuratore San Leo	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	San Leo	100.000,00	0	100.000,00	115.587,34	0	115.587,34	15.587,34	15	
2014RNHA0075	POTENZIAMENTO RETE IDRICA DI SANTARCANGELO	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Romagna Acque	Santarcangelo di Romag	900.000,00	0	0	0	0	0	-900.000,00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2018, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO
2018RNHA0009	Rinnovo rete idrica di distribuzione via Mazzini - FSC	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Santarcangelo di Romag	0	0	0	285,86	0	285,86	285,86	100	SCOSTAMENTO LEGATO ALL'AVVIO DI ATTIVITA' DI VALUTAZIONE PRELIMINARE
2014RNHA0076	COSTRUZIONE RETI DI FOGNATURA (vie Saturno, Marte, della Pace, Palazzina; vie Righi Frankling, Flaming, da Vinci; via Balduccia S. Ermete e strade Capoluogo)	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Santarcangelo di Romag	235.000,00	0	235.000,00	16.380,75	0	16.380,75	-218.619,25	-93	PROGETTO INVIATO AD ATERSIR PER RILASCIO TITOLO ABILITATIVO (CDS) E DICHIARAZIONE P.U. AI FINI DELLA PROCEDURA DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO RESASI NECESSARIA PER LA POSA DELLE RETI DI PROGETTO
2014RNHA0078	ADEG. RETI FOGNA S.ARCANGELO Z.STAZIONE	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Santarcangelo di Romag	0	0	0	811.740,41	0	811.740,41	811.740,41	100	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2018 E' CONSEGUENZIALE AL RECUPERO DELLE REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE ANNUALITA' 2016-2017. LE MOTIVAZIONI DELLE RIPIANIFICAZIONI 2016-2017 SONO GIA' STATE
2017RNHA0027	ADEGUAMENTO VIE RIGHI,DA VINCI,FRANKLIN,FLAMING	FOGNATURA		Gestore	Santarcangelo di Romag	50.000,00	0	50.000,00	75.906,07	0	75.906,07	25.906,07	51	ADDOTTE NELLE NOTE DELLE RISPETTIVE ANNUALITA'. INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO E' LEGATO AL RECUPERO DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI.
2017RNHA0028	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO S.ARCANGELO	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Santarcangelo di Romag	70.000,00	0	70.000,00	0	0	0	-70.000,00	-100	QUESTO ID RACCOGLIE SVARIATI INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI S.ARCANGELO. A PIANO ATERSIR ERA STATA INSERITA UNA PIANIFICAZIONE FLAT IN ATTESA DI DEFINIRE CON PRECISIONE GLI INTERVENTI DA REALIZZARE. NEL 2017 E' STATO COMPLETATO L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V.BALDUCCIA. NEL 2019 E' PREVISTO L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE BORGONUOVO-V.CANONICA, DA
2018RNHA0001	Risanamento Scarico 9 Monte Ugone Verucchio	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	AMIR	Verucchio	261.000,00	0	0	70.197,09	0	0	-190.802,91	-73	COMPLETARSI NEL TRIENNIO SUCCESSIVO
					<b>Totale</b>	<b>50.361.971</b>	<b>7.705.250</b>	<b>21.693.000</b>	<b>26.925.614</b>	<b>11.651.181</b>	<b>9.676.387</b>	<b>-23.414.779</b>		SCOSTAMENTO 2018 RISPETTO AGLI IMPORTI PIANIFICATI DOVUTO AL FATTO CHE SI TRATTA DI UN NUOVO ID GENERATO NEL 2017 IN QUANTO L'INTERVENTO 2014RNHA0013 E' STATO STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE COME DA NULLA OSTA ATERSIR. PEC DEL 18-12-2017. RICHIESTA HERA DEL 29-11-2017 PROT. 115133, VS PROT. AT/2017/7726. DOPO IL CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE L'ITER DI

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 8 del 18 dicembre 2020

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2018 - Gestore HERA S.p.A.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore  
Responsabile ad interim  
Area Servizio Idrico Integrato  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 18 dicembre 2020

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore  
F.to Riziero Santi

Il Segretario verbalizzante  
F.to Benedetta Casadei

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 6 maggio 2021

il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna
