



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ANNO 2023
GESTORE: IRETI S.P.A.
BACINO PROVINCIALE DI: PIACENZA**



1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2023

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2023, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di Piacenza n.2 del 2 Aprile 2020, che il gestore IRETI ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF %
GESTORE	13.465.339€	23.779.315€	10.313.976€	77%
FONDO PERDUTO	673.076€	2.005.822€	1.332.746€	198%
TOTALE	14.138.415€	25.785.137€	11.646.722€	82%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2023, esclusa struttura

Gli investimenti di struttura per l'anno 2023 non sono ancora stati rendicontati definitivamente (max. 1.236.677 €). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2023.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IRETI abbia effettuato nel corso del 2023 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa l'82%.



Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2023

L'anno 2023 è l'ultimo anno del quadriennio 2020-2023, nella tabella successiva si riepiloga l'andamento complessivo degli investimenti lordi esclusi gli investimenti di struttura.



	2020	2021	2022	2023
PIANIFICATO	22.351.213 €	19.871.763 €	18.501.913 €	14.138.415 €
CONSUNTIVO	22.885.384 €	25.167.664 €	30.093.049 €	25.785.137 €
DIFFERENZA	534.171 €	5.295.901 €	11.591.136 €	11.646.722 €

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati nel quadriennio esclusi gli investimenti di struttura

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e grafici successivi e all'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si nota maggiori investimenti nel comparto acquedottistico. La differenza più evidente nel comparto fognario-depurativo è per lo più da imputarsi al recupero dei ritardi degli anni precedenti, anticipazioni di interventi e maggiori attività di manutenzione straordinaria.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	7.503.415 €	13.664.496 €	6.161.081 €	82%
DEPURAZIONE	3.100.000 €	6.267.448 €	3.167.448 €	102%
FOGNATURA	3.285.000 €	5.648.445 €	2.363.445 €	72%
TUTTI	250.000 €	204.748 €	-45.252 €	-18%
TOTALE	14.138.415 €	25.785.137 €	11.646.722 €	82%

TAB.3 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2023 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

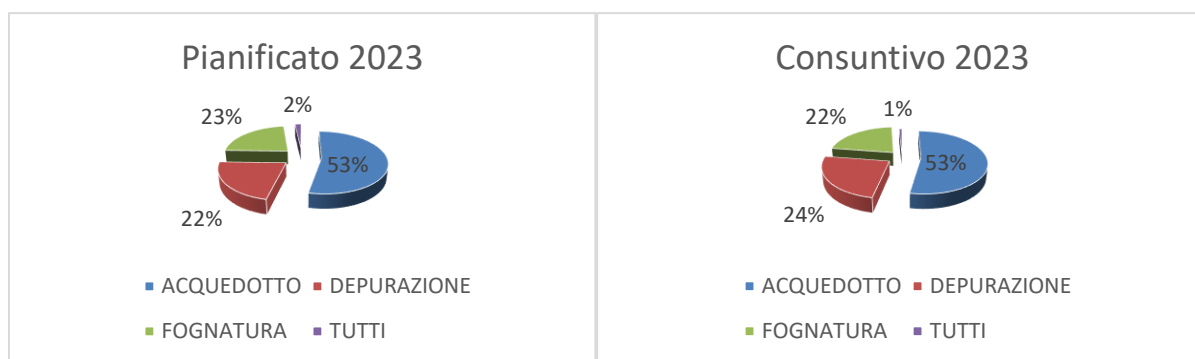


FIG.2 – Suddivisione investimenti 2023 per servizio

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA €	DIFF %
ACQUEDOTTO	3.360.000 €	8.306.223 €	4.946.223 €	147%
DEPURAZIONE	1.000.000 €	1.290.787 €	290.787 €	29%
FOGNATURA	1.960.000 €	3.179.995 €	1.219.995 €	62%
TOTALE	6.320.000 €	12.777.004 €	6.457.004 €	102%

TAB.4 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante l'anno; sono inoltre ricompresi gli interventi puntuali di manutenzione che hanno un identificativo ARSI specifico.

La tabella 5 riporta gli importi spesi nei Comuni nell'ambito delle manutenzioni straordinarie riferite agli interventi cumulativi presenti nella programmazione annuale.

Comune	2023	Totale POI 2020-2023
Agazzano	136.269 €	667.340 €
Alseno	109.284 €	740.510 €
Alta Val Tidone	228.445 €	1.414.952 €
Besenzone	18.444 €	69.517 €
Bettola	213.731 €	806.484 €
Bobbio	427.777 €	2.458.107 €
Borgonovo Val Tidone	177.517 €	843.608 €
Cadeo	207.912 €	560.680 €
Calendasco	167.336 €	645.640 €
Caorso	191.402 €	780.830 €
Carpaneto	202.887 €	1.106.386 €
Castel San Giovanni	452.480 €	2.383.457 €
Castell'Arquato	1.443.957 €	3.319.091 €
Castelvetro Piacentino	249.562 €	1.346.813 €
Cerignale	35.494 €	168.928 €
Coli	92.585 €	769.239 €
Cortebrugnatella	84.425 €	396.732 €
Cortemaggiore	211.065 €	604.370 €
Farini	351.222 €	957.657 €
Ferriere	73.396 €	609.824 €
Fiorenzuola	350.126 €	2.232.181 €
Gazzola	145.246 €	588.535 €
Gossolengo	72.786 €	582.587 €
Gragnano Trebbiense	65.597 €	625.048 €
Gropparello	197.039 €	1.304.582 €
Lugagnano Val d'Arda	283.285 €	1.705.900 €
Monticelli d'Ongina	229.169 €	729.026 €
Morfasso	76.192 €	741.898 €
Ottone	14.939 €	147.598 €
Piacenza	2.589.182 €	10.626.303 €
Pianello Val Tidone	54.566 €	647.563 €
Piozzano	102.679 €	398.534 €
Podenzano	84.235 €	707.674 €
Ponte dell'Olio	290.085 €	915.723 €
Pontenure	38.011 €	446.998 €
Rivergaro	297.721 €	1.343.323 €
Rottofreno	165.232 €	829.395 €
San Giorgio Piacentino	409.524 €	1.020.758 €
San Pietro in Cerro	53.523 €	276.288 €
Sarmato	65.462 €	291.648 €



Comune	2023	Totale POI 2020-2023
Travo	245.170 €	830.805 €
Vernasca	370.618 €	1.688.096 €
Vigolzone	158.480 €	540.856 €
Villanova sull'Arda	89.183 €	1.088.461 €
Zerba	21.290 €	270.194 €
Ziano Piacentino	198.849 €	826.464 €
Totale complessivo	11.743.382 €	52.056.606 €

TAB.5 – Importi rendicontati negli interventi cumulativi suddivisi per Comune

Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale degli interventi (sono esclusi gli interventi tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che non hanno importi nell'anno in analisi e gli investimenti di struttura).

Classi d'importo	Numero	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	70	2.264.000 €	2.802.947 €	538.947 €	24%
500.000-1.000.000 €	17	1.340.000 €	1.299.394 €	-40.606 €	-3%
1.000.000-2.000.000 €	13	950.000 €	2.354.495 €	1.404.495 €	148%
2.000.000-5.000.000 €	18	1.375.000 €	5.195.212 €	3.820.212 €	278%
Oltre 5.000.000 €	3	70.000 €	163.185 €	93.185 €	133%
Manutenzioni	6	4.750.000 €	10.048.551 €	5.298.551 €	112%
Altri cumulativi	14	3.389.415 €	3.921.355 €	531.940 €	16%
TOTALE	141	14.138.415 €	25.785.137 €	11.646.722 €	82%

TAB.6 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

La tabella 7 riporta gli investimenti realizzati suddivisi per macroindicatore ARERA di riferimento

MACROINDICATORE	CONSUNTIVO 2023
Altro	13.300 €
M1	7.771.320 €
M2	2.694.822 €
M3	3.201.987 €
M4a	5.665.246 €
M4b	59.016 €
M5	49.977 €
TOTALE COMPLESSIVO	25.785.137 €

TAB.7 – Importi rendicontati per macroindicatore ARERA

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.



INTERVENTI NON AVVIATI

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	IMPORTO PIANIFICATO 2023
1	2021PCIE0350	Completamento intervento sulla rete di distribuzione di Pecorara - Tubazione di interconnessione tra Serb. Costalta e località Casa Rossa in Comune di Pecorara - PROT. CIVILE - (Economie da OCDPC n. 468 del 21/07/2017 e n. 497 del 19/01/2018) - Atto n. 3047 del 02/09/2021 - DPC/2021/3162 del 01/09/2021)	ACQUEDOTTO	Alta Val Tidone	10.000 €
2	2015PCIE0094	Rifacimento reti acquedotto via della Libertà e piazza Repubblica	ACQUEDOTTO	Besenzone	10.000 €
3	2020PCIE0325	Rifacimento e adeguamento reti acquedotto del capoluogo di Caorso	ACQUEDOTTO	Caorso	60.000 €
4	2020PCIE0327	Potenziamento depuratore Carpaneto - 2° stralcio	DEPURAZIONE	Carpaneto	50.000 €
5	2015PCIE0112	Realizzazione impianto depurazione di Chiavenna Landi	DEPURAZIONE	Cortemaggiore	50.000 €
6	2015PCIE0117	Potenziamento dell'impianto di depurazione agglomerato Canneto	DEPURAZIONE	Gazzola	250.000 €
7	2020PCIE0326	Adeguamento depuratore Monticelli d'Ongina	DEPURAZIONE	Monticelli d'Ongina	50.000 €
8	2018PCIE0292	CRISI IDRICA: studio per ricerca nuove fonti di approvvigionamento, interconnessioni sorgenti/pozzi	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	50.000 €
9	2020PCIE0318	Manutenzione straordinaria acque meteoriche	FOGNATURA	Opere pluricomunali	150.000 €
10	2018PCIE0284	Ampliamento impianto di depurazione di Pieve Dugliara, 2° stralcio - studio fattibilità	DEPURAZIONE	Rivergaro	50.000 €
11	2018PCIE0285	Approvvigionamento e gestione pressioni: distrettualizzazione permanente e controllo pressioni	ACQUEDOTTO	Rivergaro	139.000 €
12	2015PCIE0132	Potenziamento depuratore capoluogo. 2° stralcio - San Giorgio	DEPURAZIONE	San Giorgio Piacentino	50.000 €
13	2018PCIE0291	Riduzione pressioni e distrettualizzazione Vigolzone	ACQUEDOTTO	Vigolzone	65.000 €
Totale complessivo					984.000 €

