



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ANNO 2023
GESTORE: IRETI S.P.A.
BACINO DI: REGGIO-EMILIA**



1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2023

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2023, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di Reggio-Emilia n.9 del 22 ottobre 2021, che il gestore IRETI Spa ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF %
GESTORE	18.275.053 €	29.252.161 €	10.977.108 €	60%
FONDO PERDUTO	810.060 €	1.193.431 €	383.371 €	47%
TOTALE	19.085.113 €	30.445.592 €	11.360.479 €	60%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2023, esclusa struttura

Gli investimenti di struttura per l'anno 2023 non sono ancora stati rendicontati definitivamente (max. 1.383.666 €). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2023.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IRETI abbia effettuato nel corso del 2023 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa il 60%.



Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2023

L'anno 2023 è l'ultimo anno del quadriennio 2020-2023, nella tabella successiva si riepiloga l'andamento complessivo degli investimenti lordi esclusi gli investimenti di struttura.



	2020	2021	2022	2023
PIANIFICATO	22.761.163€	23.800.485€	22.807.343€	19.085.113€
CONSUNTIVO	30.408.788€	36.883.418€	31.188.322€	30.445.591€
DIFFERENZA	7.647.625€	13.082.933€	8.380.979€	11.360.478€

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati nel quadriennio esclusi gli investimenti di struttura

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e grafici successivi e all'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si nota maggiori investimenti nel comparto acquedottistico. La differenza più evidente nel comparto fognario-depurativo è per lo più da imputarsi al recupero dei ritardi degli anni precedenti, anticipazioni di interventi e maggiori attività di manutenzione straordinaria.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	10.949.141 €	17.759.423 €	6.810.282 €	62%
DEPURAZIONE	4.335.972 €	5.420.045 €	1.084.073 €	25%
FOGNATURA	3.470.000 €	5.997.179 €	2.527.179 €	73%
TUTTI	330.000 €	1.268.943 €	938.943 €	285%
TOTALE	19.085.113 €	30.445.591 €	11.360.478 €	60%

TAB.3 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2023 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

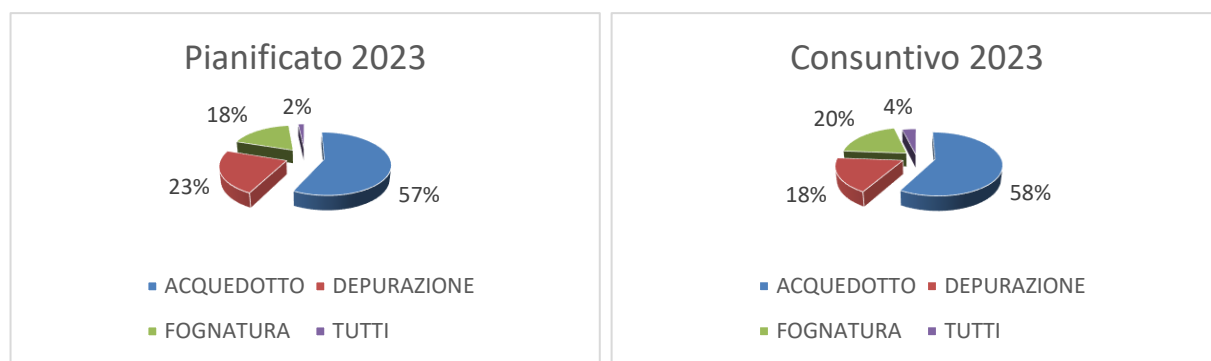


FIG.2 – Suddivisione investimenti 2023 per servizio

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	2.500.000 €	10.218.346 €	7.718.346 €	309%
DEPURAZIONE	2.000.000 €	2.834.689 €	834.689 €	42%
FOGNATURA	2.330.000 €	3.886.033 €	1.556.033 €	67%
Totale	6.830.000 €	16.939.068 €	10.109.068 €	148%

TAB.4 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante l'anno; sono inoltre ricompresi gli interventi puntuali di manutenzione che hanno un identificativo ARSI specifico.

La tabella 5 riporta gli importi spesi nei Comuni nell'ambito delle manutenzioni straordinarie riferite agli interventi cumulativi presenti nella programmazione annuale.

Comuni	2023	POI20-23
Albeia	205.460 €	720.928 €
Bagnolo in Piano	148.061 €	715.623 €
Baiso	171.661 €	603.801 €
Bibbiano	171.045 €	618.760 €
Boretto	89.713 €	369.696 €
Brescello	150.821 €	605.748 €
Cadelbosco di Sopra	126.394 €	696.328 €
Campagnola	56.859 €	286.734 €
Campegine	190.498 €	586.211 €
Canossa	105.743 €	478.801 €
Carpinetti	129.685 €	751.670 €
Casalgrande	517.064 €	2.101.584 €
Casina	84.622 €	448.953 €
Castellarano	643.162 €	2.149.626 €
Castelnovo di Sotto	252.594 €	593.672 €
Castelnovo Monti	312.032 €	1.708.480 €
Cavriago	294.997 €	1.284.578 €
Correggio	548.831 €	2.197.671 €
Fabbrico	57.307 €	291.594 €
Gattatico	102.961 €	267.236 €
Gualtieri	126.087 €	471.930 €
Guastalla	159.806 €	494.638 €
Luzzara	69.473 €	483.956 €
Montecchio	201.845 €	719.032 €
Novellara	185.235 €	784.406 €
Poviglio	124.777 €	498.781 €
Quattro Castella	240.762 €	1.082.056 €
Reggio Emilia	2.640.974 €	9.597.242 €
Reggiolo	78.867 €	313.629 €
Rio Saliceto	78.842 €	355.090 €
Rolo	30.861 €	201.280 €
Rubiera	272.609 €	884.497 €
San Martino in Rio	208.787 €	589.835 €
San Polo d'Enza	192.344 €	562.854 €
Sant'Ilario d'Enza	95.353 €	414.165 €
Scandiano	525.701 €	2.074.945 €
Ventasso	376.209 €	1.883.875 €
Vetto d'enza	77.799 €	435.304 €
Vezzano sul Crostolo	143.395 €	424.800 €



Viano	101.413 €	448.157 €
Villaminosso	310.760 €	1.379.323 €
Totale complessivo	10.601.411 €	41.577.489 €

TAB.5 – Importi rendicontati negli interventi cumulativi suddivisi per Comune

Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale degli interventi (sono esclusi gli interventi tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che non hanno importi nell'anno in analisi e gli investimenti di struttura).

Classi d'importo	Numero	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	89	1.840.000 €	4.132.027 €	2.292.027 €	125%
500.000-1.000.000 €	26	3.085.000 €	819.336 €	-2.265.664 €	-73%
1.000.000-2.000.000 €	11	1.255.972 €	1.475.462 €	219.490 €	17%
2.000.000-5.000.000 €	4	700.000 €	835.530 €	135.530 €	19%
Oltre 5.000.000 €	4	3.630.000 €	4.228.537 €	598.537 €	16%
Manutenzioni	7	6.500.000 €	16.936.464 €	10.436.464 €	161%
Altri cumulativi	7	2.074.141 €	2.018.235 €	-55.906 €	-3%
TOTALE	148	19.085.113 €	30.445.591 €	11.360.478 €	60%

TAB.6 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

La tabella 7 riporta gli investimenti realizzati suddivisi per macroindicatore ARERA di riferimento

MACROINDICATORE	CONSUNTIVO 2023
Altro	117.370 €
M1	15.333.461 €
M2	1.310.829 €
M3	2.011.025 €
M4	5.469.244 €
M5	214.095 €
M6	5.733.885 €
Preq4	255.682 €
Totale complessivo	30.445.591 €

TAB.7 – Importi rendicontati per macroindicatore ARERA

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.



INTERVENTI NON AVVIATI

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	IMPORTO PIANIFICATO 2023
1	2018REIA0180	Realizzazione nuova rete adduttrice Corniano-Malamassata	ACQUEDOTTO	500.000 €	500.000 €
2	2021REIA0288	Realizzazione collegamento fognario in Via Bacchi	FOGNATURA	120.000 €	120.000 €
3	2021REIA0289	Spostamento condotta adduttrice per frana in loc. Monte Staffola	ACQUEDOTTO	200.000 €	200.000 €
4	2021REIA0261	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0259 - Cortogno (AE 141)	DEPURAZIONE	20.000 €	20.000 €
5	2021REIA0286	Realizzazione collegamento fognario in Via Boschi	FOGNATURA	200.000 €	200.000 €
6	2021REIA0287	Rifacimento condotto scolmatore in Via Roma	FOGNATURA	50.000 €	50.000 €
7	2023REIA0295	Alluvione 2023 - Fossa Imhoff Gatta: sistemazione tubazione in uscita e ripristino antierosione nell'alveo del Rio Spirola	DEPURAZIONE	5.000 €	5.000 €
8	2018REIA0219	Potenziamento adduttrice a monte centrale idrica di Volpara	ACQUEDOTTO	750.000 €	750.000 €
9	2014REIA0061	Depuratore di Roncocesi - sistemazione e adeguamento digestori	DEPURAZIONE	220.000 €	220.000 €
10	2018REIA0222	Sostituzione rete acqua adduttrice DN 600 in Sesso-Mancasale	ACQUEDOTTO	200.000 €	200.000 €
11	2021REIA0285	Realizzazione collegamento fognario in Via Cavallotti	FOGNATURA	150.000 €	150.000 €
12	2021REIA0259	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0156 - Febbio (AE 157)	DEPURAZIONE	20.000 €	20.000 €
13	2021REIA0260	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0108 - Santonio (AE 153)	DEPURAZIONE	20.000 €	20.000 €
TOTALE COMPLESSIVO					2.455.000 €

