



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ANNO 2024
GESTORE: HERA S.P.A.
BACINO PROVINCIALE DI: MODENA**



1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2024

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l’annualità 2024, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.5 del 12 aprile 2024, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
GESTORE	19.937.003,00 €	27.839.786,06 €	7.902.783,06 €	40%
FONDO PERDUTO	9.704.000,00 €	4.199.774,00 €	- 5.504.226,00 €	-57%
TERZI	- €	- €	- €	0%
TOTALE	29.641.003,00 €	32.039.560,06 €	2.398.557,06 €	8%

TAB.1 – Tabella di confronto tra importi di piano e rendiconti nel 2024, esclusi costi di struttura

Gli investimenti di struttura per l’anno 2024 ammontano a 5.196.071,60 euro, mentre il massimo valore riconoscibile è 1.812.110,00 euro. Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”) e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d’Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d’Ambito n.63 del 27/06/2023 e deliberazione di Consiglio d’Ambito n.51 del 17 novembre 2025.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2024 investimenti leggermente superiori rispetto al pianificato per circa l’ 8%.



Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2024

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e grafici successivi all'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio. I maggiori investimenti sono nel comparto acquedottistico, oltre il 60% del totale. Complessivamente lo scostamento non è rilevante e deriva da interventi di risoluzione di interferenze su progetti di soggetti terzi, alcune ripianificazioni per mutate necessità del gestore, approfondimenti ulteriori in fase di progettazione.

Servizio	Pianificato 2024	Consuntivo 2024	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	20.259.003,00 €	20.129.601,33 €	- 129.401,67 €	-0,6%
FOGNATURA	5.735.000,00 €	6.125.017,97 €	390.017,97 €	6,8%
DEPURAZIONE	3.467.000,00 €	5.723.193,92 €	2.256.193,92 €	65,1%
ACQUE BIANCHE	180.000,00 €	61.746,76 €	- 118.253,24 €	-65,7%
Totale	29.641.003,00 €	32.039.559,98 €	2.398.556,98 €	5,5%

TAB.3 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2024 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

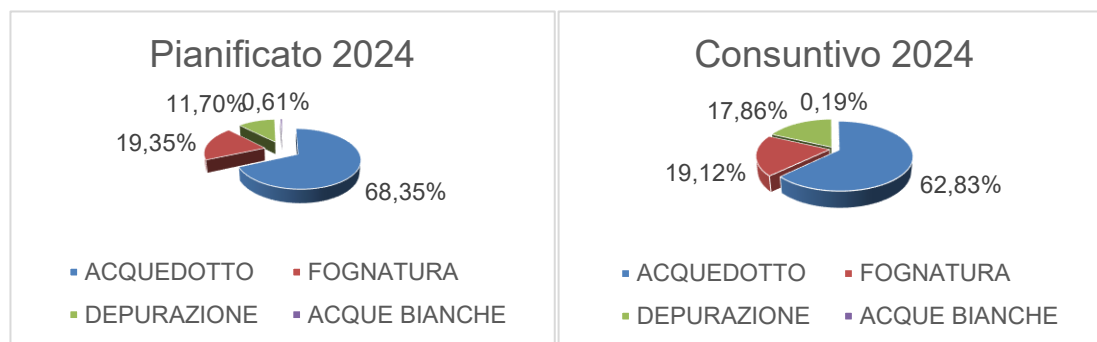


FIG.2 –Suddivisione investimenti 2024 per servizio

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.



Servizio	Pianificato 2024	Consuntivo 2024	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	13.554.406,00 €	14.009.687,27 €	455.281,27 €	3%
FOGNATURA	1.540.000,00 €	2.961.658,98 €	1.421.658,98 €	92%
DEPURAZIONE	1.200.000,00 €	3.759.534,99 €	2.559.534,99 €	213%
ACQUE BIANCHE	180.000,00 €	61.746,76 €	- 118.253,24 €	-66%
Totale	16.474.406,00 €	20.792.628,00 €	4.318.222,00 €	26%

TAB.4 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate puntualmente nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie cumulative; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante l'anno.

Per quanto attiene i microinterventi la tabella 5 riporta gli importi spesi (1476 interventi) nei Comuni nell'ambito delle manutenzioni straordinarie e altri interventi (asfalti, sostituzione contatori, distrettualizzazioni...) contenuti negli interventi cumulativi presenti nella programmazione annuale.

COMUNE	NUMERO	Consuntivo 2024
Castelfranco Emilia	60	1.041.272,76
Castelnuovo Rangone	31	830.441,12
Castelvetro di Modena	41	1.384.542,77
Fiorano Modenese	37	708.772,87
Formigine	53	1.836.381,16
Frassinoro	24	166.093,09
Guiglia	37	310.736,72
Lama Mocogno	41	221.565,30
Maranello	37	618.467,40
Marano sul Panaro	25	300.571,76
Modena	187	7.077.789,32
Montecreto	24	191.425,55
Montefiorino	42	111.490,49
Montese	69	831.388,04
Palagano	41	130.204,95
Pavullo nel Frignano	119	837.850,93
Pievepelago	40	218.981,31
Polinago	36	61.839,99
Prignano sulla Secchia	88	740.444,67
San Cesario sul Panaro	32	886.578,97
Sassuolo	89	2.858.541,64

Savignano sul Panaro	32	271.472,94
Serramazzoni	49	501.318,40
Sestola	96	726.218,82
Spilamberto	26	660.723,96
Vignola	41	1.200.263,52
Zocca	79	587.833,61
Totale complessivo	1476	25.313.212,06

TAB.5 – Importi rendicontati negli interventi cumulativi suddivisi per Comune

Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale degli interventi (sono esclusi gli interventi tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che non hanno importi nell'anno in analisi e gli investimenti di struttura).

Classe d'importo	Numero	Pianificato 2024	Consuntivo 2024	DIFFERENZA	DIFF %
Fino a 500.000 €	28	1.502.828,00 €	1.006.923,23 €	- 495.904,77 €	-33%
500.000-1.000.000 €	15	1.114.035,00 €	1.249.914,62 €	135.879,62 €	12%
1.000.000-2.000.000 €	15	5.236.734,00 €	4.469.777,55 €	- 766.956,45 €	-15%
2.000.000-5.000.000 €	5	757.000,00 €	418.346,45 €	- 338.653,55 €	-45%
Oltre 5.000.000 €	2	47.000,00 €	87.595,45 €	40.595,45 €	86%
Manutenzioni	23	16.474.406,00 €	20.792.628,00 €	4.318.222,00 €	26%
Altri cumulativi	13	4.509.000,00 €	4.014.374,68 €	- 494.625,32 €	-11%
Totale	101	29.641.003,00 €	32.039.559,98 €	2.398.556,98 €	8%

TAB.6 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

La tabella 7 riporta gli investimenti realizzati suddivisi per macroindicatore ARERA di riferimento

Macroindicatore	Consuntivo 2024
M0 Resilienza idrica	11.378,06 €
M1 Perdite	13.149.600,45 €
M2 Interruzioni di servizio	674.793,95 €
M3 Qualità dell'acqua erogata	2.925.511,82 €
M4a Frequenza allagamenti da fognatura	3.496.471,86 €
M4b Scaricatori di piena da adeguare	378.121,50 €
M5 Smaltimento fanghi in discarica	130.282,31 €
M6 Qualità dell'acqua depurata	3.943.357,29 €
Altro	7.330.042,74 €
Totale	32.039.559,98 €


TAB.7 – Importi rendicontati per macroindicatore ARERA

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.




INTERVENTI NON AVVIATI

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	Importo di progetto
1	2014MOHA0048	REVAMPING DEL POTABILIZZATORE DI SANTA CECILIA A SASSUOLO (MO)	ACQUEDOTTO	Modena	Gestore	€ 5.000.000,00
2	2014MOHA0061	STUDIO PER RICERCA ACQUE PARASSITE E SUCCESSIVI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE	FOGNATURA	Modena	Gestore	€ 266.000,00
3	2015MOHA0010	ELIMINAZIONE ACQUE IRRIGUE DA RETE VIA D'AVIA	FOGNATURA	Modena	Gestore	€ 650.000,00
4	2020MOHA0014	CHIUSURA DEL DEPURATORE DI CITTANOVA E COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI MODENA	FOGNATURA	Modena	Gestore	€ 359.000,00
5	2020MOHA0016	REVAMPING LINEA FANGHI DEPURATORE DI MODENA	DEPURAZIONE	Modena	Gestore	€ 600.000,00
6	2022MOHA0013	REVAMPING TRATTAMENTO BOTTINI DEPURATORE MODENA	DEPURAZIONE	Modena	Gestore	€ 6.000.000,00
7	2024MOHA0006	DISMISSIONE DEPURATORE DI SAN DAMASO E COLLETTAMENTO A MODENA	FOGNATURA	Modena	Gestore	€ 20.000,00
8	2022MOHA0012	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 4	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	€ -
9	2017MOHA0007	NUOVO SERBATOIO PERSELLO	ACQUEDOTTO	Pievepelago	Gestore	€ 80.000,00
10	2015MOHA0022	POTENZIAMENTO RETE VALLEURBANA-VIA MURAGLIE	ACQUEDOTTO	Sassuolo	Gestore	€ 250.000,00
11	2020MOHA0022	ESTENSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELLACQUEDOTTO NELLE VIE GANDHI E MANELLE NEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	ACQUEDOTTO	Savignano sul Panaro	Gestore	€ 90.000,00
12	2017MOHA0015	NUOVO IMP. SOLLEVAMENTO MONTARDONE	ACQUEDOTTO	Serramazzoni	Gestore	€ 300.000,00



Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Modena N.2 del 12 aprile 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 20244	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative
1	2014MOHA0003	RINNOVO E POTENZIAMENTO DORSALE IDRICA VIA EMILIA OVEST I STRALCIO	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia	Gestore	455.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2	2014MOHA0004	REVAMPING CAMPO POZZI VIA MUZZA CORONA	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia	Gestore	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
3	2014MOHA0006	REALIZZAZIONE LINEA FANGHI DEPURATORE DI CASTELFRANCO	DEPURAZIONE	Castelfranco Emilia	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
4	2014MOHA0008	COLLETTAMENTO DI PILASTRELLO AL DEPURATORE DI GAGGIO	FOGNATURA	Castelfranco Emilia	Gestore	170.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
5	2014MOHA0009	STUDIO E COLLETTAMENTO A IDONEO TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI DI RECOVATO E RASTELLINO	FOGNATURA	Castelfranco Emilia	Gestore	998.000,00 €	- €	- €	- €	- €	210.584,71 €	- €	- €	210.584,71 €	210.584,71 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO IN PARTE ALLE RICHIESTE DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO DI USURA DELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALE COINVOLTE NELL'INTERVENTO E IN PARTE DOVUTO AD UN INCREMENTO DEI COSTI PER IL RICOLLEGAMENTO DEGLI ALLACCIAMENTI DI UTENZA FOGNARI ESISTENTI ALLA NUOVA RETE.
6	2014MOHA0010	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE CENTRALIZZATO	DEPURAZIONE	Castelfranco Emilia	Gestore	2.023.000,00 €	207.000,00 €	- €	- €	207.000,00 €	307.435,17 €	- €	- €	307.435,17 €	100.435,17 €	48	SCOSTAMENTO LEGATO ALL'ACCELERAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE
7	2014MOHA0012	RINNOVO E POTENZIAMENTO DORSALE IDRICA VIA EMILIA OVEST II STRALCIO	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia	Gestore	445.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
8	2017MOHA0010	ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI GAGGIO	DEPURAZIONE	Castelfranco Emilia	Gestore	590.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
9	2020MOHA0007	RISANAMENTO DEI COLLETTORI DI ATTRAVERSAMENTO DELLA FFSS MI-BO	FOGNATURA	Castelfranco Emilia	Gestore	300.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	26.855,77 €	- €	- €	26.855,77 €	73.144,23 €	-73	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE ALCUNE LAVORAZIONI ORIGINARIAMENTE PREVISTE IN CAPO AD HERA SONO STATE DEMANDATE A FFSS.
10	2022MOHA0014	ADEGUAMENTO NORMATIVO SCOLMATORI AGGLOMERATO CASTELFRANCO	FOGNATURA	Castelfranco Emilia	Gestore	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
11	2022MOHA0018	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE CENTRALIZZATO DI CASTELFRANCO - STRALCIO 2	DEPURAZIONE	Castelfranco Emilia	Gestore	3.900.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €	26.457,73 €	- €	- €	26.457,73 €	8.457,73 €	46	
12	2024MOHA0004	POTENZIAMENTO DORSALE IDRICA VIA EMILIA OVEST	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia	Gestore	485.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €	201.755,74 €	- €	- €	201.755,74 €	81.755,74 €	68	CANTIERE IN CORSO. SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL POSTICIPO DI ATTIVITA' DI CANTIERE DAL 2023 AL 2024.
13	2015MOHA0002	NUOVO COLLEGAMENTO RETI DI PORTILE -V. VIAZZA	ACQUEDOTTO	Castelnuovo Rangone	Gestore	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €	163.900,56 €	- €	- €	163.900,56 €	43.900,56 €	36	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AD INCREMENTO COSTI DI MATERIALI E IMPRESE, NONCHE' AD ALCUNE VARIANTI MIGLIORATIVE IMPLEMENTATE IN CORSO D'OPERA.
14	2020MOHA0009	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - CASTELNUOVO RANGONE	FOGNATURA	Castelnuovo Rangone	Gestore	499.999,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
15	2014MOHA0021	NUOVO SERBATOIO BERGOGNINA_PNRR	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena	Gestore	574.789,00 €	163.561,00 €	- €	- €	163.561,00 €	138.981,95 €	- €	- €	138.981,95 €	24.579,05 €	-15	
16	2014MOHA0023	NUOVO POZZO SANTEUSEBIO	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena	Gestore	1.165.000,00 €	27.000,00 €	- €	- €	27.000,00 €	565,86 €	- €	- €	565,86 €	26.434,14 €	-97	SCOSTAMENTO LEGATO AL PERSISTERE DELLE PROBLEMATICHE CON I PROPRIETARI PER L' ACQUISIZIONE DELLA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA E CIO' HA FATTO RALLENTARE IL PROSEGUITO DEL PROGETTO CHE ATTUALMENTE RISULTA SOSPESO
17	2015MOHA0003	POTENZIAMENTO DORSALE BERGOGNINA-CAPOLUOGO	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena	Gestore	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
18	2015MOHA0006	NUOVO COLLEGAMENTO IMPIANTO TOMMASELLI - IMPIANTO S.GAETANO	ACQUEDOTTO	Formigine	Gestore	550.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
19	2014MOHA0028	REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTO APPROPRIATO AGLI AGGLOMERATI FONTANALUCCIA, PIANDELAGOTTI	FOGNATURA	Frassinoro	Gestore	919.000,00 €	99.000,00 €	- €	- €	99.000,00 €	76.012,04 €	- €	- €	76.012,04 €	22.987,96 €	-23	SCOSTAMENTO LEGATO A SLITTAMENTI NELLA MESSA IN ESERCIZIO DEL DEPURATORE IN QUANTO NEL PERIODO INVERNALE LE BASSE PORTATE IN ARRIVO NON CONSENTIVANO L'ATTIVAZIONE
20	2014MOHA0029	REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTO APPROPRIATO CASE CERBIANI	FOGNATURA	Frassinoro	Gestore	142.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
21	2017MOHA0003	INTERCON.FRAZ. SASSATELLA A SIST.DRAGONE	ACQUEDOTTO	Frassinoro	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
22	2017MOHA0004	INTERCON. FRAZ. ROMANORO A SIST.DRAGONE	ACQUEDOTTO	Frassinoro	Gestore	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	174,56 €	- €	- €	174,56 €	99.825,44 €	-99	INTERVENTO SOSPESO IN QUANTO SI SONO RESI NECESSARI ULTERIORI APPROFONDIMENTI
23	2014MOHA0030	AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI GUIGLIA LAMA	DEPURAZIONE	Guiglia	Gestore	1.428.000,00 €	540.000,00 €	- €	- €	540.000,00 €	417.865,90 €	- €	- €	417.865,90 €	122.134,10 €	-22	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLO SLITTAMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' DI CANTIERE DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE
24	2014MOHA0032	COLLETTAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI MONTEORSELLO AL DEPURATORE DI SAN GEMINIANO	FOGNATURA	Guiglia	Gestore	330.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
25	2018MOHA0001	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA VIA MICHELANGELO	FOGNATURA	Guiglia	Gestore	160.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.248,14 €	- €	- €	1.248,14 €	1.248,14 €	100	PROGETTO IN FASE DI REVISIONE PER DIFFICOLTA' REALIZZATIVE/AUTORIZZATIVE
26	2014MOHA0035	REALIZZAZIONE TRATTAMENTO APPROPRIATO LOCALITA' BARIGAZZO	DEPURAZIONE	Lama Mocogno	Gestore	315.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
27	2014MOHA0036	ADEGUAMENTO DEGLI AGGLOMERATI DI MONTECENERE NORD E DI MONTECENERE-CASA ZAGAGLIA	FOGNATURA	Lama Mocogno	Gestore	1.311.000,00 €	387.000,00 €	- €	- €	387.000,00 €	516.066,12 €	- €	- €	516.066,12 €	129.066,12 €	33	SCOSTAMENTO LEGATO A VARIANTI NON PREVENTIVABILI EMERSE IN CORSO D'OPERA
28	2014MOHA0037	Collettamento dell'agglomerato di Borra - Sanatorio al depuratore di Borra	FOGNATURA	Lama Mocogno	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
29	2017MOHA0005	POTENZIAMENTO IMPIANTO TOLLE	ACQUEDOTTO	Lama Mocogno	Gestore	100.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	38.918,41 €	- €	- €	38.918,41 €	13.918,41 €	55	
30	2017MOHA0006	NUOVO RILANCIO RETE CASA MALGARISANTONA	ACQUEDOTTO	Lama Mocogno	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
31	2014MOHA0041	RIFACIMENTO COLLETTORE COMUNE DI MARANO AL DEPURATORE DI VIGNOLA	FOGNATURA	Marano sul Panaro	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	86.046,75 €	- €	- €	86.046,75 €	86.046,75 €	100	SONO STATE CONDOTTE INDAGINI CHE HANNO FATTO EMERGERE LA NECESSITA' DI EFFETTUARE LAVORAZIONI AGGIUNTIVE ED IN PUNTI ULTERIORI DEL COLLETTORE OGGETTO DELL'INTERVENTO.
32	2015MOHA0009	CLASSIFICAZIONE A FINI POTABILI ACQUA PANARO	ACQUEDOTTO	Marano sul Panaro	Gestore	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
33	2014MOHA0048	REVAMPING DEL POTABILIZZATORE DI SANTA CECILIA A SASSUOLO (MO)	ACQUEDOTTO	Modena	Gestore	5.000.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	6.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO LEGATO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO IL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO ATTUALE NON PRESENTA CRITICITA'.
34	2014MOHA0049	POTENZIAMENTO DISSABBIATORE E SISTEMA DI TRATTAMENTI PRIMARI DEL DEPURATORE DI MODENA	DEPURAZIONE	Modena	Gestore	1.400.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	1.432,68 €	- €	- €	1.432,68 €	148.567,32 €	-99	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE. IN QUANTO SI SONO RESI NECESSARI ULTERIORI APPROFONDIMENTI DOVUTI ALLA COMPLESSITA' DELL'ATTUALE CONFIGURAZIONE IMPIANTISTICA
35	2014MOHA0053	COLLETTORE ZONA VIA SASSI DA GUICCIARDINI A DON MINZONI	FOGNATURA	Modena	Gestore	651.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
36	2014MOHA0055	ADEGUAMENTO NORMATIVA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA RETE MODENA	FOGNATURA	Modena	Gestore	9.200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	87.595,45 €	- €	- €	87.595,45 €	87.595,45 €	100	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A EVENTI METEO ECCEZIONALI CHE HANNO RESO NECESSARI ULTERIORI INTERVENTI DI RIPRISTINO NON PREVISTI, NONCHE' A PERFEZIONAMENTO SERVITU'
37	2014MOHA0059	NUOVA DORSALE DA COLLEGAROLA A MARTINIANA DA COLLEGAROLA A VACIGLIO	ACQUEDOTTO	Modena	Gestore	1.068.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
38	2014MOHA0060	REALIZZAZIONE DEL SESTO SEDIMENTATORE SECONDARIO-DEPPURATORE DI MODENA	DEPURAZIONE	Modena	Gestore	838.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
39	2014MOHA0061	STUDIO PER RICERCA ACQUE PARASSITE E SUCCESSIVI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE	FOGNATURA	Modena	Gestore	266.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	45.000,00 €	-100	COME GIA' EVIDENZIATO QUESTO INTERVENTO RISULTA DI DIFFICILE PIANIFICAZIONE PER LA COMPLESSITA' INTRINSECA DELLA PROBLEMATICHE CHE VA DA AFFRONTARE. CHE RICHIEDE UN AVANZAMENTO A STEP SUCCESSIVI SULLA BASE DELLE EVIDENZE VIA VIA EMERSE. LO SCOSTAMENTO 2024 E' LEGATO AL FATTO CHE GLI IMPORTI PIANIFICATI NELLE DIVERSE ANNUALITA' DI POI RISULTANO DI GRANDE MASSIMA NON ESSENDO LE ATTIVITA' PIANIFICABILI IN MODO PUNTUALE.
40	2015MOHA0010	ELIMINAZIONE ACQUE IRRIGUE DA RETE VIA D'AVIA	FOGNATURA	Modena	Gestore	650.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	INTERVENTO SOSPESO IN ATTESA DELL'INSERIMENTO NEL SISTEMA DEL CANALE SAN GEMINIANO
41	2017MOHA0001	REVAMPING IMPIANTO DI COLLEGAROLA	ACQUEDOTTO	Modena	Gestore	360.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	79.209,63 €	- €	- €	79.209,63 €	20.790,37 €	-20	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A LIEVI RITARDI SU ALCUNE LAVORAZIONI.
42	2017MOHA0014	ADEGUAMENTO STRUTTURALE CANALE PRADELLA	FOGNATURA	Modena	Gestore	205.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €	1.642,33 €	- €	- €	1.642,33 €	88.357,67 €	-98	INTERVENTO ANCORA IN FASE DI STUDIO/PROGETTAZIONE.



							Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Modena N.2 del 12 aprile 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				SCOSTAMENTO			
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 20244	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative	
43	2020MOHA0014	CHIUSURA DEL DEPURATORE DI CITTANOVA E COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI MODENA	FOGNATURA	Modena	Gestore	359.000,00 €	65.000,00 €	- €	- €	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €	65.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI - INTERVENTO DI RISOLUZIONE INTERFERENZE PER REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANSIONE, TEMPSTICHE DIPENDENTI DAL SOGGETTO ATTUATORE (AIPO)	
44	2020MOHA0016	REVAMPING LINEA FANGHI DEPURATORE DI MODENA	DEPURAZIONE	Modena	Gestore	600.000,00 €	260.000,00 €	- €	- €	260.000,00 €	- €	- €	- €	- €	260.000,00 €	-100	L' INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO POICHE' L' AVVIO DELLA PROGETTAZIONE E' STATO SOSPESO IN QUANTO E' IN CORSO UNA REVISIONE COMPLESSIVA DELLE STRATEGIE DI GESTIONE DEI FANGHI DI HERA CON LA FINALITA' DI INDIVIDUARE LA DOTAZIONE IMPIANTISTICA PIU' ADEGUATA.	
45	2022MOHA0010	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 4	ACQUEDOTTO	Modena	Gestore	- €	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	47.136,94 €	- €	- €	47.136,94 €	7.136,94 €	17		
46	2022MOHA0013	REVAMPING TRATTAMENTO BOTTINI DEPURATORE MODENA	DEPURAZIONE	Modena	Gestore	6.000.000,00 €	47.000,00 €	- €	- €	47.000,00 €	- €	- €	- €	- €	47.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO NON PRIORITARIO SUL BREVE PERIODO E NON LEGATO A CRITICITA' COGENTI.	
47	2022MOHA0015	RIPRISTINO RETE FOGNARIA AFFERENTE TORRENTE TIEPIDO	FOGNATURA	Modena	Gestore	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	11.670,10 €	- €	- €	11.670,10 €	11.670,10 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO, SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A COMPLETAMENTO ATTIVITA' CONTABILI	
48	2022MOHA0016	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO MODENA - SCALO MERCI MARZAGLIA	ACQUEDOTTO	Modena	Gestore	1.062.000,00 €	733.000,00 €	- €	- €	733.000,00 €	29.585,97 €	- €	- €	29.585,97 €	703.414,03 €	-95	INTERVENTO FINANZIATO PNRR, CANTIERE AVVIATO (LO SLITTAMENTO DELL'AVVIO E' STATO DETERMINATO DA RITARDI NELL'OTTENIMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO), PREVISTA CONCLUSIONE NEL 2025	
49	2022MOHA0017	NUOVA DORSALE DA VACIGLIO A MARTINIANA	ACQUEDOTTO	Modena	Gestore	2.322.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
50	2024MOHA0003	NUOVO SILOS FANGHI DEPURATORE DI MODENA	DEPURAZIONE	Modena	Gestore	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
51	2024MOHA0005	RADDIOPIO DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMARI DEL DEPURATORE DI MODENA (fattibilità)	DEPURAZIONE	Modena	Gestore	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
52	2024MOHA0006	DISMISSIONE DEPURATORE DI SAN DAMASO E COLLETTAMENTO A MODENA	FOGNATURA	Modena	Gestore	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE.	
53	2024MOHA0007	INTERFERENZE PROLUNGAMENTO TANGENZIALE MODENA - FOGNATURA - C.CLIENTE	FOGNATURA	Modena	Gestore	1.451.000,00 €	697.000,00 €	697.000,00 €	- €	- €	667.017,33 €	608.033,00 €	- €	- €	58.984,57 €	29.982,67 €	-4	
54	2024MOHA0008	INTERFERENZE PROLUNGAMENTO TANGENZIALE MODENA - ACQUEDOTTO - C.CLIENTE	ACQUEDOTTO	Modena	Gestore	1.631.000,00 €	762.000,00 €	762.000,00 €	- €	- €	1.440.413,29 €	264.994,00 €	- €	- €	1.175.419,50 €	678.413,29 €	89	SCOSTAMENTO COSTI RELATIVO ALLA MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI MODALITA' DI POSA: SONO STATE REALIZZATE DUE TOC ANZICHE' POSA A CIELO APERTO A CAUSA DI INTERFERENZE COI LAVORI IN CAPO AD AUTOSTRADE PER L'ITALIA.
55	2014MOHA0067	REALIZZAZIONE TRATTAMENTI APPROPRIATI AGGLOMERATI >200 AB/EQ IN LOCALITA': CASOLA - PIANEZZO, FARNETA CIMITERO)	FOGNATURA	Montefiorino	Gestore	1.621.000,00 €	198.000,00 €	- €	- €	198.000,00 €	129.601,70 €	- €	- €	129.601,70 €	68.398,30 €	-34	SCOTAMENTO DOVUTO ALLO SLITTAMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' DI CANTIERE DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE	
56	2022MOHA0001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - MONTESE	ACQUEDOTTO	Montese	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	233.960,30 €	- €	- €	233.960,30 €	233.960,30 €	100	ID CONCLUSO NEL 2023. GLI IMPORTI RENDICONTATI SUL PRESENTE ID SI RIFERISCONO AD ATTIVITA' INIZIATE NELLE PRECEDENTI ANNUALITA' E CHE SI SONO CONCLUSE NEL CORSO DEL 2024. DAL 2024 LE NUOVE ATTIVITA' MANUTENTIVE SONO STATE RENDICONTATE NELL'ID 2014MOHA0142.	
57	2022MOHA0002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - MONTESE	DEPURAZIONE	Montese	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
58	2022MOHA0003	RINNOVO RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO DA PRONTO INTERVENTO - MONTESE	ACQUEDOTTO	Montese	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	9.437,29 €	- €	- €	9.437,29 €	9.437,29 €	100	ID CONCLUSO NEL 2023. GLI IMPORTI RENDICONTATI SUL PRESENTE ID SI RIFERISCONO AD ATTIVITA' INIZIATE NELLE PRECEDENTI ANNUALITA' E CHE SI SONO CONCLUSE NEL CORSO DEL 2024. DAL 2024 LE NUOVE ATTIVITA' MANUTENTIVE SONO STATE RENDICONTATE NEGLI ID 2014MOHA0140 E 2014MOHA0141.	
59	2022MOHA0004	RINNOVO RETI FOGNATURA DA PRONTO INTERVENTO - MONTESE	FOGNATURA	Montese	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
60	2022MOHA0005	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO FRAZIONE SALTO	FOGNATURA	Montese	Gestore	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	4.953,88 €	- €	- €	4.953,88 €	4.953,88 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO AD ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE DELLO STATO DI FATTO DELLE RETI A SEGUITO DI PRESA IN CARICO	
61	2022MOHA0006	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO FRAZIONE MASERNO	FOGNATURA	Montese	Gestore	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	561,89 €	- €	- €	561,89 €	561,89 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO AD ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE DELLO STATO DI FATTO DELLE RETI A SEGUITO DI PRESA IN CARICO	
62	2014MOHA0073	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI TELECOMANDO E TELECONTROLLO SII	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	333.252,21 €	- €	- €	333.252,21 €	83.252,21 €	33	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO	
63	2014MOHA0086	INTERVENTI DI RIPRISTINO/PAVIMENTAZIONI STRADALI A SEGUITO DI INTERVENTI MANUTENTIVI RETI IDRICHE.	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.300.000,00 €	- €	- €	1.300.000,00 €	1.131.657,91 €	- €	- €	1.131.657,91 €	168.342,09 €	-12		
64	2014MOHA0119	RIPRISTINO ASFALTI PER OPERE DI FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	278.884,23 €	- €	- €	278.884,23 €	178.884,23 €	178	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO FOGNARIO	
65	2014MOHA0140	RINNOVO PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	5.000.000,00 €	- €	- €	5.000.000,00 €	5.196.902,79 €	- €	- €	5.196.902,79 €	196.902,79 €	3		
66	2014MOHA0141	RINNOVO RETI, ALLACCI E CONTATORI DA PRONTO INTERVENTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	3.610.000,00 €	- €	- €	3.610.000,00 €	3.157.900,96 €	- €	- €	3.157.900,96 €	452.099,04 €	-12		
67	2014MOHA0142	RINNOVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOI, CENTRALI, INVASI, IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E CAPTAZIONI (POZZI E SORGENTI)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.500.000,00 €	- €	- €	1.500.000,00 €	2.360.345,00 €	- €	- €	2.360.345,00 €	860.345,00 €	57	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMBITO IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
68	2014MOHA0143	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-MO-ATO4	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	211.398,84 €	- €	- €	211.398,84 €	11.398,84 €	5		
69	2014MOHA0144	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - MO - ATO 4	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.000.000,00 €	- €	- €	1.000.000,00 €	3.629.252,68 €	- €	- €	3.629.252,68 €	2.629.252,68 €	262	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
70	2014MOHA0145	ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - MO - ATO 4	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	67.196,75 €	- €	- €	67.196,75 €	57.196,75 €	571	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
71	2014MOHA0146	MANUTENZIONI STRAORDINARIE RETI E ALLACCI DI FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	800.000,00 €	- €	- €	800.000,00 €	1.627.395,64 €	- €	- €	1.627.395,64 €	827.395,64 €	103	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
72	2014MOHA0147	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	160.000,00 €	- €	- €	160.000,00 €	167.887,44 €	- €	- €	167.887,44 €	7.887,44 €	4		
73	2014MOHA0218	SOST. CTR PARI CALIBRO - MO - ATO4	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.700.000,00 €	- €	- €	1.700.000,00 €	1.041.609,94 €	- €	- €	1.041.609,94 €	658.390,06 €	-38	CONTO CUMULATIVO - GLI IMPORTI INSERITI A PIANO SONO DI LARGA MASSIMA. SCOSTAMENTO LEGATO AL PIANO ANNUALE DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI	
74	2014MOHA0223	RINN. RETI/ALL.FOG. DA PI -MO-ATO 4	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	580.000,00 €	- €	- €	580.000,00 €	1.166.375,90 €	- €	- €	1.166.375,90 €	586.375,90 €	101	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
75	2015MOHA0011	VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPLACQUEDOTTO MO-ATO 4	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	4.545.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	1.002,86 €	- €	- €	1.002,86 €	98.997,14 €	-98	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE NEL 2022 QUESTO ID SPECIFICO E' STATO SOSTITUITO (CON CONSEGUENTE AZZERAMENTO DELLA RELATIVA PIANIFICAZIONE NEGLI ANNI 2022-23) CON L'ID MICROINTERVENTI 2022MOHA0011.	
76	2015MOHA0013	TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.DEF.-MO-ATO4	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	110.479,32 €	- €	- €	110.479,32 €	50.479,32 €	84	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO	
77	2015MOHA0014	TELECONTROLLO E AUTOM.IMP.FOGNA-MO-ATO4	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	98.387,85 €	- €	- €	98.387,85 €	88.387,85 €	883	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO	
78	2018MOHA0006	INVESTIMENTI STRUTTURA	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.812.110,00 €	- €	- €	1.812.110,00 €	5.196.071,60 €	- €	- €	5.196.071,60 €	3.383.961,60 €	186		
79	2018MOHA0007	INVESTIMENTI STRUTTURA - TICSÌ e TIBSI	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	36.090,18 €	- €	- €	36.090,18 €	36.090,18 €	100		
80	2020MOHA0001	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - ATO 4 MO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	195.452,97 €	- €	- €	195.452,97 €	304.547,03 €	-60	CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINATI DALLE RICHIESTE DEI CLIENTI	
81	2020MOHA0002	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIATI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - ATO 4 MO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	- €	1.593.731,15 €	1.453.247,00 €	- €	140.483,78 €	93.731,15 €	6		

Pagina 3 di 4

							Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Modena N.2 del 12 aprile 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				SCOSTAMENTO		
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 20244	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative
117	2015MOHA0022	POTENZIAMENTO RETE VALLEURBANA- VIA MURAGLIE	ACQUEDOTTO	Sassuolo	Gestore	250.000,00 €	125.000,00 €	- €	- €	125.000,00 €	- €	- €	- €	- €	125.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE IL COMUNE HA OPPOSTO DINIEGO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI; CIO' COMPORTERA' UNA REVISIONE CIRCA L'INTERVENTO DA ESEGUIRSI IN TERMINI DI LOCALIZZAZIONE E CONSEGUENTEMENTE DI QUADRO ECONOMICO.
118	2018MOHA0005	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI QUARTIERE FIUMI - FSC SCHEDA 24	ACQUEDOTTO	Sassuolo	Gestore	227.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
119	2020MOHA0020	REVAMPING LINEA FANGHI DEPURATORE DI SASSUOLO	DEPURAZIONE	Sassuolo	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
120	2025MOHA0002	PNRR All. Collett AM Rio S.Marco Sassuolo	FOGNATURA	Sassuolo	Gestore	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	296,68 €	- €	- €	296,68 €	296,68 €	100	IMPORTI 2024 LEGATI AD ATTIVITA' PRELIMINARI DI INDAGINE/PROGETTAZIONE.
121	2014MOHA0184	REALIZZAZIONE NUOVO POMPAGGIO VIA SICILIA PER ALIMENTARE VIGNOLA	ACQUEDOTTO	Savignano sul Panaro	Gestore	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	12.504,70 €	- €	- €	12.504,70 €	12.504,70 €	100	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AD INCREMENTO PREZZI.
122	2020MOHA0022	Estensione della rete di distribuzione dell'acquedotto nelle vie Gandhi e Manelle nel Comune di Savignano sul Panaro	ACQUEDOTTO	Savignano sul Panaro	Gestore	90.000,00 €	23.000,00 €	- €	- €	23.000,00 €	- €	- €	- €	- €	23.000,00 €	-100	RIPROGRAMMAZIONE DELL' INTERVENTO, IN RELAZIONE ALLA MANCATA COPERTURA DELLA QUOTA CONTO CLIENTE (PREVENTIVO NON ACCETTATO)
123	2014MOHA0187	COLLETTAMENTO SCARICHI DI RICCO' E SAN DALMAZIO AL DEPURATORE ESISTENTE DI SAN DALMAZIO	DEPURAZIONE	Serramazzone	Gestore	645.000,00 €	- €	- €	- €	- €	75,00 €	- €	- €	75,00 €	75,00 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO, IMPORTI 2024 PER PERFEZIONAMENTO SERVITU'
124	2014MOHA0189	COLLETTAMENTO DELLO SCARICO NON TRATTATO DI POMPEANO NORD ALLA FOSSA IMHOFF DI POMPEANO SUD E POTENZIAMENTO DELLA IMHOFF	FOGNATURA	Serramazzone	Gestore	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
125	2014MOHA0190	REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTO APPROPRIATO NELL'AGGLOMERATO DI LA BARBONA	FOGNATURA	Serramazzone	Gestore	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
126	2017MOHA0015	NUOVO IMP. SOLLEVAMENTO MONTARDONE	ACQUEDOTTO	Serramazzone	Gestore	300.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2024 LEGATO AL PERSISTERE DELLE DIFFICOLTA' AD OTTENERE DIRITTI REALI SULLA PROPRIETA' PRIVATA DOVE REALIZZARE L' OPERA. L' INTERVENTO PERTANTO SARA' AVVIATO A VALLE DEL SUPERAMENTO DI QUANTO ESPOSTO.
127	2020MOHA0024	DORSALE PLANO-APPENNINICA CENTRALE: NUOVO SERBATOIO CASA BARTOLACELLI	ACQUEDOTTO	Serramazzone	Gestore	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
128	2014MOHA0188	RISANAMENTO FOGNARIO LOCALITÀ VARANA/PESCAROLA E IMPIANTO DI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Serramazzone, Prignano sulla Secchia	Gestore	933.280,00 €	279.000,00 €	- €	- €	279.000,00 €	449.063,30 €	- €	- €	449.063,30 €	170.063,30 €	60	SCOSTAMENTO LEGATO A VARIANTI NON PRVENTIVABILI EMERSE IN CORSO D'OPERA
129	2014MOHA0198	SVILUPPO NUOVO CAMPO ACQUIFERO CASTELLARO NORD	ACQUEDOTTO	Spilamberto	Gestore	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
130	2014MOHA0202	NUOVA CONDOTTA COCCOLA - SANTEUSEBIO	ACQUEDOTTO	Spilamberto	Gestore	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
131	2014MOHA0204	STUDIO PER RICERCA ACQUE PARASSITE E SUCCESSIVI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE	FOGNATURA	Spilamberto	Gestore	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
132	2014MOHA0205	REALIZZAZIONE NUOVO POMPAGGIO COCCOLA PER SANTEUSEBIO	ACQUEDOTTO	Spilamberto	Gestore	50.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	6.578,22 €	- €	- €	6.578,22 €	23.421,78 €	-78	TALE INTERVENTO RISULTA COLLEGATO ALL' ID 2014MOHA0202 E PERTANTO E' INIZIATO SOLO IN CORRISPONDENZA DELLA CONCLUSIONE DELL' INTERVENTO CHE RIGUARDA LE CONDOTTE IN OGGETTO.
133	2018MOHA0004	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI VIE VARIE - FSC SCHEDA 23	ACQUEDOTTO	Spilamberto	Gestore	947.500,00 €	- €	- €	- €	- €	11.161,23 €	- €	- €	11.161,23 €	11.161,23 €	100	INTERVENTO ULTIMATO AD INIZIO 2024
134	2024MOHA0002	INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEI CARICHI SCOLMATORE SPILAMBERTO	FOGNATURA	Spilamberto	Gestore	1.199.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
135	2025MOHA0001	PNRR All. Aum Off Idr Canale Diamante Spilamberto	FOGNATURA	Spilamberto	Gestore	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
136	2014MOHA0213	REALIZZAZIONE SERBATOIO DI ACCUMULO NELLA CENTRALE DI FOGAZZARO	ACQUEDOTTO	Vignola	Gestore	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
137	2015MOHA0024	NUOVO SERBATOIO GESSIERE BASSO	ACQUEDOTTO	Vignola	Gestore	1.046.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
138	2018MOHA0002	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI VIA DOCCIA - FSC SCHEDA 21	ACQUEDOTTO	Vignola	Gestore	160.500,00 €	- €	- €	- €	- €	8.610,32 €	- €	- €	8.610,32 €	8.610,32 €	100	INTERVENTO ULTIMATO AD INIZIO 2024
139	2018MOHA0003	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI SANTA MARIA ROTONDA - FSC SCHEDA 22	ACQUEDOTTO	Vignola	Gestore	260.000,00 €	- €	- €	- €	- €	4.783,10 €	- €	- €	4.783,10 €	4.783,10 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO, SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A COMPLETAMENTO ATTIVITA' CONTABILI
140	2020MOHA0025	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - VIGNOLA	FOGNATURA	Vignola	Gestore	1.400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
141	2017MOHA0017	ADEGUAMENTO AGGLOMERATI DI MONTEOMBRARO-CAMPAZZO E MONTE CORONE-CASA NADINO	FOGNATURA	Zocca	Gestore	3.519.000,00 €	426.000,00 €	- €	- €	426.000,00 €	83.450,69 €	- €	- €	83.450,69 €	342.549,31 €	-80	SCOSTAMENTO DOVUTO AL PRORUNGAMENTO DELL'ITER AUTORIZZATIVO (CONFERENZA DEI SERVIZI ANCORA IN CORSO) CHE NON HA PERMESSO L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
142	2017MOHA0018	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO VERUCCHIA	DEPURAZIONE	Zocca	Gestore	200.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	1.667,73 €	- €	- €	1.667,73 €	8.332,27 €	-83	
143	2017MOHA0019	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CA' RAME	DEPURAZIONE	Zocca	Gestore	200.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	47.780,21 €	- €	- €	47.780,21 €	17.780,21 €	59	
144	2024MOHA0001	ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI M.CORONE CASA NADINO II STR	FOGNATURA	Zocca	Gestore	390.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura
Importo Totale	31.453.113,00 €	9.704.000,00 €	- €	21.749.113,00 €	37.271.721,76 €	4.199.774,00 €	- €	33.071.947,84 €	108,1%
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura	29.641.003,00 €	9.704.000,00 €	- €	19.937.003,00 €	32.039.559,98 €	4.199.774,00 €	- €	27.839.786,06 €	
