

CLPR/2021/9 del 14 ottobre 2021

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore MONTAGNA 2000. Programma Operativo
Interventi 2020 – 2023. Approvazione consuntivo 2020**

IL COORDINATORE
Tiziana Benassi

CLPR/2021/9

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

L'anno **2021** il giorno **14** del mese di Ottobre alle ore 14,00 si è riunito il Consiglio Locale di Parma convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/9113 del 08/10/2021.

La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle *“Linee Guida temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza dell'emergenza epidemiologica COVID 19”*, approvate dal Consiglio di Ambito con deliberazione n.13 del 14/04/2020.

Assume la presidenza il Coordinatore Tiziana Benassi.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBARETO	Davide Riccoboni	Sindaco	SI	0,6148
BARDI			NO	0,6474
BEDONIA			NO	0,8900
BERCETO			NO	0,6108
BORE			NO	0,3560
BORGO VAL DI TARO	Marco Moglia	Sindaco	SI	1,5832
BUSSETO			NO	1,5392
CALESTANO			NO	0,5898
COLLECCHIO	William Pietralunga	Assessore	SI	2,8373
COLORNO	Cristiano Vecchi	Consigliere	SI	1,8949
COMPIANO	Francesco Mariani	Sindaco	SI	0,4172
CORNIGLIO	Giuseppe Delsante	Sindaco	SI	0,5830
FELINO			NO	1,8383
FIDENZA	Franco Amigoni	Assessore	SI	5,0409
FONTANELLATO	Corrado Modernelli	Consigliere	SI	1,5241
FONTEVIVO			NO	1,2332
FORNOVO DI TARO	Michela Zanetto	Sindaco	SI	1,3779
LANGHIRANO			NO	2,0586
LESIGNANO DE' BAGNI			NO	1,1064
MEDESANO	Michele Giovanelli	Sindaco	SI	2,2252
MONCHIO DELLE CORTI			NO	0,3912
MONTECHIARUGOLO			NO	2,1909

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
NEVIANO DEGLI ARDUINI			NO	0,9040
NOCETO			NO	2,6122
PALANZANO			NO	0,4253
PARMA	Tiziana Benassi	Assessore	SI	33,5372
PELLEGRINO PAR.SE	Alberto Canepari	Sindaco	SI	0,4066
POLESINE - ZIBELLO			NO	0,8390
ROCCABIANCA	Alessandro Gattara	Sindaco	SI	0,7861
SALA BAGANZA			NO	1,2263
SALSOMAGGIORE TERME	Marco Trevisan	Assessore e delegato CAMB	SI	3,9008
S. SECONDO PAR.SE			NO	1,2504
SISSA TRECASALI			NO	1,7189
SOLIGNANO			NO	0,5474
SORAGNA	Matteo Concari	Consigliere	SI	1,1278
SORBOLO MEZZANI	Marco Comelli	Consigliere	SI	2,6651
TERENZO			NO	0,4310
TIZZANO VAL PARMA			NO	0,6050
TORNOLO			NO	0,4134
TORRILE			NO	1,6179
TRAVERSETOLO			NO	1,9622
VALMOZZOLA			NO	0,3120
VARANO DE' MELEGARI	Giuseppe Restiani	Sindaco	SI	0,7141
VARSÌ	Angelo Peracchi	Sindaco	SI	0,4473
PROVINCIA DI PARMA	Giuseppe Delsante	Consigliere prov.le e vice presidente	SI	10,0000

Presenti n. 19, quote 71,6834

Assenti n. 26, quote 28,3166

Riconosciuta la validità della seduta Tiziana Benassi, in qualità di Coordinatore, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore MONTAGNA 2000. Programma Operativo Interventi 2020 – 2023. Approvazione consuntivo 2020

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’Ambito la funzione di approvazione dei piani d’ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 4 del 15 gennaio 2020 del Consiglio locale di Parma è stata approvato il Programma Operativo degli interventi per gli anni 2020-2023 con revisione straordinaria dell’annualità 2019, del servizio idrico integrato per il gestore Montagna 2000 S.p.A., che costituisce dettaglio al Piano d’Ambito;
- con deliberazione n. 84 del Consiglio d’Ambito 2111 dicembre 2020 sono state approvate le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI-3, per il bacino tariffario di Parma gestito da Montagna 2000 S.p.A.
- con deliberazione n.3 del 22 marzo 2021 del Consiglio d’Ambito è stato approvato l’aggiornamento del Piano d’Ambito del bacino territoriale di Parma;
- la deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’Ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 inoltre dispone che:
 - entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all’anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore Montagna 2000 S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2020 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata ai Comuni interessati in allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale;

rilevato che dai dati presentati è emerso per l'annualità 2020 che sono stati analizzati e sintetizzati nell'Allegato 1 parte integrante del presente atto che, nella sostanza dà conto di:

- interventi non avviati;
- interventi anticipati/conclusi;
- interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 2020 - 2023 vigente - annualità 2020, autorizzati con nulla osta ai sensi della CAMB 75/2017;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al +/- 20%;

rilevato inoltre che:

- gli investimenti realizzati risultano essere di importo inferiore, esclusi gli investimenti di struttura, rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 approvato per l'annualità 2020;
- è stata effettuata un'analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore del +/- 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto,

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti;

posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti favorevoli 17 (quote 68,5761), astenuti 2 (quote 3,1072), o contrari, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti per l'annualità 2020 del gestore Montagna 2000 S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 9 del 14 ottobre 2021

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore MONTAGNA 2000. Programma Operativo Interventi 2020 – 2023. Approvazione consuntivo 2020

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Bologna, 14/10/2021

La Dirigente
Area Servizio idrico Integrato
Ing. Marialuisa Campani

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2020
Gestore: Montagna 2000 (PR)**

14 ottobre 2021

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2020, del Programma Operativo Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.4 del 15 gennaio 2020, che il gestore Montagna 2000 ha presentato tramite il software ARSI.

	PIANIFICATO 2020	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2020	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 1.959.765	- € 653.635	€ 1.306.130	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributi Pianificati esclusi gli Investimenti di Struttura [B]	€ 97.500	-€ 97.500	€ 0	Importo Contributi a Consuntivo esclusi gli investimenti di Struttura[B]
Importo Netto Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]-[B]	€ 1.862.265	- € 556.135	€ 1.306.130	Importo Netto a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura[A]-[B]

Tab.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore Montagna 2000 abbia effettuato minori investimenti rispetto alla pianificazione approvata, esclusi gli Investimenti di Struttura.

Precisamente minori investimenti netti per complessivi - €.556.135 e minori investimenti lordi per complessivi - €. 653.635 a fronte dei minori contributi incassati per complessivi a - €. 97.500.

La percentuale degli investimenti realizzati dal Gestore rispetto agli investimenti pianificati per l'annualità 2020 con riferimento all'importo lordo, esclusi gli investimenti di struttura, è pari a 67%.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

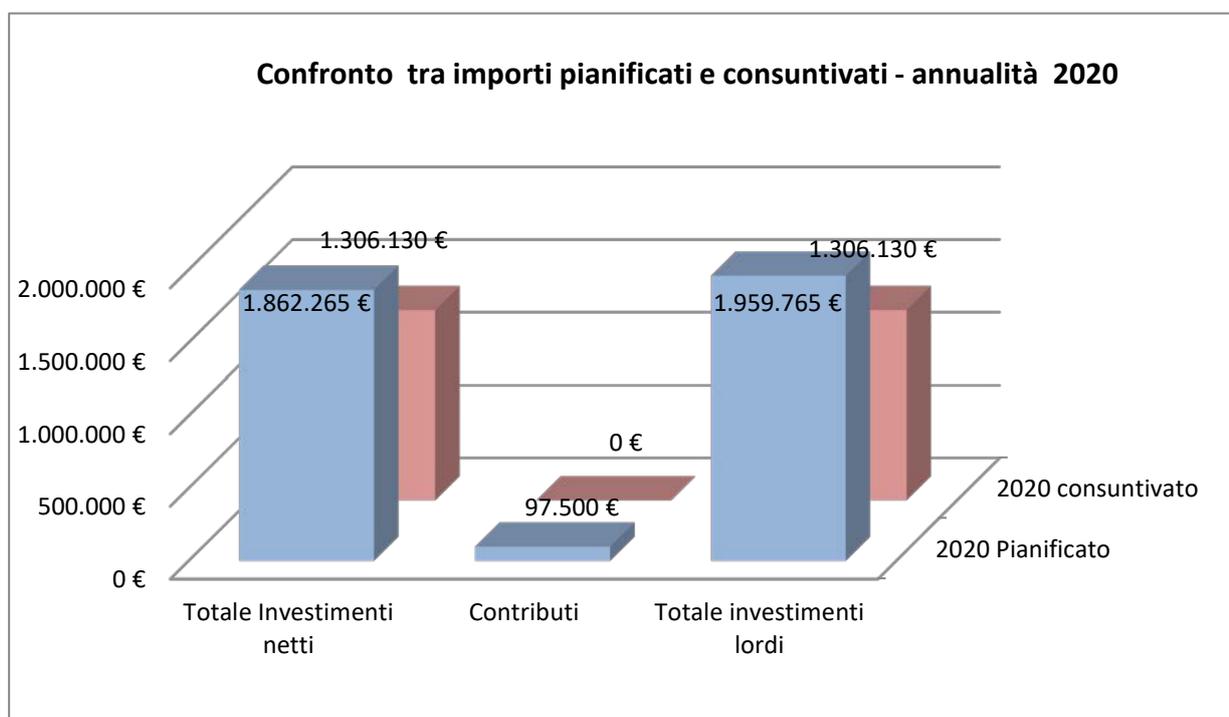


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2020 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

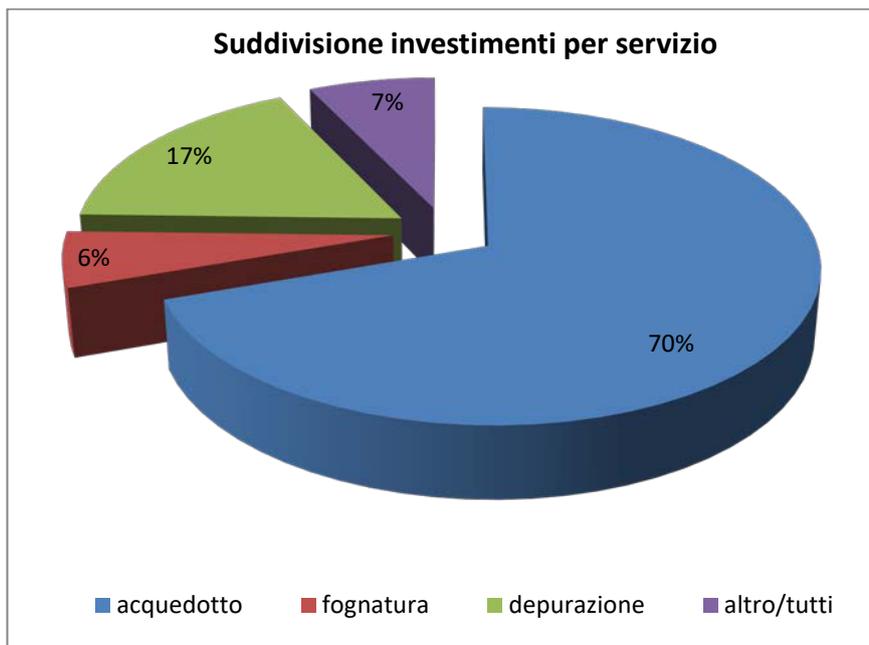


Fig.2 –Suddivisione investimenti 2020 per servizio

Nella tabella e nel grafico che seguono è riportato il numero degli interventi raggruppati sulla base degli scostamenti verificati e la rappresentazione grafica con indicazione della percentuale di ciascuna categoria rapportata al totale:

Interventi non iniziati (-100%)	7
interventi eseguiti anticipatamente o code di interventi (+100%)	37
Interventi con scostamento superiore a + o - 20%	21
interventi con scostamento inferiore a + o - 20%	2

Tab.2– Interventi che presentano scostamento tra pianificato e quanto rendicontato

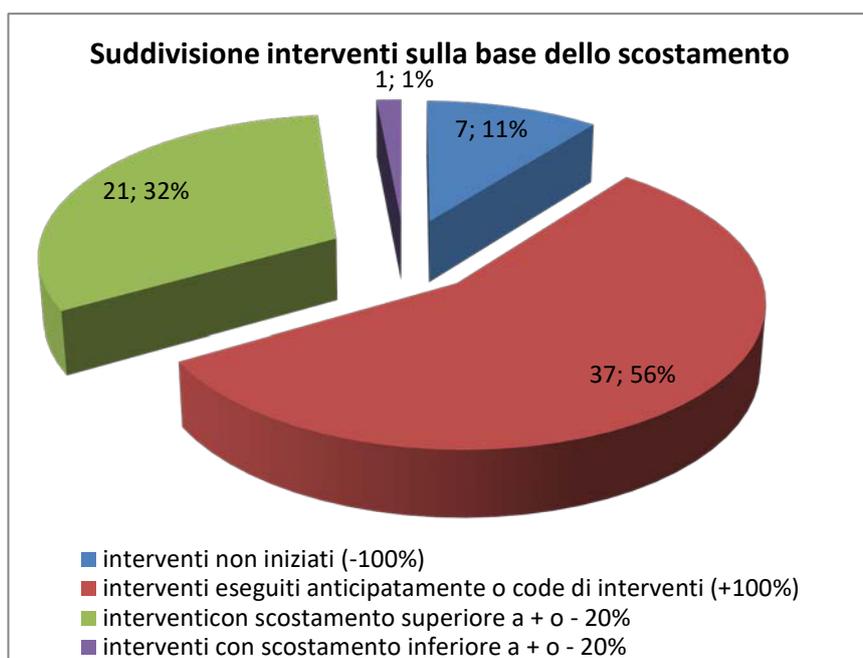


Fig.3 –Interventi realizzati nell'anno 2020 suddivisi per scostamento

Dalla tabella sopra riportata e dal relativo grafico risulta che per l'annualità 2020, n.7 interventi, che erano stati programmati per complessivi €. 366.000, non sono stati avviati (scostamento pari a - 100%), (per l'elenco si veda la Tab. 4), per i quali la giustificazione è risultata esaustiva (Allegato 1). Il Gestore ha avviato anticipatamente oppure chiuso prima rispetto a quanto programmato n.37 interventi e n.21 interventi, esclusi gli investimenti di struttura, hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno, e per i quali la giustificazione fornita è risultata esaustiva. Per n.2 interventi lo scostamento è inferiore al +/- 20% e quindi non passibile di giustificazione.

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o meno e il relativo provvedimento che ATERSIR intende eventualmente adottare, esclusi gli investimenti di struttura.

Numero interventi programmati nel 2020 (*pianificato un importo lordo diverso da zero*): 29.

Numero interventi rendicontati (importo lordo) nel 2020: 60

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2020	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2020	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	7	€ 0	€.366.000	NO	Vedi TAB. 4 Vedi il dettaglio in ALLEGATO 1	
Interventi con avvio anticipato nel 2020 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito (+100%)	37	€ 422.018	€0	NO	2014PRMA0027 2014PRMA0031 2014PRMA0037 2014PRMA0038 2014PRMA0045 2014PRMA0050 2014PRMA0055 2014PRMA0081 2015PRMA0089 2016PRMA0094 2016PRMA0100 2016PRMA0102 2018PRMA0108 2018PRMA0109 2018PRMA0110 2018PRMA0111 2018PRMA0112 2018PRMA0113 2018PRMA0114 2018PRMA0116 2018PRMA0117 2018PRMA0118 2018PRMA0119 2018PRMA0120 2018PRMA0123 2018PRMA0124 2018PRMA0126 2018PRMA0130 2018PRMA0137 2020PRMA0152 2020PRMA0154 2020PRMA0160 2020PRMA0162 2020PRMA0163 2020PRMA0181 2020PRMA0186 2020PRMA0188	

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2020	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2020	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	21	€ 819.981	€ 1.533.765	NO	2014PRMA0046 2014PRMA0070 2016PRMA0093 2016PRMA0101 2016PRMA0103 2018PRMA0115 2018PRMA0121 2018PRMA0127 2018PRMA0133 2018PRMA0135 2020PRMA0143 2020PRMA0144 2020PRMA0146 2020PRMA0151 2020PRMA0153 2020PRMA0159 2020PRMA0165 2020PRMA0169 2020PRMA0174 2020PRMA0176 2020PRMA0180	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	2	€ 64.131	€ 60.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

Tab.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Si specifica che nel corso dell'annualità 2020 sono stati rilasciati n.3 nulla osta relativi alle modifiche al Programma Operativo Interventi 2020-2023, approvato con delibera del Consiglio Locale di Parma n.4/2020, ai sensi della Camb 75/2017. Precisamente con prot.n.PG.AT/2020/6985 del 24/09/2020 è stata autorizzata la realizzazione dell'intervento: "Lavori di rifacimento di tratto di fognatura a servizio del Centro Storico via Cacchioli e Piazzale Castignoli" in Comune di Borgo Val di Taro; con prot.n.PG.AT/2020/6745 del 14/09/2020 è stata autorizzata l'anticipazione dell'intervento: "Fornitura adeguamento e installazione di impianto di rimozione di CromoIV da acque destinate al consumo umano in località Roccamurata" in Comune di Borgo Val di Taro; con prot.n.PG.AT/2020/1577 del 19/02/2020 è stata autorizzata la realizzazione dell'intervento: "Lavori di spostamento collettore fognario" in Comune di Albareto.

Gli interventi pianificati e non realizzati, con scostamento -100% sono n. 7 sintetizzati nella tabella che segue:

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo Pianificato 2020
2014PRMA0001	AL90A - Potenziamento capacità di stoccaggio serbatoio di accumulo in località Roncole di Go-tra - 1° STRALCIO	ACQUEDOTTO	Albareto	69.000	39.000

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo Pianificato 2020
2014PRMA0084	RICA156 - Rilievi e cartografia	TUTTI	Opere pluricomunali	100.000	5.000
2016PRMA0098	Ampliamento depuratore a servizio dell'agglomerato di Sugremaro (a.e.>200)	DEPURAZIONE	Compiano	348.000	140.000
2016PRMA0105	Costruzione fossa imhoff e collegamento scarichi autorizzati loc. Carniglia	DEPURAZIONE	Bedonia	112.000	112.000
2018PRMA0129	Installazione misuratori non precedentemente censiti e in punti nodali della rete acquedotto	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	60.000	25.000
2018PRMA0136	Manutenzioni straordinarie acque bianche	ACQUE BIANCHE	Opere pluricomunali		20.000
2020PRMA0168	Lavori di riqualificazione impianto di depurazione Case Lusardi a servizio di Tornolo Capoluogo	DEPURAZIONE	Tornolo	25.000	25.000

Tab.4 – Interventi pianificati ma non avviati

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n. 4 del 15/01/2020				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento %	Note giustificative
2014PRMA0044	FDT147 - Lavori di ristrutturazione impianto sollevamento gallerie filtranti	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	100.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0045	FDT148 - Lavori di ristrutturazione depuratore del Capoluogo (II livello)	DEPURAZIONE	Fornovo di Taro	150.000	0	0	0	1.249	0	1.249	100%	Si è reso necessario un piccolo intervento non programmabile
2014PRMA0046	FDT149 - Lavori di ristrutturazione rete fognaria del Capoluogo	FOGNATURA	Fornovo di Taro	150.000	50.000	0	50.000	1.240	0	1.240	-97%	Ritardi imputabili alla difficoltà reperimento dati utili alla progettazione e alla geolocalizzazione delle reti, inoltre difficoltà nell'ottenimento autorizzazioni da parte della rete ferrovie italiane
2014PRMA0050	PP139 - Sostituzione ed adeguamento tratti rete idrica acquedotti Capoluogo, Ca' del Rengo ed altri minori	ACQUEDOTTO	Pellegrino Parmense	60.000	0	0	0	7.000	0	7.000	100%	Intervento aggiuntivo e legato alla rete del Capoluogo non pianificabile
2014PRMA0054	SOL159 - Ripristino sorgenti, sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotto Capoluogo, Fopla e loc. diverse	ACQUEDOTTO	Solignano	40.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0055	SOL160 - Lavori di ristrutturazione condotte idriche del Capoluogo	ACQUEDOTTO	Solignano	40.000	0	0	0	30.360	0	30.360	100%	Interventi programmato nelle annualità precedenti e realizzato nel 2020 perchè necessarie indagini rete acquedotto
2014PRMA0057	SOL162 - Lavori di miglioramento e potenziamento reti fognarie del Capoluogo	FOGNATURA	Solignano	30.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0060	TE65A-TE66F - Lavori di sostituzione tratti di rete fognaria ed idrica in loc. Boschi di Bardone	FOGNATURA	Terenzo	68.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0066	TO169 - Ristrutturazione vecchi allacciamenti utenze acquedotti in località varie	ACQUEDOTTO	Tornolo	60.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRMA0070	VA72F- Lavori di costruzione rete fognaria ed impianto di trattamento reflui in loc. San Martino -La Borella (50AE), Maestri (35AE), Roncotasco (10AE) e rifacimento condotte in loc. diverse.	DEPURAZIONE	Valmozzola	137.000	40.000	0	40.000	700	0	700	-98%	Le opere sono state realizzate e collaudate nell'anno 2019. La quota in evidenza di - 700 è a copertura di una somma liquidata per indennizzo di un proprietario che ha ceduto la servitu dell'area ove realizzato il nuovo impianto.

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n. 4 del 15/01/2020				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento %	Note giustificative
2016PRMA0100	Lavori di miglioramento e potenziamento reti di adduzione e distribuzione degli acquedotti funzionali	ACQUEDOTTO	Solignano	20.000	0	0	0	15.627	0	15.627	100%	Realizzazione lavori programmati nelle annualità precedenti, ritardo dovuto a indagini preliminari della rete
2016PRMA0101	Lavori di messa in sicurezza delle captazioni idriche	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	350.000	50.000	0	50.000	64.493	0	64.493	28%	Attività aggiuntive rese necessarie in corso d'opera
2016PRMA0102	Messa a norma degli impianti elettrici e interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	200.000	0	0	0	4.511	0	4.511	100%	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza impianti elettrici vetusti
2016PRMA0103	Sistemi di telecontrollo dei serbatoi, degli impianti di depurazione e delle reti idriche-fognarie	TUTTI	Opere pluricomunali	150.000	15.000	0	15.000	63.915	0	63.915	326%	Ampliato sistemi di telecontrollo dei serbatoi, depuratori e reti per ottimizzazione tempi e costi intervento
2016PRMA0105	Costruzione fossa imhoff e collegamento scarichi autorizzati loc. Carniglia	DEPURAZIONE	Bedonia	112.000	112.000	0	112.000	0	0	0	-100%	Necessario procedere con ulteriori rilievi della rete fognaria che permettano un intervento preciso
2018PRMA0108	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Farneto	ACQUEDOTTO	Albareto	189.840	0	0	0	205	0	205	100%	Verifiche rete e impianto esistente per attività progettazione
2018PRMA0109	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Faggio	ACQUEDOTTO	Bardi	129.909	0	0	0	205	0	205	100%	Verifiche impianti esistenti
2018PRMA0110	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Cogno di Gazzo	ACQUEDOTTO	Bardi	161.438	0	0	0	205	0	205	100%	Attività di verifica delle dimensioni e posizione di tubazioni e tracciati
2018PRMA0111	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Groppo Gora	ACQUEDOTTO	Bardi	131.920	0	0	0	205	0	205	100%	Verifica situazione impiantistica e collegamenti rete
2018PRMA0112	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Gazzo	ACQUEDOTTO	Bardi	122.853	0	0	0	205	0	205	100%	Verifiche degli impianti esistenti per avvio progettazione
2018PRMA0113	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Granere Vallecca	ACQUEDOTTO	Bardi	238.143	0	0	0	205	0	205	100%	Verifiche preliminari dell'impianto e della rete
2018PRMA0114	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Cornolo	ACQUEDOTTO	Bedonia	146.846	0	0	0	205	0	205	100%	Verifica posizionamento tubazioni e situazione impianti

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n. 4 del 15/01/2020				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento %	Note giustificative
2018PRMA0115	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Roccamurata	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	103.765	103.765	0	103.765	49.953	0	49.953	-51%	Ritardi causati dalla difficoltà nell'ottenimento di alcuni pareri e atti di assenso da parte degli Enti preposti e ritardi nella realizzazione dell'allacciamento alla rete elettrica da parte di ENEL
2018PRMA0116	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Citerna Case Bottini	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	177.352	0	0	0	205	0	205	100%	Verifiche sugli impianti esistenti e delle reti per procedere con la progettazione lavori
2018PRMA0117	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Prinzerà Costa Piantonia Belvedere	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	108.970	0	0	0	205	0	205	100%	Verifica della situazione impiantistica esistente
2018PRMA0118	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Piazza	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	198.280	0	0	0	205	0	205	100%	Verifica dimensione e posizionamento tubi e impianto esistente
2018PRMA0119	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Filippi pozzo	ACQUEDOTTO	Solignano	93.171	0	0	0	205	0	205	100%	Verifiche degli impianti esistenti
2018PRMA0120	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc. Manganini Lamberti	ACQUEDOTTO	Varsi	107.515	0	0	0	205	0	205	100%	Verifiche preliminari impianti e reti esistenti
2018PRMA0121	Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati	ACQUEDOTTO	Albareto	100.000	90.000	45.000	45.000	854	0	854	-99%	Ritardi causati dalla poca conoscenza rete di adduzione
2018PRMA0123	Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati	ACQUEDOTTO	Bardi	100.000	0	0	0	4.996	0	4.996	100%	Spese di progettazione anticipate rispetto all'esecuzione del lavoro in programma nell'annualità 2021
2018PRMA0124	Rinnovo delle reti idriche nei centri abitati	ACQUEDOTTO	Bedonia	100.000	0	0	0	4.996	0	4.996	100%	Verifiche preliminari impianti esistenti e reti
2018PRMA0126	Installazione misuratori non precedentemente censiti e in punti nodali della rete acquedotto	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	60.000	0	0	0	23.610	0	23.610	100%	Conclusione dei lavori avviati nel 2019

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n. 4 del 15/01/2020				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento %	Note giustificative
2020PRMA0150	Adeguamento agglomerati < 200 a.e. mediante realizzazione di impianti di trattamento appropriati sugli agglomerati minori o inteconnessioni con quelli maggiori: Zermani e altri minori	DEPURAZIONE	Bore	50.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0151	Rifacimento condotte idriche vetuste e/o intasate da depositi calcarei in località Franchi, Pozzolo, Fiori e altre località	ACQUEDOTTO	Bore	70.000	70.000	0	70.000	874	0	874	-98%	Ritardi causati dalla scarsa conoscenza della rete di distribuzione che ha determinato notevoli indagini aggiuntive
2020PRMA0152	Interconnessione agglomerato di Monticelli (APR0157) con l'agglomerato di Borgo Val di Taro Capoluogo (APR0028) attraverso nuova condotta fognaria	DEPURAZIONE	Borgo Val di Taro	90.000	0	0	0	66.785	0	66.785	100%	Programmato nel 2019 ma realizzato nel 2020 per difficoltà legate all'ottenimento di permessi da parte dei proprietari dei terreni attraversati
2020PRMA0153	Rifacimento tratti di condotta di adduzione e scarichi di linea acquedotto di Nola-Frasso	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	160.000	160.000	0	160.000	410	0	410	-99%	Necessità di acquisire maggiori dettagli sulla situazione idrogeologica dei terreni attraversati dall'intervento che hanno richiesto maggiori indagini
2020PRMA0154	Rifacimento rete distribuzione acquedoto Via De Gasperi, Via Abbazia, Via Campo Fortuna	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	60.000	0	0	0	3.431	0	3.431	100%	E' stata anticipata le attività di progettazione dell'opera per consentirle la realizzazione nel corso del 2021
2020PRMA0155	Lavori di rifacimento reti acquedottistiche frazionali nelle località Porcigatone, Brunelli, San Vincenzo, Baselica, Tiedoli e altre minori	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	80.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0156	Lavori di rifacimento collettori fognari in Borgotaro Capoluogo, Ostia P.se, Belforte e altri agglomerati minori	FOGNATURA	Borgo Val di Taro	80.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0157	Realizzazione di nuovo sfioratore delle portate reflue eccedenti in Via Torresana con recapito al Rio Varacola	FOGNATURA	Borgo Val di Taro	250.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0158	Lavori di collegamento allacci del nuovo acquedotto nel Centro Storico di Borgotaro con dismissione del vecchio acquedotto	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	50.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0159	Rifacimento condotte di adduzione ai serbatoi di Isola e Breia	ACQUEDOTTO	Compiano	40.000	40.000	0	40.000	2.806	0	2.806	-92%	Ritardo legato alle maggiori indagini conoscitive condotte sulla rete di adduzione di Isola

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n. 4 del 15/01/2020				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento %	Note giustificative
2020PRMA0160	Adeguamento impianto elettrico a servizio stazione di sollevamento acquedotto Tebaldi-Monte Croce	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	20.000	0	0	0	30.012	0	30.012	100%	I lavori sono stati affidati a fine 2019 (ove era presente la programmazione) e realizzati nell'anno 2020
2020PRMA0161	Rifacimento condotte idriche vetuste a servizio delle località Piazza e altre minori	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	60.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0162	PP140 - Sostituzione ed adeguamento impianto elettrico depuratore di Pellegrino Capoluogo	DEPURAZIONE	Pellegrino Parmense	20.000	0	0	0	512	0	512	100%	Ritardo nella progettazione legata alla difficoltà di reperire i dati dell'impianto elettrico esistente
2020PRMA0163	Sostituzione a adeguamento della rete idrica di distribuzione a servizio del centro storico di Pellegrino P.se	ACQUEDOTTO	Pellegrino Parmense	50.000	0	0	0	3.216	0	3.216	100%	Lavori anticipati rispetto al pianificato a causa delle elevate perdite che determinavano mancanza di acqua alle utenze (ottenuto Nulla Osta ATERSIR ai sensi del C.AMB 75 del 2017)
2020PRMA0165	Lavori di ampliamento/potenziamento depuratore di Rubbiano	DEPURAZIONE	Solignano	290.000	190.000	0	190.000	6.838	0	6.838	-96%	Ritardi causati dalla scarsa conoscenza dell'impianto di depurazione esistente che hanno richiesto notevoli indagini aggiuntive
2020PRMA0166	Lavori di rifacimento tratti di condotte fognarie nelle località Selva Grossa, Call Sana e Boschi Bardone	FOGNATURA	Terenzo	35.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0167	Rifacimento tratto condotte idriche dell'acquedotto di Monte Bosso a servizio delle località Ozzanello, La Fornace, Selva Smeralda, Case Cattani, Sivizzano e altre minori	ACQUEDOTTO	Terenzo	90.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRMA0168	Lavori di riqualificazione impianto di depurazione Case Lusardi a servizio di Tornolo Capoluogo	DEPURAZIONE	Tornolo	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	-100%	Necessità di procedere con l'acquisizione di maggiori dettagli tecnici sull'impianto di depurazione
2020PRMA0169	Sistemi di contabilizzazione acqua sugli allacciamenti utenze delle frazioni di Santa Maria del Taro, Casale, Tornolo Capoluogo, Tarsogno e zone limitrofe	ACQUEDOTTO	Tornolo	440.000	88.000	0	88.000	35.497	0	35.497	-59%	Ritardi nei lavori causati da notevoli difficoltà nell'individuazione delle utenze a causa di gravi carenze nell'anagrafica fornita; inoltre lavori sospesi per circa 2 mesi a causa maltempo

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n. 4 del 15/01/2020				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento %	Note giustificative
2020PRMA0188	Acquisizione, adeguamento e messa in funzione di 4 impianti fotovoltaici in Comune di Fornovo: Campo sportivo Riccò (KW 14,26), Serbatoio Casa Tebaldi (KW 10,81), Scuola Materna P.zza Libertà (KW 28,6), Condominio ACER Riccò (KW 13,57). Interventi finalizzati alla riduzione dei costi energetici e a beneficio esclusivo del S.I.I.	TUTTI	Opere pluricomunali	30.000	0	0	0	14.238	0	14.238	100%	Rendicontazione dei costi di acquisto e adeguamento per la messa in funzione di 4 impianti fotovoltaici a beneficio del servizio idrico
					Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	PERCENTUALE INVESTIMENTI REALIZZATI esclusi investimenti di struttura	
					2.108.189	97.500	2.010.689	1.920.699	0	1.920.699	67%	
IMPORTO TOTALE - Esclusi gli Investimenti di Struttura					1.959.765	97.500	1.862.265	1.306.130	0	1.306.130		

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma

Tiziana Benassi

Il segretario verbalizzante

Sara Melone

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 24 gennaio 2022

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna
