



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA  
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

---

**CLMO/2024/2 del 12/04/2024**

**CONSIGLIO LOCALE di MODENA**

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Approvazione del programma degli interventi 2024-2029  
del gestore HERA s.p.a..**

**IL COORDINATORE**  
F.to Giacomo Vincenzi

CLMO/2024/2

## CONSIGLIO LOCALE di MODENA

L'anno **2024** il giorno **12** del mese di **aprile** alle ore **10.00** il Consiglio Locale di Modena convocato con lettera protocollo PG.AT/4092 del 10/04/2024 si è riunito mediante videoconferenza.

Il dibattito è conservato agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA di MODENA	Braglia Fabio	Presidente	no	
Bastiglia	Silvestri Francesca	Sindaco	si	0,6664
Bomporto	Berselli Andrea	Assessore	si	1,3622
Campogalliano	Messori Marcello	Assessore	si	1,1779
Camposanto	Vincenzi Giacomo	Assessore	si	0,5681
Carpi	Righi Riccardo	Assessore	si	8,4563
Castelfranco Emilia	Testoni Sarah	Assessore	si	3,9973
Castelnuovo Rangone	Paradisi Massimo	Sindaco	no	
Castelvetro di Modena	Franceschini Fabio	Sindaco	no	
Cavezzo	Sgarbi Gianni	Assessore	si	0,9986
Concordia sulla Secchia	Prandini Luca	Sindaco	si	1,1307
Fanano	Muzzarelli Stefano	Sindaco	no	
Finale Emilia	Poletti Claudio	Sindaco	si	1,9201
Fiorano Modenese	Branduzzi Davide	Assessore	si	2,1419
Fiumalbo	Nizzi Alessio	Sindaco	no	
Formigine	Costi Maria	Sindaco	no	
Frassinoro	Capelli Oreste	Sindaco	no	
Guiglia	Parenti Paolo	Assessore	si	0,6563
Lama Mocogno	Pasini Giovanni Battista	Sindaco	si	0,4994
Maranello	Marsigliante Elisabetta	Assessore	si	2,1871
Marano sul Panaro	Galli Giovanni	Sindaco	no	
Medolla	Paltrinieri Franca	Assessore	no	
Mirandola	Greco Alberto	Sindaco	no	
Modena	Filippi Alessandra	Assessore	si	21,5871
Montecreto	Bonucchi Leandro	Sindaco	no	
Montefiorino	Paladini Maurizio	Sindaco	no	
Montese	Deluca Matteo	Sindaco	no	
Nonantola	Baccolini Tiziana	Assessore	si	2,0403
Novi di Modena	Diacci Enrico	Sindaco	si	1,3424
Palagano	Braglia Fabio	Sindaco	no	
Pavullo nel Frignano	Venturelli Davide	Sindaco	no	
Pievepelago	Ferroni Corrado	Sindaco	no	
Polinago	Magnani Simona	Sindaco	si	0,3730
Prignano sulla Secchia	Fantini Mauro	Sindaco	si	0,6247
Ravarino	Rebecchi Maurizia	Sindaco	si	0,9090
Riolunato	Contri Daniela	Sindaco	no	

<b>Comune</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenti</b>	<b>Quote</b>
San Cesario sul Panaro	Zuffi Francesco	Sindaco	no	
San Felice sul Panaro	Bocchi Giorgio	Assessore	si	1,4248
San Possidonio	Fregni Giulio	Assessore	si	0,5912
San Prospero	Borghi Sauro	Sindaco	no	
Sassuolo	Liberi Ugo	Assessore	si	4,8642
Savignano sul Panaro	Pisciotta Davide	Assessore	si	1,2769
Serramazzoni	Quattrini Giorgio	Assessore	si	1,1689
Sestola	Magnani Fabio	Sindaco	no	
Soliera	Mazzoni Katia	Assessore	si	1,9696
Spilamberto	Costantini Umberto	Sindaco	si	1,6748
Vignola	Paragliola Anna	Assessore	si	3,1500
Zocca	Ropa Federico	Sindaco	no	

Presenti n. 27 quote 68,7594 Assenti n. 21 quote 31,2406

Riconosciuta la validità della seduta, Giacomo Vincenzi, in qualità di Coordinatore, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Approvazione del programma degli interventi 2024-2029 del gestore HERA s.p.a..**

**Visti:**

- la L.R. 6 settembre 1999, n. 25, recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”
- la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che ha istituito l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), di seguito Agenzia, ed in particolare l’art. 5 che individua gli organi dell’Agenzia e l’art. 8, comma 6, che definisce le competenze del Consiglio locale tra le quali alla lettera c) *all'approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g)*;
- la L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 e s.m.i.; la L.R. Emilia-Romagna n. 23/2011 di istituzione dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, che ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato che:**

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g);

**considerato che:**

- con deliberazione n. 5 del 2 marzo 2020 del Consiglio locale di Modena è stato approvato il programma degli interventi 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore HERA s.p.a. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito;
- con deliberazione n. 19 del 20 giugno 2022 del Consiglio locale di Modena è stato approvato l’aggiornamento del programma degli interventi del servizio idrico integrato per il gestore HERA s.p.a. limitatamente agli anni 2022-2023;
- con deliberazione n. 84 del 12 settembre 2022 il Consiglio d’ambito ha approvato le “*Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato*”;
- ARERA con deliberazione n. n. 639/2023/R/idr del 28/12/2023 ha esteso la durata dei programmi degli interventi a 6 anni;

**considerato inoltre che:**

- le succitate linee guida prevedono che il Programma degli interventi venga aggiornato periodicamente mediante revisioni annuali e revisioni straordinarie;

- ATERSIR ha chiesto ai gestori del servizio idrico integrato di formulare una proposta di programma degli interventi per il periodo 2024-2029

**dato atto** che:

- il gestore HERA s.p.a. ha trasmesso la sua proposta di programma degli interventi del servizio idrico integrato relativa agli anni 2024-2029;
- la struttura tecnica di ATERSIR ha effettuato un'analisi della proposta di Programma degli interventi 2024-2029 presentata e l'ha inviata alle Amministrazioni comunali interessate chiedendo di fornire osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento;

**rilevato** che:

- conseguentemente all'invio da parte di ATERSIR della proposta di Programma degli interventi 2024-2029 i Comuni di Guiglia, Polinago e Castelfranco Emilia hanno formulato osservazioni;
- la struttura tecnica di ATERSIR ha avviato un confronto sulle osservazioni per trovare una soluzione che contemperasse le esigenze rappresentate con l'equilibrio finanziario del programma e la sua fattibilità tecnica;

**rilevato altresì** che ad oggi non si hanno informazioni definitive in merito all'esito delle candidature avanzate nell'ambito di alcune linee di finanziamento, quali ad esempio la misura M2C4 Inv. 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti";

**considerato** che il Programma degli interventi 2024-2029 è elemento propedeutico alla definizione della manovra tariffaria del gestore per il periodo 2024-2029;

**considerato altresì** che:

- dalle prime simulazioni di applicazione del metodo tariffario MTI-4, emergono incrementi superiori ai limiti di crescita annuali a causa dell'adeguamento inflattivo dei costi operativi di gestione del servizio, dei coefficienti di calcolo dell'onere finanziario e fiscale standard e del recupero dei maggiori costi di energia elettrica sostenuti nel 2022-2023;
- al fine di applicare pienamente il metodo tariffario MTI-4 è necessario acquisire i dati preconsuntivi dei gestori del servizio e procedere alla validazione ed al caricamento sul nuovo tool di calcolo MTI-4 in corso di elaborazione da parte dell'ARERA;
- tali attività, dalle quali emergerà la situazione economico finanziaria della concessione, attuale e prospettica, e la correlata effettiva fattibilità del Programma degli Interventi, saranno completate dall'Agenzia indicativamente entro il prossimo mese di giugno;

**ritenuto pertanto** di:

- approvare il Programma degli interventi 2024-2029 del Gestore comprensivo della relazione istruttoria e dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dare mandato al Consiglio d'Ambito in sede di approvazione della manovra tariffaria ai sensi del MTI-4 di apportare le eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per garantire le condizioni succitate dandone opportuna motivazione nella relazione di accompagnamento alla manovra tariffaria e nella delibera di approvazione;

**considerato inoltre** che in presenza di incrementi superiori ai limiti di crescita annuali, la regolazione ARERA prevede, a tutela del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione

e della corretta applicazione del principio dell'integrale riconoscimento dei costi efficienti del servizio, la possibilità di ricorrere all'applicazione delle misure di riequilibrio previste nelle Convenzioni di affidamento che includono tra le altre in maniera prioritaria la "rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati" e la "revisione del Programma degli Interventi" con la finalità di garantire all'utenza livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda a tariffe socialmente sostenibili;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**dato atto** che per le versioni integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene acquisita agli atti;

**con voti favorevoli n. 25 (63,5221), astenuti n. 2 (5,2372), contrari n. 0** resi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare il programma degli interventi 2024-2029 del gestore HERA s.p.a. riportato in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto nelle more delle modifiche che si rendessero necessarie per far fronte agli impegni derivanti dall'accesso a linee di finanziamento per le quali alla data odierna sono già state avanzate candidature;
2. dare mandato al Consiglio d'Ambito in sede di approvazione della manovra tariffaria ai sensi del MTI-4 di apportare le eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per garantire le condizioni succitate dandone opportuna motivazione nella relazione di accompagnamento alla manovra tariffaria e nella delibera di approvazione;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 2 del 12/04/2024

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Approvazione del programma degli interventi 2024-2029 del gestore HERA s.p.a.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente  
Area Servizio Idrico  
Integrato  
*F.to Marialuisa Campani*

Bologna, 12/04/2024

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**  
**PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI**  
**2024-2029**

**GESTORE: HERA s.p.a.**  
**BACINO PROVINCIALE DI: MODENA**

## PREMESSA

Il Gestore HERA s.p.a., su richiesta dell'Agenzia ATERSIR, ha presentato una proposta per il nuovo Programma Operativo degli interventi per il periodo 2024-2029. Il prolungamento della durata del POI, che passa da 4 a 6 anni, è conseguente alla delibera di ARERA n. 639/2023/R/idr che lo ha esteso.

Tale proposta è stata trasmessa dall'Agenzia in via preliminare alle Amministrazioni locali che hanno potuto inviare le proprie osservazioni e richieste di modifiche e/o integrazioni.

A seguito di ulteriori confronti con il Gestore ne è scaturita una versione definitiva che viene posta all'approvazione dei Consigli Locali di ATERSIR, per poi essere approvata successivamente dal Consiglio d'Ambito quale base del nuovo schema regolatorio MT14 per il calcolo della tariffa nelle annualità considerate.

## POI 2020-2023 - CONFRONTO TRA IL PIANIFICATO E IL CONSUNTIVATO

Al fine di inquadrare la nuova programmazione si ritiene utile riassumere lo stato di attuazione della precedente programmazione relativa al periodo regolatorio 2020-2023; a tal proposito si riporta nella successiva tabella un raffronto tra pianificato e consuntivato. Si precisa che per l'anno 2023 la rendicontazione disponibile è relativa al primo semestre dell'anno, non fornisce valori confrontabili con quelli pianificati e pertanto non è riportata nella tabella.

		2020	2021	2022	2023	TOTALE
PIANIFICATO	GESTORE	21.029.583 €	26.312.583 €	25.445.583 €	24.970.583 €	97.758.332 €
	CONTO TERZI	- €	- €	- €	- €	- €
	FONDO PERDUTO	2.340.000 €	2.053.000 €	1.709.000 €	2.090.000 €	8.192.000 €
	<b>TOTALE</b>	<b>23.369.583 €</b>	<b>28.365.583 €</b>	<b>27.154.583 €</b>	<b>27.060.583 €</b>	<b>105.950.332 €</b>
CONSUNTIVATO	GESTORE	19.640.479 €	24.206.792 €	29.139.385 €	- €	72.986.656 €
	CONTO TERZI	- €	- €	- €	- €	- €
	FONDO PERDUTO	2.493.704 €	1.903.776 €	1.969.708 €		6.367.187 €
	<b>TOTALE</b>	<b>22.134.183 €</b>	<b>26.110.568 €</b>	<b>31.109.093 €</b>	<b>- €</b>	<b>79.353.843 €</b>

TAB.1 – Tabella di confronto tra pianificato e rendicontato nel periodo 2020-2023 (compresa struttura)

In estrema sintesi per gli anni 2020-2021-2022 il totale Pianificato era pari a € 78.889.749 mentre il consuntivato ad oggi è di € 79.353.843, si rileva quindi un impegno finanziario sostanzialmente in linea con la programmazione.

## DATI DI SINTESI SUL NUOVO POI 2024-2029

Il nuovo programma degli interventi prevede investimenti a carico del gestore, al lordo degli investimenti di struttura (€ 10.872.660), pari a 156,7 milioni di euro, mediamente circa 26,1 milioni/anno, (il periodo precedente ne prevedeva circa 26,5 milioni/anno medi).

	2024	2025	2026	
<b>INVESTIMENTI DEL GESTORE</b>	25.782.110 €	23.912.110 €	3.312.110 €	
<b>CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO</b>	3.459.000 €	3.403.000 €	2.000.000 €	
<b>INVESTIMENTI FINANZIATORE</b>	- €	- €	- €	
<b>TOTALE</b>	<b>29.241.110 €</b>	<b>27.315.110 €</b>	<b>25.312.110 €</b>	
	2027	2028	2029	<b>TOTALE 2024-2029</b>
<b>INVESTIMENTI DEL GESTORE</b>	22.542.110 €	22.127.310 €	22.916.110 €	<b>140.591.860 €</b>
<b>CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO</b>	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	<b>14.862.000 €</b>
<b>INVESTIMENTI FINANZIATORE</b>	- €	- €	- €	<b>- €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>24.542.110 €</b>	<b>24.127.310 €</b>	<b>24.916.110 €</b>	<b>155.453.860 €</b>

Tab.2 – Tabella degli investimenti suddivisi per annualità e tipologia di soggetto investitore

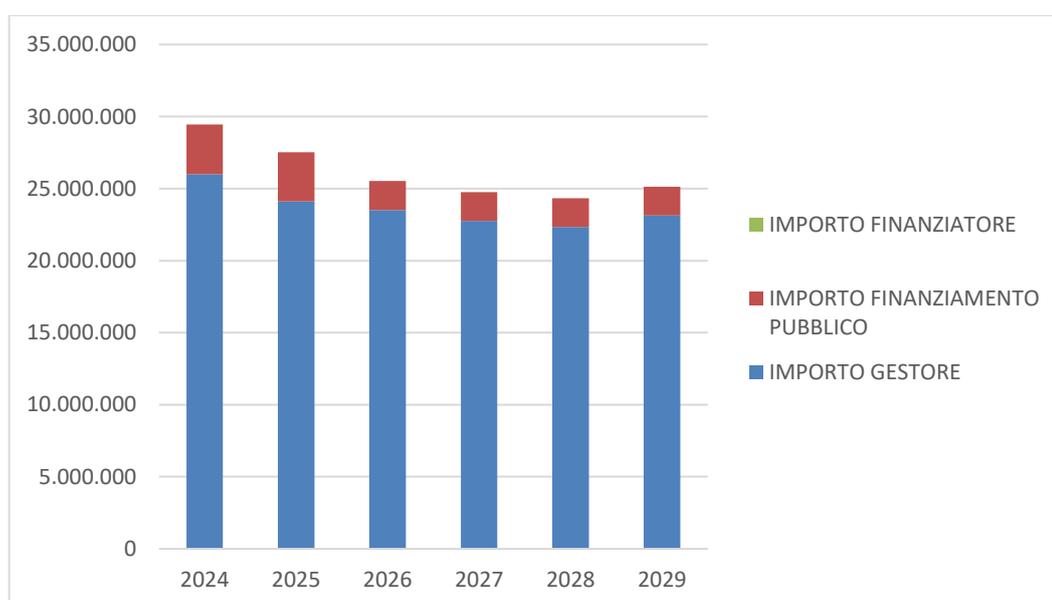


Fig.1 – Istogramma di confronto degli investimenti per soggetto investitore

Al momento sono previsti contributi a fondo perduto per due interventi nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza) uno sulla linea "Fanghi di depurazione" e uno nella linea "Fognatura e depurazione"; ulteriori interventi sono stati proposti sia nel PNRR "Perdite idriche" sia nel PNISSI (Piano Nazionale di Interventi infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico) ma al momento non sono ancora conclusi gli iter per il finanziamento, quando si concluderanno saranno aggiornati gli importi nel programma (cfr Tab.6).

Nelle pagine che seguono si riportano alcune tabelle e grafici di sintesi da un'analisi che l'Agenzia ha effettuato sulla versione proposta del POI.

Tali tabelle e grafici hanno lo scopo di illustrare, in termini numerici per alcune macro-categorie tematiche più significative, i contenuti del nuovo POI. Per il dettaglio degli interventi si rimanda all'elenco del POI e alla relativa programmazione (Allegato 1).

## CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Si propongono di seguito le classificazioni degli investimenti più significative.

Sono stati suddivisi gli interventi proposti in funzione del tipo di servizio a cui si riferiscono: acquedotto, fognatura, depurazione, acque bianche, struttura.

Gli investimenti maggiori si hanno nel servizio acquedottistico, in particolare per quanto riguarda il macroindicatore M1 relativo alle perdite che vede questo gestore attualmente in classe C.

Gli investimenti di struttura sono invece stati fissati in misura massima dalla Delibera di Consiglio d'Ambito n. 32 del 19/04/2018.

SERVIZIO	INVESTIMENTI DEL GESTORE	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	TOTALE
<b>ACQUEDOTTO</b>	84.566.000 €	10.474.000 €	95.040.000 €
<b>FOGNATURA</b>	27.515.400 €	4.388.000 €	31.903.400 €
<b>DEPURAZIONE</b>	16.707.800 €	- €	16.707.800 €
<b>ACQUE BIANCHE</b>	930.000 €	- €	930.000 €
<b>STRUTTURA</b>	10.872.660 €	- €	10.872.660 €
<b>TOTALE</b>	<b>140.591.860 €</b>	<b>14.862.000 €</b>	<b>155.453.860 €</b>

Tab.3 – Tabella degli investimenti suddivisi per tipologia di servizio

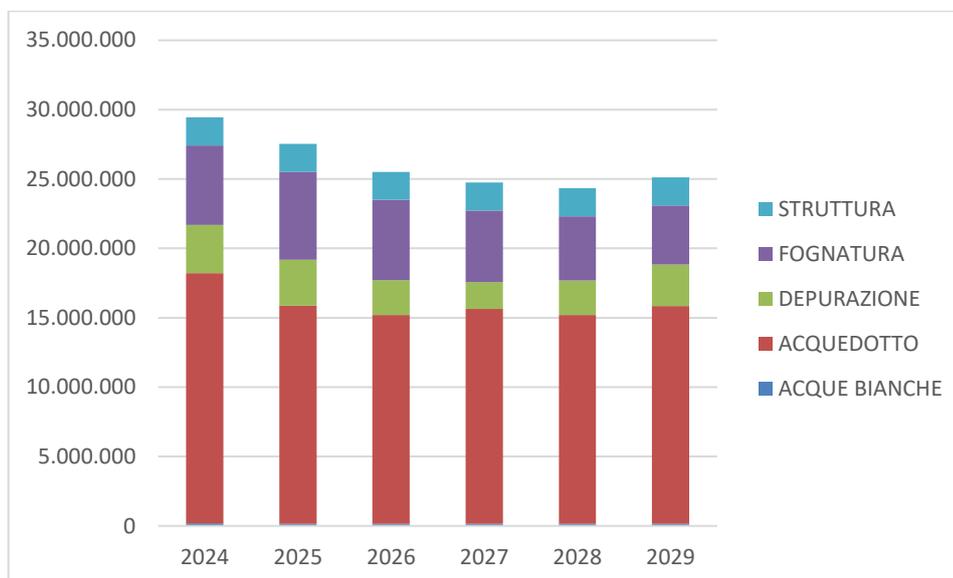


Fig.2 – Istogramma di confronto degli investimenti per tipologia di servizio

Nella tabella e nelle figure successive, si rappresentano gli interventi in base alla loro classificazione tramite i macroindicatori della qualità tecnica, come definiti da ARERA con la delibera 917/17, rispetto ai quali nella Tabella 3 è proposto il quadro al 2021 (anno più recente con dati definitivi). E' evidente l'impegno nel servizio acquedottistico (macroindicatori M1,M2,M3), rispetto al quale il macroindicatore M1 evidenzia ancora opportunità di miglioramento.

SERVIZIO -	MACROINDICATORE	Tipologia	CLASSE AL 2021
ACQUEDOTTO	M1	Perdite Idriche	B
	M2	Interruzioni del servizio	A
	M3	Qualità dell'acqua erogata	A
FOGNATURA	M4	Adeguatezza del sistema fognario	C
DEPURAZIONE	M5	Smaltimento fanghi in discarica	A
	M6	Qualità dell'acqua depurata	C

Tab.4 – Classi dei macroindicatori al 2021 (Classi da A ad E, A valore migliore, E valore peggiore)

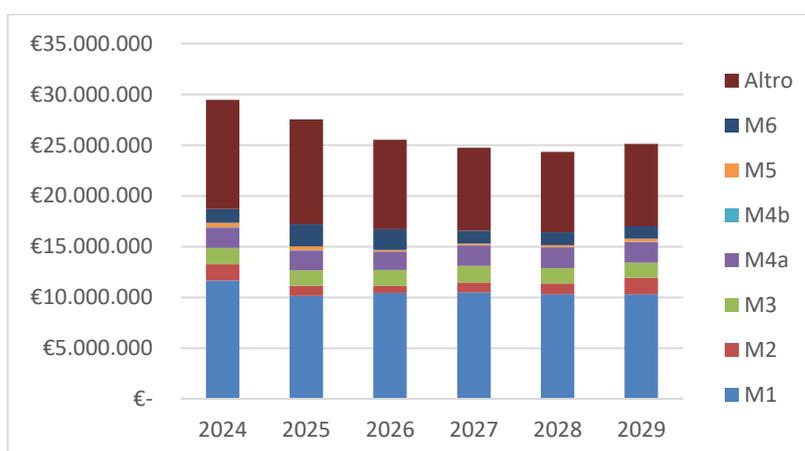


Fig.3 – Istogramma degli investimenti per macroindicatore

<b>Anno</b>	<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>M3</b>	<b>M4a</b>	<b>M4b</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>	<b>Altro</b>
<b>2024</b>	11.650.000 €	1.603.000 €	1.600.000 €	2.010.000 €	30.000 €	460.000 €	1.357.000 €	10.739.583 €
<b>2025</b>	10.140.000 €	1.018.000 €	1.500.000 €	1.960.000 €	30.000 €	360.000 €	2.170.000 €	10.345.583 €
<b>2026</b>	10.440.000 €	670.000 €	1.580.000 €	1.810.000 €	30.000 €	150.000 €	2.049.000 €	8.791.583 €
<b>2027</b>	10.490.000 €	964.000 €	1.660.000 €	2.010.000 €	30.000 €	160.000 €	1.250.000 €	8.186.583 €
<b>2028</b>	10.290.000 €	1.095.650 €	1.500.000 €	2.039.950 €	30.000 €	190.000 €	1.241.900 €	7.948.283 €
<b>2029</b>	10.290.000 €	1.640.350 €	1.500.000 €	2.039.950 €	30.000 €	258.500 €	1.241.900 €	8.123.883 €
<b>Totale complessivo</b>	<b>63.300.000 €</b>	<b>6.991.000 €</b>	<b>9.340.000 €</b>	<b>11.869.900 €</b>	<b>180.000 €</b>	<b>1.578.500 €</b>	<b>9.309.800 €</b>	<b>54.135.497 €</b>

Tab.5 – Investimenti suddivisi per macroindicatore ARERA

Il piano non contiene formalmente l'intervento strategico candidato per il PNRR sulle perdite in quanto si è in attesa di conoscere dal Governo se sarà fornita la copertura finanziaria nell'ambito del PNRR.

Sono poi stati candidati altri interventi nel PNISSI in parte già presenti nella proposta di programmazione e al momento finanziati solo da tariffa.

<b>CODICE INTERVENTO</b>	<b>TITOLO</b>	<b>COMUNE</b>	<b>IMPORTO PROGETTUALE</b>
<b>2014MOHA0003</b>	RINNOVO E POTENZIAMENTO DORSALE IDRICA VIA EMILIA OVEST I STRALCIO	Castelfranco Emilia	455.000
<b>2014MOHA0006</b>	REALIZZAZIONE LINEA FANGHI DEPURATORE DI CASTELFRANCO	Castelfranco Emilia	500.000
<b>2014MOHA0009</b>	STUDIO E COLLETTAMENTO A IDONEO TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI DI RECOVATO E RASTELLINO	Castelfranco Emilia	998.000
<b>2014MOHA0010</b>	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE CENTRALIZZATO	Castelfranco Emilia	2.023.000
<b>2014MOHA0012</b>	RINNOVO E POTENZIAMENTO DORSALE IDRICA VIA EMILIA OVEST II STRALCIO	Castelfranco Emilia	445.000
<b>2014MOHA0021</b>	NUOVO SERBATOIO BERGOGNINA	Castelvetro di Modena	453.000
<b>2014MOHA0023</b>	NUOVO POZZO SANT'EUSEBIO	Castelvetro di Modena	1.165.000
<b>2014MOHA0028</b>	REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTO APPROPRIATO AGLI AGGLOMERATI FONTANALUCCIA, PIANDELGOTTI	Frassinoro	919.000
<b>2014MOHA0029</b>	REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTO APPROPRIATO CASE CERBIANI	Frassinoro	142.000
<b>2014MOHA0030</b>	AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI GUIGLIA LAMA	Guiglia	1.428.000
<b>2014MOHA0036</b>	ADEGUAMENTO DEGLI AGGLOMERATI DI MONTECENERE NORD E DI MONTECENERE-CASA ZAGAGLIA	Lama Mocogno	1.311.000
<b>2014MOHA0048</b>	REVAMPING DEL POTABILIZZATORE DI SANTA CECILIA A SASSUOLO (MO)	Modena	5.000.000
<b>2014MOHA0053</b>	COLLETTORE ZONA VIA SASSI DA GUICCIARDINI A DON MINZONI	Modena	651.000

<b>2014MOHA0055</b>	ADEGUAMENTO NORMATIVA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA RETE MODENA	Modena	9.200.000
<b>2014MOHA0059</b>	NUOVA DORSALE DA COLLEGAROLA A MARTINIANA DA COLLEGAROLA A VACIGLIO	Modena	1.068.000
<b>2014MOHA0060</b>	REALIZZAZIONE DEL SESTO SEDIMENTATORE SECONDARIO-DEPPURATORE DI MODENA	Modena	838.000
<b>2014MOHA0067</b>	REALIZZAZIONE TRATTAMENTI APPROPRIATI AGGLOMERATI >200 AB/EQ IN LOCALITÀ: CASOLA - PIANEZZO, FARNETA CIMITERO)	Montefiorino	1.621.000
<b>2014MOHA0148</b>	REALIZZAZIONE DI COLLETTAMENTO FOGNARIO E SISTEMA DI TRATTAMENTO APPROPRIATO NEGLI AGGLOMERATI DI MONCHIO - GRANDE E DI SAVONIERO	Palagano	1.104.000
<b>2014MOHA0155</b>	VERICA: REALIZZAZIONE DI COLLETTORI E SISTEMA DI TRATTAMENTO APPROPRIATO	Pavullo nel Frignano	1.546.000
<b>2014MOHA0159</b>	REALIZZAZIONE DI COLLETTORI E SISTEMA DI TRATTAMENTO APPROPRIATO A COSCOGNO	Pavullo nel Frignano	563.000
<b>2014MOHA0160</b>	TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO II STRALCIO - ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO PIANELLI	Pavullo nel Frignano	1.098.000
<b>2014MOHA0162</b>	TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO IV STRALCIO - ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO RENNO DI SOPRA-PIANTACROCE	Pavullo nel Frignano	1.160.000
<b>2014MOHA0164</b>	REALIZZAZIONE SISTEMA DI TRATTAMENTO APPROPRIATO E OPERE DI COLLETTAMENTO NELL'AGGLOMERATO DI SANT'ANNA PELAGO	Pievepelago	1.900.000
<b>2014MOHA0170</b>	CASA AZZONI: REALIZZAZIONE SISTEMA DI TRATTAMENTO APPROPRIATO OVVERO COLLETTAMENTO ALL'AGGLOMERATO DI SASSUOLO	Prignano sulla Secchia	407.000
<b>2014MOHA0171</b>	PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO PER USO IDROPOTABILE NEL CAMPO ACQUIFERO DI SAN CESARIO S.P. IN SOSTITUZIONE	San Cesario sul Panaro	478.000

	DI UN POZZO CHE PRESENTA PROBLEMI DI NITRATI.		
<b>2014MOHA0179</b>	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA A SERVIZIO DEGLI SCOLMATORI A FORTE IMPATTO SAS1-1 E SAS1-3	Sassuolo	2.500.000
<b>2014MOHA0187</b>	COLLETTAMENTO SCARICHI DI RICCO' E SAN DALMAZIO AL DEPURATORE ESISTENTE DI SAN DALMAZIO	Serramazzoni	645.000
<b>2014MOHA0188</b>	RISANAMENTO FOGNARIO LOCALITÀ VARANA/PESCAROLA E IMPIANTO DI DEPURAZIONE	Serramazzoni	933.280
<b>2014MOHA0202</b>	NUOVA CONDOTTA COCCOLA - SANT'EUSEBIO	Spilamberto	700.000
<b>2015MOHA0019</b>	POTENZIAMENTO RETE POGGIOLROSSO	Prignano sulla Secchia	550.000
<b>2015MOHA0024</b>	NUOVO SERBATOIO GESSIERE BASSO	Vignola	1.046.000
<b>2017MOHA0002</b>	COLLETTAMENTO CASONI A PIEVEPELAGO	Pievepelago	290.000
<b>2017MOHA0009</b>	ADEGUAMENTO COSTRIGNANO-CASTELLACCIO	Palagano	814.000
<b>2017MOHA0010</b>	ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI GAGGIO	Castelfranco Emilia	590.000
<b>2017MOHA0013</b>	ELIM.ACQ.PARASSITE E RIS.CANALE COGORNO	Pavullo nel Frignano	1.380.000
<b>2017MOHA0017</b>	ADEGUAMENTO AGGLOMERATI DI MONTEOMBRARO-CAMPAZZO E MONTE CORONE-CASA NADINO	Zocca	3.519.000
<b>2017MOHA0018</b>	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO VERUCCHIA	Zocca	200.000
<b>2017MOHA0019</b>	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CA' RAME	Zocca	200.000
<b>2018MOHA0002</b>	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI VIA DOCCIA - FSC SCHEDA 21	Vignola	160.500
<b>2018MOHA0003</b>	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI SANTA MARIA ROTONDA - FSC SCHEDA 22	Vignola	260.000
<b>2018MOHA0004</b>	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI VIE VARIE - FSC SCHEDA 23	Spilamberto	947.500

<b>2018MOHA0005</b>	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI QUARTIERE FIUMI - FSC SCHEDA 24	Sassuolo	227.800
<b>2020MOHA0009</b>	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - CASTELNUOVO RANGONE	Castelnuovo Rangone	500.000
<b>2020MOHA0024</b>	DORSALE PLANO-APPENNINICA CENTRALE: NUOVO SERBATOIO CASA BARTOLACELLI	Serramazzoni	350.000
<b>2020MOHA0025</b>	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - VIGNOLA	Vignola	1.400.000
<b>2022MOHA0005</b>	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO FRAZIONE SALTO	Montese	1.000.000
<b>2022MOHA0006</b>	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO FRAZIONE MASERNO	Montese	1.000.000
<b>2022MOHA0008</b>	REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE AFFERENTE LO SCOLO COGORNO	Pavullo nel Frignano	762.000
<b>2022MOHA0013</b>	REVAMPING TRATTAMENTO BOTTINI DEPURATORE MODENA	Modena	6.000.000
<b>2022MOHA0017</b>	NUOVA DORSALE DA VACIGLIO A MARTINIANA	Modena	2.322.000
<b>2022MOHA0018</b>	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE CENTRALIZZATO DI CASTELFRANCO - STRALCIO 2	Castelfranco Emilia	3.900.000
<b>2024MOHA0002</b>	INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEI CARICHI SCOLMATORE SPILAMBERTO	Spilamberto	1.199.000
<b>2024MOHA0005</b>	RADDIOPPIO DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMARI DEL DEPURATORE DI MODENA (fattibilità)	Modena	50.000

Tab. 6 – Interventi strategici secondo la metodologia ARERA

La programmazione proposta prevede la prosecuzione di interventi già a piano e l'inserimento di nuove opere, riconoscibili dal codice ARSI che riporta l'anno di inserimento, es: 2024; nella programmazione proposta sono 48 i nuovi interventi inseriti.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione reti e impianti del servizio la proposta di programmazione è rilevante (cfr. tabella 2) e riassunta nella tabella successiva.

<b>MANUTENZIONI</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>Acquedotto</b>	13.390.000 €	11.750.000 €	12.150.000 €	12.200.000 €	12.041.150 €	12.041.150 €
<b>Fognatura</b>	1.540.000 €	1.560.000 €	1.560.000 €	1.760.000 €	1.760.000 €	1.760.000 €
<b>Depurazione</b>	1.200.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
<b>Acque bianche</b>	180.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
<b>Totale</b>	<b>16.310.000 €</b>	<b>14.760.000 €</b>	<b>15.160.000 €</b>	<b>15.410.000 €</b>	<b>15.251.150 €</b>	<b>15.251.150 €</b>

Tab. 7 – Interventi di manutenzione reti e impiant





<b>Proposta nuovo Piano Interventi 2024-2029</b>
--

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	NOTE
1	2024MOHA0004	POTENZIAMENTO DORSALE IDRICA VIA EMILIA OVEST	A	Castelfranco Emilia	POTENZIAMENTO RETE ACQUA CON POSA NUOVO TRATTO E SOSTITUZIONE DI ESISTENTE A FIANCO DI VIA EMILIA OVEST NEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). TRATTASI DI INTERVENTO IN PARTE COPERTO DA CONTRIBUTO CLIENTE. IMPORTO LAVORI 517 K EURO, MPORTO CONTRIBUTO CLIENTE 148 K EURO. NEL POI VIENE RIPORTATO L'IMPORTO PROGETTUALE PARI ALLA SOLO QUOTA A TARIFFA. QUESTO ID è STRETTAMENTE COLLEGATO ANCHE AGLI ID 2014MOHA0003 E 2014MOHA0012 CHE NE RAPPRESENTANO LA CONTINUAZIONE FINO AL COLLEGAMENTO CON LA RETE DI MODENA. INTERVENTO CON CONCLUSIONE NEL 2024.
2	2014MOHA0012	RINNOVO E POTENZIAMENTO DORSALE IDRICA VIA EMILIA OVEST II STRALCIO	A	Castelfranco Emilia	L'INTERVENTO CONSISTE NEL COMPLETAMENTO DI UNA DORSALE DI COLLEGAMENTO TRA LA RETE DI CASTELFRANCO E LA RETE DI MODENA, MEDIANTE UN TRATTO DI CONDOTTA CHE DOVRA' ATTRAVERSARE IL FIUME PANARO. QUESTO ID E' IL PROSEGUIMENTO DELL'ID 2014MOHA0003 RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE IN QUANTO INTERVENTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO
3	2022MOHA0018	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE CENTRALIZZATO DI CASTELFRANCO - STRALCIO 2	D	Castelfranco Emilia	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN FUNZIONE DELL'INTERVENTOGIA' IN ESSERE SUL DEPURATORE DI CASTELFRANCO EMILIA
4	2020MOHA0007	RISANAMENTO DEI COLLETTORI DI ATTRAVERSAMENTO DELLA FFSS MI-BO	F	Castelfranco Emilia	0
5	2022MOHA0014	ADEGUAMENTO NORMATIVO SCOLMATORI AGGLOMERATO CASTELFRANCO	F	Castelfranco Emilia	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN ATTESA DI STABILIZZAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, AL MOMENTO IN EVOLUZIONE (NUOVA DIRETTIVA ACQUE E PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE).
6	2014MOHA0010	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE CENTRALIZZATO	D	Castelfranco Emilia	IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO PER I SEGUENTI MOTIVI: - NECESSITÀ EMERSA DURANTE LO SVILUPPO DEL PROGETTO DI SOSTITUIRE TUTTE LE POMPE RELATIVE AL SOLLEVAMENTO INIZIALE - NECESSITÀ EMERSA DURANTE LO SVILUPPO DEL PROGETTO DI REALIZZARE UNA NUOVA SEZIONE RELATIVA AI PRETRATTAMENTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLA ESISTENTE VETUSTA E NON ADEGUATA - AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI INTERVENTO IN FASE DI PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO
7	2014MOHA0004	REVAMPING CAMPO POZZI VIA MUZZA CORONA	A	Castelfranco Emilia	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE ALLE MUTATE ESIGENZE DI APPROVIGIONAMENTO IMPIANTISTICO
8	2014MOHA0003	RINNOVO E POTENZIAMENTO DORSALE IDRICA VIA EMILIA OVEST I STRALCIO	A	Castelfranco Emilia	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE IN QUANTO INTERVENTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO
9	2014MOHA0006	REALIZZAZIONE LINEA FANGHI DEPURATORE DI CASTELFRANCO	D	Castelfranco Emilia	L'IMPORTO PROGETTO INDICATO RISULTA OBSELETO. TALE IMPORTO VERRA' RIDEFINITO A VALLE DI UN FUTURO STUDIO DI FATTIBILITA', ATTUALEMTE IPOTIZZATO FUORI ARCO PIANO IN QUANTO L'INTERVENTO NON RISULTA PRIORITARIO MA UTILE SUL MEDIO-LUNGO PERIODO
10	2014MOHA0009	STUDIO E COLLETTAMENTO A IDONEO TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI DI RECOVATO E RASTELLINO	F	Castelfranco Emilia	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. ID DA MANTENERE ATTIVO NEL NUOVO POI 2024-27 PER CONSENTIRE EVENTUALI CHIUSURE CONTABILI
11	2014MOHA0008	COLLETTAMENTO DI PILASTRELLO AL DEPURATORE DI GAGGIO	F	Castelfranco Emilia	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE. L'IMPORTO PROGETTO RISULTA MOLTO DATATO E VERRA' RIVALUTATO CORRETTAMENTE IN FASE DI PRPOGETTAZIONE PRELIMINARE E AGGIORNATO SUCCESSIVAMENTE A POI
12	2017MOHA0010	ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI GAGGIO	D	Castelfranco Emilia	0
13	2015MOHA0002	NUOVO COLLEGAMENTO RETI DI PORTILE -V. VIAZZA	A	Castelnuovo Rangone	0
14	2020MOHA0009	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - CASTELNUOVO RANGONE	F	Castelnuovo Rangone	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN ATTESA DI STABILIZZAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, AL MOMENTO IN EVOLUZIONE (NUOVA DIRETTIVA ACQUE E PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE).

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	NOTE
15	2014MOHA0023	NUOVO POZZO SANT'EUSEBIO	A	Castelvetro di Modena	IMPORTO PROGETTO RIDEFINITO IN RELAZIONE ALLA MODIFICA DEL PERIMETRO DI INTERVENTO; OLTRE AL REVAMPING DEL POZZO RISULTANO NECESSARIE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SIA EDILE CHE ELETTRICO DI TUTTA L'AREA INTERESSATA ALL'INTERVENTO. INTERVENTO RIPIANIFICATO IN FUNZIONE DEL CAMBIO PERIMETRO
16	2015MOHA0003	POTENZIAMENTO DORSALE BERGOGNINA -CAPOLUOGO	A	Castelvetro di Modena	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. ID DA MANTENERE NEL PIANO 2024-27 PER COMPLETAMENTO ATTIVITA' CONTABILI
17	2014MOHA0021	NUOVO SERBATOIO BERGOGNINA	A	Castelvetro di Modena	INTERVENTO RIPIANIFICATO PER NECESSITA' DI RIAFFIDARE I LAVORI A NUOVA IMPRESA
18	2015MOHA0006	NUOVO COLLEGAMENTO IMPIANTO TOMMASELLI - IMPIANTO S.GAETANO	A	Formigine	0
19	2017MOHA0004	INTERCON. FRAZ. ROMANORO A SIST.DRAGONE	A	Frassinoro	0
20	2017MOHA0003	INTERCON.FRAZ. SASSATELLA A SIST.DRAGONE	A	Frassinoro	0
21	2014MOHA0029	REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTO APPROPRIATO CASE CERBIANI	F	Frassinoro	0
22	2014MOHA0028	REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTO APPROPRIATO AGLI AGGLOMERATI FONTANALUCCIA, PIANDELGOTTI	F	Frassinoro	INTERVENTO IN ESECUZIONE
23	2014MOHA0032	COLLETTAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI MONTEORSELLO AL DEPURATORE DI SAN GEMINIANO	F	Guiglia	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. MANTENERE L'ID APERTO NEL POI 2024-27 IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI PERFEZIONARE LE SERVITU'
24	2014MOHA0030	AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI GUIGLIA LAMA	D	Guiglia	INTERVENTO IN ESECUZIONE
25	2018MOHA0001	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA VIA MICHELANGELO	F	Guiglia	INCASSO CONTRIBUTO PREVISTO NEL 2024
26	2014MOHA0036	ADEGUAMENTO DEGLI AGGLOMERATI DI MONTECENERE NORD E DI MONTECENERE-CASA ZAGAGLIA	F	Lama Mocogno	INTERVENTO IN ESECUZIONE
27	2014MOHA0035	REALIZZAZIONE TRATTAMENTO APPROPRIATO LOCALITÀ BARIGAZZO	D	Lama Mocogno	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO L' AGGLOMERATO DI BARIGAZZO E' STATO RIDEFINITO E CLASSIFICATO <200 AE (DGR 2153/2022) CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO. PERSISTONO PROBLEMATICHE DI ACQUISIZIONE DEI PERMESSI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN AREA PRIVATA
28	2017MOHA0006	NUOVO RILANCIO RETE CASA MALGARI-SANTONA	A	Lama Mocogno	INTERVENTO POSTICIPATO IN QUANTO AL MOMENTO NON SUSSISTONO CRITICITA'. ID DA MANTENERE COMUNQUE A POI IN QUANTO NECESSARIO SUL LUNGO PERIODO
29	2017MOHA0005	POTENZIAMENTO IMPIANTO TOLLE	A	Lama Mocogno	0
30	2015MOHA0009	CLASSIFICAZIONE A FINI POTABILI ACQUA PANARO	A	Marano sul Panaro	0
31	2014MOHA0041	RIFACIMENTO COLLETTORE COMUNE DI MARANO AL DEPURATORE DI VIGNOLA	F	Marano sul Panaro	0
32	2017MOHA0014	ADEGUAMENTO STRUTTURALE CANALE PRADELLA	F	Modena	INTERVENTO RELATIVO A CIRCA 500 METRI DI FOGNA DEL CENTRO DI MODENA CON PROBLEMI STRUTTURALI, SCATOLARE CHE ATTRAVERSA DIVERSE PROPRIETÀ.
33	2020MOHA0016	REVAMPING LINEA FANGHI DEPURATORE DI MODENA	D	Modena	RIVISTO IL PERIMETRO DEL PROGETTO INSERENDO LA SOSTITUZIONE DELLA CAMPANA GASOMETRICA E TORCIA E CONSEGUENTEMENTE RIAGGIORNATO IMPORTO PROGETTO DI MASSIMA
34	2020MOHA0014	CHIUSURA DEL DEPURATORE DI CITTANOVA E COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI MODENA	F	Modena	0
35	2017MOHA0001	REVAMPING IMPIANTO DI COLLEGAROLA	A	Modena	0
36	2015MOHA0010	ELIMINAZIONE ACQUE IRRIGUE DA RETE VIA D'AVIA	F	Modena	0
37	2022MOHA0016	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO MODENA - SCALO MERCI MARZAGLIA	A	Modena	IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO PER ULTERIORE ESTENSIONE DI CIRCA 200 M DELLA CONDOTTA DI PROGETTO E INCREMENTO PREZZI
38	2022MOHA0017	NUOVA DORSALE DA VACIGLIO A MARTINIANA	A	Modena	INTERVENTO COMPLESSO CHE PREVEDE ANCHE L'AUTORIZZAZIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO DELL' AUTOSTRADA A1. AGGIORNAMENTO IMPORTO COMPUTATO SULLA BASE DEL PRIMO STRALCIO GIÀ ESEGUITO E TENENDO CONTO DELL'INCREMENTO PREZZI
39	2022MOHA0015	RIPRISTINO RETE FOGNARIA AFFERENTE TORRENTE TIEPIDO	F	Modena	PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO NEL 2023 E INCASSO CONTRIBUTO. ID DA MANTENERE NEL POI 2024-27 PER COMPLETAMENTO ATTIVITA' CONTABILI
40	2014MOHA0060	REALIZZAZIONE DEL SESTO SEDIMENTATORE SECONDARIO-DEPPURATORE DI MODENA	D	Modena	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	NOTE
41	2022MOHA0013	REVAMPING TRATTAMENTO BOTTINI DEPURATORE MODENA	D	Modena	IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO PER I SEGUENTI MOTIVI: - AUMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELLA NUOVA SEZIONE DI TRATTAMENTO BOTTINI E CADITOIE IN VIRTÙ DELLA DISMISSIONE DELLA CORRISPONDENTE SEZIONE PRESSO IL DEPURATORE DI SASSUOLO - AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI
42	2014MOHA0061	STUDIO PER RICERCA ACQUE PARASSITE E SUCCESSIVI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE	F	Modena	0
43	2024MOHA0005	RADDIOPPIO DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMARI DEL DEPURATORE DI MODENA (FATTIBILITÀ)	D	Modena	0
44	2024MOHA0003	NUOVO SILOS FANGHI DEPURATORE DI MODENA	D	Modena	0
45	2024MOHA0006	DISMISSIONE DEPURATORE DI SAN DAMASO E COLLETTAMENTO A MODENA	F	Modena	0
46	2024MOHA0008	INTERFERENZE PROLUNGAMENTO TANGENZIALE MODENA - ACQUEDOTTO - C.CLIENTE	A	Modena	INTERFERENZE SULLA RETE ACQUEDOTTO PER IL PROLUNGAMENTO DELLA TANGENZIALE DI MODENA. INTERVENTO COPERTO DAL CONTRIBUTO CLIENTE ASPI AUTOSTRADE. INTERVENTO GIÀ AVVIATO NEL 2022-23
47	2024MOHA0007	INTERFERENZE PROLUNGAMENTO TANGENZIALE MODENA - FOGNATURA - C.CLIENTE	F	Modena	INTERFERENZE SULLA RETE FOGNARIA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA TANGENZIALE DI MODENA. INTERVENTO COPERTO DAL CONTRIBUTO CLIENTE ASPI AUTOSTRADE. INTERVENTO GIÀ AVVIATO NEL 2022-23
48	2014MOHA0059	NUOVA DORSALE DA COLLEGAROLA A MARTINIANA DA COLLEGAROLA A VACIGLIO	A	Modena	INTERVENTO TERMINATO
49	2014MOHA0053	COLLETTORE ZONA VIA SASSI DA GUICCIARDINI A DON MINZONI	F	Modena	0
50	2014MOHA0055	ADEGUAMENTO NORMATIVA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA RETE MODENA	F	Modena	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN ATTESA DI STABILIZZAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, AL MOMENTO IN EVOLUZIONE (NUOVA DIRETTIVA ACQUE E PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE).
51	2014MOHA0049	POTENZIAMENTO DISSABBIATORE E SISTEMA DI TRATTAMENTI PRIMARI DEL DEPURATORE DI MODENA	D	Modena	IN SEGUITO ALL' ENTRATA IN FUNZIONE DELLA GRIGLIA INSTALLATA NEL 2019, IL COMPARTO DI TRATTAMENTO DEI BOTTINI È RISULTATO SUFFICIENTEMENTE ADEGUATO E PERTANTO LA SECONDA PARTE DELL' INTERVENTO È RISULTATA AVERE MINORE PRIORITÀ ED È STATA AVVIATA LA PROGETTAZIONE A PARTIRE DAL 2022. IN BASE ALLA PROGETTAZIONE È STATO ANCHE NECESSARIO PREVEDERE LA MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DEI TRATTAMENTI PRIMARI CON AUMENTO DELL'IMPORTO PROGETTO DI 200.000 €
52	2014MOHA0048	REVAMPING DEL POTABILIZZATORE DI SANTA CECILIA A SASSUOLO (MO)	A	Modena	L'INTERVENTO DI NATURA STRATEGICA PER POTENZIARE IL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO DEL SISTEMA IDRICO MODENESE. IN CORSO STUDIO DI FATTIBILITÀ. INTERVENTO RIPIANIFICATO IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DELLE VALUTAZIONI DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ
53	2014MOHA0067	REALIZZAZIONE TRATTAMENTI APPROPRIATI AGGLOMERATI >200 AB/EQ IN LOCALITÀ: CASOLA - PIANEZZO, FARNETA CIMITERO)	F	Montefiorino	IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO PER I SEGUENTI MOTIVI: - NECESSITÀ DI REALIZZARE DUE BERLINESI IN MICROPALI A SEGUITO SI INDAGINI GEOGNOSTICHE PIÙ APPROFONDITE ESEGUITE IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - NECESSITÀ DI AUMENTARE LA POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO IN SEGUITO ALL'UNIONE DEGLI AGGLOMERATI FARNETA CIMITERO E FARNETA CASTELLO CON CONSEGUENTE REALIZZAZIONE DI NUOVA CONDOTTA DI SCARICO - AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI INTERVENTO RIPIANIFICATO PER NECESSITÀ DI MODIFICA AL TITOLO ABILITATIVO, AL MOMENTO IN FASE DI AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO PER ESECUZIONE LAVORI
54	2022MOHA0001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - MONTESE	A	Montese	ID CREATO NEL 2022 PER LE SOLE ANNUALITÀ 2022-23 PER L'INGRESSO DI MONTESE NELLA GESTIONE HERA. DAL 2024 LE ATTIVITÀ MANUTENTIVE SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO SARANNO RENDICONTATE NELL'ID ESISTENTE 2014MOHA0142
55	2022MOHA0003	RINNOVO RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO DA PRONTO INTERVENTO - MONTESE	A	Montese	ID CREATO NEL 2022 PER LE SOLE ANNUALITÀ 2022-23 PER L'INGRESSO DI MONTESE NELLA GESTIONE HERA. DAL 2024 LE ATTIVITÀ DI RINNOVO RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO SARANNO RENDICONTATE NELL'ID ESISTENTE 2014MOHA0141

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	NOTE	
56	2022MOHA0002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - MONTESE	D	Montese	ID CREATO NEL 2022 PER LE SOLE ANNUALITA' 2022-23 PER L'INGRESSO DI MONTESE NELLA GESTIONE HERA. DAL 2024 LE ATTIVITA' MANUTENTIVE SUGLI IMPIANTI DEPURAZIONE SARANNO RENDICONTATE NELL'ID ESISTENTE 2014MOHA0144	
57	2022MOHA0004	RINNOVO RETI FOGNATURA DA PRONTO INTERVENTO - MONTESE	F	Montese	ID CREATO NEL 2022 PER LE SOLE ANNUALITA' 2022-23 PER L'INGRESSO DI MONTESE NELLA GESTIONE HERA. DAL 2024 LE ATTIVITA' DI RINNOVO RETI E ALLACCI FOGNATURE SARANNO RENDICONTATE NELL'ID ESISTENTE 2014MOHA0223	
58	2022MOHA0006	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO FRAZIONE MASERNO	F	Montese	IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO PER I SEGUENTI MOTIVI: - AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI - IPOTESI DI REALIZZARE UN NUOVO IMPIANTI DI DEPURAZIONE A BIORULLI INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO SI TRATTA DI UN ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CON SCADENZA DA NUOVA DELIBERA SCARICHI IL 31/12/2027	
59	2022MOHA0005	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO FRAZIONE SALTO	F	Montese	IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO PER I SEGUENTI MOTIVI: - AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI - IPOTESI DI REALIZZARE UN NUOVO IMPIANTI DI DEPURAZIONE A BIORULLI INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO SI TRATTA DI UN ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CON SCADENZA DA NUOVA DELIBERA SCARICHI IL 31/12/2027	
60	2022MOHA0012	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 4	A	Opere Pluricomunali		0
61	2022MOHA0007	RAZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEI SERBATOI PER LA REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE IN RETE IN AREE DI MONTAGNA - ATO 4	A	Opere Pluricomunali		0
62	2020MOHA0030	ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTISTICO DEL FIUME SCOLTENNA IN LOCALITÀ STRETTARA E CONSOLIDAMENTO ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO	A	Opere Pluricomunali	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO NEL 2022, PREVISTA ULTIMAZIONE INCASSO CONTRIBUTO NEL 2023. MANTENERE L'ID ANCHE NEL PIANO 2024-27	
63	2020MOHA0017	SISTEMI DI MONITORAGGIO QUALITA' SCARICHI IN RETE FOGNARIA E RELATIVI INTERVENTI	F	Opere Pluricomunali	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA NEL CORSO DEL 2023.	
64	2022MOHA0011	ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO4	A	Opere Pluricomunali	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E IL RECUPERO DELLE AREE PENSILI. GLI IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE.	
65	2022MOHA0010	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 4	A	Opere Pluricomunali		0
66	2022MOHA0009	RILIEVO RETI FOGNARIE MO - ATO 4	F	Opere Pluricomunali		0
67	2020MOHA0001	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - ATO 4 MO	F	Opere Pluricomunali		0
68	2018MOHA0007	INVESTIMENTI STRUTTURA - TICSÌ E TIBSI	ST	Opere Pluricomunali		0
69	2018MOHA0006	INVESTIMENTI STRUTTURA	ST	Opere Pluricomunali		0
70	2020MOHA0006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA - ATO 4 MO	AD	Opere Pluricomunali		0
71	2020MOHA0005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE STRADALI - ATO 4 MO	AD	Opere Pluricomunali		0
72	2020MOHA0002	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIANTI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - ATO 4 MO	A	Opere Pluricomunali		0
73	2014MOHA0143	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-MO-ATO4	A	Opere Pluricomunali		0
74	2014MOHA0142	RINNOVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOI, CENTRALI, INVASI, IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E CAPTAZIONI (POZZI E SORGENTI)	A	Opere Pluricomunali		0
75	2014MOHA0141	RINNOVO RETI, ALLACCI E CONTATORI DA PRONTO INTERVENTO	A	Opere Pluricomunali		0
76	2014MOHA0144	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - MO - ATO 4	D	Opere Pluricomunali		0
77	2014MOHA0147	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI FOGNATURA	F	Opere Pluricomunali		0
78	2014MOHA0146	MANUTENZIONI STRAORDINARIE RETI E ALLACCI DI FOGNATURA	F	Opere Pluricomunali		0
79	2014MOHA0145	ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - MO - ATO 4	D	Opere Pluricomunali		0
80	2014MOHA0073	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI TELECOMANDO E TELECONTROLLO SII	A	Opere Pluricomunali		0
81	2014MOHA0140	RINNOVO PROGRAMMATO DELLE RETI	A	Opere Pluricomunali		0
82	2014MOHA0086	INTERVENTI DI RIPRISTINO/PAVIMENTAZIONI STRADALI A SEGUITO DI INTERVENTI MANUTENTIVI RETI IDRICHE.	A	Opere Pluricomunali		0

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	NOTE
83	2024MOHA0009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA FANGHI IMPIANTI DEPURAZIONE - MO - ATO 4	D	Opere Pluricomunali	NUOVO ID CUMULATIVO SCORPORATO DA ID 2014MOHA0144 PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI SULLA LINEA FANGHI
84	2014MOHA0119	RIPRISTINO ASFALTI PER OPERE DI FOGNATURA	F	Opere Pluricomunali	0
85	2015MOHA0011	VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPI. ACQUEDOTTO MO-ATO 4	A	Opere Pluricomunali	ID SPECIFICO SOSTITUITO DA ID CUMULATIVO 2022MOHA0011. QUESTO ID E' COMUNQUE DA MANTENERE ANCHE NEL NUOVO PIANO 2024-27 PER CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RECUPERO IN CORSO E NON TRASFERITI SUL NUOVO ID CUMULATIVO (IN QUANTO AVVIATI ANTE CREAZIONE DEL NUOVO ID CUMULATIVO)
86	2014MOHA0223	RINN. RETI/ALL.FOG. DA PI -MO-ATO 4	F	Opere pluricomunali	0
87	2014MOHA0218	SOST. CTR PARI CALIBRO - MO - ATO4	A	Opere pluricomunali	0
88	2015MOHA0014	TELECONTROLLO E AUTOM.IMP.FOGNA-MO-ATO4	F	Opere pluricomunali	0
89	2015MOHA0013	TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.DEP.-MO-ATO4	D	Opere pluricomunali	0
90	2014MOHA0148	REALIZZAZIONE DI COLLETTAMENTO FOGNARIO E SISTEMA DI TRATTAMENTO APPROPRIATO NEGLI AGGLOMERATI DI MONCHIO - GRANDE E DI SAVONIERO	F	Palagano	INTERVENTO IN ESECUZIONE
91	2017MOHA0009	ADEGUAMENTO COSTRIGNANO-CASTELLACCIO	D	Palagano	INTERVENTO IN ESECUZIONE
92	2022MOHA0019	RISANAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TOGGIANO E VIA XVIII MARZO	F	Palagano	PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO NEL 2023 E INCASSO CONTRIBUTO. ID DA MANTENERE NEL POI 2024-27 PER COMPLETAMENTO ATTIVITA' CONTABILI
93	2014MOHA0160	TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO II STRALCIO - ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO PIANELLI	F	Pavullo nel Frignano	IL QUADRO ECONOMICO DEL "VECCHIO POI" FACEVA RIFERIMENTO A VALUTAZIONI ECONOMICHE RISALENTI AL PERIODO 2016-2017. IL QE È STATO AGGIORNATO CON GLI IMPORTI NECESSARI A FAR FRONTE AGLI INCREMENTI LEGATI ALL'UTILIZZO DELL'EPU AGGIORNATO SULLA BASE DI ANALISI ATTUALIZZATE E, OVE PRESENTI, PREZZI UNITARI BASATI SU PREZZIARI PUBBLICI VIGENTI (COMUNICAZIONE GIÀ INVIATA IN SEDE DI RICHIESTA DI APPROVAZIONE PROGETTO). SLITTAMENTO DELLE ATTIVITÀ A CAUSA DELL'ALLUNGAMENTO DEI TEMPI LEGATI ALLA PROCEDURA AUTORIZZATIVA (MANCATO RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO DA PARTE DEL COMUNE E CONSEGUENTE NECESSITÀ DI RICHIESTA AD ATERSIR DI CONFERENZA DEI SERVIZI). RIPIANIFICAZIONE RECEPITA DA DGR 2201/2023
94	2014MOHA0161	SISTEMAZIONE LAGHI DI ACCUMULO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE SCOLTENNA	A	Pavullo nel Frignano	0
95	2022MOHA0008	REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE AFFERENTE LO SCOLO COGORNO	F	Pavullo nel Frignano	INTERVENTO RIPIANIFICATO FUORI PIANO IN ATTESA DI DIFINIZIONE DELLE COMPETENZE CIRCA IL FINANZIAMENTO DELL'OPERA
96	2014MOHA0162	TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO IV STRALCIO - ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO RENNO DI SOPRA-PIANTACROCE	F	Pavullo nel Frignano	IL QUADRO ECONOMICO DEL "VECCHIO POI" FACEVA RIFERIMENTO A VALUTAZIONI ECONOMICHE RISALENTI AL PERIODO 2016-2017. IL QE È STATO AGGIORNATO CON GLI IMPORTI NECESSARI A FAR FRONTE AGLI INCREMENTI LEGATI ALL'UTILIZZO DELL'EPU AGGIORNATO SULLA BASE DI ANALISI ATTUALIZZATE E, OVE PRESENTI, PREZZI UNITARI BASATI SU PREZZIARI PUBBLICI VIGENTI (COMUNICAZIONE GIÀ INVIATA IN SEDE DI RICHIESTA DI APPROVAZIONE PROGETTO). SLITTAMENTO DELLE ATTIVITÀ A CAUSA DELL'ALLUNGAMENTO DEI TEMPI LEGATI ALLA PROCEDURA AUTORIZZATIVA (MANCATO RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO DA PARTE DEL COMUNE E CONSEGUENTE NECESSITÀ DI RICHIESTA AD ATERSIR DI CONFERENZA DEI SERVIZI). RIPIANIFICAZIONE RECEPITA DA DGR 2201/2023
97	2015MOHA0015	POTENZIAMENTO RETE PAVULLO CENTRO	A	Pavullo nel Frignano	INTERVENTO DIVISO IN 2 STRALCI. IL PRIMO TRATTO E' STATO REALIZZATO. IL SECONDO TRATTO E' PREVISTO PER IL 2023. MANTENERE L'ID ANCHE NEL PIANO 2024-27
98	2017MOHA0013	ELIM.ACQ.PARASSITE E RIS.CANALE COGORNO	F	Pavullo nel Frignano	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE
99	2014MOHA0159	REALIZZAZIONE DI COLLETTORI E SISTEMA DI TRATTAMENTO APPROPRIATO A COSCOGNO	F	Pavullo nel Frignano	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE. L'IMPORTO PROGETTO RISULTA MOLTO DATATO E VERRA' RIVALUTATO CORRETTAMENTE IN FASE DI PRPOGETTAZIONE PRELIMINARE E AGGIORNATO SUCCESSIVAMENTE A POI
100	2014MOHA0155	VERICA: REALIZZAZIONE DI COLLETTORI E SISTEMA DI TRATTAMENTO APPROPRIATO	D	Pavullo nel Frignano	INTERVENTO IN ESECUZIONE

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	NOTE
101	2017MOHA0002	COLLETTAMENTO CASONI A PIEVEPELAGO	F	Pievepelago	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA NEL 2023. MANTENERE ID APERTO NEL POI 2024-27 PER COMPLETAMENTO ATTIVITA' CONTABILI
102	2014MOHA0164	REALIZZAZIONE SISTEMA DI TRATTAMENTO APPROPRIATO E OPERE DI COLLETTAMENTO NELL'AGGLOMERATO DI SANT'ANNA PELAGO	F	Pievepelago	NON SI PREVEDE PIU' IL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA PARTE DEL COMUNE. TUTTO L'INTERVENTO SARA' FINANZIATO DALLA TARIFFA
103	2017MOHA0007	NUOVO SERBATOIO PERSELLO	A	Pievepelago	INTERVENTO DI REVAMPING DEL SERBATOIO ESISTENTE. INTERVENTO AD OGGI NON PRIORITARIO E RIPIANIFICATO IN RELAZIONE ALLE MUTATE ESIGENZE GESTIONALI DEL SERVIZIO
104	2015MOHA0019	POTENZIAMENTO RETE POGGIOLROSSO	A	Prignano sulla Secchia	INTERVENTO ANTICIPATO TUTTO NEL 2023 IN QUANTO FUNZIONALE ALL'EMERGENZA IDRCIA. IMPORTO PROGETTO RIAGGIORNATO IN RELAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO DI INTERVENTO.
105	2014MOHA0170	CASA AZZONI: REALIZZAZIONE SISTEMA DI TRATTAMENTO APPROPRIATO OVVERO COLLETTAMENTO ALL'AGGLOMERATO DI SASSUOLO	F	Prignano sulla Secchia	RIPIANIFICAZIONE PER VALUTAZIONE NUOVA SOLUZIONE PROGETTUALE, PER LA QUALE SARÀ NECESSARIO NUOVO ITER AUTORIZZATIVO. LA NUOVA SOLUZIONE PROGETTUALE PREVEDERÀ IL COLLETTAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI CASA AZZONI ALL'AGGLOMERATO DI SASSUOLO (CON POSSIBILITÀ DI FUTURO COLLETTAMENTO DELLA LOCALITÀ LA FREDDA) IN LUOGO DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE SECCHIA. SOLUZIONE PROGETTUALE A FAVORE DI MAGGIORE SICUREZZA ALLA LUCE DEGLI EVENTI METEORICI E ALLUVIONALI CHE HANNO IMPATTATO IL TORRENTE SECCHIA NEL 2023
106	2014MOHA0171	PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO PER USO IDROPOTABILE NEL CAMPO ACQUIFERO DI SAN CESARIO S.P. IN SOSTITUZIONE DI UN POZZO CHE PRESENTA PROBLEMI DI NITRATI.	A	San Cesario sul Panaro	0
107	2014MOHA0179	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA A SERVIZIO DEGLI SCOLMATORI A FORTE IMPATTO SAS1-1 E SAS1-3	F	Sassuolo	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN ATTESA DI STABILIZZAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, AL MOMENTO IN EVOLUZIONE (NUOVA DIRETTIVA ACQUE E PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE).
108	2014MOHA0178	CLASSIFICAZIONE POTABILE ACQUA SECCHIA	A	Sassuolo	0
109	2015MOHA0022	POTENZIAMENTO RETE VALLEURBANA-VIA MURAGLIE	A	Sassuolo	0
110	2020MOHA0020	REVAMPING LINEA FANGHI DEPURATORE DI SASSUOLO	D	Sassuolo	0
111	2014MOHA0180	REVAMPING IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI SANTA CECILIA	A	Sassuolo	PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO NEL 2023. ID DA MANTENERE NEL POI 2024-27 PER COMPLETAMENTO ATTIVITA' CONTABILI
112	2018MOHA0005	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI QUARTIERE FIUMI - FSC SCHEDA 24	A	Sassuolo	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. INCASSO CONTRIBUTO PREVISTO NEL 2024
113	2020MOHA0022	ESTENSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUEDOTTO NELLE VIE GANDHI E MANELLE NEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	A	Savignano sul Panaro	0
114	2014MOHA0184	REALIZZAZIONE NUOVO POMPAGGIO VIA SICILIA PER ALIMENTARE VIGNOLA	A	Savignano sul Panaro	ULTIMAZIONE INTERVENTO PREVISTA PER IL 2023. MANTENERE L'ID ANCHE NEL PIANO 2024-27
115	2017MOHA0015	NUOVO IMP. SOLLEVAMENTO MONTARDONE	A	Serramazzoni	0
116	2014MOHA0188	RISANAMENTO FOGNARIO LOCALITÀ VARANA/PESCAROLA E IMPIANTO DI DEPURAZIONE	D	Serramazzoni	INTERVENTO IN ESECUZIONE
117	2020MOHA0024	DORSALE PLANO-APPENNINICA CENTRALE: NUOVO SERBATOIO CASA BARTOLACELLI	A	Serramazzoni	0
118	2014MOHA0189	COLLETTAMENTO DELLO SCARICO NON TRATTATO DI POMPEANO NORD ALLA FOSSA IMHOFF DI POMPEANO SUD E POTENZIAMENTO DELLA IMHOFF	F	Serramazzoni	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE. L'IMPORTO PROGETTO RISULTA MOLTO DATATO E VERRA' RIVALUTATO CORRETTAMENTE IN FASE DI PRPOGETTAZIONE PRELIMINARE E AGGIORNATO SUCCESSIVAMENTE A POI
119	2014MOHA0190	REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTO APPROPRIATO NELL'AGGLOMERATO DI LA BARBONA	F	Serramazzoni	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE. L'IMPORTO PROGETTO RISULTA MOLTO DATATO E VERRA' RIVALUTATO CORRETTAMENTE IN FASE DI PRPOGETTAZIONE PRELIMINARE E AGGIORNATO SUCCESSIVAMENTE A POI
120	2014MOHA0187	COLLETTAMENTO SCARICHI DI RICCO' E SAN DALMAZIO AL DEPURATORE ESISTENTE DI SAN DALMAZIO	D	Serramazzoni	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. MANTENERE L'ID APERTO NEL POI 2024-27 IN RALAZIONE ALLA NECESSITA' DI PERFEZIONARE LE SERVITU'
121	2014MOHA0205	REALIZZAZIONE NUOVO POMPAGGIO COCCOLA PER SANT'EUSEBIO	A	Spilamberto	INTERVENTO PREVISTO PER IL 2023. TALE INTERVENTO RISULTA COLLEGATO ALL' ID 2014MOHA0202 E PERTANTO VERRA' REALIZZATO CONGRUENTEMENTE CON LA CONCLUSIONE DELL' INTERVENTO CHE RIGUARDA LE CONDOTTE IN OGGETTO
122	2024MOHA0002	INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEI CARICHI SCOLMATORE SPILAMBERTO	F	Spilamberto	0

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	NOTE
123	2014MOHA0204	STUDIO PER RICERCA ACQUE PARASSITE E SUCCESSIVI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE	F	Spilamberto	IMPORTO PROGETTO SOLO RELATIVO A FUTURO STUDIO DI FATTIBILITA' PREVISTO IN CODA AL PIANO
124	2014MOHA0202	NUOVA CONDOTTA COCCOLA - SANT'EUSEBIO	A	Spilamberto	PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO A FINE 2023/INIZIO 2024
125	2014MOHA0198	SVILUPPO NUOVO CAMPO ACQUIFERO CASTELLARO NORD	A	Spilamberto	0
126	2018MOHA0004	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI VIE VARIE - FSC SCHEDA 23	A	Spilamberto	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. INCASSO CONTRIBUTO PREVISTO NEL 2024
127	2015MOHA0024	NUOVO SERBATOIO GESSIERE BASSO	A	Vignola	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO
128	2020MOHA0025	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - VIGNOLA	F	Vignola	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN ATTESA DI STABILIZZAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, AL MOMENTO IN EVOLUZIONE (NUOVA DIRETTIVA ACQUE E PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE).
129	2018MOHA0002	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI VIA DOCCIA - FSC SCHEDA 21	A	Vignola	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA, PRESISTA ULTIMAZIONE FINE 2023-INIZIO 2024. INCASSO CONTRIBUTO PREVISTO NEL 2024
130	2018MOHA0003	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI SANTA MARIA ROTONDA - FSC SCHEDA 22	A	Vignola	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. INCASSO CONTRIBUTO PREVISTO NEL 2024
131	2014MOHA0213	REALIZZAZIONE SERBATOIO DI ACCUMULO NELLA CENTRALE DI FOGAZZARO	A	Vignola	RIVALUTATA STIMA IMPORTO PROGETTO SULLA BASE DELL'ATTUALE INCREMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI. INTERVENTO INOLTRE RIPIANIFICATO PER RENDERLO COERENTE CON I NUOVI ASSETTI ACQUEDOTTISITICI, IN RELAZIONE ANCHE ALL' ID 2015MOHA0024 - NUOVO SERBATOIO GESSIERE BASSO
132	2017MOHA0017	ADEGUAMENTO AGGLOMERATI DI MONTEOMBRARO-CAMPAZZO E MONTE CORONE-CASA NADINO	F	Zocca	IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO LEGATO PREVALENTEMENTE A INCREMENTO PREZZI UNITARI DELLE MATERIE PRIME E MODIFICA DI ALCUNE SCELTE PROGETTUALI. SLITTAMENTO DELLE ATTIVITÀ A CAUSA DELLE PRESCRIZIONI RICHIESTE IN CONFERENZA DEI SERVIZI (ATTUALMENTE IN CORSO). RIPIANIFICAZIONE RECEPITA DA DGR 2201/2023
133	2017MOHA0019	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CA' RAME	D	Zocca	INTERVENTI REALIZZATI NEL 2022-23 CON COMPLETAMENTO NEL 2024
134	2024MOHA0001	ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI M.CORONE CASA NADINO II STR	F	Zocca	INTERVENTO RELATIVO AL SECONDO STRALCIO DELL' ID 2017MOHA0017
135	2017MOHA0018	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO VERUCCHIA	D	Zocca	ID STRETTAMENTE COLLEGATO ALL'ID 2017MOHA0019 IN QUANTO REALIZZATI CONGIUNTAMENTE. INTERVENTI REALIZZATI NEL 2022-23

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore  
F.to Giacomo Vincenzi

Il segretario verbalizzante  
F.to Marialuisa Campani

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore  
F.to Vito Belladonna

Bologna, 31 maggio 2024
