

CLFE/2017/11 del 13 dicembre 2017

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Gestore CADF S.p.A. approvazione del consuntivo 2015.

IL COORDINATORE
F.to Andrea Marchi

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

CLFE/2017/11

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 10,30 presso la Sala Sala Torre San Paolo della Provincia di Ferrara, si è riunito il Consiglio Locale di Ferrara convocato con lettere PG/AT/2017/7944 del 7/12/2017.

Risultano presenti all'appello:

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI FERRARA			NO	10,0000
COMUNE DI ARGENTA	Marco Chiarini	Assessore delegato	SI	5.4468
COMUNE DI BERRA			NO	1.5574
COMUNE DI BONDENO	Marco Vincenzi	Assessore delegato	SI	3.8388
COMUNE DI CENTO			NO	8.3318
COMUNE DI CODIGORO			NO	3.2139
COMUNE DI COMACCHIO	Denis Fantinuoli	Assessore delegato	SI	5.5648
COMUNE DI COPPARO			NO	4.2744
COMUNE DI FERRARA	Caterina Ferri	Assessore delegato	SI	30.7476
COMUNE DI FISCAGLIA			NO	2.5563
COMUNE DI FORMIGNANA	Marco Ferrari	Assessore delegato	SI	1.0173
COMUNE DI GORO			NO	1.2675
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA			NO	1.0631
COMUNE DI LAGOSANTO			NO	1.5097
COMUNE DI MASI TORELLO			NO	0.9176
COMUNE DI MESOLA	Gianni Michele Padovan	Assessore delegato	SI	2.0111
COMUNE DI OSTELLATO	Andrea Marchi	Sindaco	SI	1.8537
COMUNE DI POGGIO RENATICO	Daniele Garuti	Sindaco	SI	2.5918
COMUNE DI PORTOMAGGIORE			NO	3.1672
COMUNE DI RO			NO	1.1422
COMUNE DI TERRE DEL RENO			NO	3.1723
COMUNE DI TRESIGALLO			NO	1.4202
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	Alessandro Berselli	Assessore delegato	SI	2.0778
COMUNE DI VOGHIERA	Chiara Cavicchi	Sindaco	SI	1.2565

Presenti n. 10	pari a quote	56,41
Assenti n. 14	pari a quote	43,59

Riconosciuta la validità della seduta Andrea Marchi, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Gestore CADF S.p.A. approvazione del consuntivo 2015.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio d'Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
- l'art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

considerato che:

- con deliberazione n.5 del 16 dicembre 2015 del Consiglio locale di Ferrara è stato approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore CADF S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 44 del 26 luglio 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Ferrara, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale ultima deliberazione inoltre dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore CADF S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2015 attraverso il software ARSI;

rilevato che:

- durante il 2015 non è stato proposto alcun nuovo intervento che necessiti di ratifica da parte del Consiglio locale ai sensi della delibera CAMB 75/2017;
- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell'anno 2015 risultano essere inferiori di 1.149.656 euro rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 vigente;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che le motivazioni fornite dal gestore in merito agli scostamenti segnalati sono risultate ammissibili;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto pertanto:

- di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2015 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto,

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 23 (quote 68,37), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2015 per il gestore CADF S.p.A. per il bacino tariffario di Ferrara come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2015
Gestore: CADF s.p.a.**

20 luglio 2017

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2015

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2015, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Ferrara n.5 del 16 Dicembre 2015, che il gestore CADF ha trasmesso tramite il portale di rendicontazione denominato ARSI.

PIANIFICATO 2015		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2015	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 4.413.700	-€1.149.656	€ 3.264.044	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 0	€ 0	€ 0	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 4.413.700	-€1.149.656	€ 3.264.044	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2015

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore CADF in termini economici abbia effettuato nel corso del 2015 investimenti inferiori rispetto a quanto era stato preventivato per un importo di € 1.149.656; come si vedrà meglio in seguito quasi la metà di tale importo è data dal mancato avvio di 4 interventi pianificati (cfr. Tab. 2).

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

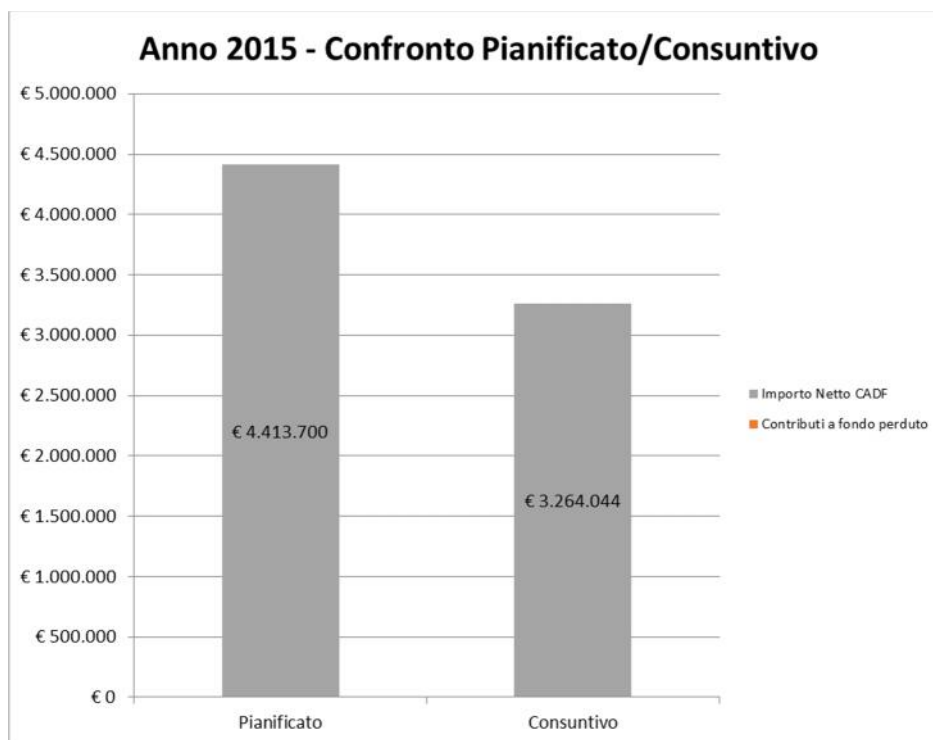


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2015

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato. Si segnala che il gestore CADF in merito agli scostamenti ai sensi della Delibera del Consiglio d'Ambito n.70/2014 ha fornito tutte le giustificazioni e sono state ritenute tutte esaurienti.

Numero di interventi programmati nel 2015: 17

Numero di interventi rendicontati nel 2015: 18

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2015	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2015	Interventi con nota giustificativa NON esaurienti	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	4	€ 0	€ 558.000			
Interventi con avvio anticipato nel 2015 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	5	€ 58.140	€ 0			
Interventi avviati nel 2015 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0			
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	10	€ 1.692.506	€ 2.503.700			
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	3	€ 1.513.398	€ 1.352.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che gli interventi non avviati, per il cui dettaglio si veda la Tabella 3, sono stati 4 per un importo complessivo pari a € 558.000 e che inoltre rispetto ai 18 interventi totali per i quali è stata presentata

la rendicontazione, per il 55% di essi lo scostamento tra quanto preventivato e quanto rendicontato è stato superiore al + o - 20% e che nel complesso quanto rendicontato per tali interventi (€ 1.692.506) è molto inferiore di ciò che era stato preventivato (€ 2.503.700).

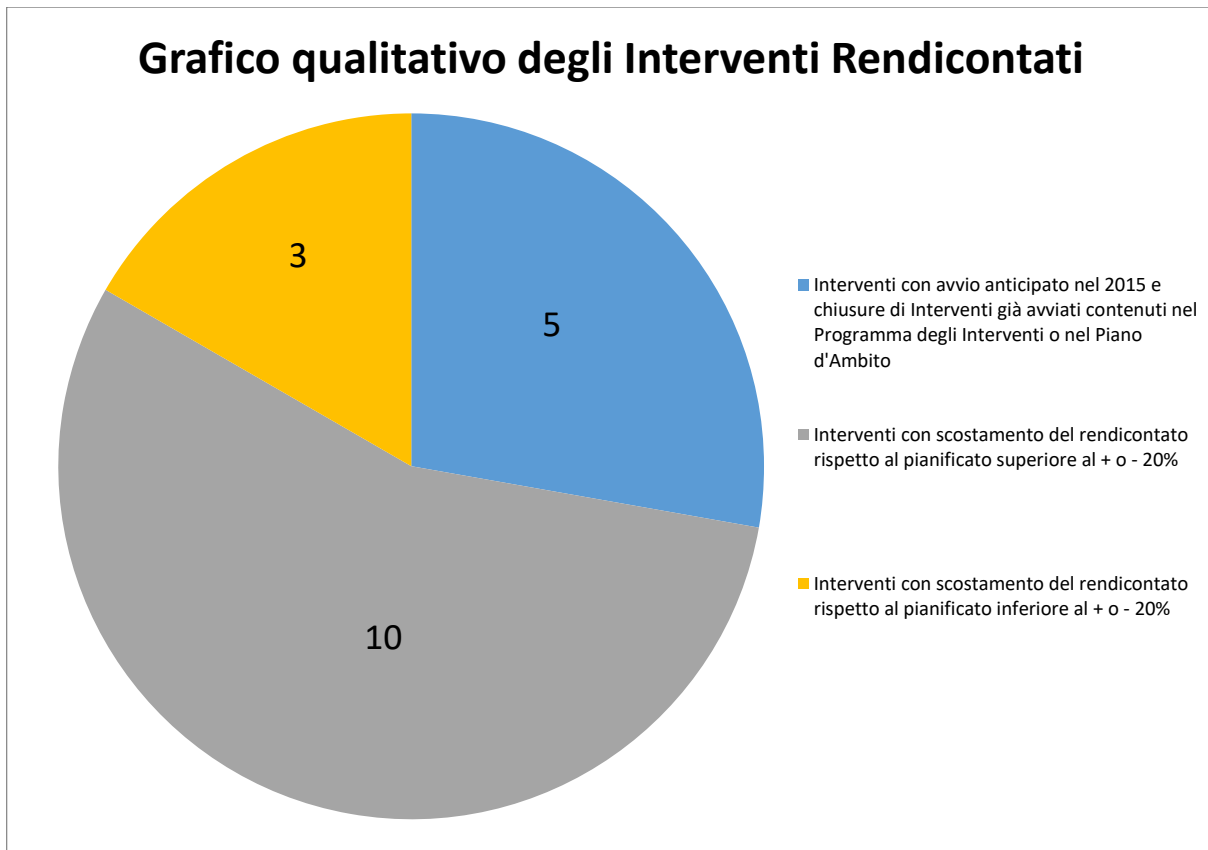


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2015 da Piano approvato
2015FECEF0015	Sostituzione m. 1200 condotta idrica via De Bernardi e via Bonaglia 5° traversa	ACQUEDOTTO	Jolanda di Savoia;	148.000
2014FECEF0017	Potenziamento depuratore di Ambrogio-Via Bonfieni ai sensi del p.to 7 - tab. 3 del D.G.R. 1053/03	DEPURAZIONE	Copparo;	130.000
2015FECEF0012	Costruzione condotte di sfioro acque bianche - Canali Naviglio e Brusabò	FOGNATURA	Copparo;	150.000
2014FECEF0018	Potenziamento depuratore di Ambrogio-Via Vallazza ai sensi del p.to 7 - tab. 3 del D.G.R. 1053/04	DEPURAZIONE	Copparo;	130.000
			TOTALE	558.000

TAB.3 Interventi previsti nel 2015 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto al preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014FEFC0001	Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie nella centrale di potabilizzazione di Serravalle	ACQUEDOTTO	Berra;	Gestore	788.967,00	140.000,00		140.000,00	125.609,66		125.609,66	-10%	
2015FEFC0001	Serravalle: revisione rete scolante del Consorzio di Bonifica, parte CADF fornitura e posa scatolare	FOGNATURA	Berra;	Gestore	307.000,00				23.672,61		23.672,61	100%	A seguito di eventi meteorici di particolare intensità, che hanno provocato forti disagi ai residenti, è stato concretizzato un accordo inter-enti sulle soluzioni tecniche di mitigazione e sul finanziamento di opere che ha reso possibile l'avvio della progettazione e sono stati sostenuti i primi costi di sondaggio e consulenza tecnica per poter programmare l'esecuzione delle opere nelle successive annualità.
2014FEFC0022	Impianto sperimentale; recupero vecchia stazione presso depuratore Codigoro	DEPURAZIONE	Codigoro;	Gestore	80.000,00				5.136,66		5.136,66	100%	Sono state anticipate nel 2015 alcune modeste spese di progettazione ed analisi materiali nelle strutture di cui era stato ipotizzato il riuso, che devono intendersi propedeutiche al progetto esecutivo e realizzazione dell'intervento nelle successive annualità
2015FEFC0003	Ricostruzione condotta di via Pambianco	FOGNATURA	Codigoro;	Gestore	100.000,00				0		0,00		
2015FEFC0002	Riparazione DN 600 sotto S.P. Granlinea a Corte Schiavina	ACQUEDOTTO	Codigoro;	Gestore	180.000,00				0		0,00		
2014FEFC0015	Comacchio-Lido degli Scacchi, via Plutone, rifacimento di condotta fognaria (cofinanziamento con Comune)	FOGNATURA	Comacchio;	Gestore	100.000,00				0		0,00		
2015FEFC0011	Depuratore di Comacchio: realizzazione scolmatore di prima pioggia nel canale collettore Adige	DEPURAZIONE	Comacchio;	Gestore	335.000,00	145.000,00		145.000,00	17.483,29		17.483,29	-88%	L'intervento, previsto nel 2015, era contenuto in un "pacchetto" di opere finalizzate alla tutela della balneabilità della costa, problematica complessa per la quale è stato creato un tavolo di consultazione inter-enti che, prima di tracciare le linee definitive di intervento, ha sviluppato varie analisi e valutazioni di tipo idraulico ed ambientale che hanno causato il protrarsi degli iter approvativi. Nel 2015 è stato possibile effettuare solamente valutazioni tecniche e sviluppi progettuali che poi sono stati completati nel 2016. A sua volta il progetto in questione è stato inserito, come tutto il programma di intervento per la difesa idraulica del Comparto Lidi Nord, in unica AIA da approvare in Conferenza di Servizi Provinciale, riguardante il sistema fognario-depurativo del Comune di Comacchio che, essendo co-finanziato da vari enti (Regione, Provincia e Comune), ha subito ulteriori ritardi degli iter approvativi.
2015FEFC0008	Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - Intervento S3 Loc. Lido Pomposa	DEPURAZIONE	Comacchio;	Gestore	770.000,00	30.000,00		30.000,00	21.418,41		21.418,41	-29%	L'intervento è soggetto allo stesso iter approvativo descritto per l'intervento 2015FEFC0011. Nel 2015 la risorsa prevista era destinata ai costi di progetto ma è stato possibile sviluppare solo una parte a causa dei tempi dell'iter.
2015FEFC0005	Porto Garibaldi: sostituzione tronco di condotta DN 700 in acciaio inox ancorato al ponte della S.S. Romea sul Canale Navigabile	FOGNATURA	Comacchio;	Gestore	200.000,00				0		0,00		
2014FEFC0011	Comacchio-Lido Pomposa, via Marfisa d'Este, sostituzione condotta m 650	ACQUEDOTTO	Comacchio;	Gestore	190.000,00				0		0,00		
2014FEFC0004	Ristrutturazione del pensile di Comacchio	ACQUEDOTTO	Comacchio;	Gestore	250.000,00				0		0,00		
2015FEFC0010	Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - Intervento S5 Loc. Porto Garibaldi Nord	DEPURAZIONE	Comacchio;	Gestore	1.770.000,00				0		0,00		
2015FEFC0006	Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - Intervento S1 Lido Nazioni - Via Nazioni Unite	DEPURAZIONE	Comacchio;	Gestore	1.200.000,00	60.000,00		60.000,00	40.677,85		40.677,85	-32%	L'intervento è soggetto allo stesso iter approvativo descritto per l'intervento 2015FEFC0011. Nel 2015 la risorsa prevista era destinata ai costi di progetto ma è stato possibile sviluppare solo una parte a causa dei tempi dell'iter.
2015FEFC0009	Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - Intervento S4 Loc. San Giuseppe	DEPURAZIONE	Comacchio;	Gestore	950.000,00				0		0,00		
2015FEFC0007	Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nor	DEPURAZIONE	Comacchio;	Gestore	1.650.000,00				0		0,00		
2015FEFC0004	Volania via Valmana - sostituzione DN 60 in c.am. Con PVC DE 75 ml 3.000	ACQUEDOTTO	Comacchio;	Gestore	110.000,00						0,00		
2014FEFC0017	Potenziamento depuratore di Ambrogio-Via Bonfieni ai sensi del p.to 7 - tab. 3 del D.G.R. 1053/03	DEPURAZIONE	Copparo;	Gestore	252.500,00	130.000,00		130.000,00	0	0	0,00	-100%	Il potenziamento dell'impianto di depurazione di via Bonfieni si rende necessario per un modesto supero di abitanti equivalenti rispetto alle attuali capacità d'impianto. Con riferimento al p.to 7 - tab. 3 del D.G.R. 1053/04, la progettazione dell'intervento deve essere completata entro il 2018 e l'esecuzione dei lavori di adeguamento impiantistico devono essere effettuati entro il 2021. L'intervento è stato riprogrammato in riferimento a tali date per dare priorità di assegnazione risorse a progettazioni più urgenti.

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto al preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2015FEFC0012	Costruzione condotte di sfioro acque bianche - Canali Naviglio e Brusabò	FOGNATURA	Copparo;	Gestore	350.000,00	150.000,00		150.000,00	0	0	0,00	-100%	L'intervento è stato differito perché la complessità della rete scolante di Copparo ha suggerito l'opportunità di attendere l'acquisizione di un modello di simulazione numerica, completato di recente. A seguire si provvederà a riprogrammare gli interventi in questione.
2014FEFC0018	Potenziamento depuratore di Ambrogio-Via Vallazza ai sensi del p.to 7 - tab. 3 del D.G.R. 1053/04	DEPURAZIONE	Copparo;	Gestore	252.500,00	130.000,00		130.000,00	0	0	0,00	-100%	Il potenziamento dell'impianto di depurazione di via Vallazza si rende necessario per un modesto supero di abitanti equivalenti rispetto alle attuali capacità d'impianto. Con riferimento al p.to 7 - tab. 3 del D.G.R. 1053/04, la progettazione dell'intervento deve essere completata entro il 2018 e l'esecuzione dei lavori di adeguamento impiantistico devono essere effettuati entro il 2021. L'intervento è stato riprogrammato in riferimento a tali date per dare priorità di assegnazione risorse a progettazioni più urgenti.
2014FEFC0008	Sostituzione ml 1.500 acquedotto Copparo-Ambrogio	ACQUEDOTTO	Copparo;	Gestore	2.288,00				2.902,32		2.902,32	100%	Trattasi di una modestissima ricaduta di spese relativa ad un intervento che avrebbe dovuto chiudersi completamente nel 2014. In questo senso si è generata nel 2015 una spesa non prevista.
2014FEFC0009	Formignana, via Prov.le Copparo-Migliarino, sostituzione condotta	ACQUEDOTTO	Formignana;	Gestore	288.000,00	148.000,00		148.000,00	4.499,74		4.499,74	-97%	L'intervento riguarda la sostituzione di una condotta idrica obsoleta. La decisione di inserire in programma di investimento la sostituzione di una condotta è in funzione di vari fattori per la misura della priorità: frequenza e gravità di guasto, estensione del territorio servito e numero di utenti coinvolti. L'evoluzione della situazione può essere soggetta ad imprevedibilità e modifiche. Durante il 2015 si è ritenuto in base a ciò di differire l'intervento, che pure è rimasto programmato per successive annualità, tanto che alla data attuale risulta eseguito. In particolare secondo questa logica nel 2015 sono stati realizzati una quantità maggiore di microinterventi contenuti nel centro di costo a cod. 2014FEFC0006 (+27%) e sono stati accelerati alcuni interventi non previsti nell'annualità sviluppando l'attività progettuale. Si veda l'intervento 2015FEFC0004.
2015FEFC0014	Rifacimento e razionalizzazione del sistema fognario della Zona Industriale	FOGNATURA	Goro;	Gestore	350.000,00				0		0,00		
2015FEFC0015	Sostituzione m. 1200 condotta idrica via De Bernardi e via Bonaglia 5° traversa	ACQUEDOTTO	Jolanda di Savoia;	Gestore	296.000,00	148.000,00		148.000,00	0	0	0,00	-100%	Motivazione analoga a quella addotta per l'intervento 2014FEFC0010. L'intervento è stato riprogrammato in annualità successive, tanto che attualmente risulta in corso di esecuzione.
2014FEFC0010	Massafiscaglia, via Castagnina, sostituzione condotta m 2550	ACQUEDOTTO	Massa Fiscaglia;	Gestore	430.000,00	230.000,00		230.000,00	14.889,10		14.889,10	-94%	L'intervento riguarda la sostituzione di una condotta idrica obsoleta. La decisione di inserire in programma di investimento la sostituzione di una condotta è in funzione di vari fattori per la misura della priorità: frequenza e gravità di guasto, estensione del territorio servito e numero di utenti coinvolti. L'evoluzione della situazione può essere soggetta ad imprevedibilità e modifiche. Durante il 2015 si è ritenuto in base a ciò di differire l'intervento, che pure è rimasto programmato per successive annualità. In particolare secondo questa logica nel 2015 sono stati realizzati una quantità maggiore di microinterventi contenuti nel centro di costo a cod. 2014FEFC0006 (+27%) e sono stati accelerati alcuni interventi non previsti nell'annualità sviluppando l'attività progettuale. Si veda l'intervento 2015FEFC0004.
2015FEFC0013	Modifica e potenziamento del sistema di scolo acque meteoriche - Canale Madonna a Migliarino (CADF/Consorzio Bonifica/Comune)	FOGNATURA	Massa Fiscaglia;	Gestore	150.000,00				0		0,00		
2015FEFC0016	Via Nuova Corriera - sostituzione DN 125 in c.am. Con PVC DE 140 ml 2.900	ACQUEDOTTO	Mesola;	Gestore	170.000,00				0		0,00		
2015FEFC0017	Adeguamento funzionale di due tratti fognari nell'abitato di Mesola e di Ariano	FOGNATURA	Mesola;	Gestore	55.000,00				0		0,00		
2014FEFC0005	Realizzazione punti di dosaggio del passivante Alifos LCZ sul DN 800 Ro-Collinara	ACQUEDOTTO	Migliarino;	Gestore					0		0,00		

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014FEF0003	Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie negli impianti di accumulo e sollevamento esistenti della rete idropotabile	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore	1.097.672,00	347.000,00		347.000,00	80.212,08		80.212,08	-77%	All'interno del presente codice-contenitore non è stato possibile realizzare buona parte dei micro interventi per motivi vari: organizzativi e di procedure autorizzative. Le verifiche di vulnerabilità sismica sulle strutture rilevanti sono state soggette ad un complesso iter procedurale di affidamento incarichi e sono attualmente in corso di svolgimento. L'iter approvativo dell'intervento manutentivo sulla torre acquedotto di Porto Garibaldi non è stato completato nel 2015 per le problematiche connesse alla tutela paesistica del territorio ricompreso nel perimetro del Parco del Delta Po. Il progetto d'intervento di rifacimento del rivestimento interno della torre piezometrica di Ariano Ferrarese non è stato completato per la complessità delle problematiche legate alle norme di sicurezza dei cantieri. Gli stessi interventi sono poi stati riprogrammati nelle successive annualità.
2015FEF0020	Verifiche sismiche centrali di potabilizzazione	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore	150.000,00				0		0,00		
2014FEF0013	Manutenzioni straordinarie, piccoli estendimenti e sostituzioni nelle reti fognarie	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore	1.118.708,00	210.000,00		210.000,00	284.339,14		284.339,14	35%	A causa delle generali condizioni delle reti fognarie è stato necessario un impegno manutentivo, prevalentemente costituito da micro interventi, più consistente di quanto non fosse stato presunto.
2014FEF0021	Realizzazione del nuovo depuratore intercomunale di Migliarino e sistema di collettamento dei reflui di Migliaro e Ostellato (*)	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore	535.872,00				0		0,00		
2014FEF0012	Ricerca perdite nella rete idropotabile	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore	1.648.775,00	300.000,00		300.000,00	37.074,66		37.074,66	-88%	La maggior parte delle risorse assegnate era stata prevista per l'ammodernamento del parco contatori. Date le numerose innovazioni tecnologiche oggi presenti, sono state approfondite ed estese le indagini di mercato e non è stato possibile procedere all'acquisto massivo di apparecchi, ma solo di alcune modeste quantità destinate a riscontri sperimentali sul campo.
2014FEF0016	Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie negli impianti di depurazione e sollevamenti fognari	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore	6.163.758,00	1.172.000,00		1.172.000,00	1.347.495,57		1.347.495,57	15%	
2014FEF0006	Manutenzioni straordinarie, piccoli estendimenti e sostituzioni nella rete primaria	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore	4.629.477,00	858.700,00		858.700,00	1.092.330,01		1.092.330,01	27%	A causa delle generali condizioni delle reti acquedottistiche è stato necessario un impegno manutentivo, prevalentemente costituito da micro interventi, più consistente di quanto non fosse stato presunto.
2014FEF0007	Interventi di dettaglio sulla rete secondaria	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.293,20		40.293,20	1%	
2014FEF0019	Altri interventi di adeguamento scarichi urbani ai sensi del p.to 7 - tab. 3 del D.G.R. 1053/03	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore					0		0,00		
2014FEF0023	Realizzazione del nuovo depuratore intercomunale di Rovereto	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore					0		0,00		
2014FEF0014	Adeguamento funzionale e potenziamento della rete scolante delle acque bianche nell'abitato di Mesola	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore	151.673,00				3.907,28		3.907,28	100%	Trattasi di una ricaduta di spese relativa ad un intervento che avrebbe dovuto chiudersi completamente nel 2014, cosa non verificatasi per problematiche attinenti fatti di cantiere. In questo senso si è generata nel 2015 una spesa non prevista.
2015FEF0019	Ro-Ruina, potenziamento sistema fognario - 2° stralcio	FOGNATURA	Ro Ferrarese;	Gestore	150.000,00				0		0,00		
2014FEF0002	Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie nella centrale di potabilizzazione di Ro Ferrarese	ACQUEDOTTO	Ro Ferrarese;	Gestore	603.123,00	175.000,00		175.000,00	99.581,33		99.581,33	-43%	All'interno del presente codice-contenitore non è stato possibile realizzare il micro intervento "recupero/riperforazione pozzo n° 34" per motivi organizzativi e di procedure autorizzative. Lo stesso intervento è poi stato riprogrammato nell'annualità 2017.
2015FEF0018	Recupero con riperforazione pozzo n° 2	ACQUEDOTTO	Ro Ferrarese;	Gestore	90.000,00				0		0,00		
2014FEF0020	Ro-Ruina, potenziamento sistema fognario e nuovo depuratore	DEPURAZIONE	Ro Ferrarese;	Gestore	253.092,00				22.521,45		22.521,45	100%	Trattasi dei costi di progettazione propedeutici alla predisposizione di un progetto di opere da realizzarsi in successive annualità
					4.413.700	0		4.413.700	3.264.044	0	3.264.044		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 11 del 13.12.2017

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Gestore CADF S.p.A. approvazione del consuntivo 2015.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 13 dicembre 2017

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ferrara

F.to Andrea Marchi

Il segretario verbalizzante

F.to Mario Ori

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 4 gennaio 2018
