



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 9

Convenzione per la regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, ex art. 14, comma 4, della Legge Regionale 6 settembre 1999 n.25, sottoscritta tra le ex Agenzie di Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.

[30/12/2008]



FORLÌ SEDE

Nr.0009457 Data 30/12/2008

Tit. D9 Interno

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DEI SISTEMI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE PRIMARIA E DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL'INGROSSO NEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DI FORLÌ-CESENA, RAVENNA E RIMINI, EX ARTICOLO 14, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999 N. 25.

L'anno duemilaotto, il giorno trenta del mese di dicembre, presso la sede di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35,

TRA

1) l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Forlì-Cesena C.F. 92047880403 con sede in Forlì, Piazza G.B. Morgagni n. 9 (di seguito anche "A.A.T.O. Forlì-Cesena"), legalmente rappresentata dal sig. Massimo Bulbi nato a [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, il quale interviene nella sua qualità di Presidente, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. 14 del 17/12/2008 (prot. 2181/08);

2) l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Ravenna C.F. 92048470394 con sede in Ravenna, Piazza dei Caduti per la libertà n. 2/4 (di seguito anche "A.A.T.O. Ravenna"), legalmente rappresentata dal sig. Sergio Baroni nato a [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, il quale interviene nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. 18 del 22/12/2008;

3) l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Rimini C.F. 91070210405 con sede in Rimini, Via Circonvallazione occidentale n. 3 (di seguito anche "A.A.T.O. Rimini"), legalmente rappresentata dal sig. Carlo Casadei nato a [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, il quale interviene nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 23/12/2008;

denominate di seguito in senso complessivo "le A.A.T.O." o "le Agenzie";

4) Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., C.F., P.IVA e Registro Imprese di Forlì n. 00337870406, con sede legale in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35 (di seguito "Romagna Acque" o "Gestore del SFA"), in persona del suo legale rappresentante e Presidente sig.ra Ariana Bocchini, nata a [REDACTED], domiciliata per la carica presso la sede della società, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 193 del 18/12/2008,

PREMESSO

1. che il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha disposto la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 147) imponendo altresì a Comuni e Province di organizzare il servizio idrico integrato come definito all'art. 141, comma 2, del medesimo decreto legislativo in modo da garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;

2. che il D. Lgs. 152/2006 ha altresì stabilito che i Comuni e le Province devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, ora contenute nel D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", successivamente modificato dall'art. 35 della legge n. 448/2001, dall'art. 14 comma 4 del D.L. n. 269/2003, poi convertito in legge n. 326/2003 e dall'art. 4 comma 234 della legge n. 350/2003;

3. che lo stesso D. Lgs. 152/2006 ha demandato ai Comuni e alle Regioni e alle Province autonome di disciplinare le forme e i modi della cooperazione tra Comuni e Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale (art. 148, comma 2);
4. che la Regione Emilia-Romagna ha dunque emanato la legge 6 settembre 1999 n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani", successivamente modificata dalla legge regionale 21 agosto 2001 n. 27, dalla legge regionale 28 gennaio 2003 n. 1 e dalla legge regionale 14 aprile 2004 n. 7;
5. che in applicazione della legge regionale n. 25/1999 tutti i comuni ricadenti negli ambiti territoriali ottimali n. 7 di Ravenna, n. 8 di Forlì-Cesena e n. 9 di Rimini, e le Province di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini, hanno costituito per ogni ambito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza dei servizi pubblici spettanti ai Comuni, anche a tutela della collettività dei cittadini-utenti, secondo il modello giuridico della convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, denominata Agenzia di ambito per i servizi pubblici (A.A.T.O.);
6. che ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 25/1999 ogni A.A.T.O. esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione;
7. che in materia di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato è stata inoltre emanata la legge regionale n. 10/2008;
8. che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione 3 dicembre 2001 n. 2679, ha adottato la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra le Agenzie d'ambito e i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, successivamente aggiornata con deliberazione 7 febbraio 2005 n. 177;
9. che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione 3 dicembre 2001 n. 2680, ha adottato gli indirizzi e linee guida per la prima attivazione del servizio idrico integrato, successivamente aggiornati con deliberazione 28 luglio 2003 n. 1550;
10. che ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 152/2006 nonché dell'art. 14 e dell'art. 10 della legge regionale n. 25/1999 i rapporti tra le A.A.T.O. e i gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni sulla base della convenzione tipo di cui al precedente punto 8, e relativo disciplinare;
11. che in seguito al processo di integrazione societaria di alcune società di servizi pubblici di Bologna e della Romagna che ha dato vita alla holding HERA S.p.A. di Bologna, la nuova società è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i rapporti di qualunque tipo e natura instaurati dalle società stesse;
12. che HERA S.p.A. è quotata in borsa dal 25/6/2003 e, per effetto della suddetta integrazione societaria e dei pregressi affidamenti, gestisce in esclusiva il servizio idrico integrato nei territori degli Ambiti Territoriali Ottimali n. 7, n.8 e n. 9 e possiede i requisiti per fruire del regime speciale previsto all'art. 113 comma 15 bis del D. Lgs 267/2000;
13. che le A.A.T.O. di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini hanno stipulato le convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato con la società Hera S.p.A. di Bologna rispettivamente in data 1° febbraio 2005, 26 aprile 2005 e 14 marzo 2002.

14. che l'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 25/1999, stabilisce attualmente che: «In presenza alla data di entrata in vigore della presente legge di un soggetto a partecipazione maggioritaria degli enti locali proprietario di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria, fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato di più ambiti territoriali ottimali, le Agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro le misure unitarie da assumere nei confronti di tale soggetto determinando lo schema di ripartizione della risorsa tra i diversi gestori e la relativa tariffa, al fine di perseguire l'omogeneità gestionale e tariffaria nonché l'economicità complessiva del sistema. Le misure adottate devono essere congruenti con quanto stabilito dalla pianificazione nazionale e regionale nel settore delle risorse idriche. Il soggetto proprietario dei medesimi sistemi può effettuare, previa deliberazione degli enti locali assunta in sede di Agenzia, la gestione delle reti e degli impianti funzionali alle attività previste nel presente comma. Tale facoltà si estende anche al caso di ulteriore acquisizione da parte del medesimo soggetto, fornitore del servizio idrico integrato, della proprietà di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria.»;

15. che Romagna Acque è una società per azioni a capitale totalmente pubblico e incedibile, titolare dei principali impianti di produzione dell'acqua potabile e principale fornitore all'ingrosso del servizio idrico del territorio romagnolo, ovvero di più ambiti territoriali ottimali, in virtù di concessioni di derivazione rilasciate dai pubblici uffici competenti, ai sensi del sopra citato articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 25/1999;

16. che la parte più importante dell'attività di Romagna Acque è relativa alla fornitura di acqua all'ingrosso al gestore del SII, con il quale gli Enti locali soci di Romagna Acque hanno stipulato, in sede di Agenzia, le convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato nei tre A.T.O.;

17. che gli enti locali soci di Romagna Acque in data 4 maggio 2006 hanno sottoscritto tra loro apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L. (convenzione soggetta a successive modifiche ed integrazioni), con la quale stabiliscono che la società ha natura di soggetto dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali medesimi e realizzano pertanto un controllo in comune sulla società stessa analogo a quello esercitato sui propri servizi, come previsto dall'art. 113 del citato Testo Unico;

18. che è in corso di realizzazione il progetto «Società delle Fonti», finalizzato alla riunione della titolarità e della gestione di tutte le fonti principali di produzione nella società Romagna Acque, che vedrebbe ampliata la propria attività già oggi svolta per circa la metà del fabbisogno idropotabile, e che detto progetto prevede che Romagna Acque continui a gestire gli impianti e le reti di distribuzione primaria di cui è già proprietaria, nonché gli altri di cui acquisisca la proprietà;

19. che con deliberazioni dell'Assemblea dei soci di Romagna acque 22 dicembre 2004 n. 8 e 4 maggio 2006 n. 7 sono stati approvati il Piano degli investimenti 2005-2014 ed il Piano operativo del Progetto Società delle Fonti;

20. che con deliberazione dell'Assemblea dei soci di Romagna acque 22 maggio 2008 n. 5 è stato aggiornato il Piano operativo del Progetto Società delle Fonti;

21. che in applicazione della richiamata norma regionale (articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 25/1999), le A.A.T.O. hanno deliberato di confermare in capo a Romagna Acque la gestione del complesso acquedottistico dell'Acquedotto della Romagna costituito dall'invaso di Ridracoli e dalla rete di adduzione e distribuzione primaria ad esso connessa, di cui Romagna Acque è proprietaria, con i seguenti atti deliberativi: A.A.T.O. Forlì-Cesena con

delibera n. 8 del 16 aprile 2003, A.A.T.O. Ravenna con delibera n. 5 del 28 marzo 2003, A.A.T.O. Rimini con delibera n. 16 del 16 luglio 2003;

22. che mediante il citato complesso acquedottistico Romagna Acque esplica il servizio di fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato negli A.T.O. n. 7 Ravenna, n. 8 Forlì-Cesena e n. 9 Rimini, in base al vigente contratto con HERA s.p.a. per la fornitura di acqua potabile avente scadenza al 31 dicembre 2008, che riflette le decisioni assunte dalle tre A.A.T.O., ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge regionale n. 25/1999, in ordine allo schema di ripartizione della risorsa disponibile dalla diga di Ridracoli ed alla relativa tariffa;

23. che il progetto «Società delle Fonti» citato al precedente punto 19 – che prevede di concentrare in Romagna Acque la proprietà e la gestione dei principali impianti di produzione negli ambiti dei tre territori provinciali (come elencati negli allegati alla presente convenzione), in modo che la società diventi il principale fornitore all'ingrosso di acqua potabile per il servizio idrico integrato in tutti i tre ambiti – è stato deliberato dagli Enti locali delle tre province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e approvato dall'Assemblea dei Soci di Romagna Acque con deliberazioni 30 gennaio 2003 n. 2 e 18 marzo 2004 n. 1;

24. che il suindicato progetto consta di due fasi, la prima delle quali, già compiuta, prevedeva il trasferimento a Romagna Acque da parte degli Enti locali e delle Società degli *assets* di tutte le dotazioni afferenti alle principali fonti locali della Romagna, mentre la seconda prevede il trasferimento a Romagna Acque, in qualità di società delle fonti, con deliberazioni delle A.A.T.O. e ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 25/1999, della gestione degli impianti che siano dalla medesima realizzati nonché quelli trasferiti nella proprietà della medesima Romagna Acque;

25. che è stata verificata la coerenza delle finalità ambientali sottese al progetto "Società delle Fonti" rispetto agli indirizzi del Piano regionale di tutela delle acque adottato con Deliberazione C.R. 22 dicembre 2004, n. 633, come successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Regionale 21/12/2005, n. 40, in quanto la riunificazione proprietaria e gestionale delle principali reti e impianti funzionali alle attività di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria di risorsa idrica in capo ad un unico soggetto risponde a preminenti esigenze di interesse pubblico quanto al migliore uso della risorsa ed alla tutela dell'ambiente;

26. che con le convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato nei tre A.T.O. sopra richiamati il Gestore del SII ha preso atto della volontà degli Enti Locali di trasferire in capo a Romagna Acque, a partire dall'anno 2008, la gestione degli impianti e reti di captazione, adduzione e distribuzione primaria di sua proprietà, ulteriori all'Acquedotto della Romagna, destinati alla produzione di acqua potabile;

27. che in data 30 novembre 2007 è stato sottoscritto il «Protocollo d'intesa relativo alla gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini», con il quale le Agenzie di Ambito di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini hanno ribadito la volontà di riconoscere ai sensi dell'articolo 14 comma 4 L.R. n. 25/1999 e s.m.i. Romagna Acque quale unico fornitore all'ingrosso di acqua potabile ai tre A.T.O. e di confermare e riunire in capo alla medesima la gestione delle principali reti e degli impianti di captazione, accumulo, potabilizzazione, sollevamento, adduzione primaria e secondaria e distribuzione primaria di acqua potabile afferenti al Servizio Idrico Integrato nel territorio delle tre A.A.T.O.;

28. che al fine di attuare il Progetto "Società delle Fonti" e di concludere la procedura di affidamento, in attuazione del Protocollo d'Intesa relativo alla gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, ex articolo 14, comma 4, della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sottoscritto in data 30 novembre 2007, ed ai fini dell'art. 23-bis, comma 12, del d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della l. 6 agosto 2008, n. 133, le parti redigono la presente Convenzione, con la quale si intende confermare in capo a Romagna Acque la gestione del complesso acquedottistico dell'Acquedotto della Romagna e della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali n. 7 Ravenna, n. 8 Forlì-Cesena e n. 9 Rimini, nonché, a fini di razionalizzazione organizzativa, risparmio economico e sostenibilità ambientale, e di integrare tale gestione con la contestuale gestione dei sistemi di captazione, adduzione, e distribuzione primaria, o singole fonti e impianti, diversi dall'Acquedotto della Romagna, già conferiti a Romagna Acque, o da essa direttamente realizzati;

29. che con il presente atto le Parti intendono regolamentare le modalità di gestione del complesso dei beni da parte di Romagna Acque e di applicazione del metodo tariffario di cui al D.P.G.R. 49/2006 anche attraverso appositi allegati;

30. che la regolamentazione dei rapporti, e in particolare la disciplina delle penali, saranno applicate entrambe tenendo conto delle peculiarità insite nell'affidamento *in house providing* conferito a Romagna Acque, società soggetta al c.d. "controllo analogo".

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. La presente convenzione ed il Disciplinare Tecnico regolano i rapporti tra le Agenzie di Ambito di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini e Romagna Acque, unico fornitore all'ingrosso di acqua potabile nei tre A.T.O. ai sensi dell'articolo 14 comma 4 L.R. n. 25/1999 e ss.mm.ii. alla quale viene affidata la gestione di tutte le reti e gli impianti di captazione, accumulo, potabilizzazione, sollevamento, adduzione primaria e secondaria e distribuzione primaria di acqua potabile afferenti al Servizio Idrico Integrato nel territorio dei comuni serviti da Romagna acque nei tre A.T.O., come previsto dal modello gestionale approvato congiuntamente dalle Agenzie d'Ambito di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini che prevede un unico gestore del Servizio di Fornitura all'ingrosso (di seguito SFA) per la produzione e la distribuzione primaria dell'acqua potabile.

2. La gestione connessa alle attività di cui al precedente comma 1 costituisce un sistema unitario che riguarda la produzione idropotabile dei tre ambiti territoriali e verrà interamente ricompresa nei rispettivi Piani d'ambito e nei relativi successivi aggiornamenti.

3. La presente convenzione ed il D.T. stabiliscono altresì i criteri e le norme generali sulla cui base sono regolati i rapporti tra Romagna Acque ed il Gestore del SII al quale spettano, in esclusiva, l'instaurazione ed il mantenimento dei rapporti con l'utenza e la riscossione della tariffa.

4. La gestione di cui al comma 1 include tutte le attività, nessuna esclusa, funzionali a e necessarie per la regolare erogazione del servizio nel pieno rispetto della presente Convenzione. Sono incluse quindi nella gestione, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti attività:

- a) esercizio e manutenzione ordinaria delle reti, degli impianti e di tutte le dotazioni accessorie e connesse, a partire dai punti di captazione delle risorse idriche grezze fino ai punti di consegna dell'acqua potabile alle reti di distribuzione secondaria;
- b) progettazione, realizzazione e collaudo degli interventi inclusi nei programmi approvati dalle Agenzie, compresa la manutenzione straordinaria;
- c) gestione delle aree di salvaguardia delle risorse utilizzate per il riformimento, delimitate secondo la normativa vigente e nei limiti delle responsabilità da questa poste a carico del gestore;
- d) progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di monitoraggio delle reti e degli impianti, inclusi i dispositivi di misura della quantità e di controllo della qualità delle acque e di rilevamento dei parametri di esercizio;
- e) costruzione, conservazione e aggiornamento dell'inventario dei beni secondo le specifiche indicate dalle Agenzie;
- f) progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo territoriale, secondo le specifiche indicate dalle Agenzie;
- g) predisposizione e realizzazione del piano di emergenza, del piano di ricerca e riduzione delle perdite e del piano di gestione delle interruzioni di servizio, di cui rispettivamente agli artt. 24, 25 e 26 della presente convenzione;
- h) instaurazione e mantenimento dei rapporti con gli Enti, pubblici e privati, con le Autorità di controllo e con i soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione, in conformità alla presente convenzione;
- i) ricerca e sviluppo di nuove fonti e modalità di produzione della risorsa;
- j) tutte le attività accessorie alle precedenti necessarie al completo espletamento della gestione conformemente alla presente convenzione.

5. La gestione oggetto della convenzione rappresenta servizio pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e segg. della legge 12 giugno 1990 n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) e costituisce attività di pubblico interesse.

6. Ogni riferimento fatto alla "convenzione" dovrà intendersi rivolto al presente documento ed ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2 Regolazione del servizio

- 1. Le funzioni di regolazione del servizio spettanti rispettivamente alla Regione Emilia-Romagna e alle Agenzie d'ambito sono stabilite agli artt. 28 e 30 della L.R. 10/2008.
- 2. Il gestore del SFA deve fornire alla Regione e alle Agenzie d'ambito entro 30 giorni in via ordinaria, ovvero entro i tempi prescritti dagli Enti stessi in occasioni straordinarie, ogni informazione e/o documento in suo possesso attinente la gestione del servizio, ogni fatto o circostanza relativi all'erogazione del servizio.
- 3. Romagna acque consente l'effettuazione alle Agenzie d'ambito, alla Regione Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, di tutti gli accertamenti

sopralluoghi e verifiche ispettive che le stesse ritengano opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddetti potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorranti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.

Articolo 3 Durata

1. La presente convenzione decorre dall'1.1.2009 e scade il 31.12.2023, salve diverse successive disposizioni di legge.
2. Nei dodici mesi antecedenti alla scadenza della convenzione, le A.A.T.O. effettueranno le valutazioni di competenza per l'affidamento della gestione di fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato ai sensi della normativa vigente. Romagna Acque resta comunque obbligata a proseguire la gestione della fornitura nel rispetto della presente convenzione fino alla decorrenza del nuovo affidamento.

Articolo 4 Obblighi e responsabilità di Romagna Acque

1. Romagna Acque si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto di convenzione, è responsabile del buon funzionamento della gestione e dovrà osservare la normativa vigente sulle acque pubbliche, sulle opere di ritenuta, sui rifiuti e sulle sostanze pericolose, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, sull'utilizzo delle risorse idriche e sulla qualità delle acque fornite ed adempiere tutti gli obblighi posti a suo carico dalla presente convenzione e relativi allegati.
2. Romagna Acque terrà sollevati e indenni le A.A.T.O. e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
3. Romagna Acque dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione della gestione assegnata, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
4. Romagna Acque assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l'obiettivo del miglioramento continuo e costante del servizio.
5. Romagna Acque assume l'impegno ad adoperarsi per attivare collaborazioni, alleanze ed intese con enti di ricerca e/o ditte specializzate con l'obiettivo di individuare tecnologie in grado di favorire il risparmio idrico e migliorare la qualità della risorsa fornita.
6. Romagna Acque dovrà garantire il permanere, per tutta la durata della convenzione, delle caratteristiche e dei requisiti in base ai quali è stata individuata come gestore degli impianti di captazione, accumulo, potabilizzazione, sollevamento, adduzione primaria e secondaria e distribuzione primaria di acqua potabile afferenti al Servizio Idrico Integrato.

Articolo 5 Perimetro del servizio

1. L'esercizio della gestione avviene all'interno dei perimetri amministrativi degli ambiti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.
2. Si prende atto che Romagna acque espleta parzialmente il servizio di fornitura all'ingrosso, per quantitativi non rilevanti della risorsa idrica, anche all'esterno dei tre ambiti territoriali ottimali. Ogni eventuale estensione delle forniture dovrà preventivamente essere approvata dalle Agenzie.

Articolo 6 Attività ulteriori e attività connesse alla fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato

1. Si prende atto che Romagna Acque svolge, in base al proprio oggetto sociale, attività di costruzione e gestione di reti per l'energia elettrica e le telecomunicazioni e attività relative all'utilizzo del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio ubicato in aree montane e collinari a fini turistici, educativi ed ambientali.
2. La gestione delle ulteriori attività di cui al comma 1 non deve arrecare alcun pregiudizio alla gestione del SFA. Di tale attività dev'essere tenuta contabilità separata dei costi e dei ricavi. A tali attività va ricondotta quota parte dei costi comuni e delle spese generali.

CAPO II – OPERE E IMPIANTI AFFIDATI ALLA GESTIONE DI ROMAGNA ACQUE

Articolo 7 Dotazione di Romagna Acque

1. Le opere, le reti e gli impianti la cui gestione è affidata a Romagna Acque, sono costituiti da:
 - a) l'Acquedotto della Romagna costituito dall'invaso di Ridracoli, dalle gallerie di adduzione, dall'impianto di potabilizzazione e dalla rete di distribuzione primaria ad esso connessa;
 - b) i sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria, le singole fonti e impianti, diversi dall'Acquedotto della Romagna, la cui proprietà è stata conferita, dai comuni proprietari e da loro società, alla stessa Romagna Acque ed ogni altra opera di cui la società acquisisca la proprietà;
 - c) opere tuttora di proprietà dei comuni o delle società degli asset, gestite dal gestore del servizio idrico integrato;
 - d) opere realizzate da HERA s.p.a. nel primo triennio di gestione;
 - e) le opere e gli impianti realizzati da Romagna acque in attuazione del Piano di prima attivazione di cui al successivo art. 13 nonché negli ulteriori Piani approvati dalle Agenzie di Ambito.
2. Tali beni sono specificamente individuati in apposito inventario predisposto e aggiornato annualmente da Romagna acque con criteri e modalità concordati con le Agenzie e fornito loro entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 8 Consegna delle opere, impianti, reti

1. Romagna Acque dichiara di trovarsi già nella disponibilità e di effettuare la gestione dei beni di cui all'art. 7 comma 1 lett. a) e che gli stessi sono conformi alle vigenti normative di settore e rispettano i requisiti previsti dalle normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza vigenti alla data di stipula della presente convenzione.
2. I beni di cui all'art. 7 comma 1 lett. b), di proprietà di Romagna Acque saranno affidati a gestione di Romagna Acque, a partire dall'1 gennaio 2009.

- e) il programma degli interventi ed il relativo piano finanziario;
- f) la tariffa di riferimento della fornitura all'ingrosso e la relativa articolazione nei bacini tariffari.

2. Il Piano è redatto in coerenza con il Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque di cui al D. Lgs. n.152/2006 e in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

3. Il Piano per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa, dopo la sua approvazione da parte delle tre Agenzie, costituisce parte integrante dei Piani d'Ambito di cui all'art. 12 della L.R. 25/99 e Romagna Acque si obbliga, fin d'ora, ad attuarlo come approvato per le parti di propria competenza.

Articolo 11 Durata del Piano

1. Il Piano ha durata fino al 31.12.2023. Esso può essere aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica prevista dal Metodo Tariffario Regionale ed in ogni momento qualora lo impongano nuove normative o il verificarsi di esigenze tecniche ed economiche per la salvaguardia dell'efficienza, efficacia ed economicità del Servizio.

Articolo 12 Procedura di formazione del Piano

1. Entro diciotto mesi dalla stipula della presente Convenzione, Romagna Acque formula alle tre A.A.T.O., per la relativa predisposizione e successiva approvazione di loro competenza, una proposta di Piano per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa in grado di corrispondere alle esigenze complessive delle medesime A.A.T.O. contenente:

- a) la stima previsionale della domanda, articolata in orizzonti di breve periodo e di medio-lungo periodo e per il territorio di ciascuna Agenzia;
- b) la descrizione dettagliata delle opere e degli impianti esistenti che assicurano allo stato attuale la produzione di risorsa per i territori dei tre A.T.O.;
- c) la descrizione dettagliata dei sistemi di adduzione primaria e secondaria e distribuzione primaria e dei punti di interconnessione con le reti di distribuzione secondaria;
- d) lo schema della fornitura e dell'adduzione;
- e) il programma degli investimenti necessari e la relativa articolazione annuale per assicurare la disponibilità della risorsa e la continuità del servizio, in coerenza con la previsione sull'evoluzione della domanda;
- f) la descrizione dettagliata della propria organizzazione aziendale e la previsione di eventuali modifiche atte a migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione;
- g) i costi operativi e la previsione della loro evoluzione, anche in conseguenza della realizzazione del piano degli investimenti e dell'attuazione delle misure di efficientamento previste, debitamente documentati;
- h) il piano economico e finanziario della gestione;
- i) la richiesta tariffaria, in applicazione del metodo normalizzato vigente.

2. Le Agenzie, valutate le proposte del Gestore del SFA, approvano il Piano entro un anno dalla presentazione del documento completo da parte di Romagna acque.

Articolo 13 Piano di prima attivazione per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa per il periodo 2009-2012

1. Nelle more dell'approvazione del Piano di cui all'art. 10, le A.A.T.O. sottoscrivono e allegano alla presente Convenzione il Piano di prima attivazione per l'organizzazione e la gestione delle attività di fornitura all'ingrosso della risorsa per il periodo 2009-2012.
2. Il prezzo dell'acqua fornita all'ingrosso dal Gestore del SFA al Gestore del SII è determinato in applicazione della presente Convenzione e del Piano di prima attivazione di cui al presente articolo.
3. Entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione le Agenzie e Romagna Acque sottoscriveranno il Disciplinare Tecnico relativo al servizio di fornitura all'ingrosso.

CAPO IV - FINANZIAMENTO

Articolo 14 Piano e risorse finanziarie

1. Romagna Acque attua i Piani di cui agli artt. 10 e 13 per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa approvati dalle A.A.T.O. e ne accetta gli obblighi conseguenti in materia di investimenti, livelli di servizio e prezzo dell'acqua all'ingrosso.
2. Le risorse finanziarie saranno reperite attraverso:
 - a) la tariffa;
 - b) il finanziamento diretto degli Enti locali costituenti le Agenzie;
 - c) qualunque altra forma di finanziamento deliberata dalle Agenzie e/o altri enti pubblici.

Articolo 15 Tariffa del servizio

1. La tariffa dell'acqua all'ingrosso è determinata in applicazione dell'art. 14 del "metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato in Emilia-Romagna" approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 marzo 2006, n. 49 e tenendo conto degli accordi assunti antecedentemente l'entrata in vigore del metodo tariffario ai sensi dell'art. 8, comma 2, nell'ambito del Protocollo d'Intesa.
2. I ricavi provenienti dall'applicazione della tariffa del servizio costituiscono il corrispettivo della gestione della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato. Fino alla data del 18/10/2025 i ricavi saranno parzialmente costituiti anche dai contributi statali in conto esercizio come a suo tempo concessi alla società. La tariffa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite in sede di revisione tariffaria dalle A.A.T.O.. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la gestione della fornitura all'ingrosso.

Articolo 16 Indicatori e progetti di intervento

1. I progetti di intervento, i relativi investimenti, i tempi e le modalità di realizzazione dei medesimi sono riportati nel Piano di cui all'art. 10, salvo quanto previsto dall'art. 13 per il periodo 2009-2012.
2. Romagna Acque è tenuta a realizzare i progetti di intervento nei tempi stabiliti nei cui agli artt. 10 e 13 e secondo le modalità previste nel Disciplinare Tecnico. In

applicano le penali previste dall'art. 32 della presente convenzione, nonché dal citato Disciplinare Tecnico.

Articolo 17 Indicatori e livelli di qualità del servizio

1. Nel Disciplinare Tecnico sono stabiliti i livelli di qualità della gestione ed i relativi indicatori.
2. Romagna Acque è tenuta a raggiungere gli standard previsti nei tempi e nelle modalità prescritti dal Disciplinare Tecnico.
3. In difetto si applicano le penali previste dall'art. 32 e nel Disciplinare Tecnico.

Articolo 18 Varianti al programma degli interventi e al modello gestionale

1. Le A.A.T.O. possono variare il programma degli interventi per adeguare la gestione a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli della gestione in atto. In tal caso le A.A.T.O. comunicano a Romagna Acque la proposta di variante, definendo con essa le conseguenti correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. Le A.A.T.O. concordano con Romagna Acque anche i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.
2. Romagna Acque è tenuta a realizzare gli interventi previsti nella variante e a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dalle A.A.T.O., anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da queste ultime e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica Romagna Acque per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dalle A.A.T.O..
3. Romagna Acque può proporre varianti al modello gestionale descritto nei Piani purché dimostri che le stesse non comportino un peggioramento dei livelli e dell'efficienza della gestione. Tali varianti non possono giustificare pretese di variazione tariffaria. Si applica in tal caso la procedura prevista per le varianti proposte da Romagna Acque che non corrispondano a nuovi obblighi di legge.
4. Romagna Acque può presentare alle A.A.T.O. domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi, ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi, nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.
5. Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge essa non può essere respinta dalle A.A.T.O., le quali possono contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta.
6. Le eventuali varianti proposte da Romagna Acque che non corrispondano a nuovi obblighi di legge, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise in sede di revisione della tariffa, salvo diverso accordo tra le Parti. Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari le A.A.T.O. sono tenute a pronunciarsi entro sei mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il termine potrà essere sospeso per tre mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte delle A.A.T.O.

7. Nel caso in cui le A.A.T.O. accettino la proposta di variante, ma non ritengano equa la compensazione tariffaria richiesta, esse notificano a Romagna Acque la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria.

CAPO V – RAPPORTI TRA GESTORI

Articolo 19 Subentro di Romagna Acque ad HERA nella gestione delle fonti di produzione

1. Romagna Acque dà atto che al fine di regolamentare i rapporti con il gestore HERA s.p.a. in ordine ai beni relativi alle cosiddette "fonti locali di produzione" conferite a Romagna Acque in attuazione del richiamato progetto «Società delle Fonti», ha raggiunto accordi per l'acquisto del relativo ramo di azienda e che, per il biennio 2009-2010, HERA e Romagna Acque stipuleranno fra loro accordi per il perfezionamento del subentro nella gestione delle fonti locali.

Articolo 20 Fornitura della risorsa idrica al gestore del SII

1. La fornitura di risorsa all'ingrosso al gestore del SII sarà regolata da appositi accordi fra quest'ultimo e Romagna Acque, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle A.A.T.O..

CAPO VII - CONTROLLO

Articolo 21 Controllo da parte delle Agenzie e della Regione

1. Le A.A.T.O. e la Regione ai sensi della legge regionale 30 giugno 2008 n. 10, esercitano il potere di controllo della gestione affidata e hanno facoltà di richiedere a Romagna Acque, che deve dare adeguata risposta nel tempo più breve possibile compatibilmente con la complessità della richiesta e dell'attività necessaria per ottemperarvi, tutte le informazioni in suo possesso attinenti la gestione del servizio, nonché ogni fatto o circostanza relativi alla regolare erogazione del servizio e sull'efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

2. Le A.A.T.O. si riservano ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da esse incaricati, ogni controllo necessario ad accertare lo svolgimento della gestione secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella presente convenzione.

3. Le A.A.T.O. controllano la gestione e l'attività del gestore del SFA al fine di:

- assicurare la corretta applicazione della tariffa per la fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dai Piani;
- valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
- definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione dei Piani.

4. Per la realizzazione di quanto sopra, Romagna Acque si obbliga a sottoporre a proprie spese a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società abilitata.

5. Per permettere l'applicazione del Metodo Tariffario Regionale, Romagna Acque redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente per ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

6. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile contenute nel Disciplinare Tecnico, prescrizioni che Romagna Acque, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad accettare integralmente.

7. Romagna Acque si impegna a sottoporre a proprie spese la propria attività a certificazione tecnica quinquennale da parte di professionisti individuati dalle A.A.T.O.. Tale certificazione dovrà in particolare accertare che le opere da realizzare e realizzate in esecuzione dei piani previsti nella presente convenzione siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi e che Romagna Acque colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.

8. Romagna Acque consente l'effettuazione, alle A.A.T.O., alla Regione Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che gli stessi ritengano opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti la gestione oggetto di convenzione. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorranti, le ragioni di urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.

9. Romagna Acque presta alle A.A.T.O. o agli organismi di controllo ogni collaborazione, agevolando i controlli e fornendo i dati richiesti nei tempi concordati.

Articolo 22 Comunicazione dati sulla gestione

1. Romagna Acque è tenuta a fornire alle A.A.T.O. tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione della fornitura all'ingrosso e lo stato di attuazione del piano di investimenti nei tempi e con le modalità stabilite nel Disciplinare Tecnico.

2. I dati tecnici, economici e gestionali verranno resi disponibili scorporando tutto ciò che non attiene alla gestione della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato individuata all'art.

1. A tale scopo Romagna Acque è organizzata con un sistema di contabilità analitica che consente di produrre le informazioni al livello di dettaglio necessario.

3. Nel Disciplinare Tecnico viene riportato il riepilogo degli obblighi di comunicazione che Romagna Acque deve rispettare periodicamente, con la specifica delle relative frequenze, dei relativi formati e delle relative modalità di trasmissione. In particolare Romagna Acque è tenuta a fornire rapporti e rendiconti aventi i contenuti e le periodicità specificati nel Disciplinare Tecnico, come di seguito elencati:

- a) rapporti trimestrali sull'avanzamento degli investimenti contenenti, almeno, le informazioni indicate nel Disciplinare Tecnico;
- b) rapporto annuale sulla gestione e sulle previsioni per l'anno in corso, entro il 30 giugno di ciascun anno, illustrante tutti i fatti ed i dati rilevanti dell'esercizio precedente e previsioni per quello in corso, come indicato dal Disciplinare Tecnico;
- c) dati relativi alla quantità ed alla qualità dell'acqua fornita ed alle interruzioni del servizio, con cadenza trimestrale.

4. Le Agenzie si riservano di specificare, con apposite direttive, la forma ed i contenuti di dettaglio dei rapporti e dei rendiconti previsti dal presente articolo.

5. Per i fini del presente articolo Romagna Acque deve organizzare e mantenere un proprio sistema di controllo interno conformemente alle disposizioni del Disciplinare Tecnico.

6. Fermi restando gli obblighi di informazione di cui al comma 3 lett. a), b) e c) del presente articolo, Romagna Acque è tenuta a segnalare tempestivamente ogni circostanza anomala riscontrata alle A.A.T.O. e alle Autorità competenti, quando prescritto dalla normativa vigente.

7. Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, le A.A.T.O. applicheranno le penali previste nell'art. 32 della convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 35 nell'ipotesi di reiterata inadempienza.

Articolo 23 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e certificazioni di qualità e ambiente

1. Romagna Acque si dota di un sistema di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro certificato secondo la norma OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001:1999.

2. Romagna Acque si dota di un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000.

3. Romagna Acque si dota di un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004.

4. Romagna Acque si impegna a mantenere i suddetti sistemi di gestione certificati secondo le norme suddette e a trasmettere annualmente copia delle certificazioni alle Agenzie.

5. Romagna Acque garantisce alle A.A.T.O. l'accesso alla documentazione dei sistemi di gestione.

Articolo 24 Piano di Emergenza

1. Entro dodici mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione Romagna Acque predispone un Piano di Emergenza in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico, sottoponendolo ad approvazione delle A.A.T.O. e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 25 Piano di ricerca e riduzione delle perdite

1. Entro il primo anno di gestione, Romagna Acque dovrà adottare, sottoponendolo alla preventiva approvazione delle A.A.T.O., un piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche, in conformità a quanto riportato nel Disciplinare Tecnico. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 99/97, Romagna Acque si impegna a trasmettere, entro il mese di febbraio di ogni anno, i risultati delle rilevazioni delle perdite degli acquedotti, effettuate in base ai criteri ed al metodo di valutazione di cui al D.M. 08/01/1997 n. 99.

Articolo 26 Piano di gestione delle interruzioni di servizio

Entro il termine di dodici mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione Romagna Acque dovrà adottare il Piano di gestione delle interruzioni di servizio di cui al Disciplinare Tecnico, da sottoporre alle A.A.T.O. ai sensi dell'allegato 8.2.9 del D.P.C.M. 04/03/1996.

Articolo 27 Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità

Il Gestore, ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs 152/2006 e degli articoli 5, 7 e 10 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modificazioni, svolge il servizio di controllo territoriale e provvede al controllo di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e distribuzione e nei potabilizzatori, anche tramite convenzioni con altri Gestori.

Il Gestore è tenuto, entro la fine di ciascun anno, a partire dall'anno 2009 a valere per l'anno 2010, a redigere un Piano di controllo valido per l'anno successivo nel quale devono essere riportati:

- i punti di campionamento,
- i profili analitici di controllo,
- le frequenze di controllo.

Il Piano di controllo deve essere reso disponibile alle Agenzie le quali potranno richiedere al Gestore motivate modifiche e/o integrazioni qualora dovessero ravvisare mancate rispondenze alla normativa vigente.

CAPO VIII – REGIME FISCALE

Articolo 28 Imposte, tasse, canoni

1. Saranno a carico di Romagna Acque, che le recupera attraverso la tariffa, tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dai Comuni e obbligatori a termini di legge.

CAPO IX – ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE

Articolo 29 Divieto di cessione della convenzione e di subaffidamento della gestione

1. È fatto divieto a Romagna Acque di cedere o subaffidare anche parzialmente la gestione della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte delle A.A.T.O., che le suddividono 1/3 per ciascuna, delle garanzie prestate da Romagna Acque.

2. Romagna Acque, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato e fermo quanto previsto dall'art. 113, comma 5ter, del d.lgs n. 267/2000, potrà avvalersi per l'esecuzione di singole attività strumentali alla gestione della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato, di soggetti terzi, individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari.

Articolo 30 Rimessione della gestione

1. Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 35, tutte le opere e attrezzature utilizzate da Romagna Acque per l'esercizio della fornitura all'ingrosso oggetto della presente convenzione, ivi comprese quelle finanziate tramite la tariffa all'ingrosso, ovvero finanziate dalla medesima Romagna Acque purché preventivamente autorizzate dalle A.A.T.O., anche non completamente ammortizzate, debbono essere rimesse nella disponibilità delle medesime A.A.T.O. in buono stato di manutenzione e in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

2. Eventuali nuovi conferimenti da parte dei comuni, di beni già in uso al gestore del servizio idrico integrato, verranno riconosciuti elegibili ai fini tariffari unicamente con riferimento alla componente costi operativi.

3. Le A.A.T.O., qualora individuino per il proseguimento della gestione un soggetto diverso da Romagna Acque, prevedranno nel bando di gara o comunque nelle delibere di affidamento, l'obbligo per il nuovo gestore del SFA di provvedere al pagamento a Romagna Acque (gestore del SFA uscente) del valore industriale residuo dei beni non ammortizzati, stabilito mediante perizia disposta dal gestore con perito indicato dalle Agenzie. Il pagamento avrà luogo entro il termine di un anno dalla data di scadenza dell'affidamento quanto al valore dei beni non ammortizzati risultante dall'ultimo bilancio approvato, salvo un congruo positivo o negativo da corrispondere entro gli ulteriori dodici mesi per tener conto del valore industriale residuo dopo l'ultimo anno di gestione ed anche in caso di prosecuzione della gestione ex art. 3 comma 2 della presente convenzione.

CAPO X - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 31 Cauzione, sanzioni pecuniarie e coperture assicurative

1. Si dà atto che Romagna Acque, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione e relativi allegati, costituirà, entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, una idonea cauzione mediante fideiussione prestata da Istituto autorizzato ai sensi dell'art. 1 lett. b) della L. 348/82 con modalità "a prima richiesta" da parte di ciascuna AATO per un importo non inferiore al 5% del ricavo medio di esercizio previsto nel relativo periodo di regolazione, con le modalità ed alle condizioni previste all'art. 75 comma 4 del D. Lgs. 163/2006.

2. Da detta cauzione le A.A.T.O. potranno prelevare l'ammontare delle penali e sanzioni eventualmente dovute da Romagna Acque per inadempienze agli obblighi da essa assunti e previsti nella convenzione e nel Disciplinare Tecnico. Romagna Acque dovrà reintegrare il deposito delle somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione congiunta delle A.A.T.O., pena la risoluzione della convenzione ai sensi del successivo art. 35.

3. La fideiussione opererà per tutto il periodo di validità della convenzione e fino a dichiarazione liberatoria rilasciata dalle A.A.T.O., su istanza di Romagna Acque.

4. Fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incumbenti a Romagna Acque, questa dovrà comunque garantire la copertura dei rischi derivanti dalla gestione, per danni causati alle A.A.T.O. ed a terzi, per tutto il periodo di validità della convenzione, mediante copertura assicurativa per danni da qualunque causa determinati a beni esistenti o di nuova realizzazione, strumentali all'espletamento del servizio, copertura assicurativa di responsabilità civile verso le A.A.T.O., i terzi in generale ed i prestatori di lavoro, con idonei massimali di garanzia.

5. Qualora durante lo svolgimento del servizio la stessa Romagna Acque arrechi danni agli impianti e alle reti utilizzati per la fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato, in ogni caso darne comunicazione scritta alle A.A.T.O..

Articolo 32 Penali

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nella convenzione e nei relativi allegati, o di comportamento omissivo o commissivo di Romagna Acque suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità della gestione ed il raggiungimento degli obiettivi, le A.A.T.O. medesime trasmetteranno a Romagna Acque formale lettera di contestazione e, se del caso,

provvederanno all'addebito di penali sulla cauzione di cui all'art. 31 commisurate alla gravità dell'inosservanza e al danno eventualmente subito da esse o dagli Enti locali associati. È facoltà di ciascuna AATO contestare al gestore eventuali inadempimenti di mero rilievo locale.

A Romagna Acque saranno applicate le penali previste dal presente articolo in caso di:

- a) mancato rispetto dei tempi di attuazione dei singoli investimenti previsti dai Piani. In tal caso verrà determinata una penale pari al 5 % del valore dell'opera non realizzata. Il disciplinare tecnico definirà le modalità di applicazione di tale penale per i periodi di regolazione tariffaria successivi al primo. Per il primo periodo tariffario, tale penale, calcolata con riferimento alla singola annualità, verrà applicata al termine del periodo di regolazione, solo qualora perduri la non completa realizzazione dell'opera e il valore dell'importo realizzato non sia almeno pari al 70 % del valore totale previsto dal Piano per il relativo intervento.
- b) mancato raggiungimento degli standard di cui all'art. 17 della convenzione, secondo le modalità di cui al Disciplinare Tecnico;
- c) omessa o ritardata comunicazione delle varianti al programma degli interventi o al modello gestionale di cui all'art. 18 della convenzione;
- d) omessa o ritardata comunicazione dei dati sul servizio di cui all'art. 22 della convenzione, secondo le modalità di cui al Disciplinare Tecnico;
- e) mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 23 della convenzione.

2. È comunque fatta salva la possibilità delle A.A.T.O. di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

3. Romagna Acque può inoltrare alle A.A.T.O. istanza di disapplicazione delle penali quando ritenga di poter dimostrare la propria estraneità e la mancanza di colpa.

4. Le somme derivanti dall'applicazione delle penali sono incamerate dalle Agenzie.

5. Nei casi previsti dal Disciplinare Tecnico, Romagna Acque è tenuta al pagamento di una penale qualora si verificassero scostamenti dei volumi fissati dal Piano per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa superiori ai limiti di tolleranza fissati nel Disciplinare stesso. L'entità della penale è stabilita dal Disciplinare tecnico in misura percentuale sul fatturato del servizio di fornitura all'ingrosso dell'anno in cui è riscontrata la violazione.

Articolo 33 Sostituzione provvisoria

1. In caso di inadempienza grave di Romagna Acque, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità della gestione di fornitura all'ingrosso, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure la fornitura non venga eseguita che parzialmente per dolo o colpa grave di Romagna Acque, le A.A.T.O. potranno prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio di Romagna Acque, compresa la provvisoria sostituzione di Romagna Acque stessa nella funzione di gestore del SFA.

2. Le A.A.T.O. potranno sostituire Romagna Acque anche nell'ipotesi di cui all'art. 18 per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati.

3. La sostituzione di Romagna Acque, nei casi previsti dai commi 1 e 2, deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale le A.A.T.O. contestano a Romagna Acque l'inadempimento riscontrato intimandole di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

4. Ove ricorrano le condizioni di cui al Disciplinare Tecnico, le A.A.T.O. hanno facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari, quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo a Romagna Acque, senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 34 Comunicazione di modificazioni soggettive

1. È fatto assoluto divieto a Romagna Acque, pena la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi del successivo art. 35, di effettuare modificazioni soggettive che comportino la perdita, in capo alla stessa Romagna Acque, dei requisiti di cui all'art. 113 comma 4 lett. a) del d. lgs. 267/2000.

2. Romagna Acque si impegna a trasmettere senza indugio alle A.A.T.O. qualunque eventuale variazione dei requisiti di cui al comma 1. In particolare, al di fuori dei casi previsti dall'art. 10, comma 4, lett. a) della legge regionale n. 25/1999, qualora Romagna Acque sia interessata da modificazioni soggettive derivanti da scorporo di rami d'azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, ovvero da modificazioni comportanti variazione dei requisiti in base ai quali Romagna Acque è stata individuata nel ruolo di gestore del SFA, Romagna Acque stessa è tenuta a comunicare entro e non oltre 30 giorni siffatte operazioni alle A.A.T.O., le quali, se non vi ostano gravi motivi, autorizzeranno alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato fino alla scadenza della convenzione.

3. La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al comma 2 è causa di risoluzione di diritto della convenzione. Il mancato rispetto del diniego dell'autorizzazione espresso dalle A.A.T.O. alle modificazioni societarie di cui al secondo comma è causa di risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art 35.

Articolo 35 Risoluzione della convenzione

1. La presente convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento di Romagna Acque o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.

2. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando Romagna Acque non abbia posto in essere la gestione alle condizioni essenziali fissate dalla convenzione o in caso di interruzione totale e prolungata della fornitura al di fuori di cause di forza maggiore, le A.A.T.O. potranno decidere la risoluzione della convenzione.

3. Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi dell'art.1456 C.C.:

- il subaffidamento della gestione in violazione dell'art. 29, salvo quanto consentito nel comma 2 dell'articolo medesimo;
- la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive di cui all'art. 34;
- il mancato rispetto del diniego dell'autorizzazione alle modificazioni societarie previste dall'art. 34;
- il mancato reintegro della cauzione in misura pari alla somma prelevata, entro 15 giorni dalla comunicazione congiunta delle A.A.T.O..

4. Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:

- a) ripetute gravi deficienze nella gestione della fornitura all'ingrosso;
- b) ripetute gravi inadempienze ai disposti della convenzione.

5. Nei casi indicati dalle lettere a) e b) del comma che precede, ai sensi dell'art. 1454 C.C. le A.A.T.O., a mezzo di regolare diffida, sono tenute a concedere a Romagna Acque un congruo termine per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto della convenzione.

6. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate a Romagna Acque e le A.A.T.O. avranno facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 36 Foro competente

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione, saranno devolute secondo competenza al giudice ordinario (Foro di Forlì) o al giudice amministrativo (Foro di Bologna).

CAPO XI - NORME FINALI

Articolo 37 Clausola interpretativa

Posto che la gestione della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato è qualificabile come servizio pubblico e che le A.A.T.O. hanno come proprio scopo istituzionale la tutela della collettività dei cittadini-utenti, resta convenuto che tutte le disposizioni della presente convenzione, del Disciplinare Tecnico e degli altri allegati alla convenzione che dovessero risultare di dubbia o non chiara interpretazione, dovranno essere interpretate nel senso più favorevole ai cittadini-utenti (*favor utentis*).

Qualsiasi modifica o integrazione della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto.

Alla presente Convenzione viene allegato il Piano di prima attivazione per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa per il periodo 2009-2012, fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea dell'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Forlì-Cesena. Dell'avvenuta ratifica verrà data comunicazione alle altre Parti.

La presente convenzione è stata redatta in n. 4 originali ed è composta da n. 21 facciate dattiloscritte e numerate progressivamente.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Forlì, 30.12.2008

Per l'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Ravenna prot. 1093 del 31.12.2008

Il Direttore

Sergio Baroni

Per l'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Forlì-Cesena prot. 2248 del 30.12.2008

Il Presidente

Massimo

Per l'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Rimini prot. 600A/2008 del

Il Direttore

Carlo Casadei

Per Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. prot. 9457

del 30.12.2008

Il Presidente

Ariana Bocchini

Romagna Acque approva specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., tra le clausole di cui alla presente convenzione, quelle appresso riportate:

art. 4 (Obblighi e responsabilità di Romagna acque); art. 5 (Perimetro del servizio); art. 6 (Attività ulteriori e attività connesse alla fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato); Art. 7 (Dotazione di Romagna Acque); art. 8 (Consegna delle opere, impianti e reti); art. 14 (Piano e risorse finanziarie); art. 15 (Tariffa del servizio); art. 18 (Varianti al programma degli interventi e al modello gestionale); art. 21 (Controllo da parte delle Agenzie e della Regione); art. 22 (Comunicazione dati sulla gestione); art. 29 (Divieto di cessione della convenzione e di subaffidamento della gestione); art. 30 (Rimessione della gestione); art. 32 (Penali); art. 33 (Sostituzione provvisoria); art. 34 (Comunicazione di modificazioni soggettive); art. 35 (Risoluzione della convenzione).

Per Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.


Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, Romagna Acque acconsente al trattamento dei propri dati ed alla relativa comunicazione a terzi in relazione ad obblighi di legge e per finalità connesse all'instaurazione del rapporto contrattuale ed alla successiva gestione della convenzione.

Per Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Forlì-Cesena
Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Ravenna
Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Rimini

**PIANO DI PRIMA ATTIVAZIONE
PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
FORNITURA ALL'INGROSSO DELLA RISORSA
PER IL PERIODO 2009-2012**





INDICE

<u>PREMESSA</u>	4
<u>1. LA FORNITURA IDRICA ALL'INGROSSO PER USI CIVILI</u>	6
<u>2. LA DOTAZIONE IMPIANTISTICA ESISTENTE E IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI</u>	8
<u>3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE</u>	11
<u>4. TRATTAMENTO DELL'INFLAZIONE</u>	14
<u>5. IL LIMITE DI PREZZO K_n</u>	14
<u>6. I COSTI OPERATIVI</u>	15
<u>7. ULTERIORI VOCI DI COSTO TRASFERITE</u>	19
<u>8. IL PIANO D'AMMORTAMENTO</u>	21
<u>9. LA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO</u>	23
<u>10. LA TARIFFA DI RIFERIMENTO</u>	26
<u>11. LE TARIFFE ALL'INGROSSO NEI TRE AMBITI TERRITORIALI</u>	28
<u>12. DETTAGLIO DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI</u>	29
<u>13. PIANO D'AMMORTAMENTO E CAPITALE INVESTITO NETTO</u>	31



INDICE DELLE FIGURE E DELLE TABELLE

<u>Tab. 1 - Il Piano di fornitura per ATO (mc)</u>	6
<u>Tab. 2 - Il Piano di fornitura per risorsa (mc)</u>	7
<u>Tab. 3 - Gli investimenti del Piano ed il relativo riconoscimento in tariffa (migliaia di Euro)</u>	10
<u>Fig. 1 - Struttura gestionale al 1 gennaio 2009</u>	13
<u>Tab. 4 - Inflazione programmata</u>	14
<u>Tab. 5 - Il limite di prezzo k</u>	14
<u>Tab. 6 - Costi operativi Acquedotto di Romagna e potabilizzatori mobili, inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)</u>	15
<u>Tab. 7 - Contributi in conto esercizio (migliaia di Euro)</u>	16
<u>Tab. 8 - Costi operativi Fonti locali ATO Forlì-Cesena, inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)</u>	17
<u>Tab. 9 - Costi operativi Fonti locali ATO Ravenna, inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)</u>	17
<u>Tab. 10 - Costi operativi Fonti locali ATO Rimini, inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)</u>	18
<u>Tab. 11 - Totale costi operativi Fonti locali, inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)</u>	18
<u>Tab. 12 - Costi operativi riconosciuti, inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)</u>	18
<u>Tab. 13 - Le componenti tariffarie trasferite, ATO Forlì-Cesena (migliaia di Euro)</u>	19
<u>Tab. 14 - Le componenti tariffarie trasferite, ATO Ravenna (migliaia di Euro)</u>	19
<u>Tab. 15 - Le componenti tariffarie trasferite, ATO Rimini (migliaia di Euro)</u>	19
<u>Tab. 16 - I ricavi per la fornitura all'ingrosso a seguito del trasferimento della gestione (migliaia di Euro)</u>	20
<u>Tab. 17 - Ammortamento (migliaia di Euro)</u>	22
<u>Tab. 18 - Capitale investito al 31/12 (migliaia di Euro)</u>	24
<u>Tab. 19 - Remunerazione massima di progetto del capitale investito (migliaia di Euro)</u>	25
<u>Tab. 20 - Ricavi e tariffa massima applicabile, compresa inflazione (migliaia di Euro)</u>	26
<u>Tab. 21 - Componenti tariffarie con remunerazione ridotta e TRM (migliaia di Euro)</u>	27
<u>Tab. 22 - TRM applicata in ciascun Ambito</u>	28



PREMESSA

Lo sviluppo del Piano di prima attivazione è relativo al primo periodo di regolazione tariffaria per il produttore all'ingrosso, in particolare è dettagliato sugli esercizi dal 2009 al 2012 compresi. Lo sviluppo del piano tariffario coincide con lo sviluppo temporale dei piani delle singole ATO per la gestione del SII.


Il presente Piano è sviluppato sulla base delle valutazioni concordate con il Gestore del SII, in merito alla gestione delle fonti locali, inoltre si considerano i vincoli e gli indirizzi fissati nel Protocollo d'intesa fra le AATO romagnole e Romagna Acque S.p.A. del 30/11/07. In particolare, il Piano di prima attivazione recepisce gli indirizzi e i vincoli posti nel suddetto Protocollo riguardo i limiti posti al tasso di remunerazione del capitale investito ed alla dinamica tariffaria.

La valutazione delle componenti di costo, trasferite dal Gestore del SII al produttore all'ingrosso, sono state concordate con tutti i soggetti coinvolti. Per quanto riguarda le componenti tariffarie connesse ai cespiti oggetto di subentro nella gestione da parte di Romagna Acque, si è fatto riferimento alla situazione contabile fornita dal gestore del SII alla data del 30/09/2008. Le immobilizzazioni in corso non comprese in detta situazione contabile e le migliorie dell'ultimo trimestre 2008, a seguito di specifica consuntivazione al 31/12/2008, comporteranno il trasferimento di ulteriori ammortamenti e remunerazione dal Gestore del SII al produttore all'ingrosso. Tale trasferimento di componenti tariffarie comporterà una revisione tariffaria anticipata alla fine del 2010, fatto salvo il principio dell'invarianza della tariffa finale all'utenza.

Le finalità del progetto Società delle Fonti

Per le caratteristiche geomorfologiche e ambientali della Romagna, fin dagli anni '60 gli enti locali hanno voluto e realizzato la diga e l'Acquedotto della Romagna, un patrimonio impiantistico che costituisce il punto di riferimento per un utilizzo della risorsa idrica di Ridracoli a livello di sistema integrato nell'ambito territoriale della Romagna. Le opere di captazione e produzione idrica dell'acqua di Ridracoli si trovano nell'ambito territoriale di Forlì-Cesena e gli impianti di distribuzione primaria sono collocati nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini al fine di integrare le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale.

Nell'ottica di medio-lungo termine per l'approvvigionamento idrico alla Romagna, gli enti locali delle tre province romagnole hanno dato avvio negli anni 2000 al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti". Il progetto è finalizzato all'unificazione,

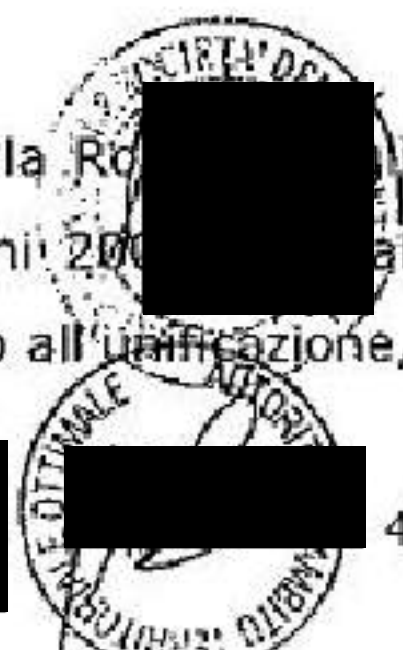

in capo ad una società a totale partecipazione pubblica, della titolarità e della gestione di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili.

Negli anni 2004-2005 è stata realizzata la prima fase del progetto relativa al conferimento in capo alla società delle dotazioni patrimoniali realizzate dai Comuni, relativi alle principali fonti di produzione e distribuzione primaria della risorsa idrica ad usi civili presenti nel territorio romagnolo. La seconda fase del progetto consiste nel trasferimento della gestione delle suddette fonti e dei relativi impianti di distribuzione primaria dal Gestore al produttore all'ingrosso come previsto sia nei citati atti sia nelle convenzioni di gestione del SII vigenti fra le AATO e il Gestore.

I nuovi impianti in corso di realizzazione collocati nell'area ravennate per l'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal Po costituiscono una dotazione impiantistica di sistema e non locale e saranno in grado di integrare la fornitura idrica romagnola in una logica di medio-lungo termine. Dall'altra parte anche gli interventi in parte già individuati e in parte in corso di definizione per migliorare la qualità della risorsa di falda nelle aree del riminese e del cesenate, risorsa imprescindibile per continuare ad assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni, fanno parte di una pianificazione impiantistica a livello di sistema territoriale a scala romagnola.

Il Piano degli Investimenti prevede il completamento e la messa in esercizio entro il 2012 di opere per un valore complessivo di 134,7 milioni di Euro. La realizzazione del Piano d'Investimenti negli anni 2009-2012 si aggiunge ad una dotazione impiantistica esistente riconosciuta in tariffa che, al netto dei fondi di ammortamento, sarà valutata al 31.12.2008 in 256,3 milioni di euro. Le componenti di costo relative al capitale esistente e di nuova realizzazione sommate ai costi di gestione determinano dinamiche tariffarie particolarmente significative.

I vincoli e gli indirizzi del Protocollo, puntualmente recepiti nella "Convenzione per la regolamentazione della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti Territoriali Ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini" e declinati in termini operativi nel Piano di prima attivazione, sono posti con l'intento di limitare gli incrementi tariffari per l'utenza.

MALE
AUTORITÀ



1. LA FORNITURA IDRICA ALL'INGROSSO PER USI CIVILI

Il fabbisogno idropotabile

Si valuta il fabbisogno nel breve periodo per soddisfare la domanda negli anni del Piano di prima attivazione 2009 -2012 con il più equilibrato mix quali-quantitativo delle risorse disponibili.

Successivamente, nell'ottica di medio-lungo termine, si pianifica l'utilizzo sia delle risorse già disponibili che di quelle potenziali per l'accesso alle quali sono necessari investimenti e tempi significativi.

I quantitativi considerati nel presente Piano di prima attivazione sono da intendersi come volumi erogati da parte del fornitore idrico all'ingrosso al gestore del SII e sono coerenti con i quantitativi considerati nei Piani tariffari per gli anni 2009-2012 sottoscritti fra il gestore del SII e le tre AATO della Romagna. L'invarianza dei volumi immessi in rete nel 2009-2012, volumi che d'altra parte confermano i dati medi consuntivati del periodo 2005-2008, costituisce un obiettivo coerente con le politiche di risparmio idrico e il contenimento delle perdite in rete che, a loro volta rappresentano finalità poste a livello di pianificazione regionale a tutti i soggetti che operano nel servizio idrico sia a livello di regolatori che di gestori.

Tab. 1 - Il Piano di fornitura per ATO (mc)

	2009	2010	2011	2012
ATO Forlì-Cesena	32.946.862	32.946.862	32.946.862	32.946.862
ATO Ravenna	34.659.219	34.659.219	34.659.219	34.659.219
ATO Rimini	39.349.967	39.349.967	39.349.967	39.349.967
TOTALE	106.956.048	106.956.048	106.956.048	106.956.048

Il piano di produzione e fornitura idrica per il periodo 2009-2012 tiene conto della necessità di dare risposta al territorio degli ambiti ottimali delle tre province romagnole; è sviluppato secondo i seguenti criteri e parametri:

- il riferimento è quello di un anno idrologico medio con il massimo utilizzo possibile delle risorse di superficie;
- le quantità prelevate e derivate dalle singole fonti tengono conto dei limiti delle concessioni;

- le quantità immesse in rete tengono conto dei vincoli impiantistici delle infrastrutture esistenti e dell'entrata in funzione nel 2012 dei nuovi impianti.

Le previsioni fatte potranno subire variazioni anche significative in base all'andamento meteorologico.

Tab. 2 - Il Piano di fornitura per risorsa (mc)


	2009	2010	2011	2012
Ridracoli	22.567.000	22.567.000	22.567.000	22.567.000
Falde e sorgenti gestite dal 01/01/09 (*)	10.379.862	10.379.862	10.379.862	10.379.862
Falde e sorgenti gestite da HERA (**)	1.519.931	1.519.931	1.519.931	1.519.931
ATO Forlì-Cesena	34.466.793	34.466.793	34.466.793	34.466.793
(*) dal 2012 prevista l'entrata in funzione del nuovo imp. di trattamento dell'acqua di falda a Cesena per la fase di collaudo				
(**) dal 2011 previsto il trasferimento della gestione a Romagna Acque - Società delle Fonti				
Ridracoli	21.106.000	21.106.000	21.106.000	21.106.000
Po (***)	13.553.219	13.553.219	13.553.219	13.553.219
ATO Ravenna	34.659.219	34.659.219	34.659.219	34.659.219
(***) dal 2012 prevista l'entrata in funzione del nuovo imp. di potabilizzazione di Ravenna				
Ridracoli	11.832.197	11.832.197	11.832.197	11.832.197
Falde, sorgenti, diga Conca	27.517.770	27.517.770	27.517.770	27.517.770
Falde, sorgenti gestite da HERA (****)	40.123	40.123	40.123	40.123
ATO Rimini	39.390.090	39.390.090	39.390.090	39.390.090
(****) dal 2011 previsto il trasferimento della gestione a Romagna Acque - Società delle Fonti				
Ridracoli	55.505.197	55.505.197	55.505.197	55.505.197
PO	13.553.219	13.553.219	13.553.219	13.553.219
falde, sorgenti, diga Conca	39.457.686	39.457.686	39.457.686	39.457.686
TOTALE PER RISORSA	108.516.102	108.516.102	108.516.102	108.516.102

2. LA DOTAZIONE IMPIANTISTICA ESISTENTE E IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Le linee guida in merito alla dotazione impiantistica possono così riassumersi :

- in un'ottica di lungo periodo, dotare il territorio, per il tramite della società, di una struttura impiantistica adeguata a garantire l'approvvigionamento idropotabile della Romagna intervenendo sia con nuovi investimenti sia valorizzando il patrimonio esistente con piani di manutenzioni straordinarie e di migliorie;
- disporre di opportuni surplus sia per quanto riguarda il dimensionamento di reti e impianti sia per quanto attiene alle disponibilità idriche, il tutto in un contesto di pianificazione impiantistica che si pone gli obiettivi di aumentare la sicurezza del servizio di fornitura idrica all'ingrosso, di rendere più omogenea la qualità dell'acqua distribuita su tutto il bacino di riferimento migliorando la qualità media della risorsa erogata e garantire appieno il bacino turistico romagnolo;
- ridurre il prelievo da falda, sostituendolo con acque di superficie o di falde meno profonde, con la modifica ed il potenziamento del campo pozzi del riminese in coerenza con le indicazioni regionali;
- l'attività di pianificazione impiantistica si deve coniugare con politiche tariffarie compatibili sia da un punto di vista sociale (quindi dinamiche tariffarie contenute per evitare incrementi eccessivi sui cittadini-consumatori) sia da un punto di vista economico-aziendale (quindi livelli tariffari che consentano la sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti in capo alla società che li realizza e li gestisce); tale obiettivo può attuarsi fissando delle priorità, in ordine alla tempistica di realizzazione delle singole opere, che tengano conto della valenza strategica dei singoli interventi.

Il piano degli investimenti prevede la realizzazione e l'entrata in funzione di circa 134,7 milioni di euro di infrastrutture e può articolarsi in tre capitoli:

- interventi atti a mettere in circolo nuove risorse idriche per circa 20 ml di mc annui: 76,7 milioni di euro
 - interventi di manutenzioni straordinarie, miglioria e potenziamento atti a migliorare la qualità della risorsa distribuita relativa alle fonti locali: 19 milioni di euro
- 

- interventi di manutenzioni straordinarie, migliorie e potenziamento dell'Acquedotto di Romagna: 38,9 milioni di euro (per i quali sono previsti contributi a fondo perduto per 0,8 milioni di euro)

Parte di questi investimenti sono attualmente in corso, altri cominceranno nel periodo 2009-2012.


L'ammontare complessivo degli interventi a carico della tariffa risulta pari a 132 milioni di euro.

Per il calcolo della penale prevista all'art. 32 comma 1 lett. a) della Convenzione si farà riferimento al valore complessivo dell'opera e non al valore riconosciuto in tariffa.

Il Piano prevede che la totalità delle opere risulti realizzata ed entri in funzione nel periodo del piano stesso. L'unica eccezione riguarda l'intervento di realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque del CER per usi potabili e industriali a Faenza che verrà completato negli anni 2013-2014. Relativamente alla realizzazione dei nuovi impianti di produzione di acqua potabile di Cesena e Ravenna, si prevede la fase di collaudo nel 2012 e conseguentemente l'entrata in funzione a regime avverrà nel 2013.

Entro l'anno 2012 Romagna Acque dovrà predisporre uno studio di fattibilità tecnico-economica relativo al progetto di utilizzo dell'invaso di Quarto a fini idropotabili.

Nella tabella successiva si riportano gli investimenti ammessi in tariffa.



Tab. 3 - Gli investimenti del piano ed il relativo riconoscimento in tariffa (migliaia di Euro)

	Al 31/12/2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTALE	TOTALE in tariffa
By-pass Galleria Derivazione Com.Mont.cond.princ.	ACQ. FOM. ACQ. ROM.	1.323 400	1.985 644	1.442	750		5.500 1.044	5.412 1.027
Man.Cond.Principale-Forbaiaola	ACQ. ROM.	280	1.018	1.693	459		3.450	3.395
Consolid.strada accesso Diga	ACQ. ROM.	350	760	1.028	500	51	2.689	2.646
Rete colleg. Serb.Covignano	ACQ. ROM.	200	10	44	1.100	496	1.850	1.820
Serbatoio Covignano	ACQ. ROM.	1.029	1.865	1.662	144		4.700	4.625
Rete S Santarcangelo	ACQ. ROM.	64			1.200	336	1.600	1.574
Rete S. Giovanni - Morciano	ACQ. ROM.	101	67	21	130	2.400	3.330	5.952
Riordino schema Idr.Conca	ACQ. ROM.	119	625	65	1.000	991	2.800	2.755
Ripr.attrav.fiume Conca	ACQ. ROM.		305				305	300
Manut.straord/migl	ACQ. ROM.		1.576	2.000	2.000	1.200	8.761	7.787
Cabina Vecchiazano	ACQ. ROM.	91	114				205	202
NIP 2	NUOVE FONTI	1.426	705	600	18.950	14.100	3.769	38.917
Rete interconnes.ravenna	NUOVE FONTI	1.224	695	5.500	13.100	12.932	33.451	32.916
Potab.e interc.Faentino	NUOVE FONTI	25	33	50	104	1.213	2.250	3.616
Pozzi cesena:imp.tratt.	FONTI LOCALI	299	64	227	500	5.600	2.711	9.401
Manut. rete acq. Bagno di Romagna	FONTI LOCALI				100	190	300	590
Manut. Str. campi pozzi ATO FC	FONTI LOCALI			300	400	300	1.300	1.300
Adeguamento centrale Alberazzo (S. Mauro P.)	FONTI LOCALI			100	200	100	400	400
Potenziamento adduttrici ATO FC	FONTI LOCALI						500	500
Manut. Str. impianti ATO RA	FONTI LOCALI			600	400	400	1.800	1.800
Nuovo campo pozzi in loc. Molino Ronci	FONTI LOCALI			1.000	1.500		2.500	2.500
Ristrutt. Imp. Potab. Bellaria	FONTI LOCALI						0	0
Manut. Str. impianti ATO RN	FONTI LOCALI			650	650	650	2.600	2.600
TOTALE		6.931	10.466	16.982	43.187	40.959	16.195	134.720
TOTALE IN TARIFFA		6.825	9.712	16.510	42.556	40.419	16.014	132.036

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

La struttura aziendale è articolata per aree e uffici di staff i cui responsabili rispondono direttamente agli amministratori con delega. Al 1/1/2009, data di inizio del presente Piano di prima attivazione la struttura complessivamente è costituita da 134 unità, di cui 107 dedicate al servizio di produzione acqua all'ingrosso e 27 dedicate ai servizi comuni, risulta così articolata:

Area Produzione e Gestione:

La gestione del complesso degli impianti dell'Acquedotto della Romagna, delle fonti locali nonché dei nuovi impianti previsti nel Piano fa capo a questa area. Per la complessità tecnico-organizzativa connessa al trasferimento di ramo d'azienda, nel periodo 2009-2012 l'organico di quest'area potrà subire degli incrementi a seguito della valutazione a consuntivo alla fine del 2010; inoltre, dal 2011 è previsto il trasferimento della gestione di ulteriori fonti di produzione nei territori delle Province di Forlì-Cesena e Rimini. Tali operazioni potrebbero riconoscere ulteriori costi al produttore all'ingrosso ed al contempo si scorporerà la stessa quota al Gestore del SII. L'assestamento gestionale non inciderà in alcun modo sulla tariffa all'utente finale.

N° 1 dirigente e n° 89 dipendenti.

Area Progettazione e Realizzazione Lavori:

Le fasi di progettazione e di realizzazione delle opere previste nel Piano sono di competenza di quest'area.

N° 7 dipendenti.

Area Gare Appalti, Espropri e Patrimonio:

Le attività riconducibili alla scelta del contraente per la realizzazione delle opere del Piano, tutte le attività di esproprio e asservimento delle aree connesse alla realizzazione delle suddette opere nonché la cura del patrimonio aziendale fanno capo a quest'area.

N° 10 dipendenti.

Area Amministrazione, Finanza e Servizi Generali:

Tutte le attività di tipo amministrativo relative alla contabilità e alla redazione del bilancio, la gestione del personale, la gestione finanziaria nonché tutte le attività riconducibili ai servizi generali (protocollo, centralini, ecc....) fanno capo a quest'area.

N° 1 dirigente e n° 11 dipendenti


Uffici di Staff:

Le attività accessorie all'attività principale quali la gestione del patrimonio a fini turistici e la gestione delle infrastrutture afferenti le telecomunicazioni, nonché quei servizi di carattere specialistico a supporto dell'intera attività aziendale (legale, qualità e sicurezza, comunicazione) sono ricondotti a specifici uffici di staff.

N° 15 dipendenti.

La società è certificata per quanto concerne i sistemi di qualità, ambiente e sicurezza ed ha adottato un modello di organizzazione gestione e controllo conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001

Fig. 1 - Struttura gestionale al 1 gennaio 2009

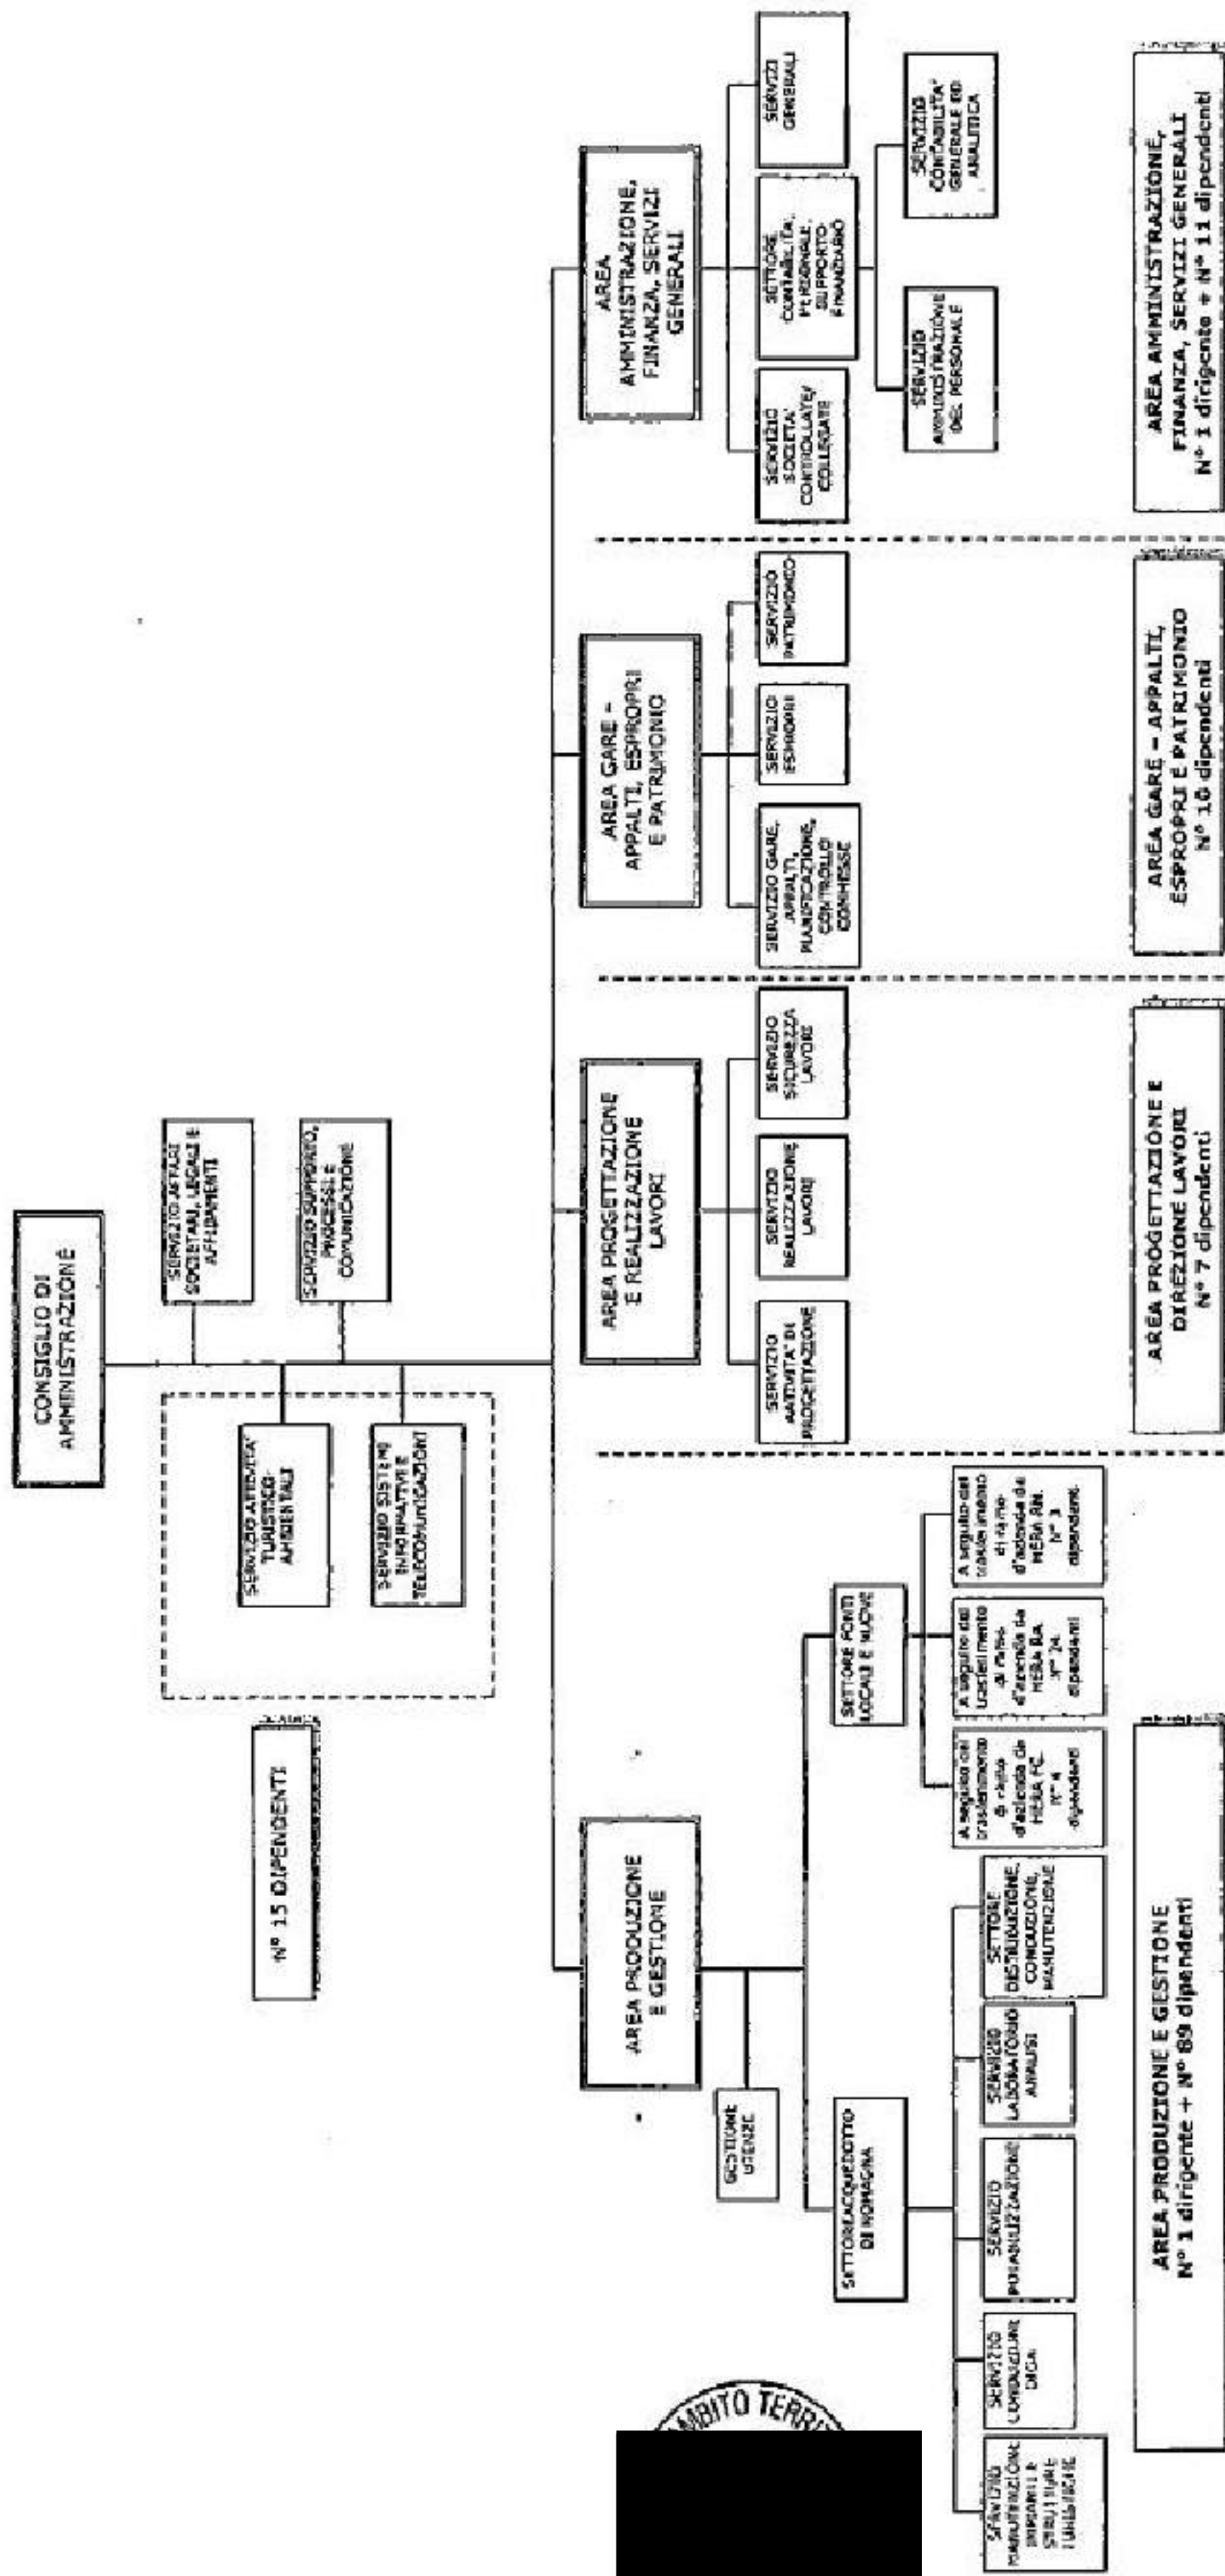

TOTALE DIPENDENTI
N° 2 dirigenti + N° 132 dipendenti

4. TRATTAMENTO DELL'INFLAZIONE

Sulla base dei tassi definiti dal più recente Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF 2008) la tariffa tiene conto della dinamica inflazionistica nella componente costi operativi.

Tab. 4 – Inflazione programmata

	2009	2010	2011	2012
Inflazione programmata	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

La tariffa di riferimento sarà adeguata secondo il tasso programmato di inflazione stabilito nel DPEF del relativo anno.

5. IL LIMITE DI PREZZO K_n

Il valore percentuale del limite di prezzo riferito all'anno n , da impiegare per la verifica dei vincoli di incremento imposti dal Metodo tariffario, è stato determinato dalle Agenzie d'ambito secondo la progressione riportata nella tabella seguente.

Tab. 5 – Il limite di prezzo k

	2009	2010	2011	2012
Limite di prezzo	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

6. I COSTI OPERATIVI

La componente relativa ai COSTI OPERATIVI è stata determinata, in analogia alle altre componenti tariffarie relative al capitale investito, secondo le tre classificazioni in cui è stato ripartito il Capitale stesso: Acquedotto della Romagna (Acqua di Ridracoli), Fonti locali, Nuove Fonti (Acqua del PO).

Per quanto riguarda i costi operativi delle fonti locali si applica l'efficientamento previsto dai singoli piani tariffari delle Agenzie, applicato precedentemente al Gestore del SII e trasferito al produttore all'ingrosso: -0,50% per le ATO Forlì-Cesena e Rimini e -0,69% per l'ATO Ravenna (SOT Hera Ravenna).

I costi operativi relativi all'acqua di Ridracoli e ai potabilizzatori mobili

In base alle linee guida del Comitato di Vigilanza delle Risorse Idriche per l'attuazione del un "Sistema di rendicontazione sul Servizio idrico Integrato" e coerentemente a quanto previsto dal "Disciplinare Tecnico" il Gestore all'ingrosso ha definito il proprio sistema contabile per riclassificare sia in termini economici che patrimoniali quanto di competenza del servizio di fornitura idrica all'ingrosso. In specifico i costi operativi in oggetto sono stati nettati dai riaddebiti agli altri sezionali per tener conto della ripartizione delle spese generali, dell'acqua venduta al di fuori dei tre ambiti romagnoli e di quegli interventi manutentivi necessari al corretto funzionamento degli impianti con valenza pluriservizio (acquedotto, telecomunicazioni, energia elettrica). I valori base dei costi operativi sono quelli del budget 2009 con azzeramento dei costi, rispetto agli anni precedenti, per la promozione e la pubblicità.

Tab. 6 – Costi operativi Acquedotto di Romagna e potabilizzatori mobili, inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
B6 - costi materie prime	1.446	1.468	1.490	1.512
B7 - costi per servizi	3.943	4.002	4.062	4.123
di cui EE	802	814	826	839
di cui smaltimento fanghi	100	102	103	105
B8 - costi per godim.beni di terzi	168	171	173	176
B9 - costi del personale	3.866	3.924	3.983	4.043
B11 - variaz.rimanenze mat.prime	0	0	0	0
B12 - accantonamenti	100	102	103	105
B14 - oneri diversi di gestione	468	473	478	484
TOTALE COSTI RICONOSCIUTI	9.991	10.139	10.289	10.442

Fin dall'entrata in funzione dell'Acquedotto di Romagna la società contabilizza annualmente dei contributi in conto esercizio a suo tempo concessi dallo Stato per coprire il previsto disavanzo finanziario e di gestione; al fini della contabilizzazione tariffaria tali contributi sono stati detratti dai costi operativi. Dal 2012 ha inizio l'ultimazione dei primi finanziamenti ottenuti a titolo di contributi in conto esercizio, con progressiva riduzione dei benefici in bilancio; in specifico giungono a scadenza quelli concessi nel 1981.

Tab. 7 - Contributi in conto esercizio (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
Contributi annuali	4.650	4.650	4.650	4.124

I costi operativi relativi alle Fonti Locali

Tali costi tengono conto dei dati comunicati dal Gestore del SII e relativi ad un anno idrologico medio in ciascuno dei tre ambiti territoriali che risultano trasferiti in capo a Romagna Acque con decorrenza 01/01/2009 (personale, utenze di energia elettrica, forniture di materiali). Tali costi sotto riportati con il dettaglio per voce di costo e per singola ATO, sono scorporati dai costi riconosciuti al Gestore del SII e trasferiti al produttore all'ingrosso. In questo modo si assicura l'invarianza della tariffa all'utente a livello complessivo e di ambito.

Per la complessità tecnico-organizzativa connessa al trasferimento del ramo d'azienda relativo a tali fonti, ulteriori costi non trasferiti saranno da valutare a consuntivo alla fine del 2010. La quantificazione di tali costi porterà ad una revisione tariffaria anticipata che potrebbe riconoscere ulteriori costi operativi al produttore all'ingrosso ed al contempo scorporerà la stessa quota al Gestore del SII. L'assestamento tariffario non inciderà in alcun modo sulla tariffa all'utente finale.

I costi operativi indicati nelle tabelle seguenti non comprendono i costi relativi alle fonti di produzione ancora gestite da HERA S.p.A., di cui al momento non è possibile stimare l'entità. Dal 2011, quando si completerà il trasferimento della gestione, saranno riconosciuti ulteriori costi operativi al produttore all'ingrosso ed al contempo verrà scorporata la stessa quota al Gestore del SII. L'assestamento tariffario non inciderà in alcun modo sulla tariffa all'utente finale.

I costi operativi per l'acquedottistica civile delle fonti situate nell'ATO Ravenna comprendono alla voce "B7 - costi per servizi":

1. costi connessi all'approvvigionamento di acqua da CER stimata in Euro 850.000 per l'anno 2009; per gli anni successivi tale valore è stato inflazionato ed efficientato. Eventuali successivi aggiornamenti del costo per l'approvvigionamento dell'acqua del Po tramite il CER saranno sottoposti al soggetto regolatore.
2. la manutenzione del Canale Carrarino e l'utilizzo della Canaletta di Polimeri Europa (ex-ANIC) rispettivamente per Euro 34.000 ed Euro 139.400. Eventuali successivi aggiornamenti di tali componenti di costo saranno sottoposti al soggetto regolatore.

Tab. 8 - Costi operativi Fonti locali ATO Forlì-Cesena, inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
B6 - costi materie prime	95	96	97	98
B7 - costi per servizi	1.539	1.554	1.570	1.586
di cui EE	1.218	1.230	1.242	1.255
di cui smaltimento fanghi	0	0	0	0
B8 - costi per godim.beni di terzi	0	0	0	0
B9 - costi del personale	203	205	207	209
B11 - variaz.rimanenze mat.prime	0	0	0	0
B12 - accantonamenti	0	0	0	0
B14 - oneri diversi di gestione	0	0	0	0
TOTALE COSTI RICONOSCIUTI	1.837	1.855	1.874	1.893

Tab. 9 - Costi operativi Fonti locali ATO Ravenna, inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
B6 - costi materie prime	545	549	554	558
B7 - costi per servizi	1.947	1.967	1.987	2.007
di cui EE	269	275	282	288
di cui smaltimento fanghi	638	643	648	654
B8 - costi per godim.beni di terzi	0	0	0	0
B9 - costi del personale	1.055	1.064	1.072	1.081
B11 - variaz.rimanenze mat.prime	0	0	0	0
B12 - accantonamenti	0	0	0	0
B14 - oneri diversi di gestione	0	0	0	0
TOTALE COSTI RICONOSCIUTI	3.547	3.580	3.613	3.646

Tab. 10 - Costi operativi Fonti locali ATO Rimini, inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
B6 - costi materie prime	90	91	92	93
B7 - costi per servizi	2.050	2.071	2.091	2.112
di cui EE	1.950	1.970	1.989	2.009
di cui smaltimento fanghi	0	0	0	0
B8 - costi per godim.beni di terzi	0	0	0	0
B9 - costi del personale	140	141	143	144
B11 - variaz.rimanenze mat.prime	0	0	0	0
B12 - accantonamenti	0	0	0	0
B14 - oneri diversi di gestione	0	0	0	0
TOTALE COSTI RICONOSCIUTI	2.280	2.303	2.326	2.349

Tab. 11 - Totale costi operativi Fonti locali, inflazionati ed efficientati (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
B6 - costi materie prime	730	736	743	749
B7 - costi per servizi	5.536	5.592	5.648	5.705
di cui EE	3.437	3.475	3.513	3.552
di cui smaltimento fanghi	638	643	648	654
B8 - costi per godim.beni di terzi	0	0	0	0
B9 - costi del personale	1.398	1.410	1.422	1.434
B11 - variaz.rimanenze mat.prime	0	0	0	0
B12 - accantonamenti	0	0	0	0
B14 - oneri diversi di gestione	0	0	0	0
TOTALE COSTI RICONOSCIUTI	7.664	7.738	7.813	7.888

I costi operativi relativi alle Nuove Fonti

Nel 2012 ha inizio la fase di collaudo del nuovo impianto di potabilizzazione di Ravenna; i costi relativi a tale fase sono compresi nell'ambito dell'appalto di progettazione esecutiva e di realizzazione dell'opera e quindi non sono considerati nei costi operativi del 2012.

Tab. 12 - Costi operativi riconosciuti, infla

	2009	2010	2011	2012
TOTALE COSTI ACQUEDOTTO DI ROMAGNA	9.991	10.139	10.289	10.442
TOTALE COSTI FONTI LOCALI	7.664	7.738	7.813	7.888
TOTALE COSTI RICONOSCIUTI	17.655	17.877	18.102	18.330

7. ULTERIORI VOCI DI COSTO TRASFERITE

Oltre ai costi operativi vengono trasferite, al produttore all'ingrosso, ulteriori voci di costo già riconosciute al Gestore del SII:

- ammortamento dei cespiti in affitto al Gestore del SII fino al 31/12/2008;
- ammortamento delle migliorie realizzate dal Gestore del SII fino al 30/09/2008 sui cespiti in affitto;
- la remunerazione del capitale investito per le migliorie sui cespiti in affitto;
- i canoni di concessione riconosciuti a Romagna Acque per le opere conferite in uso al Gestore.

Si riporta il dettaglio per ATO delle componenti sopra individuate, compresi i costi operativi.

Tab. 13 - Le componenti tariffarie trasferite, ATO Forlì-Cesena (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
Costi operativi	1.837	1.855	1.874	1.893
Ammortamenti	83	83	83	74
Remunerazione	78	75	72	68
Canoni di concessione	11	11	11	11
TOTALE COSTI TRASFERITI	2.009	2.024	2.039	2.046

Tab. 14 - Le componenti tariffarie trasferite, ATO Ravenna (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
Costi operativi	3.547	3.580	3.613	3.646
Ammortamenti	176	169	162	162
Remunerazione	123	125	125	120
Canoni di concessione	166	158	151	144
TOTALE COSTI TRASFERITI	4.012	4.032	4.051	4.072

Tab. 15 - Le componenti tariffarie trasferite, ATO Rimini (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
Costi operativi	2.280	2.303	2.326	2.349
Ammortamenti	364	363	357	346
Remunerazione	111	107	103	99
Canoni di concessione	55	55	55	55
TOTALE COSTI TRASFERITI	2.810	2.828	2.841	2.849

Tali costi vengono scorporati dalle relative componenti tariffarie riconosciute al Gestore del SII, contestualmente sono riconosciuti al produttore all'ingrosso.

Per ottenere l'invarianza delle tariffe di riferimento all'utente finale, al costo di acquisto dell'acqua di Ridracoli vengono aggiunti questi costi valorizzati in accordo con il Gestore del SII.

I costi di acquisto di acqua per il Gestore del SII corrispondono ai ricavi per il produttore all'ingrosso.

Tab. 16 - I ricavi per la fornitura all'ingrosso a seguito del trasferimento della gestione (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
ATO Forlì-Cesena	11.267	11.560	11.861	12.163
<i>di cui da Ridracoli</i>	9.258	9.536	9.822	10.116
<i>di cui da Fonti locali</i>	2.009	2.024	2.039	2.046
ATO Ravenna	12.915	13.203	13.497	13.801
<i>di cui da Ridracoli</i>	8.903	9.170	9.445	9.729
<i>di cui da Fonti locali</i>	4.012	4.032	4.051	4.072
ATO Rimini	7.276	7.428	7.579	7.729
<i>di cui da Ridracoli</i>	4.466	4.600	4.738	4.880
<i>di cui da Fonti locali</i>	2.810	2.828	2.841	2.849
TOTALE RICAVI	31.457	32.190	32.937	33.692

8. IL PIANO D'AMMORTAMENTO

Lo sviluppo del piano d'ammortamento è articolato secondo tre aggregazioni principali: Acquedotto della Romagna, Nuove Fonti e Fonti Locali.

La metodologia e i criteri utilizzati per lo sviluppo del piano ammortamenti può così sintetizzarsi:

- a) per i cespiti relativi all'Acquedotto di Romagna: proiezione degli ammortamenti secondo le vite utili residue dei singoli cespiti riconosciuti come ricostruite sulla base del preconsuntivo 2008;
- b) per i nuovi cespiti che entrano in funzione nel periodo 2009-2012: gli ammortamenti discendono dall'utilizzo delle aliquote d'ammortamento come indicate per singolo cespite; trattasi di aliquote ritenute mediamente rappresentative della vita utile economico-tecnica dei cespiti;
- c) per i cespiti relativi alle Fonti Locali e fino al 31/12/2008 in affitto ad HERA: sono stati calcolati secondo i piani di ammortamento riportati nei Piani delle singole ATO;
- d) per i cespiti relativi alle Fonti Locali e fino al 31/12/2008 concessi in uso gratuito ad HERA: dal 2005 al 2008 non sono stati ammortizzati perché considerati non funzionalmente collegati all'esercizio dell'attività d'impresa; sono stati calcolati secondo il piano d'ammortamento originario senza operare svalutazioni relative a perdite durevoli di valore. Nel caso in cui vengano rideterminati valori residui inferiori, il piano d'ammortamento verrà conseguentemente aggiornato.

Gli ammortamenti relativi all'Acquedotto di Romagna dal 2011 si riducono per l'ultimazione del processo di ammortamento di alcuni beni e la relativa entità è significativamente superiore all'aumento generato dall'entrata in funzione di nuovi cespiti fino al 2013.


Gli ammortamenti relativi alle Fonti Locali nel periodo 2009-2012 si riferiscono pressoché interamente ai cespiti già in uso da parte di HERA. Dal 2012 inizia la fase di collaudo del nuovo impianto di trattamento dell'acqua dei pozzi di Cesena, il relativo inizio del processo d'ammortamento decorrerà dal 2013 al termine del collaudo.

Gli ammortamenti relativi alle Nuove Fonti decorrono dal 2012 per la rete di interconnessione dell'Acquedotto della Romagna; in tale anno inizia la fase di collaudo

dell'impianto di potabilizzazione di Ravenna il cui ammortamento è previsto a decorrere dal 2013 al termine del collaudo.

Tab. 17 - Ammortamento (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA	13.472	13.353	12.473	9.635
CESPITI EX-AFFITTO	446	439	426	407
CESPITI CONFERITI DAI COMUNI	1.188	1.188	1.188	1.188
MIGLIORIE HERA	176	176	176	176
TOTALE AMMORTAMENTI CAPITALE INIZIALE	15.283	15.155	14.263	11.405
NUOVI CESPITI ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA	613	1.281	1.462	1.633
NUOVE FONTI	0	0	0	823
NUOVI CESPITI FONTI LOCALI	33	164	294	370
TOTALE AMMORTAMENTI CAPITALE SUCCESSIVO	646	1.445	1.756	2.826
TOTALE AMMORTAMENTI	15.929	16.600	16.019	14.230



9. LA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

Nella determinazione della componente di remunerazione rispetto a quanto stabilito nell'art. 14 co. 2 del DPGR 49/2006 le Agenzie hanno definito il margine $m=0\%$. Conseguentemente, il tasso di remunerazione rilevato quale media dei valori IRS a 15 anni nei 30 giorni immediatamente precedenti al periodo tariffario che si va a rinnovare risulta essere 3,92%.

Le percentuali definite di seguito sono da intendersi quali limiti massimi per il periodo di regolazione 2009-2012. Nell'intento di limitare gli incrementi tariffari per l'utenza, nel primo periodo di regolazione il produttore all'ingrosso ha condiviso la decisione di rinunciare ad una quota di remunerazione del capitale. Di fatto, la remunerazione effettiva sarà determinata dalla differenza tra ricavi complessivi, compresi i contributi, e le componenti costi operativi e ammortamenti.

La Remunerazione del Capitale Investito Iniziale:

1. per il capitale relativo all'Acquedotto della Romagna viene applicato un tasso di remunerazione dello 0,50% fino al completo ammortamento delle opere;
2. per il capitale relativo ai beni in affitto fino al 31/12/2008 viene applicato un tasso di remunerazione del 3,92% fino al completo ammortamento delle opere;
3. per il capitale relativo alle migliorie dei beni di cui al punto precedente, viene applicato un tasso di remunerazione del 3,92% fino al completo ammortamento delle opere;
4. per il capitale relativo ai beni conferiti dai Comuni viene applicato un tasso di remunerazione dello 0,00% fino al completo ammortamento delle opere.

La Remunerazione del Capitale Investito Successivo:

1. per il capitale relativo all'Acquedotto della Romagna, come definito nel Piano degli investimenti 2009-2012, viene applicato un tasso di remunerazione del 3,92%;
2. per il capitale relativo alle fonti locali, come definito nel Piano degli investimenti 2009-2012, viene applicato un tasso di remunerazione del 3,92%;
3. per il capitale relativo alle nuove fonti, come definito nel Piano degli investimenti 2009-2012, viene applicato un tasso di remunerazione del 3,92%.

Al capitale investito successivo come definito nel piano degli investimenti 2009-2012, per i periodi tariffari seguenti si applicherà un tasso di remunerazione pari alla media dei valori IRS a 15 anni nei 30 giorni immediatamente precedenti al periodo tariffario che si va a rinnovare, qualora realizzato nei tempi indicati nel Piano.

In caso di ritardo nella realizzazione del Piano degli investimenti 2009-2012, rispetto ai tempi previsti in tabella 3, si opererà col seguente procedimento:

1. si considera la remunerazione massima di progetto sui nuovi investimenti, calcolata con i capitali investiti di progetto moltiplicati per i rispettivi tassi di remunerazione;
2. si determinerà la remunerazione massima di consuntivo sui nuovi investimenti, calcolata con i capitali investiti a consuntivo moltiplicati per i rispettivi tassi di remunerazione;
3. la differenza tra i valori precedenti verrà portata in detrazione al fatturato totale del periodo tariffario successivo senza applicazione di Interessi. Questo metodo consente di mantenere invariata la quota di remunerazione a cui il produttore all'ingrosso ha concordato di rinunciare nel primo periodo, al fine di contenere gli incrementi tariffari.

Tab. 18 - Capitale investito al 31/12 (migliaia di Euro)


	2008	2009	2010	2011	2012
ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA	204.941	191.469	178.116	165.643	156.009
CESPITI EX-AFFITTO	9.215	8.768	8.330	7.903	7.497
CESPITI CONFERITI DAI COMUNI	20.972	19.784	18.596	17.408	16.220
MIGLIORIE HERA	4.694	4.519	4.343	4.167	3.991
TOTALE CAPITALE INIZIALE	239.822	224.540	209.384	195.121	183.717
NUOVI CESPITI ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA	12.100	19.068	24.953	28.878	32.475
NUOVE FONTI	4.042	10.094	41.733	69.526	74.626
NUOVI CESPITI FONTI LOCALI	363	3.207	6.794	13.740	18.231
TOTALE CAPITALE SUCCESSIVO	16.505	32.369	73.480	112.144	125.332
TOTALE CIN	256.327	256.909	282.865	307.265	309.049

L'applicazione dei tassi di remunerazione ai rispettivi capitali medi investiti determina la remunerazione negli anni 2009-2012.



Tab. 19 - Remunerazione massima di progetto del capitale investito (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA	991	924	859	804
CESPITI EX-AFFITTO	352	335	318	302
CESPITI CONFERITI DAI COMUNI	0	0	0	0
MIGLIORIE HERA	181	174	167	160
TOTALE REMUNERAZIONE CAPITALE INIZIALE	1.524	1.433	1.344	1.266
NUOVI CESPITI ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA	611	863	1.055	1.203
NUOVE FONTI	277	1.016	2.181	2.825
NUOVI CESPITI FONTI LOCALI	70	196	402	627
TOTALE REMUNERAZIONE CAPITALE SUCCESSIVO	958	2.075	3.638	4.655
TOTALE REMUNERAZIONE	2.482	3.507	4.983	5.920



AUTORE

10. LA TARIFFA DI RIFERIMENTO

Di norma la determinazione della tariffa idrica deriva dalla somma algebrica delle componenti tariffarie ciascuna definita nel rispetto delle metodologie e dei criteri del metodo tariffario.

Il Protocollo d'Intesa del 30/11/07 ha fissato chiari indirizzi in termini di definizione del price-cap per la tariffa di fornitura d'acqua all'ingrosso per il periodo relativo al 2009-2012; i soggetti che hanno sottoscritto il protocollo hanno stabilito che *"...il prezzo potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nei Piani delle A.T.O..."* ed a *"...garantire un impatto sulla tariffa all'ingrosso delle tre AATO non superiore tendenzialmente ad una percentuale media del 1,5% annuo, oltre all'inflazione programmata, compatibilmente con la sostenibilità economico-patrimoniale-finanziaria"* della società.

Lo sviluppo della tariffa media negli anni 2009-2012, nei termini di seguito indicati, tiene conto:

- a) per le fonti locali dei costi già riconosciuti al Gestore del SII nei Piani delle ATO e trasferiti al nuovo Gestore;
- b) per l'Acquedotto di Romagna dei ricavi dalle vendite dal 2009 al 2012 comprensivi dell'aumento del +1,5% annuo, oltre all'inflazione programmata, per consentire la recuperabilità dei nuovi investimenti. Questo incremento era già stato considerato nei singoli Piani delle ATO.

Tab. 20 - Ricavi e tariffa massima applicabile, compresa inflazione

	2009	2010	2011	2012
Volumi venduti (mc)	106.956.048	106.956.048	106.956.048	106.956.048
RICAVI vendite da Acquedotto della Romagna	22.627	23.306	24.005	24.725
RICAVI da fonti locali (= costi trasferiti da HERA)	8.830	8.884	8.932	8.967
TOTALE RICAVI	31.457	32.190	32.937	33.692
Tariffa massima €/mc	0,2941	0,3010	0,3079	0,3150


Di fatto questo limite tariffario si traduce nella valutazione della componente di costo Remunerazione del capitale tale per cui si possano garantire i ricavi massimi stimati, conseguentemente le componenti tariffarie effettivamente riconosciute sono riportate nella tabella seguente.

Tab. 21 - Componenti tariffarie con remunerazione ridotta e TRM (migliaia di Euro)

	2009	2010	2011	2012
VOLUMI VENDUTI	106.956.048	106.956.048	106.956.048	106.956.048
COSTI OPERATIVI	17.655	17.877	18.102	18.330
AMMORTAMENTI	15.929	16.600	16.019	14.230
REMUNERAZIONE DEL CAPITALE	2.524	2.363	3.466	5.256
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	-4.650	-4.650	-4.650	-4.124
FATTURATO OBIETTIVO	31.457	32.190	32.937	33.692
TRM	0,2941	0,3010	0,3079	0,3150
Incremento % compresa inflazione programmata		2,33%	2,32%	2,29%
ROI	0,98%	0,88%	1,17%	1,71%

La remunerazione totale nei quattro anni risulta inferiore alla remunerazione calcolata sul capitale riconosciuto applicando i tassi di remunerazione definiti precedentemente. Nel quattro anni di regolazione tariffaria, la remunerazione del capitale esistente risulta interamente coperta, il produttore all'ingrosso ha condiviso la decisione di rinunciare ad una quota di remunerazione sul nuovo capitale investito.

In occasione della revisione tariffaria di fine 2010, per includere in tariffa gli investimenti realizzati dal gestore del SII nell'ultimo trimestre del 2008 (valutati in base agli stati di avanzamento lavori al 31/12/2008) e per trasferire nella tariffa all'ingrosso eventuali ulteriori costi operativi ancora riconosciuti al gestore del servizio idrico integrato e valutati a consuntivo alla fine del 2010, verrà rideterminata la tariffa all'ingrosso di tabella 20 per gli anni 2011 e 2012.



11. LE TARIFFE ALL'INGROSSO NEI TRE AMBITI TERRITORIALI

Nella fase di avvio della gestione delle fonti locali, per garantire l'invarianza della tariffa di riferimento finale del SII applicata in ciascun ambito, si è determinata la tariffa all'ingrosso per l'approvvigionamento idrico di ciascun ambito territoriale secondo lo sviluppo della seguente tabella.


Tab. 22 – TRM applicata in ciascun Ambito

	2009	2010	2011	2012
TRM €/mc - ATO Forlì-Cesena	0,3420	0,3509	0,3600	0,3692
TRM €/mc - ATO Ravenna	0,3726	0,3809	0,3894	0,3982
TRM €/mc - ATO Rimini	0,1849	0,1888	0,1926	0,1964

La tabella evidenzia che, se si garantisce l'invarianza della tariffa finale del servizio idrico integrato di ciascun ambito, le tariffe all'ingrosso divergono.

Invece, se fossero stati imposti aumenti uguali in valore assoluto, alla tariffa di ciascun ambito, non si sarebbe creata divergenza nelle tariffe all'ingrosso dei tre ambiti. Questo sarebbe stato coerente con le linee guida del "progetto società delle fonti" e recepite in sede di approvazioni assembleari, che prevedono l'avvio di un processo di convergenza delle tariffe all'ingrosso.

Quindi, in occasione della revisione tariffaria prevista per la fine del 2010, verranno pienamente recepiti i criteri delle linee guida del "progetto società delle fonti", operando per garantire la convergenza delle tariffe all'ingrosso dei tre ambiti e recuperando gli effetti distorsivi che si sono generati in conseguenza dell'applicazione di tariffe divergenti nei primi due anni di regolazione.



12. DETTAGLIO DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

		al 31/12/07																							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018													
By-pass Gallena Derivazione	Investimento	1.323	1.985	1.442	750																				
	Invest. in tariffa	1.302	1.953	1.419	738																				
	Ammort. in tariffa	0	0	317	635	635	635	635	635	635	635	635													
	CIN in tariffa	1.302	3.255	4.357	4.650	3.825	3.190	2.555	1.920	1.285	650	15													
Com. Mont. cond. princ.	Investimento	400	644																						
	Invest. in tariffa	394	634	26	51																				
	Ammort. in tariffa			1.002	950	899	848	796	745	693	642	591													
	CIN in tariffa	394	1.027	1.693	459	51	51	51	51	51	51	51													
Man. Cond. Principale- Forbalea	Investimento	280	1.018	1.693	459																				
	Invest. in tariffa	276	1.002	1.666	452																				
	Ammort. in tariffa			85	170	170	170	170	170	170	170	170													
	CIN in tariffa	276	1.277	2.858	3.140	2.970	2.801	2.631	2.461	2.291	2.122	1.952													
Consolid. strada accesso Diga	Investimento	350	760	1.028	500	51																			
	Invest. in tariffa	344	748	1.012	492	50																			
	Ammort. in tariffa			33	66	66	66	66	66	66	66	66													
	CIN in tariffa	344	1.092	2.104	2.563	2.547	2.481	2.414	2.348	2.282	2.216	2.150													
Rete colleg. Sarb. Covignano	Investimento	200	10	44	1.100	496																			
	Invest. in tariffa	197	10	43	1.082	488																			
	Ammort. in tariffa			46	91	91	91	91	91	91	91	91													
	CIN in tariffa	197	207	250	1.267	1.654	1.593	1.502	1.411	1.320	1.229	1.138													
Serbatolo Covignano	Investimento	1.029	1.865	1.662	144																				
	Invest. in tariffa	1.013	1.835	1.635	142																				
	Ammort. in tariffa			87	175	175	175	175	175	175	175	175													
	CIN in tariffa	1.013	2.848	4.396	4.363	4.188	4.013	3.839	3.664	3.489	3.314	3.140													
Rete S. Santarcangelo	Investimento	64	0	0	1.200	336																			
	Invest. in tariffa	63	0	0	1.181	331																			
	Ammort. in tariffa				39	79	79	79	79	79	79	79													
	CIN in tariffa	63	63	63	1.244	1.535	1.456	1.378	1.299	1.220	1.141	1.063													
Rete S. Giovanni Morciano	Investimento	101	67	21	130	330																			
	Invest. in tariffa	99	66	21	128	327																			
	Ammort. in tariffa					148	295	295	295	295	295	295													
	CIN in tariffa	99	165	186	314	2.675	5.952	5.805	5.510	5.214	4.919	4.624													
Riordino Schema Idr. Conca	Investimento	119	625	65	1.000	991																			
	Invest. in tariffa	117	615	64	984	975																			
	Ammort. in tariffa					69	138	138	138	138	138	138													
	CIN in tariffa	117	732	796	1.780	2.755	2.686	2.549	2.411	2.273	2.135	1.998													
Rigr. attrav. fiume Conca	Investimento	305																							
	Invest. in tariffa																								
	Ammort. in tariffa																								
	CIN in tariffa																								
Manut. strada/migli	Investimento	1.576	2.000	2.000	1.200	1.985																			
	Invest. in tariffa																								
	Ammort. in tariffa																								
	CIN in tariffa																								
Cabina Vecchiavazzo	Investimento	91	114																						
	Invest. in tariffa	90	112																						
	Ammort. in tariffa																								
	CIN in tariffa	90	197	187	177	166	156	146	136	126	116	106													
NIP 2	Investimento	1.426	705	600	18.950	14.100	3.769																		
	Invest. in tariffa	1.403	694	590	18.647	13.874	3.709																		
	Ammort. in tariffa																								
	CIN in tariffa	1.403	2.097	2.687	21.334	35.209	38.917	37.963	36.053	34.144	32.234	30.325													
Rete Interconnes. ravenna	Investimento	1.224	695	5.900	13.100	12.932																			
	Invest. in tariffa	1.204	684	5.412	12.890	12.725																			
	Ammort. in tariffa																								
	CIN in tariffa	1.204	1.888	7.300	20.191	32.916	32.093	30.447	28.801	27.156	25.510	23.864													


	31/12/97	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
POZZI E INTERE. FAENONE																	
NUOVE FONTI																	
Investimento	25	33	50	104	1.213	2.250	65	260									
Invest. in tariffa	25	32	49	102	1.194	2.214	64	256									
Ammort. in tariffa																	
CIN in tariffa	25	57	106	209	1.402	3.616	3.680	3.936	90	181	181	181	181	181	181	181	181
Investimento	299	64	227	500	5.600	2.711											
Invest. in tariffa	299	64	227	500	5.600	2.711											
Ammort. in tariffa																	
CIN in tariffa	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299
POZZI CASSANI IMP. TRATT.																	
FONTI LOCALI																	
Investimento	299	363	590	1.090	6.690	9.401	9.166	8.696	8.226	7.756	7.286	6.816	6.346	5.876	5.406	4.936	4.465
Invest. in tariffa	299	363	590	1.090	6.690	9.401	9.166	8.696	8.226	7.756	7.286	6.816	6.346	5.876	5.406	4.936	4.465
Ammort. in tariffa																	
CIN in tariffa	299	363	590	1.090	6.690	9.401	9.166	8.696	8.226	7.756	7.286	6.816	6.346	5.876	5.406	4.936	4.465
MANUT. RETE ACQ. BASSO DI ROMAGNA																	
FONTI LOCALI																	
Investimento	0	0	0	100	190	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Invest. in tariffa	0	0	0	100	190	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammort. in tariffa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIN in tariffa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUT. SER. CAMPI POZZI ATO FC																	
FONTI LOCALI																	
Investimento	300	400	400	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Invest. in tariffa	300	400	400	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammort. in tariffa	6	20	20	34	46	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
CIN in tariffa	294	674	674	640	640	1.194	1.142	1.090	1.038	986	934	882	830	778	726	674	622
ADEGUAMENTO CENTRALE ALBERAZZO (S. MAURO P.)																	
FONTI LOCALI																	
Investimento	100	200	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Invest. in tariffa	100	200	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammort. in tariffa	2	8	8	14	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
CIN in tariffa	98	290	290	376	376	360	364	328	312	296	280	264	248	232	216	200	184
POTENZIAMENTO ADDUTTORI ATO FC																	
FONTI LOCALI																	
Investimento	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Invest. in tariffa	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammort. in tariffa	0	0	0	0	0	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
CIN in tariffa	0	0	0	0	0	490	470	450	430	410	390	370	350	330	310	290	270
MANUT. SER. per adeguamento impianti ATO RA																	
FONTI LOCALI																	
Investimento	600	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Invest. in tariffa	600	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammort. in tariffa	12	32	32	48	48	64	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
CIN in tariffa	588	956	956	1.108	1.108	1.644	1.572	1.500	1.428	1.356	1.284	1.212	1.140	1.068	996	924	852
NUOVE CAMPI POZZI in loc. Molino Ronci																	
FONTI LOCALI																	
Investimento	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Invest. in tariffa	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammort. in tariffa	0	63	63	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
CIN in tariffa	1.000	2.438	2.438	2.113	2.113	2.188	2.063	1.938	1.813	1.688	1.563	1.438	1.313	1.188	1.063	938	813
RISTRUT. Imp. Poale. Bologna																	
FONTI LOCALI																	
Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Invest. in tariffa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammort. in tariffa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIN in tariffa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUT. Ser. per adeguamento impianti ATO RN																	
FONTI LOCALI																	
Investimento	6.931	10.466	16.982	48.187	40.959	16.195	65	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Invest. in tariffa	6.931	10.466	16.982	48.187	40.959	16.195	65	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammort. in tariffa	-597	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIN in tariffa	6.334	10.116	16.982	48.187	40.959	16.195	65	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE																	
Investimento	6.825	9.712	16.510	42.556	40.419	16.014	64	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Invest. in tariffa	6.825	9.712	16.510	42.556	40.419	16.014	64	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammort. in tariffa	32	646	1.445	1.756	2.826	5.137	6.474	6.564	6.654	6.655	6.655	6.635	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620
CIN in tariffa	6.825	16.505	32.369	73.480	112.144	125.332	120.259	114.041	107.477	100.822	94.168	88.133	82.113	76.093	70.073	64.054	58.034

10 (16/1/2024)

13. PIANO D'AMMORTAMENTO E CAPITALE INVESTITO NETTO

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA	13.472	13.353	12.473	9.635	8.361	7.808	7.618	6.448	6.252	6.048	5.709	5.391	5.274	5.178	5.031
CESPITI EX-AFFITTO	446	439	426	407	401	387	366	358	352	349	346	343	331	328	328
CESPITI CONFERITI DAI COMUNI	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.179	1.162	1.126	1.101	1.076	1.075	448	448	448
MIGLIORIE HERA	176	176	176	176	175	174	174	174	174	174	174	174	174	173	165
TOTALE AMMORTAMENTI CAPITALE INIZIALE	15.283	15.155	14.263	11.405	10.124	9.558	9.337	8.143	7.905	7.672	7.385	6.983	6.227	6.127	5.972
NUOVI CESPITI ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA	613	1.281	1.462	1.633	1.889	2.036	2.036	2.036	2.036	1.416	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401
NUOVE FONTI	0	0	0	823	2.600	3.555	3.646	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736
NUOVI CESPITI FONTI LOCALI	33	164	294	370	648	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883
TOTALE AMMORTAMENTI CAPITALE SUCCESSIVO	646	1.445	1.756	2.826	5.137	6.474	6.564	6.655	6.655	6.035	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
TOTALE AMMORTAMENTI	15.929	16.600	16.019	14.230	15.261	16.032	15.902	14.798	14.560	13.707	13.324	13.003	12.247	12.147	11.992

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA	204.941	191.469	178.116	165.643	156.009	147.648	139.840	132.222	125.773	119.521	113.472	107.764	102.373	97.098	91.921	86.890
CESPITI EX-AFFITTO	9.215	8.768	8.330	7.903	7.497	7.096	6.709	6.343	5.985	5.633	5.284	4.938	4.595	4.264	3.936	3.608
CESPITI CONFERITI DAI COMUNI	20.972	19.784	18.596	17.408	16.220	15.032	13.844	12.665	11.503	10.377	9.276	8.200	7.125	6.076	5.028	3.980
MIGLIORIE HERA	4.694	4.519	4.343	4.167	3.991	3.816	3.642	3.468	3.293	3.119	2.944	2.770	2.596	2.423	2.250	2.085
TOTALE CAPITALE INIZIALE	239.822	224.540	209.384	195.121	183.717	173.592	164.035	154.697	146.554	138.649	130.977	123.672	116.689	110.462	104.335	98.363
NUOVI CESPITI ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA	12.100	19.068	24.953	28.878	32.475	30.586	28.550	26.514	24.478	22.442	21.026	19.624	18.223	16.822	15.421	14.020
NUOVE FONTI	4.042	10.094	41.733	69.526	74.626	72.090	68.790	65.145	61.409	57.673	53.937	50.201	46.465	42.729	38.993	35.257
NUOVI CESPITI FONTI LOCALI	363	3.207	6.794	13.740	18.231	17.583	16.701	15.818	14.936	14.053	13.170	12.288	11.405	10.522	9.640	8.757
TOTALE CAPITALE SUCCESSIVO	16.505	32.369	73.480	112.144	125.332	120.259	114.041	107.477	100.822	94.168	88.133	82.113	76.093	70.073	64.054	58.034
TOTALE CIN	256.327	256.909	282.865	307.265	309.049	293.852	278.076	262.174	247.377	232.817	219.109	205.785	192.782	180.535	168.388	156.397

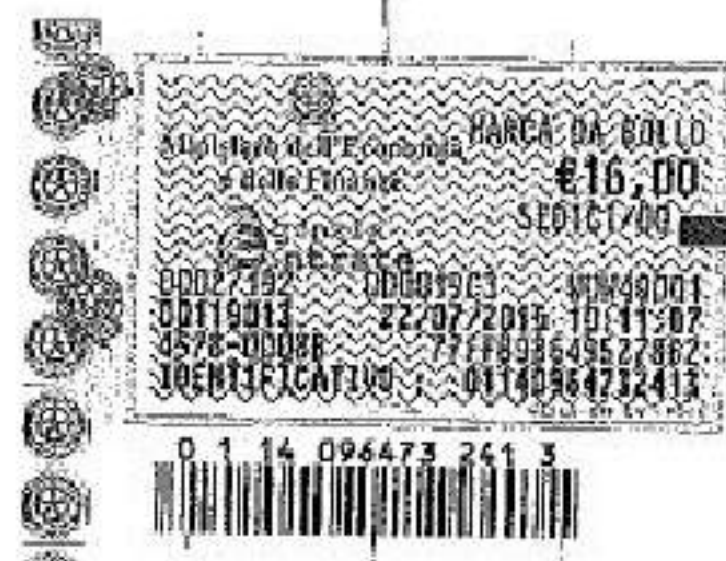

Addendum alla Convenzione per la regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso, già sottoscritta in data 30/12/2008 con le Agenzie d'Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (ora Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) per i rispettivi bacini territoriali, con scadenza il 31/12/2023 ed avente ad oggetto la Delega al Gestore del Servizio di Fornitura di Acqua all'Ingrosso dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi compresi nel Piano d'ambito ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 158-bis, comma 3.

Tra le Parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, C.F. 91342750378 con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 64 PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 26 del 13 luglio 2015, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR



(nel seguito anche Atersir o "Agenzia")

ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A., con sede legale in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35, iscritta al Registro Imprese di Forlì al n. 00337870406, CF e P.IVA 00337870406, PEC mail@pec.romagnacque.it, in persona del Dott. Tonino Bernabè, nella sua qualità di Presidente, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 18 luglio 2013 ed in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 09 maggio 2014 e n. 85 del 27 luglio 2015, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito Romagna Acque)

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Visti

- Il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014 n. 164;
- Il d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";



- La l.r. 19 dicembre 2002, n. 37 recante "Disposizioni regionali in materia di espropri";
- La l.r. 6 settembre 1999 n. 25 recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- La l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- La l.r. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";

Premesso che:

- Romagna Acque è una società a totale capitale pubblico interamente detenuto, direttamente ed indirettamente, dagli Enti locali della Romagna;
- la Società è proprietaria e gestisce i beni strumentali alla produzione e fornitura di acqua all'ingrosso al gestore del Servizio Idrico Integrato; il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso è regolato dalla convenzione sottoscritta in data 30/12/2008 con le Autorità/Agenzie d'Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e



Rimini, avente scadenza il 31/12/2023 (e s.m.i.);

- La L.R. Emilia Romagna n. 23/2011 ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006; funzioni già esercitate dalle Autorità di Ambito Territoriali Ottimali; Atersir è, dunque, subentrata, con effetto dal 1 gennaio 2012, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle precedenti forme di cooperazione e, quindi, anche delle Autorità di Ambito di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna;

- Conseguentemente, Atersir è subentrata anche nella convenzione per la regolazione della gestione del servizio di fornitura di acqua all'ingrosso, regolato dalla convenzione sottoscritta dalle preesistenti AATO con Romagna Acque in data 30/12/2008, sopra menzionata;

- Il d.l. n. 133/2014 (decreto c.d. Sblocca Italia), convertito con legge n. 164/2014, ha re-





centemente modificato il d.lgs. n. 152/2006, ag-
giungendo l'art. 158-bis ai sensi del quale:

— i progetti definitivi delle opere, degli in-
terventi previsti nei piani di investimenti com-
presi nei piani d'ambito (...) sono approvati da-
gli enti di governo degli ambiti (...) che prov-
vedono alla convocazione di apposita conferenza
di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguen-
ti della legge 7 agosto 1990 n. 241. La medesima
procedura si applica per le modifiche sostanzia-
li delle medesime opere, interventi ed impianti;

— L'approvazione di cui al comma 1 comporta di-
chiarazione di pubblica utilità e costituisce
titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli
strumenti di pianificazione urbanistica e terri-
toriale, esclusi i piani paesaggistici (...);

- L'ente di governo degli ambiti (...) costituisce
autorità espropriante per la realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo e può de-
legare, in tutto o in parte, i proprie espro-
priativi al gestore del servizio idrico integra-
to, nell'ambito della convenzione di affidamento
del servizio i cui estremi sono specificati in
ogni atto del procedimento espropriativo;

Rilevato che la vigente convenzione di servizio,




sottoscritta da Romagna Acque in data 30/12/2008 con le Autorità/Agenzie d'Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, non contempla la delega dei poteri espropriativi introdotta solo di recente, come facoltà, dal suindicato art. 158-bis;

Rilevato, inoltre, che, con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 26 del 13 luglio 2015, l'Agenzia, per ragioni di efficacia e di economicità di cui all'art. 1 L. 241/1990, ha disposto di delegare al gestore del servizio di fornitura di acqua all'ingrosso Romagna Acque l'esercizio dei poteri espropriativi di cui l'Agenzia è titolare ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di investimento di competenza del gestore compresi nei piani d'ambito;

Rilevato che, con la medesima deliberazione n. 26/2015, il Consiglio d'Ambito dell'Agenzia ha approvato il testo del seguente articolo, per l'inserimento nella vigente convenzione di servizio di fornitura di acqua all'ingrosso indicata più sopra, previa intesa con il gestore Romagna Acque:

"Delega dei poteri espropriativi.

1. L'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti ai sensi dell'art. 158-bis



del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 delega al gestore l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, quali, esemplificativamente, quelli previsti agli articoli 22-bis e 49 del D.P.R. n. 327/2001, di cui l'Agenzia medesima risulta titolare ai sensi del sopra richiamato art. 158-bis e previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (in specie D.P.R. n. 327/2001 e l.r. Emilia Romagna n. 37/2002) per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di investimento di competenza del gestore compresi nei piani d'ambito.

2. Le parti danno concordemente atto che dalla delega di cui al precedente comma 1 sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.

3. Gli estremi della presente convenzione devono



essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

4. Il Beneficiario dell'espropriazione è Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

5. Il gestore del servizio è tenuto a fornire all'Agenzia, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi delegati.”;

Ritenuto pertanto di dover adeguare la convenzione di servizio di fornitura di acqua all'ingrosso sottoscritta da Romagna Acque in data 30/12/2008 con le Autorità/Agenzie d'Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (ora Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, ai sensi della l.r. n. 23/2011) alle nuove disposizioni introdotte dal d.l. n. 133/2014, stipulando apposito atto integrativo alla medesima convenzione, secondo quanto disposto dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia con deliberazione n. 26/2015;

tutto ciò premesso e considerato nonché ritenuto parte integrante del presente atto

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Delega dei poteri espropriativi

A seguito della deliberazione del Consiglio





d'ambito dell'Agenzia n. 26 del 13 luglio 2015, dopo l'art. 13 della Convenzione per la regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, aduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso, già sottoscritta in data 30/12/2008 da Romagna Acque con le Agenzie d'Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (e s.m.i.), ora Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, è aggiunto il seguente:

"Articolo 13-bis Delega dei poteri espropriativi"

1. L'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 delega al gestore l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, quali, esemplificativamente, quelli previsti agli articoli 22-bis e 49 D.P.R. n. 327/2001, di cui l'Agenzia medesima risulta titolare ai sensi del sopra richiamato art. 158-bis e previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (in specie D.P.R. n. 327/2001 e l.r. Emilia Romagna n. 37/2002) per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di investimento di competenza



del gestore compresi nei piani d'ambito.

2. Le parti danno concordemente atto che dalla delega di cui al precedente comma 1 sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.

3. Gli estremi della presente convenzione devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

4. Il Beneficiario dell'espropriazione è Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

5. Il gestore del servizio è tenuto a fornire all'Agenzia, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi delegati."

Articolo 2 - Rinvio.

Per quanto non espressamente modificato o incompatibile con il presente atto continuano ad applicar-



si le convenzioni/accordi di cui alle premesse e
s.m.i..

Articolo 3 - Registrazione.

Il presente atto è soggetto alla registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna li 06 AGO 2015

ATERSIR

Il Direttore

Ing. Vito Belladonna

ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.

Il Presidente del Cda Dott. Tonino Bernabè





**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 10

Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nei territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

[17/12/2014]



ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI FORLÌ- CESENA, RAVENNA E RIMINI

Addl 17 DICEMBRE 2014

Tra le Parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 64 PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 54 del 20/10/2014, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR

(nel seguito anche Atersir);

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 04245520376, PEC heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con Deliberazione n. 9 del 25/11/2014 assunta ai sensi dell'articolo 23.5 dello Statuto sociale di HERA S.p.A., domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito anche HERA o Gestore);

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A., con sede legale in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35, iscritta al Registro Imprese di Forlì al n. 00337870406, CF e P.IVA 00337870406, PEC: mail@pec.romagnacque.it, in persona del Dott. Tonino Bernabè, nella sua qualità di Presidente, il quale interviene in

virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 18/07/2013 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 135 del 16/10/2014, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito Romagna Acque)

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che:

a) Hera è ed interviene nel presente Accordo in qualità di Gestore del servizio idrico integrato nei territori delle province di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini in forza delle convenzioni di affidamento sottoscritte con le Autorità/Agenzie di Ambito di Forlì-Cesena, atto sottoscritto in data 01/02/2005 avente scadenza il 31/12/2023, di Ravenna, atto sottoscritto in data 26/04/2005 avente scadenza il 31/12/2023 e di Rimini, atto sottoscritto in data 14/03/2002 avente scadenza il 14/03/2012, quest'ultimo tuttora vigente in regime di prorogatio in virtù di deliberazione Atersir n. 25 del 21/12/2012 ed in relazione al quale sono state avviate le attività propedeutiche alle procedure di nuovo affidamento del servizio;

b) Romagna Acque è una società a totale capitale pubblico interamente detenuto, direttamente ed indirettamente, dagli Enti locali della Romagna; la Società è proprietaria e gestisce i beni strumentali alla produzione e fornitura di acqua all'ingrosso al gestore del Servizio Idrico Integrato; il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso è regolato dalla convenzione sottoscritta in data 30/12/2008 con le Autorità/Agenzie d'Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, avente scadenza il 31/12/2023;

c) la Legge Regionale n. 23 del 23/12/2011 ha costituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) per l'esercizio associato

delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato a livello regionale, funzioni già esercitate dalle Autorità di Ambito Territoriali Ottimali; Atersir è, dunque, subentrata nelle convenzioni di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui alla lettera a) delle premesse;

d) l'art. 21, commi 13 e 19 del D. L. n. 201/2011, così come convertito dalla L. 214/2011, ha trasferito all'Autorità per l'Energia elettrica e il gas (oggi Autorità per l'Energia elettrica il gas e il sistema idrico nel seguito anche AEEGSI), le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, tra cui l'approvazione del metodo tariffario;

e) AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, con deliberazione del 28/12/2012, n. 585, successivamente modificata ed integrata con deliberazioni n. 73/2013 e n. 88/2013;

f) AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per la determinazione delle tariffe negli anni 2014 e 2015 con deliberazione n. 643/2013; l'Allegato I, art. 21.2, prevede la possibilità del riconoscimento tariffario di cespiti realizzati dopo il 2011 da parte di soggetti diversi dal Gestore del servizio idrico integrato, previa presentazione di una "motivata istanza" da parte dell'Ente d'Ambito, da valutarsi da parte della stessa Autorità nazionale sulla base di considerazioni di efficacia ed efficienza rispetto al raggiungimento di obiettivi specifici sul territorio;

g) Atersir, Romagna Acque ed HERA, nel periodo 2007-2011, hanno sottoscritto specifiche Convenzioni per la realizzazione e gestione da parte di Hera di opere strumentali al servizio idrico integrato nei territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, finanziate da Romagna Acque che ne è proprietaria; le convenzioni prevedono il riconoscimento, in favore di Romagna Acque, quale soggetto



finanziatore-proprietario, di un canone a copertura dei costi del capitale investito; il canone costituisce una componente tariffaria. Alla luce delle modifiche introdotte in materia tariffaria da AEEGSI, le Parti ne hanno recepito gli effetti con specifico atto;

h) Atersir, con propria deliberazione n. 22 del 28.04.2014, ha approvato, ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione AEEGSI n. 643/2013, gli specifici schemi regolatori 2014-2023 per gli ambiti territoriali delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;

i) Romagna Acque ha espressamente manifestato la propria disponibilità a finanziare, coerentemente con l'attuale quadro normativo e tariffario, parte degli investimenti previsti nei Piani degli interventi 2014-2017 per i territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, così come determinati da Atersir nella deliberazione n. 22/2014; per effetto degli atti di indirizzo dei Soci, tale disponibilità di Romagna Acque è condizionata all'approvazione da parte di AEEGSI del Piano degli interventi 2014-2017, dei correlati Piani tariffari ed economico finanziari, compreso l'inserimento dei cespiti finanziati e di proprietà di Romagna Acque, ma realizzati e gestiti dal Gestore, nelle componenti tariffarie riconosciute, e quindi della positiva valutazione della "motivata istanza" presentata da Atersir, ai sensi dell'articolo 21.2 dell'Allegato A della deliberazione AEEGSI n.643/2013, in data 22 maggio 2014 e da ultimo in data 31 luglio 2014;

l) l'Autorità ha approvato, con Deliberazione 7 agosto 2014 n. 433/2014, gli schemi regolatori recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 - 2015, proposti da Atersir e in tale contesto ha accolto la motivata istanza dell'Ente d'Ambito affermando che lo stesso "ha fornito evidenza di come tali modalità di finanziamento risultano assolutamente coerenti con le condizioni di efficienza, effi-





cacia ed economicità rispetto agli obiettivi di piano, dimostrando l'esistenza di un vantaggio economico per l'utenza"; conseguentemente, Romagna Acque, nel rispetto delle condizioni di cui al punto i) delle premesse, è autorizzata a sottoscrivere il presente Accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse sono parti integranti del presente Accordo e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'Accordo medesimo.

Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

a) Il presente Accordo stabilisce tra Atersir, Romagna Acque ed HERA le condizioni, i termini e le modalità connesse alla realizzazione e gestione da parte di Hera di opere funzionali alla gestione del servizio idrico integrato e finanziate da Romagna Acque che ne sarà proprietaria fin dal momento della loro realizzazione; tali opere devono essere espressamente previste nel Piano degli Interventi nei territori delle province di Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini.

b) In attuazione del presente Accordo Quadro, le Parti procederanno a sottoscrivere specifici Accordi Attuativi, distinti per ambito territoriale, sulla base dello "schema tipo" in allegato A). Ogni Accordo Attuativo, a seguito della sua sottoscrizione, costituisce parte attuativa ed integrante del presente Accordo Quadro. In ogni Accordo Attuativo sono individuate le singole opere da realizzarsi con il finanziamento di Romagna Acque; la somma degli importi delle opere citate in ogni Accordo Attuativo costituisce l'importo massimo dell'impegno di finanziamento di Romagna Acque per lo specifico Accordo Attuativo. Costituiranno allegati di ogni Accordo Attuativo i seguenti documenti:



- l'elenco delle singole opere oggetto di finanziamento da parte di Romagna Acque e per ciascuna l'importo del relativo quadro economico di spesa come previsto nel Piano degli Interventi;

- il cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio di ciascun intervento;

- il quadro economico di ciascun intervento redatto ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010;

- una previsione dei flussi di finanziamento a carico di Romagna Acque distinta per anno;

- una previsione dei canoni annui di spettanza di Romagna Acque a titolo di recupero dei costi del capitale investito, nei termini previsti negli schemi regolatori predisposti da Atersir e approvati da AEEGSI.

Quanto contenuto nell'allegato di ciascun Accordo Attuativo non dà titolo a nessuna delle Parti di emettere fattura o altro documento valido per l'incasso.

c) Atersir si impegna a determinare ed a riconoscere, come componente delle tariffe idriche applicabili ai territori di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, i corrispettivi di competenza di Romagna Acque (di seguito anche "canoni") quale finanziatore e proprietario delle opere al fine di consentire la copertura dei costi del capitale, secondo il principio del *full cost recovery*, nel rispetto delle normative tariffarie come fissate da AEEGSI, tenuto conto delle rinunce espressamente accettate da Romagna Acque come indicate nella deliberazione Atersir n. 22/2014. L'entità dei canoni che Romagna Acque è autorizzata a fatturare ad HERA è periodicamente definita da Atersir, in base ai dati di consuntivo rendicontati da Romagna Acque, secondo gli stessi metodi, tempi e criteri definiti da AEEGSI per il calcolo dei costi di capitale riconosciuti al gestore del servizio idrico integrato e al netto delle rinunce di quote tariffarie espressamente accettate da Romagna Acque. In sede di sotto-



scrizione dei singoli Accordi Attuativi potranno essere definite quote di rinunce tariffarie diverse da quanto previsto nella deliberazione Atersir n. 22/2014.

Art. 3 – DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e termina in data pari alla scadenza dell'Accordo Attuativo, sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, che presenta scadenza più posticipata, al fine di consentire a Romagna Acque il completo recupero dei costi del capitale investito.

Tenuto conto delle scadenze delle Convenzioni di affidamento del servizio idrico integrato al Gestore, di cui al punto a) delle premesse, Atersir si impegna ad inserire sia negli atti di gara per la scelta del nuovo Gestore, sia negli atti convenzionali di regolazione del servizio da sottoscrivere con il soggetto affidatario, l'obbligo di subentro nelle obbligazioni e nei diritti previsti in capo al Gestore, nascenti e derivanti dal presente Accordo Quadro e dai successivi Accordi Attuativi.

Art. 4 – POTERI E FUNZIONI DI ATERSIR

Atersir, quale Ente d'Ambito, esercita nei confronti di Romagna Acque e di HERA tutti i poteri e le funzioni individuate dalle vigenti norme nazionali e regionali, alle quali integralmente le Parti intendono riportarsi; Atersir si impegna sin d'ora a determinare e riconoscere, nel calcolo della tariffa del servizio idrico integrato nei territori delle province di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini, i canoni di competenza di Romagna Acque per la funzione di finanziatore e proprietario di beni strumentali alla gestione del servizio idrico integrato, in base a quanto previsto dalle deliberazioni di AEEGSI per il calcolo dei costi di capitale del gestore del servizio idrico integrato, al netto delle rinunce espressamente accettate da Romagna Acque.

Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni indicate nel presente articolo, ed in specifico, la determinazione dei canoni di spettanza di Romagna Acque per



l'attività di soggetto finanziatore ed il recepimento dei relativi effetti nel calcolo della tariffa, Atersir procederà all'acquisizione della seguente documentazione nei modi e nei tempi di volta in volta previsti dall'Autorità per la trasmissione all'Ente d'Ambito da parte del gestore delle rendicontazioni periodiche di competenza:

Documentazione richiesta a Romagna Acque:

- 1) ultimo bilancio di esercizio approvato;
- 2) dettaglio del libro cespiti aggiornato alla data dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato relativo agli investimenti realizzati da HERA e finanziati da Romagna Acque distinto per ciascun territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;
- 3) trasmissione delle informazioni relative ai cespiti di cui al precedente punto 2) nelle stesse forme e modi richiesti da AEEGSI per i beni non di proprietà del Gestore e che determinano un canone per il proprietario, canone riconosciuto nella tariffa del servizio idrico integrato (modelli "file proprietario" secondo le deliberazioni AEEGSI emesse);

Documentazione richiesta ad Hera:

- 1) i cronoprogrammi di realizzazione e messa in esercizio di ciascuna opera con il relativo importo come previsto nel Piano degli Interventi;
- 2) la rendicontazione, nell'ambito della Relazione annuale di rendicontazione tecnico-economica del servizio idrico integrato, delle somme erogate a Romagna Acque a titolo di canone per gli investimenti di cui al presente Accordo;
- 3) la rendicontazione delle somme spese per la realizzazione delle opere con l'indicazione degli importi fatturati a Romagna Acque.

ART. 5 COMPITI E RESPONSABILITÀ DI HERA

Per ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui all'articolo 2, il





Gestore del servizio, svolgerà l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, acquisirà tutte le autorizzazioni ed i permessi, nonché i necessari diritti patrimoniali sui terreni interessati dalla realizzazione delle opere necessari a garantire la piena cantierabilità; svolgerà le gare d'appalto necessarie per l'affidamento dei contratti di esecuzione lavori; curerà la direzione lavori ed il collaudo delle opere, tutto come meglio definito e dettagliato nei successivi articoli.

Per tutte le attività sopra indicate, HERA è responsabile della piena applicazione di tutte le normative vigenti in materia con particolare riguardo a quelle in tema di sicurezza dei cantieri e luoghi di lavoro, prevenzione antinfortunistica e protezione della salute dei lavoratori, di appalti e di ambiente.

ART. 6 PROGETTAZIONE DELLE OPERE

Per ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui all'articolo 2, il Gestore del servizio svolgerà la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, secondo le norme di legge vigenti, nel rispetto degli standard tecnici cogenti e di quelli normalmente utilizzati per la progettazione delle reti e degli impianti. La progettazione potrà essere sviluppata con proprio personale abilitato o mediante professionisti esterni iscritti all'Albo, individuati nel rispetto delle norme sugli appalti. Al Gestore verranno riconosciute tutte le spese sostenute a vario titolo comprese ed autorizzate nei quadri economici dei singoli interventi. Le spese tecniche per lo svolgimento delle attività di pianificazione e programmazione, progettazione, direzione dell'esecuzione, verifiche e collaudi, comprendenti sia gli onorari per affidamenti esterni, sia le spese per le medesime attività svolte da personale interno del Gestore, non potranno superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei quadri economici di ogni Accordo Attuativo al netto delle spese tecniche stesse, salvo casi particolari debitamente motivati ed autorizzati. Il Gestore, in



ogni caso, si impegna a presidiare il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza con particolare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed a tal fine svolgerà le attività di Responsabile dei Lavori e curerà lo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Romagna Acque terrà regolare rendicontazione delle spese che verranno sostenute per personale interno per le attività di verifica, collaudo tecnico-amministrativo e controllo di propria competenza o per qualsiasi altro titolo. Le spese rendicontate rimarranno contenute all'interno nei quadri economici di spesa dei singoli interventi nei limiti previsti dal presente articolo.

ART. 7 OTTENIMENTO DELLA CANTIERABILITA' DELLE OPERE

Il Gestore è responsabile dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni, concessioni, permessi, consensi, nulla osta comunque denominati, da parte di tutti gli Enti interessati (a titolo puramente indicativo e non esaustivo Comuni, ARPA, AUSL, FF.SS., Consorzi di Bonifica, Provincia, soggetti gestori di strade o autostrade, soggetti gestori di sottoservizi, ecc.), necessari alla corretta esecuzione delle opere nel pieno rispetto di tutte le norme, con particolare riguardo a quelle edilizie ed urbanistiche. Le autorizzazioni, concessioni, permessi, consensi, nulla osta comunque denominati dovranno essere intestati a Romagna Acque in qualità di soggetto proprietario delle opere. Romagna Acque si impegna, pertanto, a prestare il proprio consenso e a sottoscrivere le pratiche predisposte e istruite per la presentazione dal Gestore. Il Gestore potrà direttamente presentare le richieste di autorizzazioni, permessi, consensi, nulla osta che non necessitano di sottoscrizione da parte del proprietario dell'opera.

I diritti di proprietà o di servitù sui terreni interessati dalla realizzazione delle opere



sorgeranno in via esclusiva in capo a Romagna Acque.

Gli atti di costituzione di diritti di servitù e gli atti di compravendita verranno stipulati da Romagna Acque, quale soggetto proprietario delle opere, mentre gli "accordi bonari" preordinati alla successiva stipula delle servitù, verranno definiti e concordati direttamente dal Gestore con i proprietari delle aree interessate dai lavori di posa delle nuove opere, nel rispetto degli atti tipo individuati in accordo fra Romagna Acque ed il Gestore.

Prima dell'avvio dei lavori di ogni singolo intervento HERA, si impegna ad inviare a Romagna Acque la dichiarazione di cantierabilità delle opere firmata dal Direttore dei Lavori (come prevista dall'art.106 del D.P.R. n. 207/2010) corredata da copia dei vari permessi, consensi, nulla osta ed autorizzazioni comunque denominate, necessari per la realizzazione delle opere e copia dei diritti intestati a Romagna Acque su tutti i terreni demaniali o disponibili interessati dalla realizzazione delle opere.

ARTICOLO 8 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui all'articolo 2, sarà realizzato da HERA nel rispetto delle vigenti norme di legge.

HERA svolgerà le attività e le funzioni di Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento dell'appalto e di esecuzione delle opere.

ARTICOLO 9 - ESECUZIONE DEI LAVORI

HERA curerà la direzione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.

HERA, in ogni caso, si impegna a presidiare il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza con particolare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed a tal fine svolgerà le atti-



vità di Responsabile dei Lavori e curerà lo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

HERA, durante l'esecuzione dei lavori, si obbliga, a rispettare e fare rispettare dagli esecutori i Piani Particellari di Esproprio dei singoli interventi, sollevando Romagna Acque da ogni responsabilità verso terzi derivante dal loro mancato rispetto.

ARTICOLO 10 - COLLAUDO DELLE OPERE

HERA provvederà alla nomina del collaudatore statico per le opere strutturali ed alla nomina del collaudatore tecnico funzionale.

HERA curerà altresì la redazione del certificato di regolare esecuzione dei singoli interventi.

Nei casi in cui, in base alle norme vigenti, non sia possibile la redazione del certificato di regolare esecuzione, Romagna Acque provvederà alla nomina del collaudatore tecnico amministrativo così come previsto dalla vigente normativa sugli appalti pubblici.

Le opere, non appena positivamente collaudate, saranno affidate al Gestore del servizio idrico integrato, mediante la sottoscrizione del verbale di consegna delle opere sulla base dello "schema tipo" in allegato B).

Art. 11 VARIAZIONI AI QUADRI ECONOMICI DI SPESA DEI SINGOLI INTERVENTI

Qualora, nel corso delle attività di progettazione delle opere, o a seguito dell'effettuazione delle gare d'appalto, o nel corso dell'esecuzione, per alcuno degli interventi previsti in ciascun Accordo Attuativo, si presentino cause che possano determinare una variazione del quadro di spesa si applica quanto di seguito esposto:

a) varianti al quadro di spesa sono ammesse senza necessità di specifica autoriz-





zazione da parte di Atersir o Romagna Acque, qualora le stesse non comportino un aumento del quadro economico di spesa di ciascun intervento. HERA dovrà dare informazioni delle eventuali variazioni apportate ai singoli quadri economici di spesa contestualmente alla trasmissione della relazione informativa trimestrale di cui al successivo art. 12;

b) all'interno di ciascun Accordo Attuativo la variazione in diminuzione dell'importo complessivo di un'opera, potrà essere utilizzata per pari entità per variazioni in aumento dell'importo di una o più opere senza necessità di procedere alla sottoscrizione di atto modificativo fra le parti. HERA deve trasmettere a Romagna Acque ed Atersir, comunicazione relativa alla modifica dei valori dei quadri di spesa delle singole opere con evidenza dell'invarianza del totale dell'importo complessivamente finanziato da Romagna Acque; HERA dovrà inoltre dare informazione delle conseguenti variazioni apportate ai singoli quadri di spesa contestualmente alla trasmissione della relazione informativa trimestrale di cui al successivo art. 12;

c) la variazione in aumento del quadro di spesa di un'opera non compensata da variazioni in diminuzione di altre opere, sarà possibile solo a seguito di modifica dell'Accordo Attuativo condizionata alla disponibilità di Romagna Acque di procedere all'erogazione dell'ulteriore finanziamento. Si precisa che nel caso in cui le proposte di variazione degli Accordi Attuativi non dovessero essere autorizzate da Atersir oppure, il Gestore non dovesse comunicare per iscritto ad Atersir e Romagna Acque le suddette variazioni del quadro economico di spesa, Romagna Acque non sarà obbligata alla corresponsione di alcun ulteriore finanziamento rispetto al valore massimo definito nell'Accordo Attuativo e le maggiori spese eventualmente sostenute, rispetto al quadro economico come autorizzato da Atersir, rimarranno



esclusivamente a carico del Gestore. Resta inteso, pertanto, che Romagna Acque non è autorizzata a finanziare interventi di importo superiore a quelli autorizzati e/o non previsti nel Piano d'Ambito.

Art. 12 CONTROLLO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Le Parti concordano di prestarsi reciproca collaborazione per l'ottimale gestione sul territorio delle attività di propria competenza.

Fino al pieno affidamento dei nuovi beni al Gestore del servizio idrico integrato, mediante la sottoscrizione del verbale di consegna delle opere di cui all'allegato B), HERA si impegna a fornire a Romagna Acque una relazione trimestrale sull'andamento dei lavori al fine di consentire la verifica del rispetto degli adempimenti previsti a carico di HERA e quindi dell'entità delle erogazioni dei finanziamenti da parte di Romagna Acque.

La relazione trimestrale dovrà contenere, per ogni intervento, lo stato di avanzamento dei lavori, gli eventuali aggiornamenti dei cronoprogrammi valorizzati di attuazione e dei relativi flussi di erogazioni dei finanziamenti da parte di Romagna Acque.

ARTICOLO 13 – MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE E RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DA PARTE DI HERA

Romagna Acque si impegna a reperire le fonti di finanziamento al fine di garantire l'adeguata copertura finanziaria necessaria per la realizzazione delle opere previste nei Piani degli interventi nei territori delle province di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini, oggetto del presente Accordo, entro i limiti di spesa previsti negli accordi attuativi che verranno sottoscritti.

Le spese sostenute da HERA potranno essere finanziate da Romagna Acque nei limiti delle somme previste nei quadri di spesa dei singoli interventi, come even-



tualmente variati a seguito della progettazione delle opere, dell'esito delle gare di appalto ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, o a seguito dell'approvazione di varianti in fase esecutiva nei modi e con i limiti indicati all'art. 11.

Il costo degli interventi è da considerarsi comprensivo di tutte le voci che concorrono alla realizzazione delle opere, ricomprese nel quadro economico di progetto (lavori, oneri sicurezza, espropri, servitù, spese notarili, incarichi professionali esterni, spese di personale interno, ecc.).

I lavori dovranno essere rendicontati da HERA con le modalità previste per le opere realizzate dal Gestore, come previsto dalle convenzioni e dai disciplinari tecnici e relativi allegati regolanti l'affidamento del Servizio Idrico Integrato ad HERA.

Premesso che HERA dovrà tenere e conservare una completa rendicontazione di tutte le spese sostenute, corredata dai relativi elementi probatori, al solo fine dell'erogazione delle rate di finanziamento da parte di Romagna Acque vale quanto di seguito indicato.

Il Gestore potrà conseguire il finanziamento relativo agli interventi realizzati nei seguenti termini e modi:

- a) emissione entro il 30 aprile di ciascun esercizio della fattura relativa alle attività effettuate nel 1° trimestre di ciascun esercizio;
- b) emissione entro il 31 luglio di ciascun esercizio della fattura relativa alle attività effettuate nel 2° trimestre di ciascun esercizio;
- c) emissione entro il 30 ottobre di ciascun esercizio della fattura relativa alle attività effettuate nel 3° trimestre di ciascun esercizio;
- d) emissione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo a quello di riferimento della fattura relativa alle attività effettuate nel 4° trimestre.




Per ogni singolo intervento le fatture di Hera dovranno essere accompagnate da una rendicontazione "semplificata" indicante i costi complessivi sostenuti alla data di riferimento, distinte per singola voce aggregata del quadro di spesa, in funzione dell'aliquota IVA ad essa applicata (ad esempio: Lavori, Spese Tecniche esterne ed aziendali, Spese eliografiche, notarili , soggette ad IVA; Spese per servitù e concessioni , non soggette ad IVA) . L'importo complessivo delle fatture emesse ed accompagnate da tale rendicontazione "semplificata" non potrà superare il 90% dell'importo complessivamente stanziato o modificato per ogni singolo intervento.

La fatturazione del restante 10% potrà avvenire solo a seguito della rendicontazione finale con la trasmissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, del relativo conto finale, dei disegni di *as-built*, della certificazione sugli impianti eseguiti, del certificato di conformità edilizia e agibilità delle opere e della documentazione riportante la puntuale rendicontazione di tutte le spese a vario titolo sostenute, ognuna accompagnata dai relativi documenti probatori (a titolo indicativo: copia fatture, copia rendicontazioni costi personale interno sostenuti, ecc.).

Le fatture verranno pagate da Romagna Acque entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento fattura accompagnata dalla documentazione tecnica precedentemente descritta. In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine stabilito al comma precedente, Romagna Acque sarà tenuta al pagamento degli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. 231/2002.

In applicazione della Legge 136/2010, Romagna Acque si impegna ad effettuare i pagamenti di propria competenza nel rispetto delle disposizioni normative, HERA assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare a Romagna Acque, per ciascuna opera di cui all'allegato A) il CUP (codice unico di progetto) e si impegna altresì a

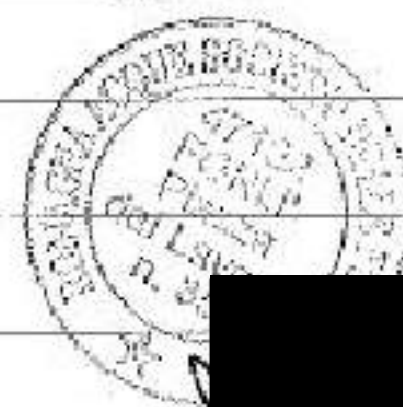



inserire, a pena di nullità, nei contratti passivi soggetti alla L. 136/2010 la clausola di cui all'art. 3, comma 9.

Quanto stabilito nelle Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato nei rispettivi Ambiti di riferimento (e relative appendici) e nei Disciplinari Tecnici, nelle parti relative agli obblighi del Gestore per quanto concerne la realizzazione e la rendicontazione tecnica degli interventi, trova applicazione nei confronti di HERA anche per gli interventi finanziati da Romagna Acque, con ciò escludendosi oneri di verifica e controllo in capo a quest'ultima ulteriori rispetto a quanto già espressamente previsto nel presente atto.

Al fine di assicurare a Romagna Acque, come finanziatore, l'equilibrio dei flussi finanziari, su base annua, occorrerà rispettare i flussi programmati limitando ad una alea massima del 10% l'eventuale scostamento in aumento delle somme finanziate nell'arco dell'anno. Qualora lo scostamento dovesse eccedere il suddetto limite l'erogazione di tale differenza sarà regolata nell'anno solare successivo.

ART. 14 ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE

A seguito del completamento delle opere, del loro collaudo e della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'allegato B (comprensivo di tutta la documentazione richiesta per legge), le stesse opere verranno gestite da HERA secondo le norme e le condizioni stabilite nelle Convenzioni di cui alla lettera a) delle premesse; in particolare per l'intera durata del presente Accordo, HERA:

- a) si impegna a corrispondere i canoni per l'utilizzo dei beni realizzati e gestiti, ma finanziati da Romagna Acque in qualità di proprietario, così come determinati da Atersir quale componente della tariffa del servizio idrico integrato, nel rispetto dei termini e nelle modalità stabiliti dall'Autorità;
- b) è responsabile e provvede con oneri interamente a carico del Gestore del SII

alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di mantenere i beni in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

c) provvede con urgenza e con oneri interamente a carico del Gestore del SII agli interventi necessari per eliminare eventuali non conformità dei beni a tutte le normative con particolare riguardo a quella in materia ambientale e di sicurezza dei luoghi di lavoro, manlevando e tenendo indenne Romagna Acque da qualsiasi responsabilità al riguardo;

d) adotta tutte le misure previste dalla normativa vigente in tema di prevenzione antinfortunistica e protezione della salute dei lavoratori, con particolare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

e) assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni, a propri dipendenti o a terzi durante il loro utilizzo ed a causa di esso;

f) assume la piena responsabilità per l'osservanza delle normative citate nel comma precedente, nonché per l'applicazione di ogni misura prevista per la prevenzione di danni di qualunque genere derivanti dall'esercizio delle attività pericolose di cui all'articolo 2050 codice civile;

g) si impegna a garantire la copertura dei rischi, sia in fase di realizzazione delle opere che di gestione delle stesse, per danni di qualunque causa determinati ai beni stessi e a terzi in generale, per tutta la durata dell'Accordo, attraverso idonee polizze assicurative e ne comunica gli estremi a Romagna Acque.

ART. 15 – MODALITÀ DI RECUPERO DEL FINANZIAMENTO

Al fine del recupero degli oneri di capitale relativi al finanziamento delle opere, Romagna Acque ha diritto al riconoscimento di un canone sino al totale recupero



dei costi del capitale; il canone sarà determinato da Atersir e liquidato da HERA nel rispetto di quanto previsto all'art.2, lettera c).

Compatibilmente con i meccanismi tariffari indicati nel citato articolo 2, l'importo annuo di ciascun canone sarà ripartito in quattro rate trimestrali di uguale importo da fatturarsi da parte di Romagna Acque a HERA e da liquidarsi nei seguenti termini:

- emissione delle fatture entro il 30/04, 31/07, 30/10 e 31/01;
- pagamento entro 60 giorni fine mese data ricevimento fattura.

In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine stabilito al comma precedente, HERA sarà tenuta al pagamento degli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. 231/2002.


Per tutta la durata del presente Accordo, l'ammortamento dei beni finanziati da Romagna Acque sarà effettuato da Romagna Acque, secondo i principi e le metodologie del nuovo metodo tariffario. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 14 lettera b) seguiranno invece il regime di trattamento dei beni del SII in gestione al Gestore, anche per quanto riguarda l'ammortamento dei beni ammortizzabili.

Art. 16 – MODIFICHE ALL'ACCORDO QUADRO

Ogni modifica del presente Accordo Quadro dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle Parti e nel rispetto delle norme disciplinanti il regime del servizio idrico integrato.

In caso di modifica del quadro normativo e tariffario di riferimento, tenuto conto di quanto previsto nelle premesse, le Parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari.

Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI / CODICE ETICO

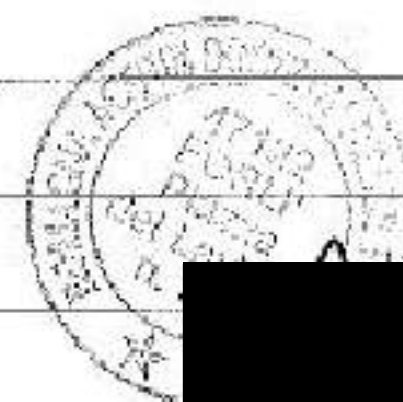

Le Parti danno atto che ciascuna di esse è titolare del trattamento dei dati personali delle altre parti di cui venga in possesso in ragione e conseguenza convenzione del presente Accordo e che tale trattamento è effettuato ai fini e per gli effetti dell'adempimento, per competenza, alla convenzione stessa. I dati personali saranno trattati dalle Parti nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dal "Codice della Privacy". A tal fine le stesse dichiarano di essersi scambiate le reciproche informative ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

Le Parti si danno inoltre atto di avere preso piena conoscenza ed accettato i principi e le norme previste nel Codice Etico e del Modello 231 aziendale di Romagna Acque e di HERA, visibili dai rispettivi siti web aziendali www.romagnacque.it e www.gruppohera.it.

Art. 18 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nelle Convenzioni d'ambito per il servizio idrico integrato citate in premessa, nonché alle vigenti norme di legge.

Art. 19 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia tra le Parti, il Foro competente esclusivo è quello di Bologna. E' espressamente esclusa qualsiasi competenza arbitrale.

Art. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente Accordo verrà registrato in solo caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 21 – COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa se effettuata

presso la sede legale dell'ente, via Pec, via fax, per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 22 – ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro i seguenti Allegati:

- allegato A: Schema "Accordo Attuativo";
- allegato B: Schema "Verbale di consegna delle opere realizzate".

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

HERA S.P.A.

L'Amministratore Delegato

Dott. Stefano Venier

ATERSIR

Il Direttore

Ing. Vito Belladonna

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.

Il Presidente

Dott. Tonino Bernabè





ALLEGATO A)

**N°....° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER
IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE
AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI**

“ ”

Addi

Tra le parti

**ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e
Rifiuti con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 64, c.f.91342750378, PEC
dgatersir@pec.atersir.emr.it nella persona del Dott., nel-
la sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza
dei poteri conferiti con delibera del Consiglio d'Ambito n. del
....., domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la
sede di Atersir ;**

(di seguito Atersir)

**HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta
al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA
04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefa-
no Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene
alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del
..... n. del, domiciliato ai fini del-
la presente Convenzione presso la sede della Società**

(nel seguito anche HERA o Gestore);

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A., con sede le-



gale in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35, iscritta al Registro Imprese di Forlì al n. 00337870406, CF e P.IVA 00337870406, PEC: mail@pec.romagnacque.it in persona del dott. Tonino Bernabè nella sua qualità di Presidente, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 18/07/2013 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

(nel seguito **Romagna Acque**)

(nel seguito congiuntamente le **Parti**)

Premesso che

a) in data _____ è stato sottoscritto, tra Atersir, Romagna Acque e Hera, l'Accordo Quadro per la realizzazione e il finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato negli ambiti territoriali di Forlì Cesena – Ravenna e Rimini;

b) ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro di cui alla lettera precedente, il presente atto costituisce parte attuativa ed integrante dello stesso.

Art.1- Premesse

Le premesse sono parti integranti del presente atto e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'atto medesimo.

Art. 2-Oggetto

Con il presente atto le Parti danno attuazione a quanto previsto all'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro di cui alla lettera a) delle premesse; in allegato

1) l'elenco delle singole opere oggetto di finanziamento da parte di Roma-




gna Acque e di realizzazione da parte di Hera previste dal presente Accordo Attuativo; si dà atto che le suddette opere sono previste nel Piano degli interventi, documento di programmazione facente parte dello schema regolatorio per le tariffe _____ dell'ambito territoriale di _____, come predisposto da Atersir con delibera n.22/2014 ed approvato da AEEGSI con deliberazione n.433/2014. Per ogni opera è indicato l'importo del relativo quadro di spesa come previsto nel Piano degli Interventi _____.

La somma degli importi delle opere in allegato 1) è pari ad euro _____ (.....), tale valore costituisce l'importo massimo dell'impegno di finanziamento di Romagna Acque per le suddette opere, fatto salvo quanto previsto all'art.11 dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro suddetto, costituiscono parte integrante del presente Accordo Attuativo i seguenti allegati:

1. l'elenco delle singole opere oggetto di finanziamento da parte di Romagna Acque e per ciascuna l'importo del relativo quadro economico di spesa come previsto nel Piano degli Interventi _____;
2. il cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio di ciascuna opera;
3. il quadro economico di spesa di ciascuna opera redatto ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010;
4. la previsione dei flussi di finanziamento a carico di Romagna Acque distinta per anno.



5. una previsione dei canoni annui di spettanza di Romagna Acque a titolo di recupero dei costi del capitale investito, nei termini previsti negli schemi regolatori predisposti da Atersir e approvati da AEEGSI.

Tutte le disposizioni espresse nell'Accordo Quadro di cui alla lettera a) delle premesse, nessuna esclusa, trovano totale ed integrale applicazione nel presente Accordo Attuativo.

Letto, approvato e sottoscritto.


ATERSIR

ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A.

[REDACTED]

HERA S.p.A.

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]



ALLEGATO B)

**VERBALE DI CONSEGNA DELL'INTERVENTO/DEGLI INTER-
VENTI DENOMINATO/I “ _____ ”**

Addì _____

Tra le parti

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. ____ del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito **HERA o Gestore**);

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A., con sede legale in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35, iscritta al Registro Imprese di Forlì al n. 00337870406, CF e P.IVA 00337870406, PEC: mail@pec.romagnacque.it in persona del dott. Tonino Bernabè nella sua qualità di Presidente, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 18/07/2013 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ____ del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

(nel seguito **Romagna Acque**)

(nel seguito congiuntamente le **Parti**)

Premesso che

a) in data _____ è stato sottoscritto, tra Atersir, Romagna Acque e Hera, l'Accordo Quadro per il finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato negli ambiti territoriali di Forlì Cesena – Ravenna e Rimini (nel seguito **Accordo**) ;

b) le Parti hanno deciso di attuare l'intervento/gli interventi denominato/i " _____ " sottoscrivendo il relativo Accordo Aattuativo in data _____ ed approvandone il relativo Progetto e Quadro economico, compresi gli ulteriori allegati previsti;

c) l'intervento è stato realizzato _____ (tempi e modi di realizzazione dell'intervento)

d) HERA è il Gestore del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali delle Province di Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini in forza delle convenzioni di affidamento sottoscritte con le Autorità di Ambito di Forlì-Cesena (atto sottoscritto in data 01/02/2005 avente scadenza il 31/12/2023), di Rimini (atto sottoscritto in data 14/03/2002 avente scadenza il 14/03/2012, in regime di prorogatio) e di Ravenna (atto sottoscritto in data 26/04/2005 avente scadenza il 31/12/2023);

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

1. Le premesse sono parti integranti del presente atto e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'atto medesimo.

2. Il Gestore con la firma del presente verbale accetta in consegna senza riserve le opere e si impegna ad assumerne la gestione alle condizioni , patti e termini di cui alle Convenzioni di affidamento del SII nei territori delle Province di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini e di cui all'Accordo in premessa.



3. Romagna Acque dichiara di ricevere, con la sottoscrizione del presente Verbale, tutta la documentazione attestante la rendicontazione dell'intervento eseguito e autorizza, pertanto, HERA ad emettere la relativa fattura a saldo prevista all'art. 13.

Letto, approvato e sottoscritto.

Si allega:

- 1) Collaudo delle opere
- 2) Documentazione di rendicontazione

ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A.

[Redacted signature area]

HERA S.p.A.

[Redacted signature area]



[Redacted signature area]



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 10A

Addendum all'Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nei territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. in data 17/12/2014

ADDENDUM ALL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI FORLÌ-CESENA, RAVENNA E RIMINI, SOTTOSCRITTO TRA HERA S.P.A., ATERSIR, ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. IN DATA 17/12/2014

Tra le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna Via Cairoli, 8/F - 40121 Bologna, PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 54 del 20/10/2014, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR

(nel seguito **ATERSIR**)

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito anche **HERA** o **Gestore**)

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A., con sede legale in Forlì, Piazza Orsi Mangelli n. 10, iscritta al Registro Imprese di Forlì al n. 00337870406, CF e P.IVA 00337870406, PEC: mail@pec.romagnacque.it in persona del dott. Tonino Bernabè nella sua qualità di Presidente, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 69

	del 30.06.2015, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 del	
	02.05.2019 e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 89 del	
	25.06.2019, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della So-	
	cietà	
	(nel seguito Romagna Acque)	
	(nel seguito congiuntamente le Parti)	
	Premesso che	
	a) in data 17/12/2014 è stato sottoscritto, tra ATERSIR, Romagna Acque e HE-	
	RA, l'Accordo Quadro (nel seguito Accordo Quadro) per la realizzazione e il fi-	
	nanziamento di opere relative al servizio idrico integrato negli ambiti territoriali di	
	Forlì Cesena – Ravenna e Rimini;	
	b) a seguito della delibera del Consiglio d'Ambito di Atersir n. 24 assunta in data	
	20/03/2019 è stato approvato il documento denominato "Modalità di calcolo delle	
	spese tecniche sostenute dal Gestore per la progettazione e la realizzazione delle	
	opere previste nei programmi degli interventi del SII ai fini del riconoscimento ta-	
	riffario" che modifica l'attuale disciplina delle spese tecniche di cui all'articolo 6	
	dell'Accordo Quadro;	
	c) si rende pertanto necessario sostituire l'attuale articolo 6 dell'Accordo Quadro	
	con il testo novellato di cui al presente Addendum.	
	Tutto ciò premesso	
	si conviene e si stipula quanto segue.	
	Art.1 - Premesse	
	Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto e costituiscono	
	condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbli-	
	gazioni disposte dalle Parti con l'atto medesimo.	

	Art. 2 – Modifica art. 6 dell’Accordo Quadro	
	L’articolo 6 – Progettazione delle opere dell’Accordo Quadro viene sostituito integralmente con il presente testo:	
	“Art. 6 – Progettazione delle opere.	
	Per ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui all’articolo 2, il Gestore del servizio svolgerà la progettazione, secondo le norme di legge vigenti, nel rispetto degli standard tecnici cogenti e di quelli normalmente utilizzati per la progettazione delle reti e degli impianti. La progettazione potrà essere sviluppata con proprio personale abilitato o mediante professionisti esterni iscritti all’Albo, individuati nel rispetto delle norme sugli appalti. Al Gestore verranno riconosciute tutte le spese sostenute a vario titolo comprese ed autorizzate nei quadri economici dei singoli interventi. Le spese tecniche sostenute dal Gestore per la progettazione e la realizzazione delle opere verranno riconosciute nei modi e limiti definiti nel documento denominato “Modalità di calcolo delle spese tecniche sostenute dal Gestore per la progettazione e la realizzazione delle opere previste nei programmi degli interventi del SII ai fini del riconoscimento tariffario” approvato da ATERSIR nella Delibera del Consiglio d’Ambito n. 24 del 20/03/2019. Il Gestore, in ogni caso, si impegna a presidiare il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza con particolare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed a tal fine svolgerà le attività di Responsabile dei Lavori e curerà lo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.”	
	Art. 3 – Disposizioni transitorie.	
	Le Parti concordano che le modalità di calcolo delle spese tecniche contenute nel novellato art. 6 dell’Accordo Quadro si applicheranno agli Accordi Attuativi sotto-	



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 10B

Primo Accordo attuativo dell'Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

[22/12/2014]

N. 1° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

"INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DORSALE SUD RIMINI -PREMENTE E INTERVENTO DI RICONVERSIONE DEPURATORE MARECCHIESE"


Addì, 22 dicembre 2014

Tra le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 64 PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 54 del 20/10/2014, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR sede di Atersir

(di seguito Atersir)

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 25/11/2014 assunta ai sensi dell'art. 23.5 dello Statuto sociale di HERA S.p.A., domiciliato ai fini della presente



Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito anche **HERA o Gestore**)

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A., con sede legale in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35, iscritta al Registro Imprese di Forlì al n. 00337870406, CF e P.IVA 00337870406, PEC: mail@pcc.romagnacque.it in persona del dott. Tonino Bernabè nella sua qualità di Presidente, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 18/07/2013 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 135 del 16/10/2014, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito **Romagna Acque**)

(nel seguito congiuntamente le **Parti**)

Premesso che

- a) in data 17/12/2014 è stato sottoscritto, tra Atersir, Romagna Acque e HERA, l'Accordo Quadro (nel seguito **Accordo Quadro**) per la realizzazione e il finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato negli ambiti territoriali di Forlì Cesena – Ravenna e Rimini;
- b) ai sensi dell'art. 2 lettera b) dell'Accordo Quadro, il presente Accordo costituisce parte attuativa ed integrante dello stesso;
- c) il Piano degli Interventi 2014 – 2017 relativamente all'ambito territoriale di Rimini, approvato in aprile 2014, in corso di aggiornamento da parte di Atersir, prevede gli interventi denominati i) Intervento di Realizzazione del Collettore Fognario Dorsale Sud Rimini – Premente, tra le opere finanziate



da Romagna Acque e realizzate dal Gestore, ii) Intervento di Riconversione del Depuratore Marecchiese, tra le opere finanziate dal Comune di Rimini;

d) alla luce della pianificazione aggiornata degli interventi trasmessa da Hera ad Atersir il 10/12/2014, al fine di mantenere l'equilibrio fra i finanziatori delle opere e senza che questo comporti un aumento dell'importo netto degli investimenti a carico della tariffa, è necessario provvedere ad alcune modifiche dei soggetti finanziatori delle opere stesse;

e) in relazione a quanto riportato al precedente punto d) l' Intervento di Riconversione del Depuratore Marecchiese verrà posto tra le opere finanziate da Romagna Acque;

f) al fine di mantenere sostanzialmente invariato l'impegno finanziario complessivo di Romagna Acque contestualmente alla suddetta revisione, alcune opere che nel Piano degli Interventi citato risultano finanziate da Romagna Acque, troveranno diversa copertura finanziaria; in particolare, per quanto attiene al presente Accordo , per l'intervento denominato "Realizzazione Vasca Rodella" (euro 11.700.000) non sarà più previsto l'impegno finanziario di Romagna Acque;

g) pur nelle more di perfezionamento della revisione del Piano degli Interventi da parte di Atersir gli interventi denominati i) Intervento di Realizzazione del Collettore Fognario Dorsale Sud Rimini – Premente, ii) Intervento di Riconversione del Depuratore Marecchiese, sono da ritenersi opere oggetto dell'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dello stesso .

Si conviene e si stipula quanto segue

Art.1- Premesse

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto e costitui-



scono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'atto medesimo.

Art. 2-Oggetto

Con il presente Accordo Attuativo (nel seguito **Accordo**) le Parti danno attuazione a quanto previsto all'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro.

Tutte le disposizioni espresse nell'Accordo Quadro, nessuna esclusa, trovano totale ed integrale applicazione nel presente Accordo.

In particolare Romagna Acque si impegna a finanziare e Hera si impegna a realizzare i seguenti interventi di cui all'allegato 1) e precisamente:

- Intervento di Realizzazione del Collettore Fognario Dorsale Sud Rimini - Premente;
- Intervento di Riconversione del Depuratore Marecchiese.

La somma degli importi degli interventi oggetto del presente Accordo è pari ad euro 12.719.389,00 (dodicimilioni settecentodiciannovetrecentottantave virgola zerozero); tale valore costituisce l'importo massimo dell'impegno di finanziamento di Romagna Acque per le suddette opere, fatto salvo quanto previsto all'art.11 dell'Accordo Quadro.

Le Parti si danno atto e concordano che l'Intervento di Riconversione del Depuratore Marecchiese è stato suddiviso in quattro lotti: Lotto ISA Pompe, Lotto ISA Elettrico, Lotto Rete e Lotto Torrino, di cui i primi due lotti già conclusi, il Lotto Rete in corso di esecuzione e il Lotto Torrino in fase di gara per l'affidamento dei lavori. In considerazione di ciò, anche in deroga a quanto previsto all'art. 2 lettera b) ultimo capoverso dell'Accordo Quadro, con la sottoscrizione del presente Accordo Hera avrà titolo per fatturare a Romagna Acque gli interventi già eseguiti e in corso di esecuzione, con le



modalità di cui all'art. 13 dell'Accordo Quadro.

Art. 3 Allegati

Ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro, costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. Elenco degli interventi e relativa pianificazione economica;
 2. Cronoprogramma degli interventi :
 - 2.A) Cronoprogramma Dorsale SUD Rimini - Premente;
 - 2.B) Cronoprogramma Riconversione Depuratore Marecchiese - Lotto Rete;
 - 2.C) Cronoprogramma Riconversione Depuratore Marecchiese - Lotto Torino;
 3. Quadri economici di spesa di ciascuna opera redatto ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010:
 - 3.A) Quadro economico Realizzazione Collettore fognario Dorsale SUD Rimini - Premente ;
 - 3.B) Quadro Economico Riconversione Depuratore Marecchiese comprensivo dei Quadri Economici dei singoli lotti ;
 4. Previsione dei flussi di finanziamento a carico di Romagna Acque distinta per anno;
 5. Previsione dei canoni annui di spettanza di Romagna Acque a titolo di recupero dei costi del capitale investito, nei termini previsti negli schemi regolatori predisposti da Atersir e approvati da AEEGSI.
- Per quanto concerne l'Allegato 5) le parti si danno atto che la previsione dei canoni annui è stata sviluppata sulla base di quanto segue:
- il cronoprogramma di realizzazione ed entrata in funzione delle opere di cui all'allegato 1);



- il calcolo del canone tiene conto della formula di valorizzazione dei "Capex" e della decurtazione del 20% dell'onere fiscale standard, come previsto da Atersir nella Delibera n. 22/2014.

Considerato che ai sensi dell'articolo 19 dell'Allegato A della Delibera AEEGSI n. 643/2013, il calcolo dell'onere finanziario standard deriva da una serie di variabili tra cui la media del rendimento dei BTP decennali negli ultimi 12 mesi (pari al 4,41% -media 2013- per la determinazione tariffaria 2014 e 2015), tale dato è stato aggiornato per il periodo decorrente dal 2016 per tener conto della flessione di tale rendimento registrata nel 2014 ed è stato posto pari al 3,20%.

Si ribadisce quanto espresso nell'Accordo Quadro in merito al puntuale recepimento delle disposizioni tariffarie di AEEGSI per quanto concerne la definitiva determinazione dei canoni e quindi anche per gli aspetti determinati dall'onere finanziario: i valori indicati in Allegato 5) non sono pertanto da ritenersi in alcun modo vincolanti ma puramente indicativi in base alle informazioni disponibili.

Art. 4 Durata

Il presente Accordo ha efficacia, anche in via di ratifica, dalla data di inizio delle attività di realizzazione degli interventi e termina alla data del completo recupero da parte di Romagna Acque dei costi del capitale investito per gli stessi nei modi e termini di cui all'art. 15 dell'Accordo Quadro.

Letto, approvato e sottoscritto.

ATERSIR

Ing. Vito Bolladonna



ROMA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A.

Dot. T. [redacted]

HERA S.p.

ALLEGATO 1

N. 1° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

DEFINIZIONI	STATO AVANZAMENTO	QUADRO DI SPESA AL 31/12/13	quadro di spesa presunto lordo 2014	quadro di spesa presunto lordo 2015	quadro di spesa presunto lordo 2016	quadro di spesa presunto lordo 2017	quadro di spesa presunto lordo oltre 2017	TOT. IMPEGNO (SPESA AL 31/12/2013 + PLAN. AGGIORNATA)	IPOTESI ENTRATA IN FUNZIONE
PSB REALIZZ. CUP VALE SUD RN - PREMENTE	In progettazione	0	24.000	1.752.000	800.000	5.700.000	987.760	7.687.760	2018
PMA RIFORMA INIZIATIVE DI PIANIFICAZIONE	terminata esecuzione (LOTTO USA) / in esecuzione (LOTTO RETE) / progettazione terminata (lotto TORINO + VASCHE + COMPL.)	285.372	1.625.000	2.281.000	1.490.257	0	0	5.081.629	2016

1.0	20/03/2014	D.B.	M.L.	L.Z.	Emissione
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROL. (CHCK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)					
Ingegneria					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)					
Riconversione depuratore Marecchiese - Lotto rete					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO					
				N° ELABORATO (DOCUMENT N)	N° COMMESSA (JOB N°)
					R.2150.11.04.00006
				ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME)
				G14017154	G14017154
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Barti Pichat 2/4 - 40127 Bologna tel. 051.267.111 fax 051.267.525 www.gruppohera.it				DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)	
				Cronoprogramma fasi di lavoro	
				SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°) 1
					DI (LAST)

CRONOPROGRAMMA

FASE		1°Mese				2°Mese				3°Mese				4°Mese				5°Mese			
		1° sett	2° sett	3° sett	4° sett	1° sett	2° sett	3° sett	4° sett	1° sett	2° sett	3° sett	4° sett	1° sett	2° sett	3° sett	4° sett	1° sett	2° sett	3° sett	4° sett
1	1 <i>Primo intervento</i>																				
	1.1 Allestimento cantiere																				
	1.2 Fornitura tubi/pezzi speciali/saracinesche/giunti, ecc																				
	1.3 Realizzazione pozzetti																				
	1.4 Scavi a sezione obbligata compreso posa tubazioni in ghisa Dn 800/Dn 1200, rinforzo e reinterramento (previa verifica utenze interrate)																				
	1.5 Posa valvole, giunti																				
	1.6 Posa misuratori di portata																				
	1.7 Formazione di fondazione stradale con manto di usura																				
	1.8 Opere di finitura																				
2	2 <i>Secondo intervento</i>																				
	2.1 Realizzazione pozzetto A																				
	2.2 Posa valvole, giunti, collegamenti pozzetto A																				
	2.3 Realizzazione pozzetto B																				
	2.4 Posa valvole, giunti, collegamenti pozzetto B																				
	2.5 Collegamento con tubo Dn 600 su ponte tubo																				
	2.6 Reinterramento scavi																				
	2.7 Opere di finitura																				




ALL. 2C



1.0	13/10/2014	D.B.	M.L.	L.Z.	Esecuzione
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROL. (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) Ingegneria					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) Riconversione Depuratore Marecchiese - Lotto Torrino - CUP H91B14000130005					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO					
				N° ELABORATO (DOCUMENT N°)	N° COMMESSA (JOB N°) R.2150.11.04.00006
				ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) G14018250	NOME FILE (FILE NAME) G14018250
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Bertè Pichet 2/4 - 40127 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.287.525 www.gruppohera.it		DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) Cronoprogramma			
		SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°) 1	DI (LAST) 2	



FASE		1ª Fase					2ª Fase					3ª Fase					4ª Fase					5ª Fase					6ª Fase					7ª Fase					8ª Fase					9ª Fase											
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																	
3	1. Tarefa																																																				
	2. Tarefa																																																				
	3. Tarefa																																																				
	4. Tarefa																																																				
	5. Tarefa																																																				
	6. Tarefa																																																				
	7. Tarefa																																																				
	8. Tarefa																																																				
	9. Tarefa																																																				
	10. Tarefa																																																				
	11. Tarefa																																																				
	12. Tarefa																																																				
	13. Tarefa																																																				
	14. Tarefa																																																				
	15. Tarefa																																																				
	16. Tarefa																																																				
	4	1. Tarefa																																																			
		2. Tarefa																																																			
3. Tarefa																																																					
4. Tarefa																																																					
5. Tarefa																																																					
6. Tarefa																																																					
7. Tarefa																																																					
8. Tarefa																																																					



QUADRO ECONOMICO



QUADRO ECONOMICO

PSBO Piano per la Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato
della città di Rimini

Realizzazione collettore fognario "Dorsale SUD"
III° Stralcio- Premente

A Lavori			
	Lavori a corpo		6.800.000,00
	Oneri per la sicurezza		272.000,00
	Totale lavori		7.072.000,00
B Somme a disposizione			
1	Spese tecniche	3%	212.160,00
2	Imprevisti	5%	353.600,00
3	Allacciamenti a pubblici servizi		50.000,00
	Totale somme a disposizione		615.760,00
IMPORTO COMPLESSIVO			7.687.760,00



**QUADRO ECONOMICO "RICONVERSIONE DEPURATORE MARECCHIESE" (con
ricepimento prescrizioni di Conferenza dei Servizi, ma senza coperture e senza
demolizioni vasche di ossidazione e vasca di contatto)**

		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI			
IMPORTO LAVORI A CORPO			
<i>di cui:</i>			
<i>per lavori (netto)</i>	Euro	3.925.829,41	
<i>per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)</i>	Euro	242.702,01	
Totale lavori	Euro		4.168.531,42
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	Euro	30.000,00	
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini (campagna rilevamento odori)	Euro	55.000,00	
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	Euro	62.000,00	
B.4) Imprevisti	Euro	267.500,00	
B.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	Euro	10.000,00	
B.6) Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza, collaudi, supporto al Responsabile del Procedimento	Euro	430.798,20	
B.7) Spese per concessioni, autorizzazioni e altre imposte	Euro	7.800,00	
Totale somme a disposizione	Euro		863.098,20
 IMPORTO DELL'INVESTIMENTO	Euro		 5.031.629,61



**QUADRO ECONOMICO "RICONVERSIONE DEPURATORE MARECCHIESE - LOTTO
POTENZIAMENTO ISA - POMPE
post gara**

		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI			
IMPORTO LAVORI A CORPO			
<i>di cui:</i>			
<i>per lavori (netto)</i>	Euro	209.827,80	
<i>per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)</i>	Euro	6.000,00	
Totale lavori a base d'appalto (+ arrotondamento)	Euro		215.827,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	Euro	0,00	
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini	Euro	0,00	
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	Euro	0,00	
B.4) Imprevisti	Euro	17.000,00	
B.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	Euro	0,00	
B.6) Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza, collaudi, supporto al Responsabile del Procedimento	Euro	21.000,00	
B.7) Spese per concessioni, autorizzazioni e altre imposte	Euro		
Totale somme a disposizione	Euro		38.000,00
 IMPORTO DELL'INVESTIMENTO	Euro		253.827,80



**QUADRO ECONOMICO "RICONVERSIONE DEPURATORE MARECCHIESE - LOTTO
POTENZIAMENTO ISA - IMPIANTI ELETTRICI
post gara**

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI A CORPO		
<i>di cui:</i>		
<i>per lavori (netto)</i>	Euro 175.761,30	
<i>per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)</i>	Euro 4.820,00	
Totale lavori a base d'appalto	Euro	180.581,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	Euro 0,00	
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini	Euro 0,00	
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	Euro 27.000,00	
B.4) Imprevisti	Euro 5.500,00	
B.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	Euro	
B.6) Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza, collaudi, supporto al Responsabile del Procedimento	Euro 20.000,00	
Totale somme a disposizione	Euro	52.500,00
IMPORTO DELL'INVESTIMENTO	Euro	233.081,30



**QUADRO ECONOMICO "RICONVERSIONE DEPURATORE MARECCHIESE -
LOTTO RETE" - post gara**

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI A CORPO		
<i>di cui:</i>		
<i>per lavori (netto)</i>	Euro 578.788,30	
<i>per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)</i>	Euro 45.352,02	
Totale lavori	Euro	624.140,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	Euro 10.000,00	
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini	Euro 25.000,00	
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	Euro 0,00	
B.4) Imprevisti	Euro 90.000,00	
B.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	Euro 10.000,00	
B.6) Spese tecniche relative al: progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza, collaudi, supporto al Responsabile del Procedimento	Euro 75.000,00	
B.8) Spese per concessioni, autorizzazioni e altre imposte	2.800,00	
Totale somme a disposizione	Euro	212.800,00
IMPORTO DELL'INVESTIMENTO	Euro	836.940,32

ROMA

**QUADRO ECONOMICO di progetto "RICONVERSIONE DEPURATORE MARECCHIESE -
LOTTO TORRINO E OPERE DI COMPLETAMENTO"**

		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI			
IMPORTO LAVORI A CORPO			
<i>di cui:</i>			
<i>per lavori (netto)</i>	Euro	2.961.452,01	
<i>per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)</i>	Euro	186.529,99	
Totale lavori	Euro		3.147.982,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	Euro	20.000,00	
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini (campagna rilevamento odori)	Euro	30.000,00	
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	Euro	35.000,00	
B.4) Imprevisti	Euro	155.000,00	
B.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	Euro	0,00	
B.6) Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza, collaudi, supporto al Responsabile del Procedimento	Euro	314.798,20	
B.7) Spese per concessioni, autorizzazioni e altre imposte	Euro	5.000,00	
Totale somme a disposizione	Euro		559.798,20
 IMPORTO DELL'INVESTIMENTO	Euro		 3.707.780,19



**N. 1° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI
OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI**

Allegato 4

Previsione dei flussi di finanziamento a carico di Romagna Acque distinta per anno

INTERVENTO	STATO AVANZAMENTO 2014	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	TOTALE IMPORTO
PSB-REALIZZ.DORSALE SUD RN-PREMENTE	In progettazione	0	25.000	175.000	800.000	5.700.000	987.760	7.687.760
PSB-RICONVERSIONE DEP. MARECCHIESE	Terminata esecuzione (LOTTO ISA) / In esecuzione (LOTTO RETE) / progettazione terminata (LOTTO TORRINO + VASCHE+COMPL)	285.372	1.025.000	2.231.000	1.490.257	0	0	5.031.629



N. 1° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Allegato 5

Previsione dei canoni annui di spettanza di Romagna Acque (*)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
AMMORTAMENTI	0	0	174.482	174.482	366.676	366.676	366.676	366.676	366.676
ONERE FINANZIARIO	66.648	186.731	269.944	551.431	567.699	550.872	534.044	517.217	500.390
ONERE FISCALE (decurtazione 20%)	18.981	53.181	79.978	158.719	161.681	156.889	152.096	147.304	142.511
COSTO DI CAPITALE - CANONE	85.630	239.912	524.403	884.632	1.096.056	1.074.436	1.052.816	1.031.197	1.009.577

(*) la previsione dei canoni è sviluppata fino all'anno 2024: a seguito dei futuri piani finanziari lo sviluppo temporale proseguirà fino alla conclusione dell'accordo

S.P.A.



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 10C

Revisione del Primo Accordo attuativo dell'Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

REVISIONE DEL 1° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Tra le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna Via Cairoli, 8/F - 40121 Bologna, PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.54 del 20/10/2014, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR

(di seguito **ATERSIR**)

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 25/11/2014 assunta ai sensi dell'art. 23.5 dello Statuto sociale di Hera S.p.A., domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito anche **HERA** o **Gestore**)

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A., con sede legale in Forlì, Piazza Orsi Mangelli n. 10, iscritta al Registro Imprese di Forlì al n. 00337870406, CF e P.IVA 00337870406, PEC: mail@pec.romagnacque.it in persona del dott. Tonino Bernabè nella sua qualità di Presidente, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 89

del 25/06/2019 e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 100 del 10.07.2019, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito **Romagna Acque**)

(nel seguito congiuntamente le **Parti**)

Premesso che

a) in data 17/12/2014 è stato sottoscritto, tra ATERSIR, Romagna Acque e HERA, l'Accordo Quadro (nel seguito **Accordo Quadro**) per la realizzazione e il finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato negli ambiti territoriali di Forlì Cesena – Ravenna e Rimini;

b) ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro, il presente atto costituisce parte attuativa ed integrante dello stesso;

c) il Piano degli Interventi 2014 – 2017 relativamente all'ambito territoriale di Rimini, approvato in aprile 2014, prevedeva gli interventi denominati:

- Intervento di realizzazione del collettore Fognario Dorsale Sud Rimini 3° stralcio – Premente;

- Intervento di riconversione del Depuratore Marecchiese

tra le opere finanziate da Romagna Acque e realizzate dal Gestore e pertanto opere oggetto dell'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dello stesso;

d) in data 22 dicembre 2014 è stato stipulato il “1° Accordo Attuativo dell'Accordo Quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al Servizio Idrico Integrato nel territorio della Provincia di Rimini” (nel seguito **Accordo Attuativo**) per il finanziamento da parte di Romagna Acque e la realizzazione da parte di HERA delle opere citate al precedente punto;

e) HERA ha richiesto la disponibilità di ATERSIR a modificare l'Accordo Attua-

tivo di cui al precedente punto d), variando i valori dei quadri economici degli interventi come risulta dall'Allegato 2, da cui si evince che l'importo totale dell'accordo passa da euro 12.719.389,00 a euro 16.590.789,00 e come tale incremento sia dovuto all'aumento dei costi delle spese tecniche:

f) ATERSIR si è resa disponibile a concedere una deroga al limite fissato dall'art. 6 dell'Accordo Quadro per le spese tecniche, previa verifica a consuntivo del dettaglio analitico delle componenti di costo, fermo restando che le stesse non potranno superare il 15% dell'importo dei lavori a consuntivo per ogni singolo progetto.

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 - Premesse

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'atto medesimo.

Art. 2 -Oggetto

Con la presente Revisione del 1° Accordo Attuativo dell'Accordo Quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al Servizio Idrico Integrato nel territorio della Provincia di Rimini (nel seguito **Revisione dell'Accordo Attuativo**) le Parti danno attuazione a quanto previsto dall'art.11 lettera c) ed all'art. 16 dell'Accordo Quadro.

Fermo restando che Romagna Acque si impegna a finanziare ed HERA si impegna a realizzare i seguenti interventi di cui all'Allegato 1) e precisamente:

A) Intervento di Realizzazione del Collettore Fognario Dorsale Sud Rimini – Prementente;

B) Intervento di Riconversione del Depuratore Marecchiese.

A seguito della proposta di revisione la somma degli importi degli interventi oggetto della presente Revisione dell'Accordo Attuativo è pari ad euro 16.590.789,00 (sedicimilionicinquecentonovantamilasettecentottantanove virgola zerozero), escluso I.V.A..

Le Parti si danno atto e concordano che, anche in deroga a quanto previsto all'art. 2 lett. b) ultimo capoverso dell'Accordo Quadro, con la sottoscrizione della presente Revisione dell'Accordo Attuativo, HERA avrà titolo per fatturare a Romagna Acque gli interventi già eseguiti e in corso di esecuzione, con le modalità di cui all'art. 13 dell'Accordo Quadro.

Art. 3 - Allegati

Costituiscono parte integrante della presente Revisione dell'Accordo Attuativo i seguenti allegati:

1. Elenco degli interventi e relativa pianificazione economica;

2. Tabella di sintesi dei quadri economici modificati.

Art. 4 - Spese tecniche

La sottoscrizione della presente Revisione dell'Accordo Attuativo non comporta per ATERSIR la preventiva accettazione delle spese tecniche nella misura prevista dalla sintesi dei quadri economici modificati (Allegato 2). Le spese tecniche liquidabili potranno essere quelle autorizzate da ATERSIR anche in deroga al limite fissato dall'art. 6 dell'Accordo Quadro, previa verifica a consuntivo del dettaglio analitico delle componenti di costo, fermo restando che le stesse non potranno superare il 15% dell'importo dei lavori a consuntivo di ogni singolo progetto.

L'importo delle opere da porre a base di calcolo delle spese tecniche è costituito dalla somma di:

	- importo lavori (punto a1),	
	- oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (punto a2),	
	- importo dei lavori in economia (punto b1)	
	in riferimento al quadro economico di progetto di cui all'art. 16 del D.P.R. n.ro	
	207/2010. Eventuali forniture dirette o da magazzino esplicitate nel quadro econo-	
	mico potranno essere comprese nell'importo delle opere IO.	
	Articolo 5 - Disposizioni finali	
	Le Parti si danno atto che per quanto non specificamente disciplinato dal presente	
	atto restano invariate le condizioni regolate dal 1°Accordo Attuativo stipulato in	
	data 22/12/2014.	
	Articolo 6 - Firma digitale	
	Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con	
	firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collega-	
	te.	
	Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC	
	dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	ATERSIR	
	Ing. Vito Belladonna	
	(firmato digitalmente)	
	ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A.	
	Dott. Tonino Bernabè	
	(firmato digitalmente)	
	HERA S.p.A.	
	Dott. Stefano Venier	

(firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

REVISIONE N.1 ° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO TRA ATERSIR, HERA S.p.A. E ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A. PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

QUADRO DI SPESA

ID ATERSIR (codice ARSI)	DEFINIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	AMBITO	STATO DI AVANZAMENTO	quadro di spesa al 31/12/2018	2019	2020	2021	TOTALE INTERVENTO I.V.A. esclusa	IPOTESI DI ENTRATA IN FUNZIONE
2014RNHA0059	REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DORSALE SUD RIMINI 3° STRALCIO - PREMENTE	FOGNATURA DEPURAZIONE	Rimini	ATO 9	In esecuzione lavori (Rete) In progettazione (Sollevamenti 2B e 3B)	1.124.519,00	2.623.946,00	4.245.765,00	2.327.848,00	10.322.078,00	2021
2015RNHA0002	RICONVERSIONE DEL DEPURATORE MARECCHIESE	DEPURAZIONE	Rimini	ATO 9	Terminata esecuzione (LOTTO ISA - LOTTO RETE) / In esecuzione lavori (LOTTO TORRINO- LOTTO DEMOLIZIONI)	5.560.137,00	708.574,00			6.268.711,00	2017
TOTALE						6.684.656,00	3.332.520,00	4.245.765,00	2.327.848,00	16.590.789,00	

2					
1					
0	06/06/2019				
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL (CHCK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)					
DIREZIONE INGEGNERIA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)					
ACCORDO QUADRO TRA HERA, ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI E ATERSIR PER FINANZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI FORLÌ-CESENA, RAVENNA E RIMINI DEL 17 DICEMBRE 2014 - RICHIESTA MODIFICA ACCORDO ATTUATIVO RIMINI DEL 22 DICEMBRE 2014					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)			WBS	CODICE CUP (CUP CODE)	
			CODICE DOCUMENTO (CODE)	N° COMMESSA (JOB N.)	
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME)	
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Bertè Pichat 2/4 - 40127 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.287.525 www.gruppohera.it			 HERAtech s.r.l. Viale C. Bertè Pichat 2/4 - 40127 Bologna tel 051.287111 fax 051.250418		
			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)		
			PROSPETTO COMPARAZIONE ECONOMICA		
			(SCALE)	(SHEET N°)	(LAST)
				1	2

ACCORDO ATTUATIVO	QE IN CONVENZIONE			QE AGGIORNATO con consolidamento sconti e varianti (con Spese tecniche e altre spese art.16 DPR 207/2010 calcolate in coerenza con i contenuti del DM 17/06/2016)				DELTA DA FINANZIARE PER INTERVENTO (QE AGGIORNATO - QE CONVENZIONE)		
INTERVENTO	IMPORTO TOTALE	Importo delle Opere + altre spese	SPESE TECNICHE come definite da A.Q.	IMPORTO TOTALE	Importo delle Opere + altre spese	Spese tecniche (limite massimo 15% dell'importo delle opere a consuntivo)	Importo delle opere (su cui calcolare le ST a consuntivo)	TOTALE	Importo delle Opere + altre spese	SPESE TECNICHE
Intervento di Realizzazione del Collettore Fognario Dorsale Sud RIMINI 3° stralcio - Premente	7.687.760,00	7.475.600,00	212.160,00	10.322.078,67	9.008.620,33	1.313.458,34	8.756.388,94	2.634.318,67	1.533.020,33	1.101.298,34
Intervento di Riconversione del Depuratore Marecchiese - LOTTO ISA Pompe - LOTTO ISA Elettrico - LOTTO Rete - LOTTO Torrino	5.031.629,61	4.600.831,41	430.798,20	6.268.711,12	5.467.040,32	801.670,79	5.344.471,94	1.237.081,51	866.208,91	370.872,59
TOTALE ACCORDO ATTUATIVO	12.719.389,61	12.076.431,41	642.958,20	16.590.789,79	14.475.660,65	2.115.129,13	14.100.860,88	3.871.400,18	2.399.229,24	1.472.170,93

LIMITE SPESE TECNICHE RICONOSCIBILI (con deroghe all'art. 6 AQ)

1.811.464,71

2.115.129,13



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 10D

Secondo Accordo attuativo dell'Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

[28/12/2015]

N. 2° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL
FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE
AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI RIMINI

"PSBO - CONDOTTE SOTTOMARINE AUSA" e "INTERVENTO DI
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA DI ADDUZIONE DAL SER-
BATOIO DI COVIGNANO AL SERVIZIO DELLA ZONA SUD DEL
COMUNE DI RIMINI"

Addì, 28/12/ 2015

Tra le Parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Roma-
gna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bo-
logna Via Aldo Moro n. 64 PEC dgater-
sir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito
Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il qua-
le interviene alla presente scrittura in forza dei
poteri conferiti con deliberazione del Consiglio
d'Ambito n. 54 del 20/10/2014, domiciliato ai fini
della presente Convenzione presso la sede di ATER-
SIR

(di seguito ATERSIR)

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti
Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese
di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA



04245520376, PEC heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità di Amministratore delegato, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione n. 10 del 25/11/2014, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito anche HERA o Gestore)

ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A., con sede legale in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35, iscritta al Registro Imprese di Forlì al n. 00337870406, CF e P.IVA 00337870406, PEC mail@pec.romagnacque.it in persona del dott. Tonino Bernabè nella sua qualità di Presidente, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 18/07/2013 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 30/06/2015, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito Romagna Acque)

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che

a) in data 17/12/2014 è stato sottoscritto, tra ATERSIR, Romagna Acque e HERA, l'Accordo Quadro



(nel seguito **Accordo Quadro**) per la realizzazione e il finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato negli ambiti territoriali di Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini;

b) ai sensi dell'art. 2 lettera b) dell'Accordo Quadro, il presente Accordo costituisce parte attuativa ed integrante dello stesso;

c) il Piano d'Ambito 2014 - 2039 relativamente all'ambito territoriale di Rimini, approvato in data 29/9/2015 del. 47/2015 da parte di ATERSIR, prevede gli interventi denominati i) *PSBO - Condotte Sottomarine Ausa*, ii) *Intervento di realizzazione di una condotta di adduzione dal serbatoio di Covi gnano al servizio della zona sud del Comune di Rimini* tra le opere finanziate da Romagna Acque e realizzate dal Gestore;

d) nelle more del perfezionamento della revisione straordinaria del Piano degli Interventi, attualmente in corso da parte di ATERSIR, che recepirà quanto deliberato per il Piano d'Ambito sopracitato, gli interventi denominati i) *PSBO - Condotte Sottomarine Ausa*, ii) *Intervento di realizzazione di una condotta di adduzione dal serbatoio di Covi gnano al servizio della zona sud del Comune di Rimini*, sono da ritenersi opere oggetto dell'Accordo



Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dello stesso;

e) tenuto conto che per l'Intervento di realizzazione di una condotta di adduzione dal serbatoio di Covignano al servizio della zona sud del Comune di Rimini, risulta sostanzialmente conclusa la procedura espropriativa a favore di Romagna Acque (i.e. decreti di asservimento coattivo già emessi e aree occupabili previa comunicazione al Comune di Rimini) e che Romagna Acque stessa si impegna a completare l'acquisizione di tutti i permessi, nulla osta e autorizzazioni necessari a garantire la piena cantierabilità dell'opera, mentre Hera si impegna a completare l'aggiornamento della progettazione esecutiva;

f) che in forza della vigente disciplina tariffaria Romagna Acque non potrà completare l'intervento di realizzazione sulla rete acquedottistica di cui alla precedente lettera e), che dovrà viceversa essere realizzato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato sulla base del progetto esecutivo già redatto da Romagna Acque ed in corso di aggiornamento, conformemente alle nuove disposizioni in materia tariffaria e di riconoscimento dei canoni in favore dei soggetti finanziatori;



g) di conseguenza, con il presente atto, le Parti intendono dare attuazione al finanziamento ed alla realizzazione di tale intervento, disciplinando le attività specifiche di competenza di Romagna Acque e di HERA, in considerazione ed in coerenza con il nuovo metodo tariffario introdotto da AEEGSI. Per tali ragioni, le disposizioni del presente Accordo Attuativo, per la parte relativa all'intervento denominato "Intervento di realizzazione di una condotta di adduzione dal serbatoio di Covignano al servizio della zona sud del Comune di Rimini" presenta una disciplina specifica (art. 3) ed ulteriore rispetto alle condizioni e termini di cui all'Accordo Quadro citato.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'Atto medesimo.

Art. 2 - Oggetto

Con il presente Accordo Attuativo (nel seguito **Accordo**) le Parti danno attuazione a quanto previsto all'art. 2 lettera b) dell'Accordo Quadro.



Tutte le disposizioni espresse nell'Accordo Quadro, fatta eccezione per quanto riportato all'art. 3 del presente Accordo Attuativo, trovano totale ed integrale applicazione nel presente Accordo.

In particolare Romagna Acque si impegna a finanziare ed HERA si impegna a realizzare i seguenti interventi di cui all'allegato 1) e precisamente:

- PSBO - Condotte Sottomarine Ausa;
- Intervento di realizzazione di una condotta di adduzione dal serbatoio di Covignano al servizio della zona sud del Comune di Rimini.

La somma degli importi degli interventi oggetto del presente Accordo è pari ad euro 18.131.625,00 (diottomilionicentotrentunomilaseicentoventicinque virgola zero zero), escluso I.V.A. di cui:

- euro 17.546.625,00, escluso I.V.A. riferiti al quadro di competenza HERA;
- euro 585.000,00, escluso I.V.A. riferiti al quadro di competenza Romagna Acque (costi diretti Romagna Acque).

Le Parti si danno atto e concordano che, anche in deroga a quanto previsto all'art. 2 lettera b) ultimo capoverso dell'Accordo Quadro, con la sottoscrizione del presente Accordo, HERA avrà titolo per fatturare a Romagna Acque gli interventi già



eseguiti e in corso di esecuzione, con le modalità di cui all'art. 13 dell'Accordo Quadro.

Art. 3 - "Intervento di realizzazione di una condotta di adduzione dal serbatoio di Covignano al servizio della zona sud del Comune di Rimini".

1. Per l'intervento denominato "Intervento di realizzazione di una condotta di adduzione dal serbatoio di Covignano al servizio della zona sud del Comune di Rimini", in considerazione delle motivazioni di cui in premessa, le Parti concordano di definire la seguente disciplina speciale.

Il costo complessivo di tale opera di cui al presente articolo, prevista dal Piano d'Ambito di cui in premessa, è pari ad euro 2.511.625,00 (duemilionicinquecentoundicimilaseicentoventicinque virgola zero zero).

2. Il quadro economico di spesa potrà essere rideterminato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'esito della gara di appalto ai sensi della vigente normativa per l'affidamento dei lavori, nei limiti indicati all'art. 11 dell'Accordo Quadro od a seguito dell'approvazione di varianti in fase esecutiva, nei modi e con i limiti indicati dal presente articolo.

3. Le parti riconoscono che relativamente

all'intervento oggetto del presente articolo, Romagna Acque ha completato l'attività progettuale preliminare, definitiva, ed esecutiva, sono state sostanzialmente completate le attività espropriative (i.e. decreti di asservimento coattivo già emessi e aree occupabili previa comunicazione al Comune di Rimini}), e si impegna a completare l'acquisizione di tutti i permessi, nulla osta e autorizzazioni necessari a garantire la piena cantierabilità dell'opera (i.e. è in fase di rilascio per il titolo abilitativo - permesso di costruire da parte del Comune di RN).

4. Hera si impegna a eseguire l'aggiornamento / revisione finale del progetto esecutivo al fine di avviare la fase di aggiudicazione dell'intervento in questione

5. Fa eccezione a quanto indicato ai precedenti commi 3 e 4 l'intervento di "Sostituzione della condotta DN900 ammalorata presente in prossimità della Via Leoni / Via del Castoro", il cui importo è ricompreso nelle somme a disposizione, per il quale HERA si impegna a sviluppare la progettazione ed ottenere ed acquisire tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta necessari per la realizzazione dell'opera ovvero tutto quanto è necessario a ren-



dere tale intervento cantierabile.

6. HERA svolgerà solamente le attività e le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - RUP - per le fasi di affidamento dell'appalto e di esecuzione delle opere, ad esclusione delle opere riferite all'intervento di "Sostituzione della condotta DN900 ammalorata presente in prossimità della Via Leoni / Via del Castoro", per il quale svolgerà le attività e funzioni di RUP anche per la fase progettuale e di ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione lavori ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente Accordo.

7. A parziale modifica dell'art. 7 dell'Accordo Quadro, si dà atto che le attività di esproprio, ivi compreso l'ottenimento degli accordi di servitù, sono state sostanzialmente completate (i.e. decreti di asservimento coattivo già emessi e aree occupabili previa comunicazione al Comune di Rimini) da parte di Romagna Acque sulla base di quanto previsto nel Piano Particellare di Esproprio del progetto. Sulle opere è stata acquisita la dichiarazione di pubblica utilità nonché la variante degli strumenti urbanistici nei Comuni interessati agli interventi programmati.

Durante l'esecuzione dei lavori HERA si obbliga,

pertanto, sin da ora, al rispetto del Piano Particellare di Esproprio approvato, sollevando Romagna Acque da ogni responsabilità verso terzi derivante dal suo mancato rispetto.

Eventuali necessità di modifica, ai sensi di legge, del Piano Particellare di Esproprio, dovranno essere proposte per tempo e per iscritto da parte di HERA ed essere preventivamente autorizzate da Romagna Acque.

HERA si obbliga a sottoporre tali richieste tempestivamente in modo da garantire il regolare avanzamento dei lavori tenendo indenne Romagna Acque da eventuali danni/ricieste di indennizzo causati da propri ritardi, fermo restando che il contratto di affidamento dell'appalto sarà sottoscritto da HERA, subordinatamente alla immissione in possesso delle aree.

8. Romagna Acque ha tenuto regolare rendicontazione delle spese sino ad ora sostenute per la progettazione e realizzazione delle opere oggetto del presente articolo.

Le spese che verranno ulteriormente sostenute per le attività che rimangono di competenza di Romagna Acque (liquidazione di danni ed occupazioni e personale interno per verifiche e controlli, pratiche



espropriative ed autorizzative), verranno puntualmente rendicontate e rimarranno contenute all'interno di quanto previsto nei quadri di spesa approvati per la parte di competenza di Romagna Acque.

Art. 4 - Allegati

Ai sensi dell'art. 2 lettera b) dell'Accordo Quadro, costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. Elenco degli interventi e relativa pianificazione economica;

2. Cronoprogramma degli interventi:

2.A) Cronoprogramma "PSBO - Condotte Sottomarine AUSA";

2.B) Cronoprogramma "Intervento di realizzazione di una condotta di adduzione dal serbatoio di Covignano al servizio della zona sud del Comune di Rimini";

3. Quadri economici di spesa di ciascuna opera redatti ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 207/2010:

3.A) Quadro economico "PSBO - Condotte Sottomarine AUSA";

3.B) Quadro Economico "Intervento di realizzazione di una condotta di adduzione dal serbatoio di Covignano al servizio della zona sud del Comune di Ri-



mini" ;

4. Previsione dei flussi di finanziamento a carico di Romagna Acque distinta per anno;

Articolo 5: Canonî annui di spettanza di Romagna Acque

A titolo di recupero dei costi del capitale investito, compete a Romagna Acque un canone annuo determinato nel rispetto di quanto previsto negli schemi regolatori predisposti da Atersir e approvati da AEEGSI. Il calcolo del canone terrà conto della formula di valorizzazione dei "Ca-pex" e della decurtazione del 20% dell'onere fiscale standard.

Art. 6 - Durata

Il presente Accordo ha efficacia, anche in via di ratifica, dalla data di inizio delle attività di realizzazione degli interventi e termina alla data del completo recupero da parte di Romagna Acque dei costi del capitale investito per gli stessi nei modi e termini di cui all'art. 15 dell'Accordo Quadro.

Letto, approvato e sottoscritto.

ATERSIR

Ing. Vito Belladonna



ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A.

Dott. Tonino Bernabè

HERA S.p.A.


Dott. Stefano Venier

N. 2° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

ALLEGATO 1

COSTI INDICATI	STATO AVULSA PERIODO	QUADRO DI COMPLESSIVA MEDIA							TOT QUANTO COMPLESSIVO	POTER INERSTA IN FUNZIONE
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
OPERE DI INTERPRETATIONE DI UNA COMUNITA DI ADATTAMENTO DAL PERIODO DI ESPANSIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	OPERE DI INTERPRETATIONE	94.800	985.000	114.000	2.700.000	8.000.000	4.504.123	0	15.124.000	0,00
TOTALE		94.800	985.000	114.000	2.700.000	8.000.000	4.504.123	0	15.124.000	0,00








3.0	04/02/2015	S.S.	M.B.	L.Z.	Emissione	
2.0	03/02/2015	S.S.	L.Z.	L.Z.	Emissione	
1.0	15/09/2014	S.S.	L.Z.	L.Z.	Emissione	
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROL. (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)	
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) Ingegneria						
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) PSBO - Condotte Sottomarine Ausa						
IDENTIFICATIVO IMPIANTO						
			N° ELABORATO (DOCUMENT N°)		N° COMMESSA (JOB N°)	
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)		NOME FILE (FILE NAME)	
 GRUPPO HERA HERA S.p.A. Holding Energia Acqua Ambiente Viale Carlo Farini Piazza 2/4 40121 Bologna tel. 051.267.111 fax 051.267.625 www.gruppohera.it			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) Cronoprogramma			
			SCALA (SCALE)		N° FOGLIO (SHEET N°)	DI (LAST)
					1	2

Condotta sottomarina Ausa

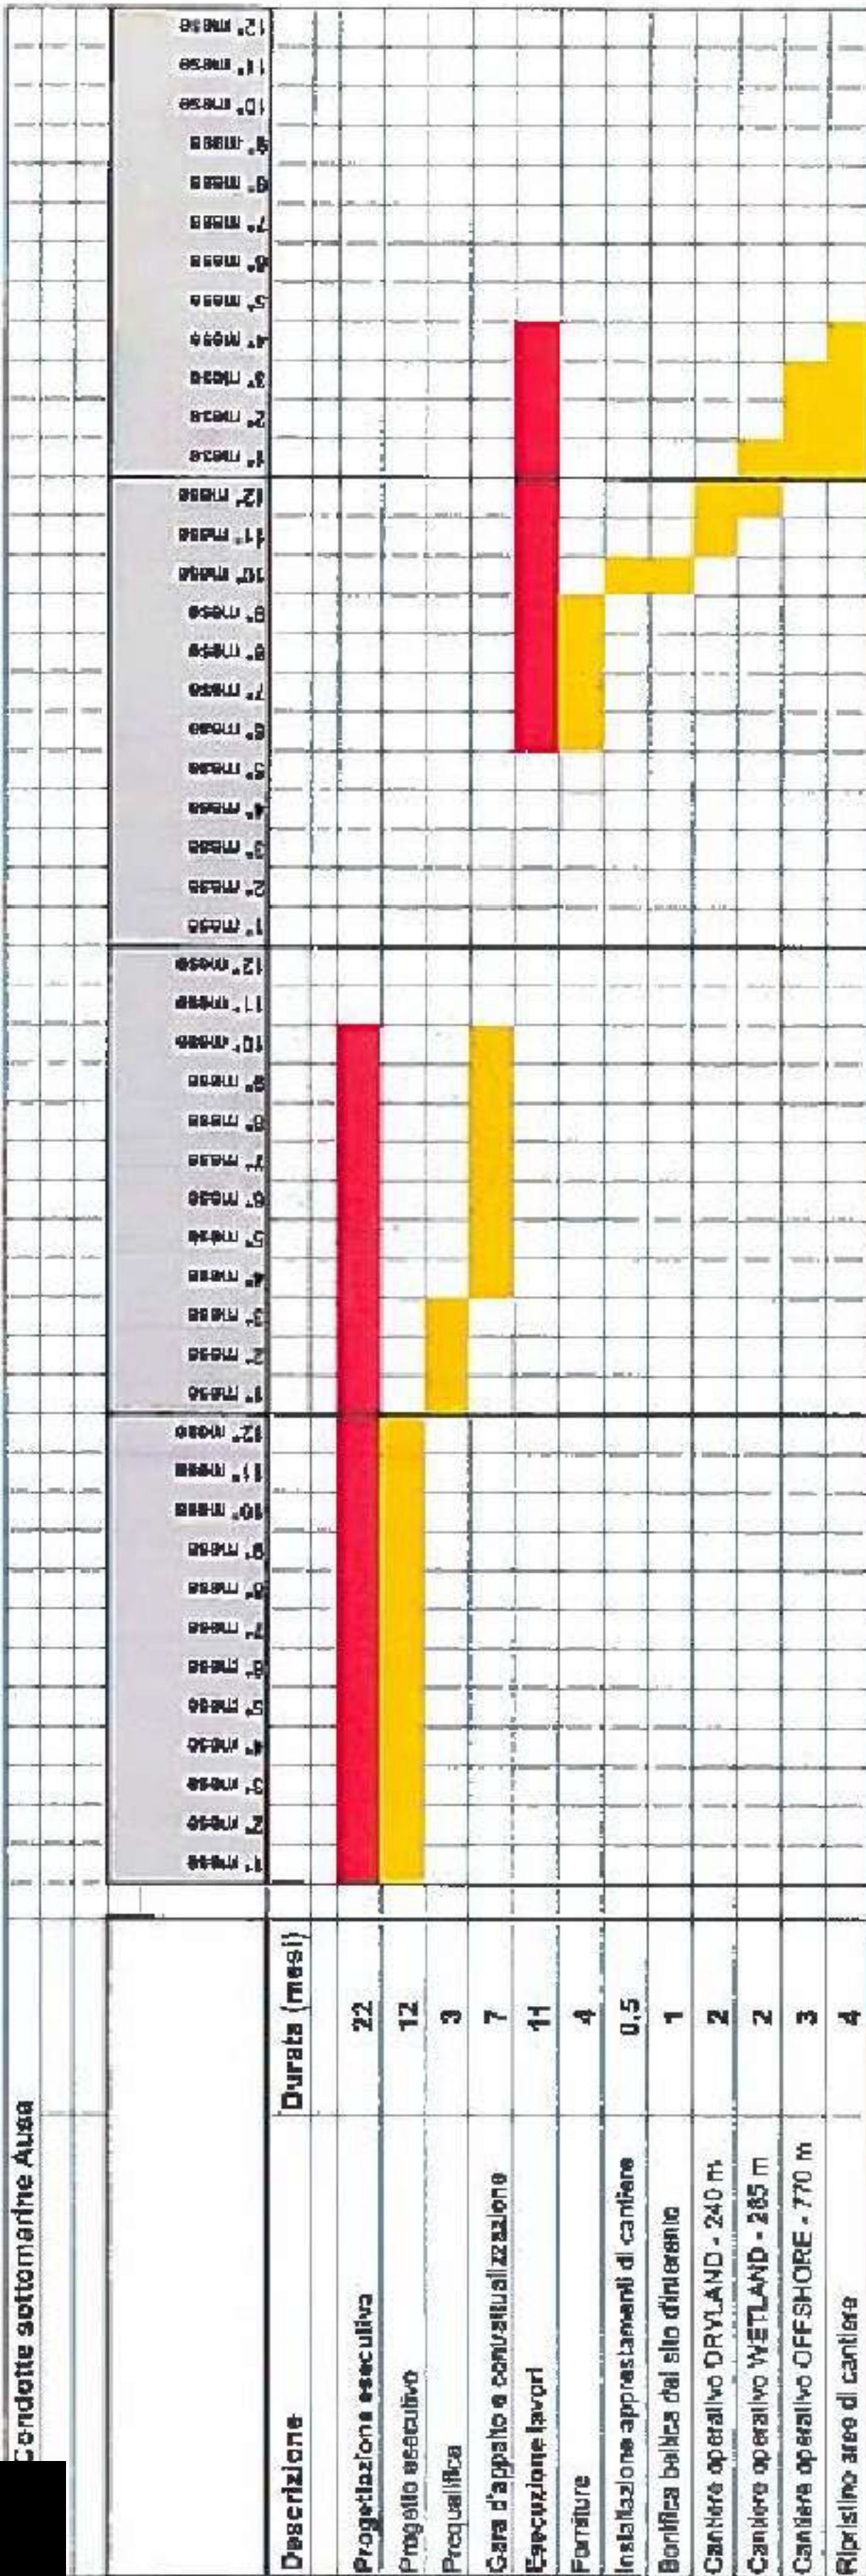



PROGETTO ESECUTIVO

PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA DI ADDUZIONE
DAL SERBATOIO DI COVIGNANO AL SERVIZIO DELLA ZONA
SUD DEL COMUNE DI RIMINI

Progettazione :



Il progettista e direttore tecnico :
di Alpina Acque S.r.l.

Dott. Ing. RENATO DEL PRETE
Ordine Ingegneri Provincia di Bari n. 5073

NORME TECNICHE E STIME			
CRONOPROGRAMMA			2.03
Revisioni	N°	Descrizione	Data
	0	Emissione	Luglio 2009
	1	Revisione	Settembre 2009
	2	Revisione	
Numero elaborato	E A 2 0 4 0 2 0 3 r 1		

ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI
PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'ADDUZIONE DAL SERBATOIO DI COVIGNANO AL SERVIZIO DELLA ZONA SUD DEL
COMUNE DI RIMINI

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ	Durata	Mese														Mese	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A Installazione del cantiere, apertura pista di lavoro e bonifica ordigni bellici	80 gg																
B Posa condotte in ghisa sferoidale	210 gg																
B ₁ Fornitura e sfilamento tubazioni	30 gg																
B ₂ Posa tubazioni	40 gg																
B ₃ Attraversamento Fosso Berattone	20 gg																
B ₄ Attraversamento SS RN-SM	45 gg																
B ₅ Attraversamento Torrente Ausa	50 gg																
B ₆ Camerette di manovra, pozzetti di sfiato e di scarico	25 gg																
C Posa condotte in acciaio	60 gg																
C ₁ Fornitura, sfilamento e assemblaggio tubazioni	30 gg																
C ₂ Posa tubazioni	20 gg																
C ₃ Camerette di manovra, pozzetti di sfiato e di scarico	10 gg																
D Opere di finitura, sistemazioni esterne e collaudi	90 gg																
TOT	420 gg																





1.0	16/09/2014	S.S.	M.B.	L.Z.	Emissione
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROL (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) Ingegneria					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) PSBO - Condotte Sottomarine Ausa - Progetto Definitivo					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO					
				N° ELABORATO (DOCUMENT N°)	N° COMMESSA (JOB N°) T.2150.11.03.00010
				ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) G14017910	NOME FILE (FILE NAME) G14017910
 GRUPPO HERA HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Bert Pichet 2/4 40121 Bologna Tel. 051.287.111 Fax 051.287.828 www.gruppohera.it				DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) Quadro Economico	
				SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°) 1

Condotte sottomarine AUSA
QUADRO ECONOMICO
CONDOTTE SOTTOMARINE

		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI A BASE D'APPALTO			
IMPORTO LAVORI			
<i>di cui:</i>			
Condotte sottomarine	Euro	11.129.702,26	
Opere Elettromeccaniche	Euro	1.512.540,00	
Opere Elettriche	Euro	420.377,43	
Onari per la sicurezza		261.252,39	
Totale lavori a base d'appalto	Euro		13.323.872,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1) Rilevi, accertamenti e indagini	Euro	350.000,00	
B.2) Allacciamenti ai pubblici servizi	Euro	10.000,00	
B.3) Imprevisti	Euro	666.193,60	
B.4) Acquisizioni, occupazioni, indennizzi	Euro	200.000,00	
B.5) Spese tecniche, Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, verifiche e collaudi	Euro	1.065.909,77	
B.6) Spese per concessioni, autorizzazioni e altre imposte arrotondamenti	Euro	2.000,00	
		2.024,54	
Totale somme a disposizione	Euro		2.296.127,91
IMPORTO DELL'INVESTIMENTO	Euro		15.620.000,00
IVA	Euro		1.757.592,12
Importo complessivo con IVA	Euro		17.377.592,12





00	30/04/2015	R.Rossi	R.Resca	R.Resca	PROGETTO ESECUTIVO - REV
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROL. (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) Ingegneria					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA DI ADDUZIONE DAL SERBATOIO DI COVIGNANO AL SERVIZIO DELLA ZONA SUD DEL COMUNE DI RIMINI					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)					
				N° ELABORATO (DOCUMENT N°) 2.07 rev	N° COMMESSA (JOB N°) 11400454752
				ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) T.2150.11.01.00009	NOME FILE (FILE NAME)
 GRUPPO HERA HERA S.p.A. Holding Energia Riscaldamento Ambiente Viale Carlo Farini 3/A 40137 Bologna Tel. 051. 287.111 fax 051. 287. 825 www.gruppohera.it				DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) QUADRO ECONOMICO	
				SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°) 1

QUADRO ECONOMICO "CONDOTTA ADDUZIONE DAL SERBATOIO DI COVIGNANO AL SERVIZIO DELLA ZONA SUD DEL COMUNE DI RIMINI"				
Descrizione		Progetto Esecutivo Settembre 2009	ripartizione importi quadro economico tra Hera SpA e RASDF	
			Romagna Acque	Hera
Lavori a base d'asta				
1	Importo Lavori	€ 1.406.000,00	€ 0,00	€ 1.406.000,00
2	Oneri per la sicurezza diretti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Oneri per la sicurezza specifici	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 32.000,00
	SOMMANO LAVORI BASE D'ASTA	€ 1.438.000,00	€ 0,00	€ 1.438.000,00
Somme a disposizione				
1	Forniture dirette, lavori in economia o eseguiti tramite altri affidamenti	€ 117.000,00	€ 88.000,00	€ 29.000,00
2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00
3	Interferenze	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
4	Concessioni e allacciamenti pubblici servizi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
5	Maggiori lavori imprevisti	€ 61.000,00	€ 0,00	€ 61.000,00
6	Espropri, servitù, occupazioni e danni	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00
7	Spese tecniche (progettazione, coordinamento sicurezza, DL, Assistenza lavori e contabilità)	€ 224.125,00	€ 110.000,00	€ 114.125,00
8	Spese per effettuazione gara d'appalto	€ 5.000,00	€ 500,00	€ 4.500,00
9	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudi specialistici	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
10	Accantonamenti per accordi bonari di cui art.240 e applicazione del prezzo chiuso art.133 del d.lgs 163/06 e s.m.i.	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
11	Capitalizzazione personale interno	€ 85.500,00	€ 85.500,00	€ 0,00
12	sostituzione condotta ACC DN900	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00
	SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.073.625,00	€ 585.000,00	€ 488.625,00
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 2.511.625,00	€ 585.000,00	€ 1.926.625,00







**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 10E

Revisione del Secondo Accordo attuativo dell'Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.



**REVISIONE DEL SECONDO ACCORDO ATTUATIVO
DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA
REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI.**

Tra le Parti

**ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi
Idrici e Rifiuti** con sede in Bologna Via Cairoli n. 8/F, C.F. 91342750378,
PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it nella persona dell'Ing. Vito Belladonna,
nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in
forza dei poteri conferiti con delibera del Consiglio d'Ambito n. 54 del
20/10/2014, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di ATERSIR;

(nel seguito **ATERSIR**)

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta
al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale 04245520376, Partita
IVA 03819031208, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott.
Stefano Venier, nella sua qualità di Amministratore delegato, il quale inter-
viene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del
25/11/2014 assunta ai sensi dell'articolo 23.5 dello Statuto sociale di HERA
S.p.A., domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Società;

(nel seguito anche **HERA** o **Gestore**);

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A., con sede le-
gale in Forlì, Piazza Orsi Mangelli n. 10, iscritta al Registro Imprese di Forlì
al n. 00337870406, CF e P.IVA 00337870406, PEC:
mail@pec.romagnacque.it in persona del Dott. Tonino Bernabè nella sua
qualità di Presidente, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deli-

berazione del Consiglio di Amministrazione n. 203 del 16/12/2020, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Società;

(nel seguito **Romagna Acque**)

(nel seguito congiuntamente le **Parti**)

Premesso che

a) in data 17/12/2014 è stato sottoscritto, tra ATERSIR, Romagna Acque e HERA, l'Accordo Quadro per la realizzazione e il finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato negli ambiti territoriali di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini modificato e integrato con l'Addendum all'Accordo Quadro sottoscritto in data 16/10/2019 con efficacia dal 22/10/2019 (nel seguito atti congiuntamente denominati **Accordo Quadro**);

b) ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro, il presente atto costituisce parte attuativa ed integrante dello stesso;

c) in data 28/12/2015 è stato stipulato il 2° *Accordo Attuativo dell'Accordo Quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al Servizio Idrico Integrato nel territorio della Provincia di Rimini* (nel seguito **Accordo Attuativo**) per il finanziamento da parte di Romagna Acque e la realizzazione da parte di HERA delle opere: i) *PSBO – Condotte Sottomarine Ausa* per l'importo di euro 15.620.000,00 e ii) *Intervento di realizzazione di una condotta di adduzione dal serbatoio di Covignano al servizio della zona sud del Comune di Rimini* per l'importo di euro 2.511.625,00 di cui euro 585.000,00 costi diretti di Romagna Acque;

d) HERA ha richiesto con nota del 25/05/2019 prot. 44639 la disponibilità di ATERSIR ad incrementare l'importo progettuale dell'Accordo Attuativo di cui al precedente punto c), per sopravvenute esigenze manifestatesi du-

rante la realizzazione delle opere, proponendo di aggiornare gli importi complessivi dei singoli interventi nel seguente modo:

• **2014RNHA0055 PSB - Condotta Sottomarina AUSA:** Ulteriore fabbisogno per euro 2.900.000,00 (che determina un nuovo importo finale di progetto pari a euro 18.520.000,00)

• **2014RNHA0049 Rete di collegamento serbatoio Covignano:** Ulteriore fabbisogno per euro 850.000,00 (che determina un nuovo importo finale di progetto pari a euro 3.361.625,00, di cui sempre euro 585.000,00 costi diretti di Romagna Acque);

e) ATERSIR, acquisita la disponibilità di Romagna Acque all'aumento del finanziamento dell'Accordo Attuativo per un ulteriore importo di euro 3.750.000,00, con nota del 04/6/2020 prot. n. PG.AT/2020/0004143 ha rilasciato il proprio nulla osta ai nuovi importi progettuali;

f) il Programma degli Interventi del Gestore per il quadriennio 2020-2023 relativamente all'ambito territoriale di Rimini, approvato con delibera CLRN/2020/03 del 28 settembre 2020, che costituisce proposta di aggiornamento del Piano d'Ambito, prevede: *PSB – Realizzazione condotta sottomarina bacino Ausa* (ID ATERSIR 2014RNHA0055) per l'importo di euro 18.520.000,00 e *Rete di collegamento serbatoio Covignano – Acquedotto Romagna* (ID ATERSIR 2014RAHA0049) per l'importo di euro 3.361.625,00 tra le opere finanziate da Romagna Acque e realizzate dal Gestore e, pertanto, oggetto dell'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dello stesso.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1 - Premesse

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'atto medesimo.

Art. 2 -Oggetto

Con la presente *Revisione del 2° Accordo Attuativo dell'Accordo Quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al Servizio Idrico Integrato nel territorio della Provincia di Rimini* (nel seguito **Revisione dell'Accordo Attuativo**) le Parti danno attuazione a quanto previsto dagli articoli 11 (lettera c) e 16 dell'Accordo Quadro.

Fermo restando che Romagna Acque si impegna a finanziare ed HERA si impegna a realizzare gli interventi di cui all'allegato 1) e precisamente:

A) PSBO - Condotte Sottomarine Ausa;

B) Intervento di realizzazione di una condotta di adduzione dal serbatoio di Covignano al servizio della zona sud del Comune di Rimini.

La nuova somma complessiva degli importi degli interventi oggetto della presente *Revisione dell'Accordo Attuativo* è pari ad euro 21.880.474,00 (ventunmilioniottocentottantamilaquattrocentosettantaquattro/00), IVA esclusa, di cui:

- euro 21.245.474,00, escluso I.V.A. riferiti al quadro di competenza HERA;
- euro 635.000,00, escluso I.V.A. riferiti al quadro di competenza Romagna Acque (costi diretti Romagna Acque).

Le Parti si danno atto e concordano che, anche in deroga a quanto previsto all'art. 2 lett. b) ultimo capoverso dell'Accordo Quadro, con la sottoscrizione della presente *Revisione dell'Accordo Attuativo*, HERA avrà titolo per



fatturare a Romagna Acque gli interventi già eseguiti e in corso di esecuzione, con le modalità di cui all'art. 13 dell'Accordo Quadro.

Art. 3 - Allegati

Ai sensi dell'art 2 lettera b) dell'Accordo Quadro, costituiscono parte integrante della presente Revisione dell'Accordo Attuativo i seguenti allegati aggiornati:

1. Elenco degli interventi e relativa pianificazione economica;

2. Cronoprogramma degli interventi:

2.A) Cronoprogramma "*PSBO – Condotte Sottomarine Ausa*" (non presente perché l'intervento è da ritenersi concluso, in quanto i lavori sono terminati e mancano solo i collaudi);

2.B) Cronoprogramma "*Intervento di realizzazione di una condotta di adduzione dal serbatoio di Covignano al servizio della zona sud del Comune di Rimini*";

3. Quadro economico di spesa di ciascuna opera:

3.A) Quadro economico "*PSBO – Condotte Sottomarine Ausa*";

3.B) Quadro Economico "*Intervento di realizzazione di una condotta di adduzione dal serbatoio di Covignano al servizio della zona sud del Comune di Rimini*".

Art. 4 - Spese tecniche

Le spese tecniche liquidabili potranno essere quelle autorizzate da ATER-SIR anche in deroga al limite fissato dall'art.6 dell'Accordo Quadro, previa verifica a consuntivo del dettaglio analitico delle componenti di costo, fermo restando che le stesse non potranno superare il 15% dell'importo dei lavori a consuntivo di ogni singolo progetto.

L'importo delle opere da porre a base di calcolo delle spese tecniche è costituito dalla somma di:

- Importo lavori (punto a1)
- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (punto a2)
- Importo dei lavori in economia (punto b1)

in riferimento al quadro economico di progetto di cui all'art. 16 del D.P.R. n.ro 207/2010. Eventuali forniture dirette o da magazzino esplicitate nel quadro economico potranno essere comprese nell'importo delle opere IO.

Articolo 5 - Disposizioni finali

Le Parti si danno atto che per quanto non specificamente disciplinato dal presente atto restano invariate le condizioni regolate dal 2° Accordo Attuativo stipulato in data 28/12/2015 ad eccezione dell'art.5 "Canoni annui di spettanza di Romagna Acque" in quanto il calcolo del canone terrà conto della formula di valorizzazione dei "Capex", della decurtazione del 50% dell'onere fiscale standard e del time lag.

Articolo 6 - Firma digitale

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A.

Dott. Tonino Bernabè

(firmato digitalmente)

HERA S.p.A.

Dott. Stefano Venier

(firmato digitalmente)

ATERSIR

Ing. Vito Belladonna

(firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

2° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO TRA ATERSIR, HERA S.p.A. E ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ' DELLE FONTI S.p.A. PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

QUADRO DI COMPETENZA HERA

ID ATERSIR (codice ARS1)	DEFINIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	AMBITO	STATO DI AVANZAMENTO	quadro di spesa al 31/12/2019	2020	2021	QUADRO DI COMPETENZA HERA
2014RNHA0058	PSBO - CONDOTTE SOTTOMARINE AUSA	FOGNA TURA	Rimini	ATO 9 - RN	Terminata Esecuzione	15.554.373	2.800.000	165.627	18.520.000
2014RNHA0049	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA DI ADDUZIONE DAL SERBATOIO DI COMIGNANO AL SERVIZIO DELLA ZONA SUD DEL COMUNE DI RIMINI	ACQUEDOTTO	Rimini	ATO 9 - RN	In esecuzione lavori	1.054.211	57.935	1.513.328	2.725.474
TOTALE						16.608.584	2.857.935	1.778.955	21.245.474

QUADRO COMPETENZA RASdF	TOTALE INTERVENTO	IPOTESI DI ENTRATA IN FUNZIONE
0	18.520.000	2021
635.000	3.360.474	2021
635.000	21.880.474	



3					
2					
1	17/09/2020	Ricci Stefano	Rossi Roberta	Rossi Roberta	PROGETTO DI VARIANTE
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL. (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)					
DIREZIONE INGEGNERIA – PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE ROMAGNA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)					
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA DI ADDUZIONE DAL SERBATOIO DI COVIGNANO AL SERVIZIO DELLA ZONA SUD DEL COMUNE DI RIMINI					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)			WBS T.2150.11.01.00009		CODICE CUP (CUP CODE) H97B08000030003
			CODICE DOCUMENTO (CODE)		N° COMMESSA (JOB N.) N11400454752
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME)	
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Moro Pichat 204 - 40127 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.287.525 www.gruppohera.it			 HERAtech s.r.l. Viale C. Dardi Pichat 204 - 40127 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.250.118 pec: heratech@pec.gruppohera.it www.heratech.it		
			CRONOPROGRAMMA		
			SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°) 1	DI (LAST) 2

REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA DI ADDUZIONE DAL SERBATOIO DI COVIGNANO AL SERVIZIO DELLA ZONA SUD DEL COMUNE DI RIMINI	Descrizione fasi																
	mese -2	mese -1	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12	mese 13	mese 14	mese 15
Costruzione e Avvio Esercizio																	

3					
2	11/05/2020	L.F.	M.V.	L.Z.	Previsione a finire
1	16/09/2014	S.S.	M.B.	L.Z.	Emissione
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRAWN)	CONTROL (CHECK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)					
DIREZIONE INGEGNERIA – PROGETTAZIONE - PROGETTAZIONE IMPIANTI ACQUA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)					
PSBO - Condotte Sottomarine Ausa					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)			WBS		CODICE CUP (CUP CODE)
			T.2150.11.03.00010		H97H14000700005
			CODICE DOCUMENTO (CODE)		N° COMMESSA (JOB N.)
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME)	
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Berti Pichat 2/4 - 40137 Bologna tel. 051.287.1111 fax 051.250449 pec: heratech@pec.gruppohera.it www.gruppohera.it			 HERAtech s.r.l. Viale C. Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna tel 051.287.1111 fax 051.250449 pec: heratech@pec.gruppohera.it www.heratech.it		
			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)		
			QUADRO ECONOMICO		
			SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°)	DI (LAST)
				1	2

Quadro Economico

Importo previsionale
a finire

A Somme per lavori		
A1 lavori a misura, a corpo, in economia		9.317.864,75
A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		380.467,67
A3-1 forniture dirette		0,00
A3-2 forniture da magazzino		0,00
A3-3 Perizie di variante (approvate e da approvare)		3.870.042,58
A3-4 Danni mareggiate		840.575,92
A3-5 Riserve (Ipotesi di accoglimento per Accordo Bonario)		1.400.000,00
Totale A:		€ 15.808.950,92
B Somme a disposizione		
B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		132.963,61
B2 rilievi, accertamenti e indagini		652.698,58
B3 allacciamenti ai pubblici servizi		10.000,00
B4 imprevisti		81.693,49
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		200.000,00
B6 accantonamento		0,00
B7 spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010 - (*)		1.622.523,40
B8		
B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici		0,00
B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		11.170,00
Totale B:		€ 2.711.049,08
Totale intervento (A+B)		€ 18.520.000,00

(*)

Il valore è limitato per rispettare l'importo complessivo approvato da Atersir (18.520.000 €). A parità di importo complessivo limite, il valore delle "spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010" verrà rideterminato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati fino ad un limite del 15% dell'importo delle opere a consuntivo, ai sensi dell'art.4 della Revisione dell'Accordo Attuativo

Quadro Economico		Importo totale AA originale	Importo RASdF previsionale	Importo Hera previsionale	Importo totale previsionale (MAX)
A	Somme per lavori				
A1	lavori a misura, a corpo, in economia	1.406.000,00	0,00	1.971.025,69	1.971.025,69
A2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	0,00	0,00	86.800,00	86.800,00
A3-1	forniture dirette	32.000,00	0,00	0,00	0,00
A3-2	forniture da magazzino		0,00	0,00	0,00
	Totale A:	€ 1.438.000,00	€ 0,00	€ 2.057.825,69	€ 2.057.825,69
B	Somme a disposizione				
B1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	372.000,00	91.000,00	90.000,00	181.000,00
B2	rilievi, accertamenti e indagini	28.000,00	28.000,00	20.000,00	48.000,00
B3	allacciamenti ai pubblici servizi	3.000,00	0,00	0,00	0,00
B4	imprevisti	61.000,00	0,00	288.847,00	288.847,00
B5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	250.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00
B6	accantonamento	25.000,00	0,00	0,00	0,00
B7	spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010 - (*)	249.125,00	110.500,00	268.650,90	379.150,90
B8	eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00	0,00
B9	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
B10	capitalizzazione personale interno RASdF (voce presente nel QE originale)	85.500,00	85.500,00	0,00	85.500,00
	Totale B:	€ 1.073.625,00	€ 635.000,00	€ 667.648,31	€ 1.302.648,31
Totale intervento (A+B)		€ 2.511.625,00	€ 635.000,00	€ 2.725.474,00	€ 3.360.474,00

(*) L'importo totale previsionale massimo è stato calcolato sulla base dell'art. 4 della Revisione dell'Accordo Attuativo (15% dell'importo delle opere a consuntivo). Il calcolo è stato fatto sulla base degli importi previsionali ed è da considerarsi di riferimento per la determinazione del totale dell'Accordo Attuativo.

La quota di "spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010" di competenza Hera è stata calcolata come differenza tra il suddetto importo e quello individuato nel QE iniziale come ST RASdF, dopo aver escluso i collaudi che saranno in capo a Hera.





**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 10F

Terzo Accordo attuativo dell'Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

**TERZO ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER
IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE
AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI RIMINI**

Tra le Parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna Via Cairoli n. 8/F, C.F. 91342750378, PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it nella persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del Consiglio d'Ambito n. 54 del 20/10/2014, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR ;

(nel seguito **ATERSIR**)

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità di Amministratore delegato, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 25/11/2014 assunta ai sensi dell'articolo 23.5 dello Statuto sociale di HERA S.p.A., domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

(nel seguito anche **HERA** o **Gestore**);

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A., con sede legale in Forlì, Piazza Orsi Mangelli n. 10, iscritta al Registro Imprese di Forlì al n. 00337870406, CF e P.IVA 00337870406, PEC:

mail@pec.romagnacque.it in persona del dott. Tonino Bernabè nella sua qualità di Presidente, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione Amministrazione n. 167 del 17/12/2019 – Oggetto n. 10, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

(nel seguito **Romagna Acque**)

(nel seguito congiuntamente le **Parti**)

Premesso che

a) in data 17/12/2014 è stato sottoscritto, tra ATERSIR, Romagna Acque e HERA, l'Accordo Quadro per la realizzazione e il finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato negli ambiti territoriali di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini modificato e integrato con l'Addendum all'Accordo Quadro sottoscritto in data 16/10/2019 (nel seguito atti congiuntamente denominati **Accordo Quadro**);

b) ai sensi dell'art. 2 lettera b) dell'Accordo Quadro, il presente Accordo Attuativo (nel seguito **Accordo**) costituisce parte attuativa ed integrante dello stesso;

c) l'integrazione del Piano d'Ambito per gli interventi 2016-2019 relativamente all'ambito territoriale di Rimini (deliberazione CLRN/2017/5 del 1 febbraio 2017) prevede quelli denominati i) *Potenziamento rete idrica di Santarcangelo* e ii) *Riordino dello schema idrico del Conca*, tra le opere finanziate da Romagna Acque e realizzate dal Gestore e, pertanto, da ritenersi opere oggetto dell'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dello stesso;

d) per l'intervento "*Riordino dello schema idrico del Conca*" il Piano

d'Ambito prevede un importo progetto di euro 1.855.000, congruente con l'importo del quadro di spesa dell'intervento allegato al presente accordo, ma un importo pianificato inferiore all'importo del quadro complessivo di spesa dell'intervento allegato al presente accordo; per l'intervento "*Poten-
ziamento rete idrica di Santarcangelo*" il Piano d'Ambito prevede un im-
porto progetto di euro 1.326.000 inferiore all'importo del quadro di spesa
dell'intervento allegato al presente accordo;

e) tenuto conto che per l'intervento *Potenziamento rete idrica di Santar-
cangelo* sono state svolte da parte di Romagna Acque le attività preliminari
di progettazione e di indagini e che le Parti riconoscono quanto esplicitato
all'art. 3;

f) tenuto conto che per l'intervento *Riordino dello schema idrico del Con-
ca* sono state svolte da parte di Romagna Acque le progettazioni prelimina-
re, definitiva ed esecutiva, è stata conclusa la fase espropriativa a favore di
Romagna Acque con la sottoscrizione degli atti di asservimento e di occu-
pazione e sono stati acquisiti da parte di Romagna Acque tutti i permessi,
nulla osta e autorizzazioni necessari per l'esecuzione dell'intervento;

g) che in forza della vigente disciplina tariffaria Romagna Acque non potrà
completare l'intervento *Riordino dello schema idrico del Conca* di cui alla
precedente lettera f) in quanto trattasi di condotta distributrice, che dovrà es-
sere realizzato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato sulla base del pro-
getto esecutivo già redatto da Romagna Acque, conformemente alle nuove
disposizioni in materia tariffaria e di riconoscimento dei canoni in favore dei
soggetti finanziatori;

h) di conseguenza, con il presente atto, le Parti intendono dare attuazione

al finanziamento e alla realizzazione dell'intervento *Riordino dello schema idrico del Conca*, disciplinando le attività specifiche di competenza di Romagna Acque e di HERA, in considerazione ed in coerenza con il nuovo metodo tariffario introdotto da AEEGSI;

i) per tali ragioni, il presente Accordo Attuativo, per la parte relativa ai suddetti interventi, presenta una disciplina specifica (art. 4) ed ulteriore rispetto alle condizioni e termini di cui all'Accordo Quadro citato.

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'Accordo medesimo.

Articolo 2 - Oggetto

Con il presente Accordo le Parti danno attuazione a quanto previsto all'art. 2 lettera b) dell'Accordo Quadro.

Tutte le disposizioni espresse nell'Accordo Quadro trovano totale ed integrale applicazione nel presente Accordo.

In particolare, Romagna Acque si impegna a finanziare, ed HERA si impegna a realizzare, i seguenti interventi di cui all'allegato 1) e precisamente:

A) *Potenziamento rete idrica di Santarcangelo*;

B) *Riordino dello schema idrico del Conca*.

La somma degli importi degli interventi oggetto del presente Accordo è pari ad euro 3.787.381,00 (tremilionsettecentoottantasettemilatrecentoottantuno virgola zerozero), escluso IVA di cui:

- euro 2.048.657 riferiti a *Potenziamento rete idrica di Santarcangelo*;

	- euro 1.738.724 riferiti a <i>Riordino dello schema idrico del Conca</i> .	
	In particolare, per l'intervento <i>Potenziamento rete idrica di Santarcangelo</i> ,	
	sono da prevedere:	
	- euro 2.013.607 riferiti al quadro di competenza HERA;	
	- euro 35.050 riferiti al quadro di competenza Romagna Acque.	
	Per l'intervento <i>Riordino dello schema idrico del Conca</i> , sono da prevedere:	
	- euro 1.043.360 riferiti al quadro di competenza HERA;	
	- euro 695.364 riferiti al quadro di competenza Romagna Acque.	
	Le Parti si danno atto e concordano che, anche in deroga a quanto previsto	
	all'art. 2 lettera b) ultimo capoverso dell'Accordo Quadro, con la sottoscri-	
	zione del presente Accordo, HERA avrà titolo per fatturare a Romagna Ac-	
	que gli interventi già eseguiti e in corso di esecuzione, con le modalità di cui	
	all'art. 13 dell'Accordo Quadro.	
	Articolo 3 - Intervento di “<i>Potenziamento rete idrica di Santarcangelo</i>”	
	1. Le Parti riconoscono che, relativamente all'intervento oggetto del pre-	
	sente articolo, Romagna Acque ha svolto le attività preliminari di pro-	
	gettazione e di indagini per importo complessivo pari a euro 35.050.	
	2. HERA si impegna a presentare istanza di variante dell'importo comples-	
	sivo dell'opera secondo quanto previsto dalla deliberazione	
	CAMB/2017/75 del 12 ottobre 2017.	
	Articolo 4 - Intervento di “<i>Riordino dello schema idrico del Conca</i>”	
	1. Per l'intervento denominato “ <i>Riordino dello schema idrico del Conca</i> ”,	
	in considerazione delle motivazioni di cui in premessa, le Parti concor-	
	dano di definire la seguente disciplina speciale.	
	2. Le Parti riconoscono che relativamente all'intervento oggetto del pre-	

	sente articolo, Romagna Acque ha completato le attività progettuali de-	
	finitiva ed esecutiva, le attività espropriative e l'acquisizione di tutti i	
	permessi, nulla osta e autorizzazioni necessari a garantire la piena can-	
	tierabilità dell'opera. Inoltre, Romagna Acque ha eseguito un tratto di	
	acquedotto previsto progettualmente nel Comune di Cattolica, via E.	
	Romagna.	
	3. HERA ha validato il progetto esecutivo consegnato da Romagna Acque	
	e svolto la gara per l'esecuzione delle opere. HERA, quindi, si configura	
	come Responsabile Unico del Procedimento.	
	4. A parziale modifica dell'art. 7 dell'Accordo Quadro, si dà atto che le at-	
	tività di esproprio, ivi compreso l'ottenimento degli accordi di servitù,	
	sono state completate da parte di Romagna Acque sulla base di quanto	
	previsto nel Piano Particellare di Esproprio del progetto.	
	Durante l'esecuzione dei lavori HERA si obbliga, pertanto, sin da ora, al	
	rispetto del Piano Particellare di Esproprio approvato, sollevando Ro-	
	magna Acque da ogni responsabilità verso terzi derivante dal suo man-	
	cato rispetto.	
	Eventuali necessità di modifica, ai sensi della legge, del Piano Particel-	
	lare di Esproprio, dovranno essere proposte per tempo e per iscritto da	
	parte di HERA ed essere preventivamente autorizzate da Romagna Ac-	
	que.	
	HERA si obbliga a sottoporre tali richieste tempestivamente in modo da	
	garantire il regolare avanzamento dei lavori tenendo indenne Romagna	
	Acque da eventuali danni/richieste di indennizzo causati da propri ritar-	
	di.	

	5. Romagna Acque ha tenuto regolare rendicontazione delle spese sino ad ora sostenute per la progettazione, per le pratiche espropriative ed autorizzative e per i lavori eseguiti nel Comune di Cattolica, via E. Romagna.	
	6. HERA si impegna a presentare istanza di variante dell'importo complessivo dell'opera secondo quanto previsto dalla deliberazione CAMB/2017/75 del 12 ottobre 2017.	
	Articolo 5 - Allegati	
	Ai sensi dell'art. 2 lettera b) dell'Accordo Quadro, costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:	
	1. Elenco degli interventi e relativa pianificazione economica	
	2. Cronoprogramma degli interventi:	
	2.A) Cronoprogramma Intervento <i>"Potenziamento rete idrica di Santarcangelo"</i> ;	
	2.B) Cronoprogramma Intervento <i>"Riordino dello schema idrico del Conca"</i> .	
	3. Quadro economico di spesa di ciascuna opera redatto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 207/2010;	
	3.A) Quadro economico Intervento <i>"Potenziamento della rete idrica di Santarcangelo"</i> ;	
	3.B) Quadro Economico Intervento <i>"Riordino dello schema idrico del Conca"</i> .	
	Articolo 6 - Canoni annui di spettanza di Romagna Acque	
	A titolo di recupero dei costi del capitale investito compete a Romagna Acque un canone annuo determinato nel rispetto di quanto previsto negli	

	schemi regolatori predisposti da ATERSIR e approvati da ARERA. Il calcolo del canone terrà conto della formula di valorizzazione dei “Ca-pex” e della decurtazione del 20% dell’onere fiscale standard.	
	Articolo 7 - Durata	
	Il presente Accordo ha efficacia, anche in via di ratifica, dalla data di inizio delle attività di realizzazione degli interventi e termina alla data del completo recupero da parte di Romagna Acque dei costi del capitale investito per gli stessi nei modi e termini di cui all’art. 15 dell’Accordo Quadro.	
	Articolo 8 - Firma digitale	
	Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.	
	Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell’avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell’atto a tutti i contraenti.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A.	
	Dott. Tonino Bernabè	
	(firmato digitalmente)	
	HERA S.p.A.	
	Dott. Stefano Venier	
	(firmato digitalmente)	
	ATERSIR	
	Ing. Vito Belladonna	
	(firmato digitalmente)	

ALLEGATO 1

3° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO TRA ATERSIR, HERA S.p.A. E ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A. PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

ID ATERSIR (codice ARSI)	DEFINIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	AMBITO	STATO DI AVANZAMENTO	quadro di spesa al 31/12/2019	2020	2021	2022	QUADRO COMPETENZA HERA I.V.A. escl.	QUADRO COMPETENZA RASdF I.V.A. escl.	TOTALE INTERVENTO I.V.A. esclusa	IPOTESI DI ENTRATA IN FUNZIONE
2014RNHA0075	Potenziamento della rete idrica di Santarcangelo	ACQUEDOTTO	Santarcangelo di Romagna	ATO 9 - RN	In progettazione	129.000	750.994	636.424	497.189	2.013.607	35.050	2.048.657	2021
2015RNHA0001	Riordino dello schema idrico del Conca	ACQUEDOTTO	Cattolica	ATO 9 - RN	In esecuzione lavori	481.000	300.840	261.520		1.043.360	695.364	1.738.724	2020
TOTALE						610.000	1.051.834	897.944	497.189	3.056.967	730.414	3.787.381	

3							
2							
1	03/10/2019				PROGETTO ESECUTIVO		
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL. (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)		
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) DIREZIONE INGEGNERIA PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE ROMAGNA							
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) REALIZZAZIONE DI TRATTI DI RETE ACQUEDOTTO PER LA CONNESSIONE DEL SERBATOIO CAPPUCCINI CON L'IMPIANTO GALLERIA DRENANTE E I POZZI BORNACCINO E CECCARINO NEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)							
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)			WBS T.2150.11.01.00008		CODICE CUP (CUP CODE)		
			CODICE DOCUMENTO (CODE)		N° COMMESSA (JOB N.)		
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME)			
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Dante, 8/10 - 40127 Bologna tel. 051.287111 fax 051.287112 info@gruppohera.it			 HERAtech s.r.l. Viale G. Berri Pichat 2/4 - 40127 Bologna tel. 051.287111 fax 051.250418 pec.heratech@pec.gruppohera.it www.heratech.it			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) CRONOPROGRAMMA	
			SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°) 1	DI (LAST) 2		

[illegible]

3					
2					
1	08/11/2019	Roberta Rossi	Roberta Rossi	Marco Guidorzi	Aggiornamento
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL. (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)					
DIREZIONE INGEGNERIA – PROGETTAZIONE - PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE ROMAGNA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)					
RIORDINO DELLO SCHEMA IDRICO DEL CONCA. LOTTO 2 OPERE DI DISTRIBUZIONE					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)			WBS T.2150.11.01.00010		CODICE CUP (CUP CODE) H65E16000020005
			CODICE DOCUMENTO (CODE)		N° COMMESSA (JOB N.) 11400454615
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME)	
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Scati Rivetti 2/4 - 40127 Bologna tel. 051.287111 fax 051.250418 pec: heratech@pec.gruppohera.it www.gruppohera.it			 HERAtech s.r.l. Viale C. Berni Pichat 2/4 - 40127 Bologna tel.051.287111 fax 051.250418 pec: heratech@pec.gruppohera.it www.heratech.it		
			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) CRONOPROGRAMMA		
SCALA (SCALE)			N° FOGLIO (SHEET N°) 1		DI (LAST) 2

[illegible]

3					
2					
1	03/10/2019				PROGETTO ESECUTIVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL. (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) DIREZIONE INGEGNERIA PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE ROMAGNA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) REALIZZAZIONE DI TRATTI DI RETE ACQUEDOTTO PER LA CONNESSIONE DEL SERBATOIO CAPPUCCINI CON L'IMPIANTO GALLERIA DRENANTE E I POZZI BORNACCINO E CECCARINO NEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)			WBS T.2150.11.01.00008		CODICE CUP (CUP CODE)
			CODICE DOCUMENTO (CODE)		N° COMMESSA (JOB N.)
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME)	
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Berni Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287111 fax 051.250418 pec: heratech@pec.gruppohera.it www.gruppohera.it			 HERAtech s.r.l. Viale C. Berni Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287111 fax 051.250418 pec: heratech@pec.gruppohera.it www.heratech.it		
			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) QUADRO ECONOMICO		
			SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°) 1	DI (LAST) 3

Quadro Economico - PE

Importo netto

A	Somme per lavori	
	A1 lavori a misura, a corpo, in economia	1.531.319,75
	A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	98.074,48
	A3-1 forniture dirette	0,00
	A3-2 forniture da magazzino	0,00
	Totale A:	€ 1.629.394,23
B	Somme a disposizione	
	B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	3.000,00
	B2 rilievi, accertamenti e indagini	41.300,00
	B3 allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
	B4 imprevisti	83.684,71
	B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	5.739,93
	B6 accantonamento	0,00
	B7 spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010 *	250.487,94
	B8	
	B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
	B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
	Totale B:	€ 384.212,58
	Totale intervento (A+B)	€ 2.013.606,81

* importo calcolato sulla base della Delibera Consiglio d'Ambito di Atersir n.24/2019 sulla Modalità di calcolo delle ST sostenute dal Gestore ai fini del riconoscimento tariffario e decurtato delle spese tecniche sostenute direttamente da RASdF

calcolo ST da CAMB/2019/24 del 20 marzo 2019

Tiologia di opera	rete
IO (voci A+B1)	€ 1.581.248,90
a	4,3947
b	0,2240
C ₁	500,00
C ₂	2.000,00
n (accordi bonari)	3
m (procedimenti espropriativi)	0

STab	284.022,94
STc	1.500,00
ST _{TOT}	285.522,94

Quadro Economico associato al titolo abilitativo (PD)

Importo netto

A Somme per lavori	
A1 lavori a misura, a corpo, in economia	1.531.319,75
A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	49.929,15
A3-1 forniture dirette	0,00
A3-2 forniture da magazzino	0,00
Totale A:	€ 1.581.248,90
B Somme a disposizione	
B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini	41.300,00
B3 allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
B4 imprevisti	81.019,57
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	8.739,93
B6 accantonamento	0,00
B7 B8 spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010	285.522,94
B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
Totale B:	€ 416.582,44
Totale intervento (A+B)	€ 1.997.831,34

3								
2								
1	08/11/219	Roberta Rossi	Roberta Rossi	Marco Guidorzi	POST GARA			
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL (CHCK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)			
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)								
DIREZIONE INGEGNERIA PROGETTAZIONE - PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE ROMAGNA								
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)								
RIORDINO DELLO SCHEMA IDRICO DEL CONCA. LOTTO 2 OPERE DI DISTRIBUZIONE								
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)			WBS		CODICE CUP (CUP CODE)			
			T.2150.11.01.00010		H65E16000020005			
			CODICE DOCUMENTO (CODE)		N° COMMESSA (JOB N.)			
					11400454615			
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)		NOME FILE (FILE NAME)			
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.257.111 fax 051.257.525 www.gruppohera.it			 HERAtech s.r.l. Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel 051.257111 fax 051.250418 pec: heratech@pec.gruppohera.it www.heratech.it			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)		
						QUADRO ECONOMICO		
			SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°)	DI (LAST)			
				1	3			

Quadro Economico post gara		Importo netto
A Somme per lavori		
A1 lavori a misura, a corpo, in economia		678.753,55
A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		80.634,56
A3-1 forniture dirette		0,00
A3-2 forniture da magazzino		0,00
Totale A:		€ 759.388,11
B Somme a disposizione		
B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		16.000,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini		10.000,00
B3 allacciamenti ai pubblici servizi		0,00
B4 imprevisti		146.720,51
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		14.000,00
B6 accantonamento		0,00
B7		
B8 spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010 - *		97.251,40
B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici		0,00
B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		0,00
Totale B:		€ 283.971,91
Totale intervento (A+B)		€ 1.043.360,02

* importo calcolato sulla base della Delibera Consiglio d'Ambito di Atersir n. 24/2019 sulla Modalità di calcolo delle ST sostenute dal Gestore ai fini del riconoscimento tariffario e dimezzato in quanto le ST siriferiscono solo alle fasi di Appalto e Esecuzione lavori

calcolo ST da CAMB/2019/24 del 20 marzo 2019

input (da QE)

Tiologia di opera	rete
IO (voci A+B1)	970.753,75
a	4,3947
b	0,2240
C ₁	500,00
C ₂	2.000,00
n (accordi bonari)	0
m (procedimenti espropriativi)	0

output

STab	194.502,81
STc	0,00
ST _{TOT}	194.502,81

**Quadro Economico progetto esecutivo
(prima fase progettuale eseguita da Hera)**

Importo netto

A	Somme per lavori	
A1	lavori a misura, a corpo, in economia	874.119,19
A2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	80.634,56
A3-1	forniture dirette	0,00
A3-2	forniture da magazzino	0,00
Totale A:		€ 954.753,75
B	Somme a disposizione	
B1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	16.000,00
B2	rilievi, accertamenti e indagini	10.000,00
B3	allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
B4	imprevisti	49.037,69
B5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	14.000,00
B6	accantonamento	0,00
B7	spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010	194.502,81
B8		
B9	eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
B10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
Totale B:		€ 283.540,50
Totale intervento (A+B)		€ 1.238.294,25



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 10G

Quarto Accordo attuativo dell'Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.



**QUARTO ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO
PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE
RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITO-
RIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI**

Tra le Parti

**ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi
Idrici e Rifiuti** con sede in Bologna Via Cairoli n. 8/F, C.F. 91342750378,
PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it nella persona dell'Ing. Vito Belladonna,
nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in
forza dei poteri conferiti con delibera del Consiglio d'Ambito n. 54 del
20/10/2014, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di ATERSIR;

(nel seguito **ATERSIR**)

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta
al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale 04245520376, Partita
IVA 03819031208, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott.
Stefano Venier, nella sua qualità di Amministratore delegato, il quale inter-
viene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del
25/11/2014 assunta ai sensi dell'articolo 23.5 dello Statuto sociale di HERA
S.p.A., domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Società;

(nel seguito anche **HERA** o **Gestore**);

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A., con sede le-
gale in Forlì, Piazza Orsi Mangelli n. 10, iscritta al Registro Imprese di Forlì
al n. 00337870406, CF e P.IVA 00337870406, PEC:
mail@pec.romagnacque.it in persona del Dott. Tonino Bernabè nella sua
qualità di Presidente, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deli-

berazione del Consiglio di Amministrazione n. 204 del 16/12/2020, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Società,

(nel seguito **Romagna Acque**)

(nel seguito congiuntamente le **Parti**)

Premesso che

a) in data 28/12/2010 è stato sottoscritto tra l'Autorità d'Ambito territoriale per i Servizi Pubblici di Rimini, Romagna Acque Società delle Fonti e AMIR S.p.A. la *Convenzione per la definizione delle modalità di finanziamento del progetto denominato "Interventi di potenziamento del depuratore di Santa Giustina di Rimini e relative reti di collettamento delle acque reflue dell'area di Bellaria Igea Marina e parte settentrionale di Rimini"*;

b) in data 15/04/2011 è stato sottoscritto tra HERA, Romagna Acque Società delle Fonti e AMIR la *Convenzione per la realizzazione e la gestione di opere relative al servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Rimini*;

c) in tali Convenzioni è previsto l'intervento denominato PSB - RADDOPPIO DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA, identificato con ID ATERSIR 2014 RNHA0052 e finanziato esclusivamente da Romagna Acque per complessivi 27.500.000,00 euro;

d) con provvedimento della Provincia di Rimini n. 131 del 05/07/2007, in ultimo modificato con provvedimento n. 1687 del 30/11/2015, la società Hera S.p.A., quale gestore del servizio idrico integrato, fu iscritta al n.6 dell'elenco dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione ai sensi dell'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al depuratore ubicato in Comune di Rimini, via Fiumicino 6, località Santa Giustina;

e) il sistema attualmente presente presso il depuratore di Santa Giustina per il trattamento bottini non è sufficiente e adeguato a trattare anche il refluo proveniente dalla pulizia delle caditoie stradali del bacino del Marecchiese. Si rende pertanto necessario procedere con la progettazione e la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento caditoie presso il depuratore di Santa Giustina in sostituzione dei letti di essiccamento presenti presso l'ex depuratore Marecchiese;

f) in un'ottica di efficientamento logistico e gestionale si prevede inoltre l'accorpamento del sistema di trattamento bottini, già presente presso il depuratore di Santa Giustina, al nuovo trattamento caditoie;

g) ai sensi della Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.75 del 12/10/2017, con PG.AT/2020/0002645 del 23/03/2020 ATERSIR ha rilasciato il nulla osta all'aumento di importo progettuale per l'intervento denominato PSB – RADDOPPIO DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA, identificato con ID ATERSIR 2014 RNHA0052. Nello specifico, l'importo progettuale è stato rideterminato in complessivi euro 27.984.725,00 al fine di includere la variante progettuale per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento bottini e caditoie presso il depuratore di Santa Giustina, il cui importo progettuale è pari a 2.515.478,00 (duemilionicinquecentoquindicimilaquattrocentosettantotto/00), escluso I.V.A.;

h) con Deliberazione 27 Dicembre 2019 580/2019/R/IDR "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MI1 – 3", ARE-RA disciplina anche le attività di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, e di trattamento di bottini;

Premesso altresì che

i) in data 17/12/2014 è stato sottoscritto, tra ATERSIR, Romagna Acque e HERA, l'Accordo Quadro per la realizzazione e il finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato negli ambiti territoriali di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini modificato e integrato con l'Addendum all'Accordo Quadro sottoscritto in data 16/10/2019 (nel seguito atti congiuntamente denominati Accordo Quadro);

j) ai sensi dell'art. 2 lettera b) dell'Accordo Quadro, il presente Accordo Attuativo (nel seguito Accordo) costituisce parte attuativa ed integrante dello stesso;

k) il Piano d'Ambito relativamente all'ambito territoriale di Rimini, prevede l'intervento PSB – RADDOPPIO DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA ID ATERSIR 2014 RNHA0052, di cui fa parte la variante progettuale per la realizzazione dell'impianto di trattamento bottini e caditoie Santa Giustina, tra le opere finanziate da Romagna Acque e realizzate dal Gestore, e pertanto da ritenersi opere oggetto dell'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dello stesso;

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'Accordo medesimo.

Articolo 2 - Oggetto

Con il presente Accordo le Parti danno attuazione a quanto previsto all'art. 2 lettera b) dell'Accordo Quadro.



Tutte le disposizioni espresse nell'Accordo Quadro trovano totale ed integrale applicazione nel presente Accordo.

In particolare, Romagna Acque si impegna a finanziare, ed HERA si impegna a realizzare la variante progettuale denominata IMPIANTO DI TRATTAMENTO BOTTINI E CADITOIE SANTA GIUSTINA, facente parte dell'ID ATERSIR 2014 RNHA0052.

L'importo dell'intervento oggetto del presente Accordo è pari ad euro, 2.515.478,00 (duemilionicinquecentoquindicimilaquattrocentosettantotto/00), escluso I.V.A., in parte coperto dalla quota di finanziamento rimasta a disposizione sull'ID 2014RNHA0052 relativa all'accordo di finanziamento del 28/12/2010.

Le Parti si danno atto e concordano che, anche in deroga a quanto previsto all'art. 2 lettera b) ultimo capoverso dell'Accordo Quadro, con la sottoscrizione del presente Accordo, HERA avrà titolo per fatturare a Romagna Acque gli interventi già eseguiti e in corso di esecuzione, con le modalità di cui all'art. 13 dell'Accordo Quadro.

Articolo 3 - Allegati

Ai sensi dell'art. 2 lettera b) dell'Accordo Quadro, costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. **Elenco degli interventi e relativa pianificazione economica;**
2. **Cronoprogramma degli interventi:**
 - 2.A) Cronoprogramma della variante progettuale "Impianto di trattamento bottini e caditoie Santa Giustina";
3. **Quadro economico** di spesa di ciascuna opera redatto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 207/2010;

3.A) Quadro economico della variante progettuale "Impianto di trattamento bottini e caditoie Santa Giustina";

3.B) Quadro economico complessivo del progetto "PSB- Raddoppio Depuratore Santa Giustina" a seguito della variante progettuale.

Articolo 4 - Canoni annui di spettanza di Romagna Acque

A titolo di recupero dei costi del capitale investito compete a Romagna Acque un canone annuo determinato nel rispetto di quanto previsto negli schemi regolatori predisposti da ATERSIR e approvati da ARERA. Il calcolo del canone terrà conto della formula di valorizzazione dei "Capex", della decurtazione del 50% dell'onere fiscale standard e del time lag.

Articolo 5 - Durata

Il presente Accordo ha efficacia, anche in via di ratifica, dalla data di inizio delle attività di realizzazione degli interventi e termina alla data del completo recupero da parte di Romagna Acque dei costi del capitale investito per gli stessi nei modi e termini di cui all'art. 15 dell'Accordo Quadro.

Articolo 6 - Firma digitale

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A.

Dott. Tonino Bernabè

(firmato digitalmente)

HERA S.p.A.

Dott. Stefano Venier

(firmato digitalmente)

ATERSIR

Ing. Vito Belladonna

(firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

4° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO TRA ATERSIR, HERA S.p.A. E ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A. PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

ID ATERSIR (codice ARSI)	DEFINIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	AMBITO	STATO DI AVANZAMENTO	quadro di spesa al 31/12/2019	2020	2021	2022	TOTALE INTERVENTO I.V.A. esclusa	IPOTESI DI ENTRATA IN FUNZIONE
2014 RNHA0052	Variante progettuale "IMPIANTO DI TRATTAMENTO BOTTINI E CADITOIE SANTA GIUSTINA"	DEPURAZIONE	Rimini	ATO 9 - RN	In esecuzione lavori	139.502	132.085	1.745.595	498.296	2.515.478	2021

TOTALE						139.502	132.085	1.745.595	498.296	2.515.478	
---------------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------	--



3					
2					
1	08/09/2010	Lorenzo Guarnieri	Lisa Zoli	Lisa Zoli	Fase di contrattualizzazione Impresa
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRAWN)	CONTROL (CHECK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) DIREZIONE INGEGNERIA PROGETTAZIONE IMPIANTI ACQUA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) VARIANTE PROGETTUALE: IMPIANTO DI TRATTAMENTO BOTTINI E CADITOIE SANTA GIUSTINA					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)			WBS T.2150.11.04.00008		CODICE CUP (CUP CODE)
			CODICE DOCUMENTO (CODE)		N° COMMESSA (JOB N.)
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME)	
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambientali viale Carlo Benini Profani 2/4 - 40127 Bologna tel. 051.287.1111 fax 051.287.1125 www.gronoprogramma.it			 HERAtech s.r.l. viale C. Rodi Piccoli 2/4 - 40127 Bologna tel. 051.287.1111 fax 051.250410 pro@heratech.it www.heratech.it		
DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) GRONOPROGRAMMA			SCALA (SCALE)		N° FOGLIO (SHEET N°) 1
					DI (LAST) 2

VARIANTE PROGETTUALE: IMPIANTO DI TRATTAMENTO BOTTINI E CADITOIE SANTA GIUSTINA	mese -3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

3							
2							
1	16/12/2019	Lorenzo Guarnieri	Lisa Zoll	Davide Corrente	PROGETTO ESECUTIVO		
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL (CHKD)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)		
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)							
DIREZIONE INGEGNERIA PROGETTAZIONE IMPIANTI ACQUA							
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)							
VARIANTE PROGETTUALE: IMPIANTO DI TRATTAMENTO BOTTINI E CADITOIE SANTA GIUSTINA							
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)			WBS T.2150.11.04.00008		CODICE CUP (CUP CODE)		
			CODICE DOCUMENTO (CODE)		N° COMMESSA (JOB N.)		
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME)			
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Farini 200 - 40139 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.297.525 www.gruppohera.it			 HERAtech s.r.l. Viale C. Galvani 200 - 40127 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.2574.14 pec: heratech@pec.gruppohera.it www.heratech.it			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)	
						QUADRO ECONOMICO	
			SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°) 1	DI (LAST) 3		

Quadro Economico - PE

Importo netto

A Somme per lavori	
A1 lavori a misura, a corpo, in economia	1.917.008,64
A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	53.769,89
A3-1 forniture dirette	0,00
A3-2 forniture da magazzino	0,00
Totale A:	€1.970.778,53
B Somme a disposizione	
B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	5.000,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini	5.000,00
B3 allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
B4 imprevisti	132.698,04
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
B6 accantonamento	0,00
B7 spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010	402.001,81
B8	
B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
Totale B:	€544.699,85
Totale intervento (A+B)	
	€ 2.515.478,38

* importo calcolato sulla base della Delibera Consiglio d'Ambito di Atersir n.24/2019 sulla Modalità di calcolo delle ST sostenute dal Gestore ai fini del riconoscimento tariffario

calcolo ST da CAMB/2019/24 del 20 marzo 2019

Tiologia di opera	impianto
IO (voci A+B1)	€ 1.975.778,53
a	8,9470
b	0,2610
C ₁	500,00
C ₂	2.000,00
n (accordi bonari)	0
m (procedimenti espropriativi)	0

STab	402.001,81
STc	0,00
ST _{TOT}	402.001,81

Quadro Economico associato al titolo abilitativo (PE)

Importo netto

A Somme per lavori	
A1 lavori a misura, a corpo, in economia	1.917.008,64
A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	53.769,89
A3-1 forniture dirette	0,00
A3-2 forniture da magazzino	0,00
Totale A:	€ 1.970.778,53
B Somme a disposizione	
B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	5.000,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini	5.000,00
B3 allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
B4 imprevisti	132.698,04
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
B6 accantonamento	0,00
B7 spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010	402.001,81
B8	
B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
Totale B:	€ 544.699,85
Totale intervento (A+B)	€ 2.515.478,38



3					
2					
1	31/12/2017			M.V.	FINALE
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL (CHKD)	APPROVATO (APPRD)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)					
DIREZIONE INGEGNERIA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)					
PSB – RADDOPPIO DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)			WBS	CODICE CUP (CUP CODE)	
			T.2150.11.04.00001	E93J05000050005	
			CODICE DOCUMENTO (CODE)	N° COMMESSA (JOB N.)	
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME)	
 HERA S.p.A. Holding Energie Risorse Ambiente Via Carlo Berti Motet 2/4 - 40127 Bologna Tel. 051.287.111 Fax 051.287.025 www.gruppohera.it			 HERAtech s.r.l. Via G. Berghini 2/4 - 40127 Bologna Tel. 051.287.111 Fax 051.280405 info@heratech.it www.heratech.it		
			QUADRO ECONOMICO		
			SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°)	DI (LAST)
				1	2

Quadro Economico finale

Importo netto

A	Somme per lavori	
A1	lavori a misura, a corpo, in economia	18.759.669,00
A2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	257.000,00
A1'	perizia 1	758.129,30
A1''	perizia 2	371.058,73
A1'''	contratto complementare	245.000,00
Totale A:		€20.390.857,03
B	Somme a disposizione	
B1'	imprevisti	45.422,02
B1''	adempimenti VIA	37.000,00
B2	allacciamenti ai pubblici servizi	97.521,79
B3	espropri, servitù, concessioni e accordi bonari	0,00
B4	spese tecniche di DL	3.346.136,89
B5	consulenze e laboratori	24.023,00
B6	spese per gara d'appalto	25.000,00
B7	spese per collaudi	55.398,46
B8	capitalizzazioni interne	125.000,00
Totale B:		€ 3.755.502,16
Totale intervento (A+B) Hera		€ 24.146.359,19
Costi diretti sostenuti da RASdF		€ 1.322.887,43
Totale complessivo		€ 25.469.246,62



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 11

Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, AMIR S.p.A.

[22/01/2015]

ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Tra le Parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 64 PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 65 del 17/12/2014, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR

(nel seguito anche Atersir);

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 04245520376, PEC heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del Comitato Esecutivo del 15/12/2014, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito anche HERA o Gestore);

AMIR S.p.A., con sede legale in Rimini, Via Dario Campana n. 63, iscritta al Registro Imprese di Rimini al n. 02349350401, CF e P.IVA 02349350401, PEC: amirspa@legalmail.it, in persona del Sig. Alberti Brighi, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del

15/01/2015, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede
della Società

(nel seguito AMIR)

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che:

a) Hera è ed interviene nel presente Accordo in qualità di Gestore del servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini in forza della convenzione di affidamento sottoscritta con l'Autorità/Agenzia di Ambito di Rimini, atto sottoscritto in data 14/03/2002 scaduto il 14/03/2012 e tuttora vigente in regime di prorogatio in virtù di deliberazione Atersir n. 25 del 21/12/2012 fino alla decorrenza del nuovo affidamento;

b) AMIR è una società a totale capitale pubblico proprietaria dei beni strumentali alla gestione del servizio idrico integrato ubicati nei territori dei Comuni Soci;

c) tra HERA e AMIR sono in vigore il "Contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto il 20/05/2003 Rep. 22207/12555" e il "Contratto di affitto di ramo d'azienda e cessione di beni del 28/02/2000 Rep. n. 16218/3878, integrato da scrittura privata del 28/09/2002";

d) la Legge Regionale n. 23 del 23/12/2011 ha costituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato a livello regionale, funzioni già esercitate dalle Autorità di Ambito Territoriali Ottimali; Atersir è, dunque, subentrata nelle convenzioni di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui alla lettera a) delle premesse;

e) l'art. 21, commi 13 e 19 del D. L. n. 201/2011, così come convertito dalla L. 214/2011, ha trasferito all'Autorità per l'Energia elettrica e il gas (oggi Autorità per l'Energia elettrica il gas e il sistema idrico nel seguito anche AEEGSI), le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, tra cui l'approvazione del metodo tariffario;

f) AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, con deliberazione del 28/12/2012, n. 585, successivamente modificata ed integrata con deliberazioni n. 73/2013 e n. 88/2013;

g) AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per la determinazione delle tariffe negli anni 2014 e 2015 con deliberazione n. 643/2013;

l'Allegato A, art. 21.2, prevede la possibilità del riconoscimento tariffario di cespiti realizzati dopo il 2011 da parte di soggetti diversi dal Gestore del servizio idrico integrato, previa presentazione di una "motivata istanza" da parte dell'Ente d'Ambito, da valutarsi da parte della stessa Autorità nazionale sulla base di considerazioni di efficacia ed efficienza rispetto al raggiungimento di obiettivi specifici sul territorio;

h) Atersir, AMIR ed HERA hanno sottoscritto specifiche Convenzioni per la realizzazione e gestione da parte di Hera di opere strumentali al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini, finanziate da AMIR che ne è proprietaria; le convenzioni prevedono il riconoscimento, in favore di AMIR, quale soggetto finanziatore-proprietario, di un canone a copertura dei costi del capitale investito; il canone costituisce una componente tariffaria. Alla luce delle modifiche introdotte in materia tariffaria da AEEGSI, le Parti ne hanno recepito gli effetti con specifico atto;

i) Atersir, con propria deliberazione n. 22 del 28.04.2014, ha approvato, ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione AEEGSI n. 643/2013, gli specifici schemi regolatori 2014-2023 per l'ambito territoriale della provincia di Rimini;

l) AMIR ha espressamente manifestato la propria disponibilità a finanziare, coerentemente con l'attuale quadro normativo e tariffario, parte degli investimenti previsti nei Piani degli interventi 2014-2017 per il territorio della provincia di Rimini, così come determinati da Atersir nella deliberazione n. 22/2014; per effetto degli atti di indirizzo dei Soci, tale disponibilità di AMIR è condizionata all'approvazione da parte di AEEGSI del Piano degli interventi 2014-2017, dei correlati Piani tariffari ed economico finanziari, compreso l'inserimento dei cespiti finanziati e di proprietà di AMIR, ma realizzati e gestiti dal Gestore, nelle componenti tariffarie riconosciute, e quindi della positiva valutazione della "motivata istanza" presentata da Atersir, ai sensi dell'articolo 21.2 dell'Allegato A della deliberazione AEEGSI n.643/2013, in data 22 maggio 2014 e da ultimo in data 31 luglio 2014;

m) l'Autorità ha approvato, con Deliberazione 7 agosto 2014 n. 433/2014, gli schemi regolatori recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014-2015, proposti da Atersir e in tale contesto ha accolto la motivata istanza dell'Ente d'Ambito affermando che lo stesso "ha fornito evidenza di come tali modalità di finanziamento risultano assolutamente coerenti con le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità rispetto agli obiettivi di piano, dimostrando l'esistenza di un vantaggio economico per l'utenza"; conseguentemente, AMIR, nel rispetto delle condizioni di cui al punto l) delle

premessa, è autorizzata a sottoscrivere il presente Accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse sono parti integranti del presente Accordo e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'Accordo medesimo.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

a) Il presente Accordo stabilisce tra Atersir, AMIR ed HERA le condizioni, i termini e le modalità connesse alla realizzazione e gestione da parte di Hera di opere funzionali alla gestione del servizio idrico integrato e finanziate da AMIR che ne sarà proprietaria fin dal momento della loro realizzazione; tali opere devono essere espressamente previste nel Piano degli Interventi nel territorio della Provincia di Rimini.

b) In attuazione del presente Accordo Quadro, le Parti procederanno a sottoscrivere specifici Accordi Attuativi sulla base dello "schema tipo" in allegato A). Ogni Accordo Attuativo, a seguito della sua sottoscrizione, costituisce parte attuativa ed integrante del presente Accordo Quadro. In ogni Accordo Attuativo sono individuate le singole opere da realizzarsi con il finanziamento di AMIR; la somma degli importi delle opere citate in ogni Accordo Attuativo costituisce l'importo massimo dell'impegno di finanziamento di AMIR per lo specifico Accordo Attuativo. Costituiranno allegati di ogni Accordo Attuativo i seguenti documenti:

- l'elenco delle singole opere oggetto di finanziamento da parte di AMIR e per ciascuna l'importo del relativo quadro economico di spesa come previsto nel Piano degli Interventi;

- il cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio di ciascun intervento;

- il quadro economico di ciascun intervento redatto ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010;

- una previsione dei flussi di finanziamento a carico di AMIR distinta per anno;

- una previsione dei canoni annui di spettanza di AMIR a titolo di recupero dei costi del capitale investito, nei termini previsti negli schemi regolatori predisposti da Atersir e approvati da AEEGSI.

Quanto contenuto nell'allegato di ciascun Accordo Attuativo non dà titolo a nessuna delle Parti di emettere fattura o altro documento valido per l'incasso.

- c) Atersir si impegna a determinare ed a riconoscere, come componente delle tariffe idriche applicabili al territorio di Rimini, i corrispettivi di competenza di AMIR (di seguito anche "canoni") quale finanziatore e proprietario delle opere al fine di consentire la copertura dei costi del capitale, secondo il principio del full cost recovery, nel rispetto delle normative tariffarie come fissate da AEEGSI, tenuto conto delle rinunce espressamente accettate da AMIR come indicate nella deliberazione Atersir n. 22/2014. L'entità dei canoni che AMIR è autorizzata a fatturare ad IIERA è periodicamente definita da Atersir, in base ai dati di consuntivo rendicontati da AMIR, secondo gli stessi metodi, tempi e criteri definiti da AEEGSI per il calcolo dei costi di capitale riconosciuti al gestore del servizio idrico integrato e al netto delle rinunce di quote tariffarie espressamente accettate da AMIR. In sede di sottoscrizione dei singoli Accordi Attuativi potranno essere definite quote di

rinunce tariffarie diverse da quanto previsto nella deliberazione Atersir n. 22/2014.

Art. 3 – DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e termina in data pari alla scadenza dell'Accordo Attuativo, sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, che presenta scadenza più posticipata, al fine di consentire a AMIR il completo recupero dei costi del capitale investito.

Tenuto conto della scadenza della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato al Gestore, di cui al punto a) delle premesse, Atersir si impegna ad inserire sia negli atti di gara per la scelta del nuovo Gestore, sia negli atti convenzionali di regolazione del servizio da sottoscrivere con il soggetto affidatario, l'obbligo di subentro nelle obbligazioni e nei diritti previsti in capo al Gestore, nascenti e derivanti dal presente Accordo Quadro e dai successivi Accordi Attuativi.

Art. 4 – POTERI E FUNZIONI DI ATERSIR

Atersir, quale Ente d'Ambito, esercita nei confronti di AMIR e di HERA tutti i poteri e le funzioni individuate dalle vigenti norme nazionali e regionali, alle quali integralmente le Parti intendono riportarsi; Atersir si impegna sin d'ora a determinare e riconoscere, nel calcolo della tariffa del servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, i canoni di competenza di AMIR per la funzione di finanziatore e proprietario di beni strumentali alla gestione del servizio idrico integrato, in base a quanto previsto dalle deliberazioni di AEEGSI per il calcolo dei costi di capitale del gestore del servizio idrico integrato, al netto delle rinunce espressamente accettate da AMIR.

Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni indicate nel presente articolo, ed in specifico, la determinazione dei canoni di spettanza di AMIR per l'attività di soggetto finanziatore ed il recepimento dei relativi effetti nel calcolo della tariffa, Atersir procederà all'acquisizione della seguente documentazione nei modi e nei tempi di volta in volta previsti dall'Autorità per la trasmissione all'Ente d'Ambito da parte del gestore delle rendicontazioni periodiche di competenza:

Documentazione richiesta a AMIR:

- 1) ultimo bilancio di esercizio approvato;
- 2) dettaglio del libro cespiti aggiornato alla data dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato relativo agli investimenti realizzati da IIERA e finanziati da AMIR;
- 3) trasmissione delle informazioni relative ai cespiti di cui al precedente punto 2) nelle stesse forme e modi richiesti da AEEGSI per i beni non di proprietà del Gestore e che determinano un canone per il proprietario, canone riconosciuto nella tariffa del servizio idrico integrato (modelli "file proprietario" secondo le deliberazioni AEEGSI emesse);

Documentazione richiesta ad Hera:

- 1) i cronoprogrammi di realizzazione e messa in esercizio di ciascuna opera con il relativo importo come previsto nel Piano degli Interventi;
- 2) la rendicontazione, nell'ambito della Relazione annuale di rendicontazione tecnico-economica del servizio idrico integrato, delle somme erogate a AMIR a titolo di canone per gli investimenti di cui al presente Accordo;
- 3) la rendicontazione delle somme spese per la realizzazione delle opere con l'indicazione degli importi fatturati a AMIR.

ART. 5 COMPITI E RESPONSABILITÀ DI HERA

Per ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui all'articolo 2, il Gestore del servizio, svolgerà l'attività di progettazione pre-

liminare, definitiva ed esecutiva, acquisirà tutte le autorizzazioni ed i permessi, nonché i necessari diritti patrimoniali sui terreni interessati dalla realizzazione delle opere necessari a garantirne la piena cantierabilità; svolgerà le gare d'appalto necessario per l'affidamento dei contratti di esecuzione lavori; curerà la direzione lavori ed il collaudo delle opere, tutto come meglio definito e dettagliato nei successivi articoli.

Per tutte le attività sopra indicate, HERA è responsabile della piena applicazione di tutte le normative vigenti in materia con particolare riguardo a quelle in tema di sicurezza dei cantieri e luoghi di lavoro, prevenzione antinfortunistica e protezione della salute dei lavoratori, di appalti e di ambiente.

ART. 6 PROGETTAZIONE DELLE OPERE

Per ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui all'articolo 2, il Gestore del servizio svolgerà la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, secondo le norme di legge vigenti, nel rispetto degli standard tecnici cogenti e di quelli normalmente utilizzati per la progettazione delle reti e degli impianti. La progettazione potrà essere sviluppata con proprio personale abilitato o mediante professionisti esterni iscritti all'Albo, individuati nel rispetto delle norme sugli appalti. Al Gestore verranno riconosciute tutte le spese sostenute a vario titolo comprese ed autorizzate nei quadri economici dei singoli interventi. Le spese tecniche per lo svolgimento delle attività di pianificazione e programmazione, progettazione, direzione dell'esecuzione, verifiche e collaudi, comprendenti sia gli ono-

rari per affidamenti esterni, sia le spese per le medesime attività svolte da personale interno del Gestore, non potranno superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei quadri economici di ogni Accordo Attuativo al netto delle spese tecniche stesse, salvo casi particolari debitamente motivati ed autorizzati. Il Gestore, in ogni caso, si impegna a presidiare il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza con particolare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed a tal fine svolgerà le attività di Responsabile dei Lavori e curerà lo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

AMIR terrà regolare rendicontazione delle spese che verranno sostenute per personale interno per le attività di verifica, collaudo tecnico-amministrativo e controllo di propria competenza o per qualsiasi altro titolo. Le spese rendicontate rimarranno contenute all'interno nei quadri economici di spesa dei singoli interventi nei limiti previsti dal presente articolo.

ART. 7 OTTENIMENTO DELLA CANTIERABILITA' DELLE OPERE

Il Gestore è responsabile dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni, concessioni, permessi, consensi, nulla osta comunque denominati, da parte di tutti gli Enti interessati (a titolo puramente indicativo e non esaustivo Comuni, ARPA, AUSL, FF.SS., Consorzi di Bonifica, Provincia, soggetti gestori di strade o autostrade, soggetti gestori di sottoservizi, ecc.), necessari alla corretta esecuzione delle opere nel pieno rispetto di tutte le norme, con particolare riguardo a quelle edilizie ed urbanistiche tiene indenne Amir da qualsiasi esborso dovuto per il mancato, incompleto, tardivo o non corretto adem-

pimento agli obblighi previsti dal presente articolo. Le autorizzazioni, concessioni, permessi, consensi, nulla osta comunque denominati dovranno essere intestati a AMIR in qualità di soggetto proprietario delle opere. AMIR si impegna, pertanto, a prestare il proprio consenso e a sottoscrivere le pratiche predisposte e istruite per la presentazione dal Gestore. Il Gestore potrà direttamente presentare le richieste di autorizzazioni, permessi, consensi, nulla osta che non necessitano di sottoscrizione da parte del proprietario dell'opera.

I diritti di proprietà o di servitù sui terreni interessati dalla realizzazione delle opere sorgeranno in via esclusiva in capo a AMIR.

Gli atti di costituzione di diritti di servitù e gli atti di compravendita verranno stipulati da AMIR, quale soggetto proprietario delle opere, mentre gli "accordi bonari" preordinati alla successiva stipula delle servitù, verranno definiti e concordati direttamente dal Gestore con i proprietari delle aree interessate dai lavori di posa delle nuove opere, nel rispetto degli atti tipo individuati in accordo fra AMIR ed il Gestore.

Prima dell'avvio dei lavori di ogni singolo intervento IIERA, si impegna ad inviare a AMIR la dichiarazione di cantierabilità delle opere firmata dal Direttore dei Lavori (come prevista dall'art. 106 del D.P.R. n. 207/2010) corredata da copia dei vari permessi, consensi, nulla osta ed autorizzazioni comunque denominate, necessari per la realizzazione delle opere e copia dei diritti intestati a AMIR su tutti i terreni demaniali o disponibili interessati dalla realizzazione delle opere.

ARTICOLO 8 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui all'articolo

2, sarà realizzato da HERA nel rispetto delle vigenti norme di legge.

HERA svolgerà le attività e le funzioni di Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento dell'appalto e di esecuzione delle opere.

ARTICOLO 9 - ESECUZIONE DEI LAVORI

HERA curerà la direzione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.

HERA, in ogni caso, si impegna a presidiare il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza con particolare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed a tal fine svolgerà le attività di Responsabile dei Lavori e curerà lo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

HERA, durante l'esecuzione dei lavori, si obbliga, a rispettare e fare rispettare dagli esecutori i Piani Particellari di Esproprio dei singoli interventi, sollevando AMIR da ogni responsabilità verso terzi derivante dal loro mancato rispetto.

ARTICOLO 10 - COLLAUDO DELLE OPERE

HERA provvederà alla nomina del collaudatore statico per le opere strutturali ed alla nomina del collaudatore tecnico funzionale.

HERA curerà altresì la redazione del certificato di regolare esecuzione dei singoli interventi.

Nei casi in cui, in base alle norme vigenti, non sia possibile la redazione del certificato di regolare esecuzione, AMIR provvederà alla nomina del collaudatore tecnico amministrativo così come previsto dalla vigente normativa sugli appalti pubblici.

Le opere, non appena positivamente collaudate, saranno affidate al Gestore del servizio idrico integrato, mediante la sottoscrizione del verbale di consegna delle opere sulla base dello "schema tipo" in allegato B).

Art. 11 VARIAZIONI AI QUADRI ECONOMICI DI SPESA DEI SINGOLI INTERVENTI

Qualora, nel corso delle attività di progettazione delle opere, o a seguito dell'effettuazione delle gare d'appalto, o nel corso dell'esecuzione, per alcuno degli interventi previsti in ciascun Accordo Attuativo, si presentino cause che possono determinare una variazione del quadro di spesa si applica quanto di seguito esposto:

a) varianti al quadro di spesa sono ammesse senza necessità di specifica autorizzazione da parte di Atersir o AMIR, qualora le stesse non comportino un aumento del quadro economico di spesa di ciascun intervento. HERA dovrà dare informazioni delle eventuali variazioni apportate ai singoli quadri economici di spesa contestualmente alla trasmissione della relazione informativa trimestrale di cui al successivo art. 12;

b) all'interno di ciascun Accordo Attuativo la variazione in diminuzione dell'importo complessivo di un'opera potrà essere utilizzata per pari entità per variazioni in aumento dell'importo di una o più opere senza necessità di procedere alla sottoscrizione di atto modificativo fra le parti. HERA deve trasmettere a AMIR ed Atersir, comunicazione relativa alla modifica dei valori dei quadri di spesa delle singole opere con evidenza dell'invarianza del totale dell'importo complessivamente finanziato da AMIR; HERA dovrà inoltre dare informazione delle conseguenti variazioni apportate ai singoli quadri di spesa contestualmente alla trasmissione della relazione informati-

va trimestrale di cui al successivo art. 12;

c) la variazione in aumento del quadro di spesa di un'opera non compensata da variazioni in diminuzione di altre opere, sarà possibile solo a seguito di modifica dell'Accordo Attuativo condizionata alla disponibilità di AMIR di procedere all'erogazione dell'ulteriore finanziamento. Si precisa che nel caso in cui le proposte di variazione degli Accordi Attuativi non dovessero essere autorizzate da Atersir oppure, il Gestore non dovesse comunicare per iscritto ad Atersir e AMIR le suddette variazioni del quadro economico di spesa, AMIR non sarà obbligata alla corresponsione di alcun ulteriore finanziamento rispetto al valore massimo definito nell'Accordo Attuativo e le maggiori spese eventualmente sostenute, rispetto al quadro economico come autorizzato da Atersir, rimarranno esclusivamente a carico del Gestore. Resta inteso, pertanto, che AMIR non è autorizzata a finanziare interventi di importo superiore a quelli autorizzati e/o non previsti nel Piano d'Ambito.

Art. 12 CONTROLLO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Le Parti concordano di prestarsi reciproca collaborazione per l'ottimale gestione sul territorio delle attività di propria competenza.

Fino al pieno affidamento dei nuovi beni al Gestore del servizio idrico integrato, mediante la sottoscrizione del verbale di consegna delle opere di cui all'allegato B), HERA si impegna a fornire a AMIR una relazione trimestrale sull'andamento dei lavori al fine di consentire la verifica del rispetto degli adempimenti previsti a carico di HERA e quindi dell'entità delle erogazioni dei finanziamenti da parte di AMIR.

La relazione trimestrale dovrà contenere, per ogni intervento, lo stato di

avanzamento dei lavori, gli eventuali aggiornamenti dei cronoprogrammi valorizzati di attuazione e dei relativi flussi di erogazioni dei finanziamenti da parte di AMIR.

ARTICOLO 13 – MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE E RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DA PARTE DI HERA

AMIR si impegna a reperire le fonti di finanziamento al fine di garantire l'adeguata copertura finanziaria necessaria per la realizzazione delle opere previste nel Piano degli interventi nel territorio della provincia di Rimini, oggetto del presente Accordo, entro i limiti di spesa previsti negli Accordi Attuativi che verranno sottoscritti.

Le spese sostenute da HERA potranno essere finanziate da AMIR nei limiti delle somme previste nei quadri di spesa dei singoli interventi, come eventualmente variati a seguito della progettazione delle opere, dell'esito delle gare di appalto ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, o a seguito dell'approvazione di varianti in fase esecutiva nei modi e con i limiti indicati all'art. 11.

Il costo degli interventi è da considerarsi comprensivo di tutte le voci che concorrono alla realizzazione delle opere, ricomprese nel quadro economico di progetto (lavori, oneri sicurezza, espropri, servitù, spese notarili, incarichi professionali esterni, spese di personale interno, ecc.).

I lavori dovranno essere rendicontati da HERA con le modalità previste per le opere realizzate dal Gestore, come previsto dalla convenzione e dal disciplinare tecnico e relativi allegati regolanti l'affidamento del Servizio Idrico

Integrato ad HERA.

Premesso che HERA dovrà tenere e conservare una completa rendicontazione di tutte le spese sostenute, corredata dai relativi elementi probatori, al solo fine dell'erogazione delle rate di finanziamento da parte di AMIR vale quanto di seguito indicato.

Il Gestore potrà conseguire il finanziamento relativo agli interventi realizzati nei seguenti termini e modi:

- a) emissione entro il 30 aprile di ciascun esercizio della fattura relativa alle attività effettuate nel 1° trimestre di ciascun esercizio;
- b) emissione entro il 31 luglio di ciascun esercizio della fattura relativa alle attività effettuate nel 2° trimestre di ciascun esercizio;
- c) emissione entro il 30 ottobre di ciascun esercizio della fattura relativa alle attività effettuate nel 3° trimestre di ciascun esercizio;
- d) emissione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo a quello di riferimento della fattura relativa alle attività effettuate nel 4° trimestre.

Per ogni singolo intervento le fatture di Hera dovranno essere accompagnate da una rendicontazione "semplificata" indicante i costi complessivi sostenuti alla data di riferimento, distinte per singola voce aggregata del quadro di spesa, in funzione dell'aliquota IVA ad essa applicata (ad esempio: Lavori, Spese Tecniche esterne ed aziendali, Spese eliografiche, notarili, soggette ad IVA; Spese per servitù e concessioni, non soggette ad IVA) . L'importo complessivo delle fatture emesse ed accompagnate da tale rendicontazione "semplificata" non potrà superare il 90% dell'importo complessivamente stanziato o modificato per ogni singolo intervento.

La fatturazione del restante 10% potrà avvenire solo a seguito della rendicontazione finale con la trasmissione del certificato di regolare esecuzione o

di collaudo, del relativo conto finale, dei disegni di as-built, della certificazione sugli impianti eseguiti, del certificato di conformità edilizia e agibilità delle opere e della documentazione riportante la puntuale rendicontazione di tutte le spese a vario titolo sostenute, ognuna accompagnata dai relativi documenti probatori (a titolo indicativo: copia fatture, copia rendicontazioni costi personale interno sostenuti, ecc.). Hera tiene indenne Amir da qualsiasi esborso dovuto per il mancato, incompleto, tardivo o non corretto adempimento agli obblighi previsti dal presente articolo.

Le fatture verranno pagate da AMIR entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento fattura accompagnata dalla documentazione tecnica precedentemente descritta. In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine stabilito al comma precedente, AMIR sarà tenuta al pagamento degli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. 231/2002.

In applicazione della Legge 136/2010, AMIR si impegna ad effettuare i pagamenti di propria competenza nel rispetto delle disposizioni normative, HERA assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare a AMIR, per ciascuna opera di cui all'allegato A) il CUP (codice unico di progetto) e si impegna altresì a inserire, a pena di nullità, nei contratti passivi soggetti alla L. 136/2010 la clausola di cui all'art. 3, comma 9.

Quanto stabilito nella Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e nel Disciplinare Tecnico, nelle parti relative agli obblighi del Gestore per quanto concerne la realizzazione e la rendicontazione tecnica degli interventi, trova applicazione nei confronti di HERA anche per gli interventi finanziati da AMIR, con ciò escludendosi oneri di verifica e controllo in ca-

po a quest'ultima ulteriori rispetto a quanto già espressamente previsto nel presente atto.

ART. 14 ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE

A seguito del completamento delle opere, del loro collaudo e della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'allegato B (comprensivo di tutta la documentazione richiesta per legge), le stesse opere verranno gestite da HERA secondo le norme e le condizioni stabilite nella Convenzione di cui alla lettera a) delle premesse; in particolare per l'intera durata del presente Accordo, HERA:

a) si impegna a corrispondere i canoni per l'utilizzo dei beni realizzati e gestiti, ma finanziati da AMIR in qualità di proprietario, così come determinati da Atersir quale componente della tariffa del servizio idrico integrato, nel rispetto dei termini e nelle modalità stabiliti dall'Autorità;

b) è responsabile e provvede con oneri interamente a carico del Gestore del SII alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di mantenere i beni in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

c) provvede con urgenza e con oneri interamente a carico del Gestore del SII agli interventi necessari per eliminare eventuali non conformità dei beni a tutte le normative con particolare riguardo a quella in materia ambientale e di sicurezza dei luoghi di lavoro, manlevando e tenendo indenne AMIR da qualsiasi responsabilità al riguardo;

d) adotta tutte le misure previste dalla normativa vigente in tema di prevenzione antinfortunistica e protezione della salute dei lavoratori, con parti-

colare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

e) assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni, a propri dipendenti o a terzi durante il loro utilizzo ed a causa di esso;

f) assume la piena responsabilità per l'osservanza delle normative citate nel comma precedente, nonché per l'applicazione di ogni misura prevista per la prevenzione di danni di qualunque genere derivanti dall'esercizio delle attività pericolose di cui all'articolo 2050 codice civile;

g) si impegna a garantire la copertura dei rischi, sia in fase di realizzazione delle opere che di gestione delle stesse, per danni di qualunque causa determinati ai beni stessi e a terzi in generale, per tutta la durata dell'Accordo, attraverso idonee polizze assicurative e ne comunica gli estremi a AMIR.

ART. 15 – MODALITÀ DI RECUPERO DEL FINANZIAMENTO

Al fine del recupero degli oneri di capitale relativi al finanziamento delle opere, AMIR ha diritto al riconoscimento di un canone sino al totale recupero dei costi del capitale; il canone sarà determinato da Atersir e liquidato da HERA nel rispetto di quanto previsto all'art.2, lettera c).

Compatibilmente con i meccanismi tariffari indicati nel citato articolo 2, l'importo annuo di ciascun canone sarà ripartito in quattro rate trimestrali di uguale importo da fatturarsi da parte di AMIR a HERA e da liquidarsi nei seguenti termini:

- emissione delle fatture entro il 30/04, 31/07, 30/10 e 31/01;
- pagamento entro 60 giorni fine mese data ricevimento fattura.

In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine stabilito al

comma precedente, HERA sarà tenuta al pagamento degli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. 231/2002.

Per tutta la durata del presente Accordo, l'ammortamento dei beni finanziati da AMIR sarà effettuato da AMIR, secondo i principi e le metodologie del nuovo metodo tariffario. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 14 lettera b) seguiranno invece il regime di trattamento dei beni del SIT in gestione al Gestore, anche per quanto riguarda l'ammortamento dei beni ammortizzabili.

Art. 16 – MODIFICHE ALL'ACCORDO QUADRO

Ogni modifica del presente Accordo Quadro dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle Parti e nel rispetto delle norme disciplinanti il regime del servizio idrico integrato.

In caso di modifica del quadro normativo e tariffario di riferimento, tenuto conto di quanto previsto nelle premesse, le Parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari.

Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI / CODICE ETICO

Le Parti danno atto che ciascuna di esse è titolare del trattamento dei dati personali delle altre parti di cui venga in possesso in ragione e conseguenza convenzione del presente Accordo e che tale trattamento è effettuato ai fini e per gli effetti dell'adempimento, per competenza, alla convenzione stessa. I dati personali saranno trattati dalle Parti nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dal "Codice della Privacy". A tal fine le stesse dichiarano di essersi scambiate le reciproche informative ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

Le Parti si danno inoltre atto di avere preso piena conoscenza ed accettato i

principi e le norme previste nel Codice Etico e del Modello 231 aziendale di AMIR e di HERA, visibili dai rispettivi siti web aziendali www.amir.it e www.gruppohera.it.

Art. 18 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nella Convenzione d'ambito per il servizio idrico integrato citata in premessa, nonché alle vigenti norme di legge.

Art. 19 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia tra le Parti, il Foro competente esclusivo è quello di Bologna. È espressamente esclusa qualsiasi competenza arbitrale.

Art. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente Accordo verrà registrato in solo caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 21 – COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa se effettuata presso la sede legale dell'ente, via Pec, via fax, per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 22 – ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro i seguenti Allegati:

- allegato A: Schema "Accordo Attuativo";
- allegato B: Schema "Verbale di consegna delle opere realizzate".

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Addì, 22 gennaio 2015

ATERSIR

Ing. Vito Belladonna

[REDACTED]

AMIR S.p.A.

Sig.

[REDACTED]

HERA S.p.A.

Dott. Stefano Menier

[REDACTED]

6

[REDACTED]

ALLEGATO A)

**N°....° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER
IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE
AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI RIMINI**

“ _____ ”

Addi _____

Tra le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 64, c.f.91342750378, PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it nella persona del Dott. _____, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del Consiglio d'Ambito n. _____ del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di Atersir;

(di seguito **Atersir**)

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Bertè Picchi n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del _____ n. _____ del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito anche **HERA** o **Gestore**);

AMIR S.p.A., con sede legale in Rimini, Via Dario Campana n. 63, iscritta

al Registro Imprese di Rimini al n. 02349350401, CF e P.IVA
02349350401, PEC: amirspa@legalmail.it in persona di
_____, nella sua qualità di _____, in forza
dei poteri conferiti con _____, domiciliato ai fini della presente Conven-
zione presso la sede della Società;

AMIR(nel seguito AMIR)

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che

- a) in data _____ è stato sottoscritto, tra Atersir, AMIR e Hera,
l'Accordo Quadro per la realizzazione e il finanziamento di opere relative al
servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Rimini;
- b) ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro di cui alla lettera pre-
cedente, il presente atto costituisce parte attuativa ed integrante dello stesso.

Art.1- Premesse

Le premesse sono parti integranti del presente atto e costituiscono condi-
zioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle ob-
bligazioni disposte dalle Parti con l'atto medesimo.

Art. 2 - Oggetto

Con il presente atto le Parti danno attuazione a quanto previsto all'art.2 let-
tera b) dell'Accordo Quadro di cui alla lettera a) delle premesse.

In allegato 1) è riportato l'elenco delle singole opere oggetto di finanzia-
mento da parte di AMIR e di realizzazione da parte di Hera previste dal pre-
sente Accordo Attuativo; si dà atto che le suddette opere sono previste nel
Piano degli interventi, documento di programmazione facente parte dello
schema regolatorio per le tariffe _____ dell'ambito territoriale

di Rimini, come predisposto da Atersir con delibera n.22/2014 ed approvato da AEEGSI con deliberazione n.433/2014. Per ogni opera è indicato l'importo del relativo quadro di spesa come previsto nel Piano degli Interventi _____.

La somma degli importi delle opere in allegato 1) è pari ad euro _____ (.....), tale valore costituisce l'importo massimo dell'impegno di finanziamento di AMIR per le suddette opere, fatto salvo quanto previsto all'art.11 dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro suddetto, costituiscono parte integrante del presente Accordo Attuativo i seguenti allegati:

1. l'elenco delle singole opere oggetto di finanziamento da parte di AMIR e per ciascuna l'importo del relativo quadro economico di spesa come previsto nel Piano degli Interventi _____;
2. il cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio di ciascuna opera;
3. il quadro economico di spesa di ciascuna opera redatto ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010;
4. la previsione dei flussi di finanziamento a carico di AMIR distinta per anno.
5. una previsione dei canoni annui di spettanza di AMIR a titolo di recupero dei costi del capitale investito, nei termini previsti negli schemi regolatori predisposti da Atersir e approvati da AEEGSI.

Art. 3 Durata

Il presente Accordo Attuativo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e termina alla data del completo recupero da parte di AMIR dei costi

del capitale investito nei modi e termini di cui all'art. 15 dell'Accordo Quadro.

Tutte le disposizioni espresse nell'Accordo Quadro di cui alla lettera a) delle premesse, nessuna esclusa, trovano totale ed integrale applicazione nel presente Accordo Attuativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

ATERSIR

AMIR S.p.A.

HERA S.p.A.

ALLEGATO B)

**VERBALE DI CONSEGNA DELL'INTERVENTO/DEGLI INTER-
VENTI DENOMINATO/ " _____ "**

Addì _____

Tra le parti

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta
al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA
04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefa-
no Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene
alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del Consiglio
di Amministrazione n. _____ del _____, domiciliato ai fini della presente
Convenzione presso la sede della Società _____

(nel seguito HERA o Gestore);

AMIR S.p.A., con sede legale in Rimini, Via Dario Campana n. 63, iscritta
al Registro Imprese di Rimini al n. 02349350401, CF e P.IVA
02349350401, PEC: amirspa@legalmail.it in persona di
_____, nella sua qualità di _____, in forza
dei poteri conferiti con _____, domiciliato ai fini della presente Conven-
zione presso la sede della Società _____

(nel seguito AMIR)

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che

a) in data _____ è stato sottoscritto, tra Atersir, AMIR e Hera,
l'Accordo Quadro per il finanziamento di opere relative al servizio idrico
integrato nell'ambito territoriale di Rimini (nel seguito Accordo);

b) le Parti hanno deciso di attuare l'intervento/gli interventi denominato/i
" " sottoscrivendo il relativo Accordo Attuativo in data
 ed approvandone il relativo Progetto e Quadro economico, compresi gli ulteriori allegati previsti;

c) l'intervento è stato realizzato (tempi e modi di realizzazione dell'intervento)

d) HERA è il Gestore del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini in forza della convenzione di affidamento sottoscritte con l'Autorità di Ambito di Rimini (atto sottoscritto in data 14/03/2002 avente scadenza il 14/03/2012, in regime di prorogatio);

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

1. Le premesse sono parti integranti del presente atto e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'atto medesimo.

2. Il Gestore con la firma del presente verbale accetta in consegna senza riserve le opere e si impegna ad assumerne la gestione alle condizioni, patti e termini di cui alle Convenzioni di affidamento del SII nel territorio della Provincia di Rimini e di cui all'Accordo in premessa.

3. AMIR dichiara di ricevere, con la sottoscrizione del presente Verbale, tutta la documentazione attestante la rendicontazione dell'intervento eseguito e autorizza, pertanto, HERA ad emettere la relativa fattura a saldo prevista all'art. 13.

Letto, approvato e sottoscritto.

Si allega:

1) Collaudo delle opere

2) Documentazione di rendicontazione

AMIR S.p.A.

HERA S.p.A.



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 11A

Addendum all'Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, AMIR S.p.A. in data 22/01/2015

**ADDENDUM ALL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E
LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO IN-
TEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI, SOTTO-
SCRITTO TRA HERA S.P.A., ATERSIR, AMIR S.P.A. IN DATA 22/01/2015**

Tra le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna Via Cairoli, 8/F - 40121 Bologna, PEC dgater-sir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 54 del 20/10/2014, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR

(nel seguito **ATERSIR**)

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito anche **HERA** o **Gestore**)

AMIR S.p.A. con sede legale in Rimini, Via Dario Campana n. 63, iscritta al Registro Imprese di Rimini al n. 02349350401, CF e P.IVA 02349350401, PEC: amir-spa@legalmail.it, in persona del dott. Alessandro Rapone, nella sua qualità di Amministratore Unico, in forza dei poteri conferiti dall'Assemblea dei Soci del 30/04/2019, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede della Società;

(nel seguito **AMIR**)

(nel seguito congiuntamente le **Parti**)

nel rispetto degli standard tecnici cogenti e di quelli normalmente utilizzati per la progettazione delle reti e degli impianti. La progettazione potrà essere sviluppata con proprio personale abilitato o mediante professionisti esterni iscritti all'Albo, individuati nel rispetto delle norme sugli appalti. Al Gestore verranno riconosciute tutte le spese sostenute a vario titolo comprese ed autorizzate nei quadri economici dei singoli interventi. Le spese tecniche sostenute dal Gestore per la progettazione e la realizzazione delle opere verranno riconosciute nei modi e limiti definiti nel documento denominato "Modalità di calcolo delle spese tecniche sostenute dal Gestore per la progettazione e la realizzazione delle opere previste nei programmi degli interventi del SII ai fini del riconoscimento tariffario" approvato da ATERSIR nella Delibera del Consiglio d'Ambito n. 24 del 20/03/2019. Il Gestore, in ogni caso, si impegna a presidiare il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza con particolare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed a tal fine svolgerà le attività di Responsabile dei Lavori e curerà lo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Potranno essere riconosciute eventuali attività tecnico-amministrative svolte da AMIR a supporto del Gestore, fermo restando che le stesse dovranno essere ricomprese nei limiti definiti nel summenzionato documento "Modalità di calcolo delle spese tecniche sostenute dal Gestore per la progettazione e la realizzazione delle opere previste nei programmi degli interventi del SII ai fini del riconoscimento tariffario" sulla base di specifici accordi tra AMIR e Gestore.

Art. 3 – Disposizioni transitorie.

Le Parti concordano che le modalità di calcolo delle spese tecniche contenute nel novellato art. 6 dell'Accordo Quadro si applicheranno agli Accordi Attuativi sotto-



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 11B

Primo Accordo attuativo dell'Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, AMIR S.p.A.

[13/07/2015]



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 11C

Secondo Accordo attuativo dell'Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, AMIR S.p.A.

[07/09/2016]

N. 2° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL
FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE
AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI RIMINI

"INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE FO-
GNARIO IN VIA ABBAZIA - INTERVENTO DI BONIFICA RE-
TE IDRICA VIA MONTE DEL PRETE BASSO - INTERVENTO DI
COMPLETAMENTO COLLETTAMENTO SCARICHI (4,18) CON
NUOVO DEPURATORE A SANT'ANSOVINO - "STRALCIO FO-
GNATURA"

Addì 07 SET. 2016 2016

Tra le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna
Via Aldo Moro n. 64, c.f.91342750378, PEC dgater-
sirepec.atersir.emr.it nella persona del Dott. Vito
Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il
quale interviene alla presente scrittura in forza
dei poteri conferiti con delibera del Consiglio
d'Ambito n.65 del 17/12/2014, domiciliato ai fini
del presente Accordo presso la sede di Atersir ;

(di seguito **Atersir**)

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti
Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese



di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA
04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in
persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità
di Amministratore Delegato, il quale interviene al-
la presente scrittura in forza dei poteri conferiti
con delibera del Comitato Esecutivo del
15/12/2014, domiciliato ai fini del presente Ac-
cordo presso la sede della Società

(nel seguito anche Hera o Gestore);

AMIR S.p.A., con sede legale in Rimini, Via Dario
Campana n. 63, iscritta al Registro Imprese di Ri-
mini al n. 02349350401, CF e P.IVA 02349350401,
PEC: amirspa@legalmail.it, in persona di ^{ALESSANDRO}~~Alberto~~
~~RAPONE~~
~~Brighi~~, nella sua qualità di Amministratore Unico,
in forza dei poteri conferiti dall'Assemblea dei
Soci del 15 gennaio 2015, domiciliato ai fini del-
presente Accordo presso la sede della Società;

(nel seguito AMIR)

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che

a) in data 22/01/2015 è stato sottoscritto, tra
Atersir, AMIR e Hera, l'Accordo Quadro (nel seguito
Accordo Quadro) per la realizzazione e il finanzia-
mento di opere relative al servizio idrico integra-
to nell'ambito territoriale di Rimini;

b) ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro, il presente Accordo Attuativo (nel seguito Accordo) costituisce parte attuativa ed integrante dello stesso;

c) il Piano degli Interventi 2015-2019 relativamente all'ambito territoriale di Rimini, approvato da Atersir con deliberazione n. 4 del 18 Dicembre 2015 prevede tra gli interventi finanziati da AMIR e realizzati dal Gestore i) Completamento del collettore fognario in Via Abbazia in comune di Morciano; ii) Bonifica rete idrica Via monte del prete Basso in comune di Saludecio; iii) Completamento collettamento scarichi (4,18) con nuovo depuratore a Sant'Ansovino - "stralcio fognatura" in comune di Saludecio.

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parti integranti del presente Accordo e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'Accordo medesimo.

Art. 2 - Oggetto

Con il presente Accordo le Parti danno attuazione a quanto previsto all'art. 2 lettera b) dell'Accordo Quadro.

Tutte le disposizioni espresse nell'Accordo Quadro, nessuna esclusa, trovano totale ed integrale applicazione nel presente Accordo.

In particolare AMIR si impegna a finanziare e Hera si impegna a realizzare i seguenti interventi di cui all'allegato 1) e precisamente:

- Intervento di Completamento del collettore fognario in Via Abbazia in comune di Morciano;
- Intervento di Bonifica rete idrica Via monte del prete Basso in comune di Saludecio;
- Intervento di Completamento collettamento scari-
chi (4,18) con nuovo depuratore a Sant'Ansovino
"stralcio fognatura" in comune di Saludecio.

La somma degli importi delle opere oggetto del presente Accordo è pari ad euro 464.251,00 (quattrocentsessantaquattromila e duecentocinquantuno euro) tale valore costituisce l'importo massimo dell'impegno di finanziamento di AMIR per le suddette opere, fatto salvo quanto previsto all'art. 11 dell'Accordo Quadro.

Art. 3 - Allegati

Ai sensi dell'art. 2 lettera b) dell'Accordo Quadro, costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. Elenco degli interventi finanziati da parte di

AMIR e per ciascuno l'importo del relativo quadro economico di spesa;

2. Cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio di ciascun intervento:

2.a) Cronoprogramma intervento di Completamento del collettore fognario in Via Abbazia in comune di Morciano;

2.b) Cronoprogramma intervento di Bonifica rete idrica Via monte del prete Basso in comune di Saludecio;

2.c) Cronoprogramma intervento di Completamento collettamento scarichi (4,18) con nuovo depuratore a Sant'Ansovino - "stralcio fognatura" in comune di Saludecio;

3. Quadri economici di spesa di ciascuna opera redatto ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010:

3.a) Quadro Economico di spesa intervento di Completamento del collettore fognario in Via Abbazia in comune di Morciano;

3.b) Quadro Economico di spesa intervento di Bonifica rete idrica Via monte del prete Basso in comune di Saludecio;

3.c) Quadro Economico di spesa intervento di Completamento collettamento scarichi (4,18) con nuovo depuratore a Sant'Ansovino - "stralcio fognatura"

in comune di Saludecio;

4. Previsione dei flussi di finanziamento a carico di AMIR distinta per anno.

Art.4 - Canonî annui di spettanza di AMIR

A titolo di recupero dei costi del capitale investito, compete ad AMIR un canone annuo determinato

nel rispetto di quanto previsto negli schemi regolatori predisposti da Atersir e approvati da AEEGSI. Il calcolo del canone terrà conto della formula di valorizzazione dei "Capex" e della decurtazione del 20% dell'onere fiscale standard.

Art. 5 - Durata

Il presente Accordo ha efficacia, anche in via di ratifica, dalla data di inizio delle attività di realizzazione degli interventi e termina alla data del completo recupero da parte di AMIR dei costi del capitale investito per gli stessi nei modi e termini di cui all'art. 15 dell'Accordo Quadro.

Letto, approvato e sottoscritto.

ATERSIR

Il Direttore

Inq. Vito Belladonna

AMIR S.p.A.

L'Amministratore Unico

Dott. ~~Alberto Brighi~~ ALESSANDRO RADONE


HERA S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Dott. ~~Stefano Venier~~

ALLEGATO 1 N.3 ACCORDO ATTINATIVO DELL'ACCORDO QUADRO TRA ATERRIR, HERA S.p.A., AMIR S.p.A. PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI											
CODICE ATERRIR (ARS)	DEFINIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	AMBITO	STATO AVANZAMENTO	QUADRO DI SPESA COMPETENZA LORA					
						QUADRO DI SPESA AL 31/12/2015	2016	2017	2018	2019	101 INTERVENTI IN V.A. ESCLUSA
4113P-040044	URBANI LAMBERTO COLLEZIONE FOGNARIO VIA AURELIA	DESE-VALICA	Montebelluna di Pinerolo	STO 5 - RM	in progetto	0	20.000	143.520	0	0	143.520
4013P-400019	ROMICA RETE IDRICA VIA MONTE DEL PIU' II NOVA	PIU' II NOVA	Gallesio	STO 2 - RM	progettazione in corso	0	5.000	15.335	0	0	15.335
4113P-400015	COMPLETAMENTO LUBETTAMENTO SCARICHI (A.18) CON ATRONDI DI PURGATORE A SANT'ANDREO VINO - STRALFON FOGNARIO	STRALFON	Gallesio	STO 3 - RM	progettazione in corso	0	20.000	230.395	0	0	230.395
TOTALE						0	45.000	419.251	0	0	464.251

00	02/2016	MCI	AMz	RRc	PROGETTO DEFINITIVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROL. (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT):					
INGEGNERIA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION):					
COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA ABBAZIA – COLLETTAMENTO REFLUI LOC. CASE GARUFFI					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER):					
VIA PIETRO DI BENNONE – COMUNE DI MORCIANO					
				N° ELABORATO (DOCUMENT N°)	N° COMMESSA (JOB N°)
				ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) T.2150.11.03.00017	NOME FILE (FILE NAME) CRO
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Bacci-Piccoli 1/4 - 40127 Bologna Tel. 051 287.1111 Fax 051 287.1112 www.hera.it				DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION):	
				CRONOPROGRAMMA LAVORI	
				SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°) 1
					DI (LAST) 2



n° commessa. (Job n°)

H Documento (Doc. Id)

Rev. (Issue)

n° foglio (Sheet n°)

Discussion

T.2150.11.03.00017

20

N

2

CRONOPROGRAMMA LAVORI

**COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA ABBAZIA - COLLETTAMENTO REFLUI LOC. CASE GARUFFI
IN COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA**

CRONOPROGRAMMA

[illegible]

Il Progettista
HERA S.p.A.
Ing. Luca Migliori

0	Feb 2016	ALz	AMz	RRc	PROGETTO DEFINITIVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROLLATO (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) INGEGNERIA ACQUA – PROGETTAZIONE RETI					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) COMPLETAMENTO COLL.TO SC.(4,18) - STRALCIO ACQUEDOTTO - BONIFICA RETE IDRICA VIA MONTE DEL PRETE BASSO					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER) RETE ACQUEDOTTO SALUDECIO					
				ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) WBS T.2150.11.01.00011	JOB n°
				N° ELABORATO (DOCUMENT N°)	NOME FILE (FILE ID) CRONO_SANTANSOVINO_AOQ
 HERA S.p.A. Holding Energie Risorse Ambientali Viale G. Bernabè 2/4 - 40127 Bologna tel. 051.267.111 - fax 051.251.525 www.heraenergia.it				DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) CRONOPROGRAMMA	
				SCALA (SCALE) --	N° FOGLIO (SHEET N°) 1

Il Progettista
HERA S.p.A.
Ing. Luca Migliori

0	Feb 2016	ALz	AMz	RRc	PROGETTO DEFINITIVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRAWN BY)	CONTROLLATO (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) INGEGNERIA ACQUA – PROGETTAZIONE RETI					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) ADEGUAMENTO SCARICHI (4,18) CON NUOVO DEPURATORE A S. ANSOVINO					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER) RETE FOGNARIA SALUDECIO					
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) WBS T.2150.11.03.00019	JOB n° 11500434179	
			N° ELABORATO (DOCUMENT N°)	NOME FILE (FILE ID) CRONO_SANTANSOVINO_FOG	
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorsa Ambiente Viale C. del Piave 2/4 40127 Bologna tel. 051.257.111 fax 051.267.075 www.gruppohera.it			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) CRONOPROGRAMMA		
			SCALA (SCALE) --	N° FOGLIO (SHEET N°) 1	DI (LAST) 2

00	02/2016	MCI	AMz	RRc	PROGETTO DEFINITIVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROL. (CHK'D)	APPROVATO (APP'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)					
INGEGNERIA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)					
COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA ABBAZIA – COLLETTAMENTO REFLUI LOC. CASE GARUFFI					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)					
VIA PIETRO DI BENNONE – COMUNE DI MORCIANO					
				N° ELABORATO (DOCUMENT N°)	N° COMMESSA (JOB N°)
				ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME)
				T.2150.11.03.00017	QE
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorsa Ambiente Viale Carlo Berni Fichtel 2/4 - 40137 Bologna tel. 051.267.111 fax 051.237.025 www.gruppo-hera.it				DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)	
				QUADRO ECONOMICO	
SCALA (SCALE)				N° FOGLIO (SHEET N°)	DI (LAST)
--				1	2

**QUADRO ECONOMICO - COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA ABBAZIA
(COLLETTAMENTO REFLUI LOC. CASE GARUFFI)
IN COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA**

VOCE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTI
A1	lavori a misura, a corpo, in economia	€ 115.000
A2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.600
TOT LAVORI (A)		€ 119.600
B1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
B2	rilevi, accertamenti e indagini	€ 6.500
B3	allacciamenti a pubblici servizi	€ 5.000
B4	imprevisti	€ 5.980
B5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 5.000
B7	spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al CSP, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al CSE, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni	€ 14.208
B8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, o di verifica e validazione	€ 7.232
TOT SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 43.920
TOTALE INVESTIMENTO I.V.A. ESCLUSA (A+B)		€ 163.520
B12 - I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
TOTALE INVESTIMENTO I.V.A. COMPRESA		

Il Progettista
HERA S.p.A.
Ing. Luca Migliori

0	Feb 2016	ALz	AMz	RRc	PROGETTO DEFINITIVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROLLATO (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) INGEGNERIA ACQUA - PROGETTAZIONE RETI					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) COMPLETAMENTO COLL.TO SC.(4,18) - STRALCIO ACQUEDOTTO - BONIFICA RETE IDRICA VIA MONTE DEL PRETE BASSO					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER) RETE ACQUEDOTTO SALUDECIO					
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) WBS T.2150.11.01.00011	JOB n°	
			N° ELABORATO (DOCUMENT N°)	NOME FILE (FILE ID) GE_SANTANSOVINO_ACQ	
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale C. Ratti Paroli 2/4 40121 Bologna tel. 051.267.111 fax 051.287.525 www.gruppohera.it			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
			SCALA (SCALE) --	N° FOGLIO (SHEET N°) 1	DI (LAST) 2

QUADRO ECONOMICO - BONIFICA RETE IDRICA VIA MONTE DEL PRETE BASSO

VOCE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTI
A1	lavori a misura, a corpo, in economia	€ 37.000
A2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.330
TOT LAVORI (A)		€ 40.330
B1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
B2	rilevi, accertamenti e indagini	€ 3.000
B3	allacciamenti a pubblici servizi	
B4	imprevisti	€ 2.017
B5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
B7	spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al CSP, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al GSE, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni	€ 4.535
B8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 453
TOT SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 10.005
TOTALE INVESTIMENTO I.V.A. ESCLUSA (A+B)		€ 50.335
B12 - I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
TOTALE INVESTIMENTO I.V.A COMPRESA		

Il Progettista
HERA S.p.A.
Ing. Luca Migliori

0	Feb 2016	ALZ	AMZ	RRc	PROGETTO DEFINITIVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROLLATO (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) INGEGNERIA ACQUA – PROGETTAZIONE RETI					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) ADEGUAMENTO SCARICHI (4,18) CON NUOVO DEPURATORE A S. ANSOVINO					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER) RETE FOGNARIA SALUDECIO					
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) WBS T.2150.11.03.00019	JOB n° 11500434179	
			N° ELABORATO (DOCUMENT N°)	NOME FILE (FILE ID) QE_SANTANSOVINO_FOGNA	
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale G. Berio-Hotet 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.287.929 www.gruppohera.it			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
			SCALA (SCALE) --	N° FOGLIO (SHEET N°) 1	DI (LAST) 2

QUADRO ECONOMICO - ADEGUAMENTO SCARICHI (4, 18) CON NUOVO DEPURATORE A S. ANSOVINO

VOCE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
A1	lavori a misura, a corpo, in economia	€ 180.500
A2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 16.245
TOT LAVORI (A)		€ 196.745
B1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
B2	rilevi, accertamenti e indagini	€ 15.000
B3	allacciamenti a pubblici servizi	
B4	imprevisti	€ 9.837
B5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 4.000
B7	spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al CSP, alla conferenza di servizi, alla direzione lavori e al CSE, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incensivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni	€ 22.258
B8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, o di verifica e validazione	€ 2.250
TOT SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 53.651
TOTALE INVESTIMENTO I.V.A. ESCLUSA (A+B)		€ 250.396
B12 - I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
TOTALE INVESTIMENTO I.V.A COMPRESA		

ALLEGATO 4 N.2° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO TRA ATERSIR, HELIA S.p.A., AMIR S.p.A. PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI											
CODICE ATERSIR (ARS)	DEFINIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	AMBITO	STATO AVANZAMENTO	PREVISIONI E FLUSSI FINANZIARI A CARICO AMIR					IPOTESI DI ENTRATA IN FUNZIONE
						2016	2017	2018	2019	TOI INTERVENTO I.V.A. ESCLUSA	
2016RHA0204	COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA ABBAZIA	FOGNATURA	Monte San Giacomo	ATO 5 - RN	In progettazione	20.000	243.520	0	0	162.520	2017
2016RHA0219	BONIFICA RETE IDRICA VIA MONTE ILLELLE IL BASSO	ACQUEDOTTO	Salussola	ATO 6 - RN	In progettazione in corso	5.000	45.335	0	0	50.335	2017
2016RHA0015	COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO SCARICHI (4.16x) CON NUOVO DISPURATORE A SANT'AMONINO - STRALCIO FOGNATURA	FOGNATURA	Salussola	ATO 6 - RN	In progettazione in corso	20.000	230.396	0	0	250.396	2017
TOTALE						45.000	419.251	0	0	464.251	



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 11D

Terzo Accordo attuativo dell'Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, AMIR S.p.A.

[21/06/2018]

**3° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL
FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE
AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI RIMINI.**

Addì 11.10. 2018

Tra le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e
Rifiuti con sede in Bologna Via Cairolì 8/F, C.F. 91342750378, PEC dga-
tersir@pec.atersir.emr.it nella persona del Dott. Vito Belladonna, nella sua
qualità di Direttore. Il quale interviene alla presente scrittura in forza dei
poteri conferiti con delibera del Consiglio d'Ambito n.65 del 17/12/2014,
domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Atersir ;

(di seguito Atersir)

Hera S.p.A. con sede in Bologna, Viale Carlo Bertè Pichat n. 2/4, iscritta al
Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA
04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefa-
no Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene
alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del Comitato
Esecutivo del 15/12/2014, domiciliato ai fini del presente Accordo presso
la sede della Società

(nel seguito anche Hera o Gestore);

AMIR S.p.A. con sede legale in Rimini, Via Dario Campana n. 63, iscritta
al Registro Imprese di Rimini al n. 02349350401, CF e P.IVA
02349350401, PEC: amirspa@legalmail.it, in persona di dott. Alessandro
Rapone, nella sua qualità di Amministratore Unico, in forza dei poteri con-

feriti dall'Assemblea dei Soci del 08 luglio 2016, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede della Società;

(nel seguito AMIR)

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che

a) in data 22/01/2015 è stato sottoscritto, tra Atersir, AMIR e Hera, l'Accordo Quadro per la realizzazione e il finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Rimini (nel seguito **Accordo Quadro**);

b) ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro, il presente Accordo Attuativo (nel seguito **Accordo**) costituisce parte attuativa ed integrante dello stesso;


c) il Piano d'Ambito 2016-2019 relativamente all'ambito territoriale di Rimini, approvato da Atersir con deliberazione CLRN/2017/5 del 1 febbraio 2017 prevede gli interventi denominati i) *Risanamento scarico n. 9 Monte Ugone - Verucchio*; ii) *Dismissione Depuratore Ponte Santa Maria Maddalena e collettamento fognari*, tra le opere finanziate da AMIR e realizzate dal Gestore e pertanto da ritenersi opere oggetto dell'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dello stesso

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Premesse

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'Accordo medesimo.

Articolo 2 - Oggetto

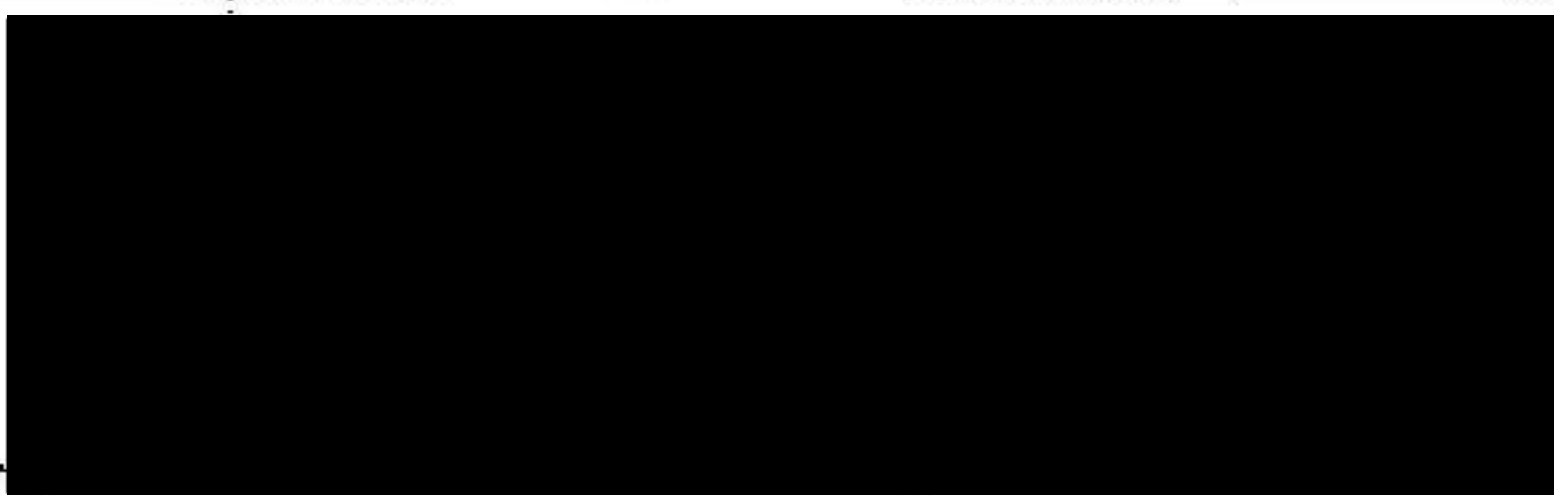

Con il presente Accordo le Parti danno attuazione a quanto previsto all'art. 2 lettera b) dell'Accordo Quadro.

Tutte le disposizioni espresse nell'Accordo Quadro, nessuna esclusa, trovano totale ed integrale applicazione nel presente Accordo.

In particolare AMIR si impegna a finanziare e Hera si impegna a realizzare i seguenti interventi di cui all'allegato 1) e precisamente:

A) Risanamento scarico n. 9 Monte Ugone - Verucchio;

B) Dismissione Depuratore Ponte Santa Maria Maddalena e collettamento fognario.

La somma degli importi delle opere oggetto del presente Accordo è pari ad euro 1.216.800,00 (unmilione duecentosedici mila ottocento virgola zero zero) escluso IVA.

Le Parti si danno atto e concordano che, anche in deroga a quanto previsto all'art. 2 lettera b) ultimo capoverso dell'Accordo Quadro, con la sottoscrizione del presente Accordo Hera avrà titolo per fatturare a AMIR gli interventi già eseguiti e in corso di esecuzione con le modalità di cui all'art. 13 dell'Accordo Quadro.

Articolo 3 - Allegati

Ai sensi dell'art. 2 lettera b) dell'Accordo Quadro, costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. Elenco degli interventi e relativa pianificazione economica;

2. Cronoprogramma degli interventi:

2.A) Cronoprogramma Intervento "Risanamento scarico n. 9 Monte Ugone - Verucchio";

2.B) Cronoprogramma Intervento "Dismissione Depuratore Ponte Santa

Maria Maddalena e collettamento fognario”.

3. Quadri economici di spesa di ciascuna opera redatto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 207/2010:

3.A) Quadro Economico Intervento “Risanaamento scarico n. 9 Monte Ugone – Verucchio”;

3.B) Quadro Economico Intervento “Dismissione Depuratore Ponte Santa Maria Maddalena e collettamento fognario”.

4. Previsione dei flussi di finanziamento a carico di AMIR distinta per anno.

Articolo 4 - Canonì annui di spettanza di AMIR

A titolo di recupero dei costi del capitale investito compete ad AMIR un canone annuo determinato nel rispetto di quanto previsto negli schemi regolatori predisposti da Atersir e approvati da ARERA. Il calcolo del canone terrà conto della formula di valorizzazione dei “Capex” e della decurtazione del 20% dell’onere fiscale standard.

Articolo 5 - Durata

Il presente Accordo ha efficacia, anche in via di ratifica, dalla data di inizio delle attività di realizzazione degli interventi e termina alla data del completo recupero da parte di AMIR dei costi del capitale investito per gli stessi nei modi e termini di cui all’art. 15 dell’Accordo Quadro.

Letto, approvato e sottoscritto.

ATERSIR

Il Direttore

Ing. Vito Belladonna

[Redacted signature area]

[Redacted footer area]

AMLR S.p.A.

L'Amministratore Unico


Dott. Alessandro Rapone

Hera S.p.A.

L'Amministratore Delegato


Dott. Stefano Venier

Allegato 2.A)

2	30/06/2017	Alz	Amz	RRc	PROGETTO DEFINITIVO REV 02 - RICHIESTA GESTIONE RETI POGNARIE DI RIMINI	
1	12/09/2014	Azi	AMz	RRc	PROGETTO DEFINITIVO REV01	
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRAWN)	CONTROL (CHECKED)	APPROVATO (APPROVED)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)	
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) DIREZIONE INGEGNERIA						
PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE ACQUA						
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) RISANAMENTO SCARICO N. 9 ZONA MONTE UGONE - COMUNE DI VERUGGIO (RN)						
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER) VIE MESSINA E NANNI				WSS R.2150.11.03.00129	CODICE CUP (CUP CODE) NON SOGGETTO A CUP	
				CODICE DOCUMENTO (CODE)	N° COMMESSA (JOB N.) N80700040205	
				ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME) 013-20-13_PD_E05_01	
 GRUPPO HERA HERA S.p.A. Holding Energie Acqua Ambiente Viale Carlo Farini 24 - 40127 Bologna Tel. 051.287.111 www.gruppohera.it		 HERAtech Divisione del Gruppo Hera HERAtech S.p.A. Viale Carlo Farini 24 - 40127 Bologna Tel. 051.287.111 www.hera.tech.it		DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) CRONOPROGRAMMA LAVORI		
		SCALA (SCALE)		N° FOGLIO (SHEET N°) 1	DI (LAST) 2	



Risanamento scavo n. 9 Monte Ugone												
Descrizione fasi lavorative												
Cantiere 1 - via Nanni	Allestimento cantiere 1 e 2											
	Dismissione cantiere 1											
	Esecuzione saggi e sondaggi											
	Dismissione cantiere 2											
Cantiere 1 - via Nanni	Posa tubazioni in PVC De 200 mm											
	Adeguamento scalmatore esistente											
	Colloquio tratto di fognatura											
	Collegamento a rete esistente su Strada Provinciale											
Cantiere 2 - via Mosetta	Realizzazione ripristini definitivi											
	Posa Piemento in PEAD De 90 mm PN16											
	Posa fognature tratto P0-P2-P1											
	Stazione di pompaggio: OPERE CIVILI											
	Stazione di pompaggio: POSA POMPE											
	Stazione di pompaggio: piping in inox di collegamento											
	Stazione di pompaggio: QUADRI ELETTRICI											
	Realizzazione ripristini provvisori e sistemazioni sup.											
Realizzazione ripristini definitivi												
Durata complessiva: 112 giorni												



Allegato 2.B)

3					
2	20/03/2017	MCI	AMz	RRc	PROGETTO DEFINITIVO
1	30/03/2015	MCI	AMz	RRc	PROGETTO DEFINITIVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)					
DIREZIONE INGEGNERIA					
PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE ACQUA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)					
COLLETTAMENTO DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PONTE SANTA MARIA MADDALENA AL COLLETTORE DI VALLATA "DESTRA MARECCHIA" NEI COMUNI DI NOVAFELTRIA E SAN LEO (RN)					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)			WBS	CODICE CUP (CUP CODE)	
DEP. P.S.M. MADDALENA (COD. SAP: 4099905)			R.2150.11.03.00082		
			CODICE DOCUMENTO (CODE)	N° COMMESSA (JOB N.)	
			E.06	11200486617	
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME)	
				PD.AGG_E.00.XLS	
 GRUPPO HERA HERA S.p.A. Headquarters: Via degli Indipendenti 40/10000 Viale Carlo Farini/Palazzo 2/A 40127 Bologna Tel. 051.287.1111 www.gruppohera.it		 HERAtech Società del Gruppo Hera HERAtech s.p.a. Viale Carlo Farini/Palazzo 2/A 40127 Bologna Tel. 051.287.1111 www.hera.tech.it		DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)	
		GRONOPROGRAMMA			
		SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°)	DI (LAST)	
			1	2	

CRONOPROGRAMMA

[illegible]

Quadro Economico

Importo netto

A	Somme per lavori	
A1	lavori a misura, a corpo, in economia	213.227,57
A2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	22.902,89
A3-1	forniture dirette	0,00
A3-2	forniture da magazzino	
Totale A:		€236.130,46
B	Somme a disposizione	
B1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
B2	rilievi, accertamenti e indagini	9.400,00
B3	allacciamenti ai pubblici servizi	6.000,00
B4	imprevisti	12.576,52
B5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
B6	accantonamento	
B7		
B8	spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010	87.193,02
B9	eventuali spese per commissioni giudicatrici	
B10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
Totale B:		€115.169,54
Totale intervento (A+B)		€ 351.300,00
D1 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€47.441,16
Totale intervento (A+B) con IVA		€ 398.741,16

Quadro Economico

Importo netto

A Somme per lavori		
A1 lavori a misura, a corpo, in economia		555.337,24
A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		40.808,64
A3-1 forniture dirette		0,00
A3-2 forniture da magazzino		
Totale A:		€596.145,88
B Somme a disposizione		
B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		10.000,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini		12.400,00
B3 allacciamenti ai pubblici servizi		16.000,00
B4 imprevisti		31.727,29
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		20.000,00
B6 accantonamento		
B7 spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010		179.226,83
B8 eventuali spese per commissioni giudicatrici		
B9 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
Totale B:		€269.354,12
Totale intervento (A+B)		€ 865.500,00
D1 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€113.865,22
Totale intervento (A+B) con IVA		€ 979.365,22



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 11E

Quarto Accordo attuativo dell'Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, AMIR S.p.A.

4° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI.

Tra le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna Via Cairoli 8/F, C.F. 91342750378, PEC dga-
tersir@pec.atersir.emr.it nella persona del Dott. Vito Belladonna, nella sua
qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei
poteri conferiti con delibera del Consiglio d'Ambito n.65 del 17/12/2014,
domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di ATERSIR ;

(di seguito ATERSIR)

Hera S.p.A. con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al
Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA
04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefa-
no Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene
alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del Comitato
Esecutivo del 15/12/2014, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la
sede della Società

(nel seguito anche HERA o Gestore);

AMIR S.p.A. con sede legale in Rimini, Via Dario Campana n. 63, iscritta
al Registro Imprese di Rimini al n. 02349350401, CF e P.IVA
02349350401, PEC: amirspa@legalmail.it, in persona di dott. Alessandro
Rapone, nella sua qualità di Amministratore Unico, in forza dei poteri con-
feriti dall'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2019, domiciliato ai fini del pre-

	sente Accordo presso la sede della Società;	
	(nel seguito AMIR)	
	(nel seguito congiuntamente le Parti)	
	Premesso che	
	a) in data 22/01/2015 è stato sottoscritto, tra ATERSIR, AMIR e HERA, l'Accordo Quadro per la realizzazione e il finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Rimini, modificato e integrato con l'Addendum alla Accordo Quadro sottoscritto in data 16/10/2019 con efficacia dal 22/10/2019 (nel seguito atti congiuntamente denominati Accordo Quadro);	
	b) ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro, il presente Accordo Attuativo (nel seguito Accordo) costituisce parte attuativa ed integrante dello stesso;	
	c) il Piano d'Ambito 2014-2039 relativamente all'ambito territoriale di Rimini, prevede gli interventi denominati <i>i) PSB – Separazione rete fognaria Rimini Nord II° stralcio – III° lotto; ii) Completamento separazione della rete fognaria limitrofa a Via di Vittorio – II° stralcio – I° lotto</i> , tra le opere finanziate da AMIR e realizzate dal Gestore e pertanto da ritenersi opere oggetto dell'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dello stesso	
	si conviene e si stipula quanto segue	
	Articolo 1 - Premesse	
	Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'Accordo medesimo.	
	Articolo 2 - Oggetto	
	2	

	Con il presente Accordo le Parti danno attuazione a quanto previsto all'art. 2	
	lettera b) dell'Accordo Quadro.	
	Tutte le disposizioni espresse nell'Accordo Quadro, nessuna esclusa, trovano totale ed integrale applicazione nel presente Accordo.	
	In particolare AMIR si impegna a finanziare, e HERA si impegna a realizzare, i seguenti interventi di cui all'allegato 1) e precisamente:	
	A) PSB – Separazione rete fognaria Rimini Nord II° stralcio – III° lotto;	
	B) Completamento separazione della rete fognaria limitrofa a Via di Vittorio – II° stralcio – I° lotto.	
	La somma degli importi delle opere oggetto del presente Accordo è pari ad euro 6.176.713,00 (seimilionicentosettantaseimilasettecentotredici virgola zerozero) escluso IVA.	
	Le Parti si danno atto e concordano che, anche in deroga a quanto previsto all'art. 2 lettera b) ultimo capoverso dell'Accordo Quadro, con la sottoscrizione del presente Accordo HERA avrà titolo per fatturare a AMIR gli interventi già eseguiti e in corso di esecuzione con le modalità di cui all'art. 13 dell'Accordo Quadro.	
	Articolo 3 - Allegati	
	Ai sensi dell'art. 2 lettera b) dell'Accordo Quadro, costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:	
	1. Elenco degli interventi e relativa pianificazione economica;	
	2. Cronoprogramma degli interventi:	
	2.A) Cronoprogramma Intervento “PSB – Separazione rete fognaria Rimini Nord II° stralcio – III° lotto”;	
	2.B) Cronoprogramma Intervento “Completamento separazione della rete	
	3	

		fognaria limitrofa a Via di Vittorio – II° stralcio – I° lotto”.	
		3. Quadri economici di spesa di ciascuna opera redatto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 207/2010:	
		3.A) Quadro Economico Intervento “PSB – Separazione rete fognaria Rimini Nord II° stralcio – III° lotto”;	
		3.B) Quadro Economico Intervento “Completamento separazione della rete fognaria limitrofa a Via di Vittorio – II° stralcio – I° lotto”.	
		Articolo 4 - Canoni annui di spettanza di AMIR	
		A titolo di recupero dei costi del capitale investito compete ad AMIR un canone annuo determinato nel rispetto di quanto previsto negli schemi regolatori predisposti da ATERSIR e approvati da ARERA. Il calcolo del canone terrà conto della formula di valorizzazione dei “Capex” e della decurtazione del 20% dell’onere fiscale standard.	
		Articolo 5 - Durata	
		Il presente Accordo ha efficacia, anche in via di ratifica, dalla data di inizio delle attività di realizzazione degli interventi e termina alla data del completo recupero da parte di AMIR dei costi del capitale investito per gli stessi nei modi e termini di cui all’art. 15 dell’Accordo Quadro.	
		Articolo 6 – Firma digitale	
		Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.	
		Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell’avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell’atto a tutti i contraenti.	
		Letto, approvato e sottoscritto.	
		4	

ALLEGATO 1
4° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO TRA ATERSIR, HERA S.p.A. E AMIR S.p.A. PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

ID ATERSIR (codice ARSI)	DEFINIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	AMBITO	STATO DI AVANZAMENTO	quadro di spesa al 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE INTERVENTO I.V.A. esclusa	IPOTESI DI ENTRATA IN FUNZIONE
2019RNHA0001	PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN-IPSTRALCIO (3° Lotto)	FOGNATURA	Rimini	ATO 9 - RN	In esecuzione Lavori	423.000	1.600.000	1.619.000	1.065.000	1.270.724	5.997.724	2023
2019RNHA0002	COMPLETAMENTO SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA LIMITROFA A VIA DI VITTORIO - II STRALCIO - I LOTTO	FOGNATURA	Ceriano	ATO 9 - RN	In esecuzione Lavori	129.000	49.989	0	0		178.989	2020
TOTALE						552.000	1.649.989	1.619.000	1.065.000	1.270.724	6.176.713	

3							
2							
1	27/11/2019	RRs	RRs	RRs	PROGETTO ESECUTIVO		
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL. (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)		
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) DIREZIONE INGEGNERIA PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE ROMAGNA							
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN-II°STRALCIO (3° Lotto)							
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER) BRANCONA			WBS T.2150.11.03.00083		CODICE CUP (CUP CODE)		
			CODICE DOCUMENTO (CODE)		N° COMMESSA (JOB N.) N11800576886		
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)		NOME FILE (FILE NAME)		
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Berni Felsat 2/4 - 40127 Bologna tel. 051.287111 fax 051.287112 www.gruppohera.it			 HERAtech s.r.l. Viale C. Berni Felsat 2/4 - 40127 Bologna tel. 051.287111 fax 051.280418 pec: heratech@pec.gruppohera.it www.heratech.it			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) CRONOPROGRAMMA	
			SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°) 1	DI (LAST) 2		

3					
2					
1	27/11/2019	MCI	MCI	MGd	PROGETTO ESECUTIVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL. (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) DIREZIONE INGEGNERIA PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE ROMAGNA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) COMPLETAMENTO SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA LIMITROFA A VIA DI VITTORIO - II STRALCIO - I LOTTO					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)			WBS T.2150.11.03.00096	CODICE CUP (CUP CODE)	
			CODICE DOCUMENTO (CODE)	N° COMMESSA (JOB N.) 11900001102	
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME)	
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Berni/Follet 2/4 - 40127 Bologna tel. 051.287111 fax 051.287112 www.gruppohera.it			 HERAtech s.r.l. Viale C. Berni/Follet 2/4 - 40127 Bologna tel. 051.287111 fax 051.280418 pec: heratech@pec.gruppohera.it www.heratech.it		
			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) CRONOPROGRAMMA		
			SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°) 1	DI (LAST) 2

COMPLETAMENTO SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA LIMITROFA A VIA DI VITTORIO - II STRALCIO - I LOTTO	mese -4	mese -3	mese -2	mese -1	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12	mese 13
Descrizione fasi																	
Costruzione, collaudo e avviamento																	

2					
1					
0	11/04/2019	RRs	RRs	RRs	PROGETTO ESECUTIVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL. (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) DIREZIONE INGEGNERIA PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE ROMAGNA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN-II°STRALCIO (3° Lotto)					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)				WBS T.2150.11.03.00083	CODICE CUP (CUP CODE)
				CODICE DOCUMENTO (CODE)	N° COMMESSA (JOB N.) 11800576886
				ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME)
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Bardi Pichet 2/A - 40127 Bologna tel. 051.287.111 www.gruppohera.it				 HERAtech s.r.l. Viale Carlo Bardi Pichet 2/A - 40127 Bologna tel. 051.287.111 www.heraotech.it	
DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) QUADRO ECONOMICO				SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°) 1
					DI (LAST) 3

Quadro Economico - PROGETTO ESECUTIVO

Importo netto

A	Somme per lavori	
A1	lavori a misura, a corpo, in economia	3.706.620,39
A2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	209.113,61
A3-1	forniture dirette	0,00
A3-2	forniture da magazzino	0,00
Totale A:		€3.915.734,00
B	Somme a disposizione	
B1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	832.321,14
B2	rilevi, accertamenti e indagini	118.876,05
B3	allacciamenti ai pubblici servizi	150.000,00
B4	imprevisti	250.846,56
B5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	92.000,00
B6	accantonamento	0,00
B7	spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010 *	637.946,19
B8		
B9	eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
B10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
Totale B:		€2.081.989,94
Totale intervento (A+B)		€ 5.997.723,94

*
importo calcolato sulla base della Delibera Consiglio d'Ambito di Atersir n.24/2019 sulla
Modalità di calcolo delle ST sostenute dal Gestore ai fini del riconoscimento tariffario

calcolo ST da CAMB/2019/24 del 20 marzo 2019

Tiologia di opera	rete
IO (voci A+B1)	4.486.159,99 €
a	4,3947
b	0,2240
C ₁	500,00
C ₂	2.000,00
n (accordi bonari)	
m (procedimenti espropriativi)	0

STab	637.946,19
STc	0,00
ST _{TOT}	637.946,19

**Quadro Economico associato al titolo abilitativo
(PROGETTO DEFINITIVO)**

Importo netto

A Somme per lavori	
A1 lavori a misura, a corpo, in economia	3.412.466,24
A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	241.372,61
A3-1 forniture dirette	0,00
A3-2 forniture da magazzino	0,00
Totale A:	€ 3.653.838,85
B Somme a disposizione	
B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	832.321,14
B2 rilievi, accertamenti e indagini	90.876,05
B3 allacciamenti ai pubblici servizi	150.000,00
B4 imprevisti	236.351,80
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	95.000,00
B6 accantonamento	
B7 spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010	637.946,19
B8	
B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici	
B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
Totale B:	€ 2.042.495,18
Totale intervento (A+B)	€ 5.696.334,03

2					
1					
0	09/05/2019	MCI	MCI	RRs	PROGETTO ESECUTIVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL. (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) DIREZIONE INGEGNERIA PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE ROMAGNA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) COMPLETAMENTO SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA LIMITROFA A VIA DI VITTORIO - II STRALCIO - I LOTTO					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)			WBS T.2150.11.03.00096		CODICE CUP (CUP CODE)
			CODICE DOCUMENTO (CODE)		N° COMMESSA (JOB N.) 11900001102
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)		NOME FILE (FILE NAME)
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorsa Ambiente Viale Carlo Berli Pichat 2/A - 40127 Bologna tel. 051.287.111 www.gruppohera.it			 HERAtech S.p.A. Società del Gruppo Hera Viale Carlo Berli Pichat 2/A - 40127 Bologna tel. 051.287.111 www.hera.tech.it		
			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) QUADRO ECONOMICO		
			SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°) 1	DI (LAST) 3

Quadro Economico - PROGETTO ESECUTIVO

Importo netto

A	Somme per lavori	
A1	lavori a misura, a corpo, in economia	121.585,49
A2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	7.223,56
A3-1	forniture dirette	0,00
A3-2	forniture da magazzino	0,00
Totale A:		€ 128.809,05
B	Somme a disposizione	
B1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	2.500,00
B2	rilevi, accertamenti e indagini	2.070,00
B3	allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
B4	imprevisti	6.668,95
B5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
B6	accantonamento	0,00
B7	spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010 *	38.941,03
B8		
B9	eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
B10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
Totale B:		€ 50.179,98
Totale intervento (A+B)		€ 178.989,03

calcolo ST da CAMB/2019/24 del 20 marzo 2019

Tiologia di opera	rete
IO (voci A+B1)	122.167,70 €
a	4,3947
b	0,2240
C ₁	500,00
C ₂	2.000,00
n (accordi bonari)	0
m (procedimenti espropriativi)	0
STab	38.941,03
STc	0,00
ST _{TOT}	38.941,03

**Quadro Economico associato al titolo abilitativo
(PROGETTO DEFINITIVO)**

Importo netto

A Somme per lavori	
A1 lavori a misura, a corpo, in economia	109.597,84
A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	10.069,86
A3-1 forniture dirette	0,00
A3-2 forniture da magazzino	0,00
Totale A:	€ 119.667,70
B Somme a disposizione	
B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	2.500,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini	2.070,00
B3 allacciamenti ai pubblici servizi	
B4 imprevisti	6.211,89
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
B6 accantonamento	
B7 spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010	38.941,03
B8	
B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici	
B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
Totale B:	€ 49.722,92
Totale intervento (A+B)	€ 169.390,62



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 11F

Quinto Accordo attuativo dell'Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, AMIR S.p.A.

5° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI.

Tra le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna Via Cairoli 8/F, C.F. 91342750378, PEC dga-
tersir@pec.atersir.emr.it nella persona del Dott. Vito Belladonna, nella sua
qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei
poteri conferiti con delibera del Consiglio d'Ambito n.65 del 17/12/2014,
domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di ATERSIR ;

(di seguito ATERSIR)

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta
al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale 04245520376, Partita
IVA 03819031208, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott.
Stefano Venier, nella sua qualità di Amministratore delegato, il quale inter-
viene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del
Comitato Esecutivo del 15/12/2014, domiciliato ai fini del presente atto
presso la sede della Società;

(nel seguito anche **HERA** o **Gestore**);

AMIR S.p.A. con sede legale in Rimini, Via Dario Campana n. 63, iscritta
al Registro Imprese di Rimini al n. 02349350401, CF e P.IVA
02349350401, PEC: amirspa@legalmail.it, in persona di dott. Alessandro
Rapone, nella sua qualità di Amministratore Unico, in forza dei poteri con-
feriti dall'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2019, domiciliato ai fini del pre-

	sente Accordo presso la sede della Società;	
	(nel seguito AMIR)	
	(nel seguito congiuntamente le Parti)	
	Premesso che	
	a) in data 22/01/2015 è stato sottoscritto, tra ATERSIR, AMIR e HERA, l'Accordo Quadro per la realizzazione e il finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Rimini, modificato e integrato con l'Addendum alla Accordo Quadro sottoscritto in data 16/10/2019 con efficacia dal 22/10/2019 (nel seguito atti congiuntamente denominati Accordo Quadro);	
	b) ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro, il presente Accordo Attuativo (nel seguito Accordo) costituisce parte attuativa ed integrante dello stesso;	
	c) il Piano d'Ambito 2020-2023 relativamente all'ambito territoriale di Rimini, prevede gli interventi denominati <i>i) Ottimizzazione sistema fognario di Cattolica – Bacino Via Toscana e strade limitrofe; ii) Realizzazione nuova fognatura nera in zona Rio Pircio; iii) Interventi sulle condotte di mandata del sollevamento Vienna</i> , tra le opere finanziate da AMIR e realizzate dal Gestore e pertanto da ritenersi opere oggetto dell'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dello stesso	
	si conviene e si stipula quanto segue	
	Articolo 1 - Premesse	
	Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'Accordo medesimo.	
	2	

Articolo 2 - Oggetto

Con il presente Accordo le Parti danno attuazione a quanto previsto all'art. 2 lettera b) dell'Accordo Quadro.

Tutte le disposizioni espresse nell'Accordo Quadro, nessuna esclusa, trovano totale ed integrale applicazione nel presente Accordo.

In particolare AMIR si impegna a finanziare, ed HERA si impegna a realizzare, i seguenti interventi di cui all'allegato 1) e precisamente:

A) Ottimizzazione sistema fognario di Cattolica – Bacino Via Toscana e strade limitrofe;

B) Realizzazione nuova fognatura nera in zona Rio Pircio;

C) Interventi sulle condotte di mandata del sollevamento Vienna.

La somma degli importi delle opere oggetto del presente Accordo è pari ad euro 1.406.178,00 (unmilionequattrocentoseimilacentosettantotto virgola zerozero) IVA esclusa.

Le Parti si danno atto e concordano che, anche in deroga a quanto previsto all'art. 2 lettera b) ultimo capoverso dell'Accordo Quadro, con la sottoscrizione del presente Accordo HERA avrà titolo per fatturare ad AMIR gli interventi già eseguiti e in corso di esecuzione con le modalità di cui all'art. 13 dell'Accordo Quadro.

Articolo 3 - Allegati

Ai sensi dell'art. 2 lettera b) dell'Accordo Quadro, costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. Elenco degli interventi e relativa pianificazione economica;

2. Cronoprogramma degli interventi:

2.A) Cronoprogramma Intervento “Ottimizzazione sistema fognario di Cat-

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

AMIR S.p.A.

L'Amministratore Unico

Dott. Alessandro Rapone

(firmato digitalmente)

HERA S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Dott. Stefano Venier

(firmato digitalmente)

ATERSIR

Il Direttore

Ing. Vito Belladonna

(firmato digitalmente)

ALLEGATO 1
5° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO TRA ATERSIR, HERA S.p.A. E AMIR S.p.A. PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

ID ATERSIR (codice ARSI)	DEFINIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	AMBITO	STATO DI AVANZAMENTO	quadro di spesa al 31/12/2021	2022	2023	2024	TOTALE INTERVENTO I.V.A. esclusa	IPOTESI DI ENTRATA IN FUNZIONE
2020RNHA0011	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO DI CATTOLICA - BACINO VIA TOSCANA E STRADE LIMITROFE	FOGNATURA	Cattolica	ATO 9 - RN	Progettazione Definitiva	116.583	358.417	75.000		550.000	2022
2016RNHA0012	REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA NERA IN ZONA RIO PIRGIO	FOGNATURA	Bellaria Igea Marina	ATO 9 - RN	Esecuzione Lavori	761.972	10.000			771.972	2021
2017RNHA0004	INTERVENTI SULLE CONDOTTE DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO VIENNA	FOGNATURA	Cattolica	ATO 9 - RN	Terminata Esecuzione	84.206				84.206	2020
TOTALE						962.762	368.417	75.000	0	1.406.178	

3					
2					
1	27/04/2021	FMt	FMt	RRs	PROGETTO DEFINITIVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) DIREZIONE INGEGNERIA PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE - PROGETTAZIONE LAVORI PROGRAMMATI					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI CATTOLICA					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER) ZONA DELLE REGIONI E ZONA DELLE NAZIONI				WBS T.2150.11.03.00120	CODICE CUP (CUP CODE)
				CODICE DOCUMENTO (CODE)	N° COMMESSA (JOB N.) N12000980066
				ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME)
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambientali Viale Carlo Dotti Piccini 2/4 - 40127 Bologna Tel. 051.267.111 Fax 051.267.535 www.gruppohera.it		 HERAtech s.r.l. Viale C. Barti Piccini 2/4 - 40127 Bologna Tel. 051.267111 Fax 051.260418 pec: heratech@pec.gruppohera.it www.heratech.it		DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) CRONOPROGRAMMA	
		SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°) 1	DI (LAST) 2	

OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI CATTOLICA	mese -2	mese -1	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12	mese 13	mese 14	mese 15	mese 16	mese 17	mese 18	mese 19	mese 20	mese 21	mese 22
<i>Descrizione fasi</i>																								
Progettazione definitiva																								
Autorizzazioni (permessi Enti)																								
Progettazione esecutiva																								
Autorizzazioni (titolo abilitativo Comune)																								
Appalto e Contratto																								
Costruzione e Avvio Esercizio																								

3							
2							
1	26/04/2021	Ing. R. Rossi	Ing. R. Rossi	Ing. M. Guidorzi	PREVISIONALE A FINIRE		
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL. (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)		
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) DIREZIONE INGEGNERIA PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE - PROGETTAZIONE LAVORI PROGRAMMATI							
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA NERA IN ZONA RIO PIRCIO. COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA							
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)			WBS T.2150.11.03.00094		CODICE CUP (CUP CODE) H51B21001330005		
			CODICE DOCUMENTO (CODE)		N° COMMESSA (JOB N.) N11700712682		
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME)			
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Farini-Pichat 2/4 40137 Bologna tel. 051.287111 fax 051.2871300 www.gruppohera.it			 HERAtech s.r.l. Viale C. Bertini Pichat 2/4 40127 Bologna tel 051.287111 fax 051.250418 pec: heratech@pec.gruppohera.it www.heratech.it			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) CRONOPROGRAMMA	
			SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°) 1	DI (LAST) 2		

REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA NERA IN ZONA RIO PIRCIO. COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA		mese -2	
		mese -1	
Descrizione fasi Costruzione e Avvio Esercizio		mese 1	
		mese 2	
		mese 3	
		mese 4	
		mese 5	
		mese 6	
		mese 7	
		mese 8	
		mese 9	
		mese 10	
		mese 11	
		mese 12	
		mese 13	
		mese 14	
		mese 15	
		mese 16	
		mese 17	
		mese 18	
		mese 19	
		mese 20	
		mese 21	
		mese 22	

3							
2							
1	27/04/2021	Ing.FMt	Ing.FMt	Ing.RRs	PROGETTO DEFINITIVO		
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL. (CHCK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)		
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) DIREZIONE INGEGNERIA PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE - PROGETTAZIONE LAVORI PROGRAMMATI							
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI CATTOLICA							
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)			WBS T.2150.11.03.00120		CODICE CUP (CUP CODE)		
			CODICE DOCUMENTO (CODE)		N° COMMESSA (JOB N.) N12000980066		
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) E06	NOME FILE (FILE NAME) CATTOLICA_PD_E06_00			
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Ratti Pichat 2/4 - 40127 Bologna tel. 051.287111 fax 051.2871525 www.gruppohera.it			 HERAtech s.r.l. Viale C. Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna tel 051.287111 fax 051.250418 pec@heratech@pec.gruppohera.it www.heratech.it			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) QUADRO ECONOMICO	
			SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°) 1	DI (LAST) 3		

Quadro Economico - PD

Importo netto

A	Somme per lavori	
	A1 lavori a misura, a corpo, in economia	379.315,88
	A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	29.000,00
	A3-1 forniture dirette	0,00
	A3-2 forniture da magazzino	0,00
	Totale A:	€ 408.315,88
B	Somme a disposizione	
	B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	5.000,00
	B2 rilievi, accertamenti e indagini	15.000,00
	B3 allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
	B4 imprevisti	21.415,79
	B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
	B6 accantonamento	0,00
	B7 spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010 *	100.268,41
	B8	
	B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
	B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
	Totale B:	€ 141.684,20
	Totale intervento (A+B)	€ 550.000,08

* importo calcolato sulla base della Delibera Consiglio d'Ambito di Atersir n.24/2019 sulla Modalità di calcolo delle ST sostenute dal Gestore ai fini del riconoscimento tariffario

calcolo ST da CAMB/2019/24 del 20 marzo 2019

Tipologia di opera	rete
IO (voci A+B1)	€ 413.315,88
a	4,3947
b	0,2240
C ₁	500,00
C ₂	2.000,00
n (accordi bonari)	0
m (procedimenti espropriativi)	0

impianto	a	8,9470
impianto	b	0,261
rete	a	4,3947
rete	b	0,224

ST _{ab}	100.268,41
ST _c	0,00
ST _{TOT}	100.268,41

Quadro Economico Progetto Definitivo

Importo netto

A Somme per lavori	
A1 lavori a misura, a corpo, in economia	379.315,88
A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	29.000,00
A3-1 forniture dirette	0,00
A3-2 forniture da magazzino	0,00
Totale A:	€ 408.315,88
B Somme a disposizione	
B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	5.000,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini	15.000,00
B3 allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
B4 imprevisti	21.415,79
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
B6 accantonamento	0,00
B7 spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010	100.268,41
B8	
B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
Totale B:	€ 141.684,21
Totale intervento (A+B)	€ 550.000,09

3					
2					
1	26/04/2021	Ing.R.Rossi	Ing.R.Rossi	Ing. M.Guidorzi	PREVISIONALE A FINIRE
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) DIREZIONE INGEGNERIA PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE - PROGETTAZIONE LAVORI PROGRAMMATI					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA NERA IN ZONA RIO PIRCIO. COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)			WBS T.2150.11.03.00094		CODICE CUP (CUP CODE)
			CODICE DOCUMENTO (CODE)		N° COMMESSA (JOB N.) N11700712682
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)		NOME FILE (FILE NAME)
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente 10516 Ozzano d'Erba, P.le Europa 2/4 - 40127 Bologna tel. 051.287111 fax 051.287125 www.gruppohera.it			 HERAtech s.r.l. Viale G. Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna tel. 051.287111 fax 051.250418 pec.heratech@pec.gruppohera.it www.heratech.it		
			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) QUADRO ECONOMICO		
			SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°) 1	DI (LAST) 3

Quadro Economico - previsionale a finire

Importo netto

A	Somme per lavori	
	A1 lavori a misura, a corpo, in economia	485.391,02
	A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	56.199,50
	A3-1 forniture dirette	34.718,80
	A3-2 forniture da magazzino	0,00
	Totale A:	€ 576.309,32
B	Somme a disposizione	
	B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
	B2 rilievi, accertamenti e indagini	11.185,19
	B3 allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
	B4 imprevisti	0,00
	B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	10.000,00
	B6 accantonamento	0,00
	B7 spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010 *	174.477,75
	B8	
	B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
	B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
	Totale B:	€ 195.662,94
	Totale intervento (A+B)	€ 771.972,26

* importo calcolato sulla base della Delibera Consiglio d'Ambito di Atersir n.24/2019 sulla Modalità di calcolo delle ST sostenute dal Gestore ai fini del riconoscimento tariffario

calcolo ST da CAMB/2019/24 del 20 marzo 2019

Tiologia di opera	rete
IO (voci A+B1)	€ 837.694,65
a	4,3947
b	0,2240
C ₁	500,00
C ₂	2.000,00
n (accordi bonari)	2
m (procedimenti espropriativi)	0
STab	173.477,75
STc	1.000,00
ST _{TOT}	174.477,75

impianto	a	8,9470
impianto	b	0,261
rete	a	4,3947
rete	b	0,224

Quadro Economico Progetto Rio Pircio

Importo netto

A Somme per lavori	
A1 lavori a misura, a corpo, in economia (*)	784.359,46
A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	53.335,19
A3-1 forniture dirette	0,00
A3-2 forniture da magazzino	0,00
Totale A:	€ 837.694,65
B Somme a disposizione	
B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini	14.000,00
B3 allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
B4 imprevisti	42.584,73
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	5.000,00
B6 accantonamento	0,00
B7 spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010	174.477,75
B8	
B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
Totale B:	€ 236.062,48
Totale intervento (A+B)	€ 1.073.757,13

(*) lavori titolo abilitativo (PD) + extra perimetro approvato in variante dal Comune con Delibera n.236 del 23/12/2019

3							
2							
1	01/04/2021	L.Z.	T.A.	T.A.	QE finale		
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL. (CHCK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)		
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) DIREZIONE ACQUA FOGNATURA E DEPURAZIONE							
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) INTERVENTI SULLE CONDOTTE DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO VIENNA - CATTOLICA							
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)			WBS T.2150.11.03.00029		CODICE CUP (CUP CODE) H64H20000550005		
			CODICE DOCUMENTO (CODE)		N° COMMESSA (JOB N.)		
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME)			
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Farini Micheli 3/4 - 40127 Bologna tel. 051.287111 fax 051.287115 www.gruppohera.it			 HERAtech s.r.l. Viale C. Bertini Pichat 2/4 - 40127 Bologna tel 051.287111 fax 051.250418 pec: heratech@pec.gruppohera.it www.heratech.it			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) QUADRO ECONOMICO	
			SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°) 1	DI (LAST) 3		

Quadro Economico finale

Importo netto

A Somme per lavori	
A1 lavori a misura, a corpo, in economia	61.380,00
A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	
A3-1 forniture dirette	
A3-2 forniture da magazzino	
Totale A:	€ 61.380,00
B Somme a disposizione	
B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini	0,00
B3 allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
B4 imprevisti	0,00
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
B6 accantonamento	0,00
B7 spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010 *	22.826,44
B8	
B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
Totale B:	€ 22.826,44
Totale intervento (A+B)	
	€ 84.206,44

* importo calcolato sulla base della Delibera Consiglio d'Ambito di Atersir n.24/2019 sulla Modalità di calcolo delle ST sostenute dal Gestore ai fini del riconoscimento tariffario

calcolo ST da CAMB/2019/24 del 20 marzo 2019

Tipologia di opera	rete	
IO (voci A+B1)	€	61.380,00
a		4,3947
b		0,2240
C ₁		500,00
C ₂		2.000,00
n (accordi bonari)		0
m (procedimenti espropriativi)		0
STab		22.826,44
STc		0,00
ST _{TOT}		22.826,44

impianto	a	8,9470
impianto	b	0,261
rete	a	4,3947
rete	b	0,224

Quadro Economico Progetto

Importo netto

A Somme per lavori	
A1 lavori a misura, a corpo, in economia	61.380,00
A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	
A3-1 forniture dirette	
A3-2 forniture da magazzino	
Totale A:	€ 61.380,00
B Somme a disposizione	
B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini	0,00
B3 allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
B4 imprevisti	0,00
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
B6 accantonamento	0,00
B7 spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010	22.826,44
B8 eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
Totale B:	€ 22.826,44
Totale intervento (A+B)	€ 84.206,44



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 12

Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, SIS S.p.A.

[19/11/2015]

ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Addì 19 novembre 2015

Tra le Parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 64, PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 51 del 10 novembre 2015, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR

(nel seguito anche Atersir);

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 04245520376, capitale sociale interamente versato euro 1.489.538.745,00, PEC hera-spa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del Consi-

glio di Amministrazione del 28/04/2014, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito anche HERA o Gestore);

Società Italiana Servizi S.p.A. (S.I.S. S.p.A.), con sede legale in Comune di Cattolica (RN) , Piazza della Repubblica n. 12, 47841 Cattolica (RN) iscritta C.C.I.A.A di Rimini e C.F. n. 82006370405, P.IVA 01289310409, capitale sociale interamente versato euro 36.959.282,00, PEC: sis.spa@peccicura.it, in persona del sig. Gianfranco Cenci, nella sua qualità di Presidente del C.d.A., il quale interviene in virtù dei poteri conferiti ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10/09/2015, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito SIS)

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che:

a) Hera è ed interviene nel presente Accordo in qualità di Gestore del servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini in forza della convenzione di affidamento sottoscritta con di Ambito di Rimini, atto sotto-

scritto in data 14/03/2002 scaduto il 14/03/2012 e tuttora vigente in regime di prorogatio in virtù di deliberazione Atersir n. 25 del 21/12/2012 fino alla decorrenza del nuovo affidamento;

b) SIS è una società a totale capitale pubblico proprietaria dei beni strumentali alla gestione del servizio idrico integrato ubicati nei territori dei Comuni Soci;

c) tra HERA e SIS è in vigore il "Contratto di affitto di ramo d'azienda" sottoscritto il 20/05/2003 Rep. 22205/12554" integrato con "Addendum al contratto di affitto di ramo d'azienda del 20 Maggio 2003 Rep. 22205/12554" sottoscritto in data 11/12/2007 Rep. 675/403;

d) la Legge Regionale n. 23 del 23/12/2011 ha costituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato a livello regionale, funzioni già esercitate dalle Autorità di Ambito Territoriali Ottimali; Atersir è, dunque, subentrata nelle convenzioni di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui alla lettera a) delle premesse;

e) l'art. 21, commi 13 e 19 del D. L. n. 201/2011,

così come convertito dalla L. 214/2011, ha trasferito all'Autorità per l'Energia elettrica e il gas (oggi Autorità per l'Energia elettrica il gas e il sistema idrico nel seguito anche AEEGSI), le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, tra cui l'approvazione del metodo tariffario;

f) AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, con deliberazione del 28/12/2012, n. 585, successivamente modificata ed integrata con deliberazioni n. 73/2013 e n. 88/2013;

g) AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per la determinazione delle tariffe negli anni 2014 e 2015 con deliberazione n. 643/2013;

l'Allegato A, art. 21.2, prevede la possibilità del riconoscimento tariffario di cespiti realizzati dopo il 2011 da parte di soggetti diversi dal Gestore del servizio idrico integrato, previa presentazione di una "motivata istanza" da parte dell'Ente d'Ambito, da valutarsi da parte della stessa Autorità nazionale sulla base di considerazioni di efficacia ed efficienza rispetto al raggiungimento di obiettivi specifici sul territorio;

h) Atersir, con propria deliberazione n. 22 d

28.04.2014, ha approvato, ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione AEEGSI n. 643/2013, gli specifici schemi regolatori 2014-2023 per l'ambito territoriale della provincia di Rimini;

i) SIS ha manifestato la propria disponibilità a finanziare, coerentemente con l'attuale quadro normativo e tariffario, parte degli investimenti previsti per il territorio della provincia di Rimini; per effetto degli atti di indirizzo dei Soci, tale disponibilità di SIS è condizionata all'approvazione da parte di AEEGSI del Piano degli interventi, dei correlati Piani tariffari ed economico finanziari, compreso l'inserimento dei cespiti finanziati e di proprietà di SIS, ma realizzati e gestiti dal Gestore, nelle componenti tariffarie riconosciute.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse sono parti integranti del presente Accordo e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'Accordo medesimo.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

a) Il presente Accordo stabilisce tra Atersir, SIS ed HERA le condizioni, i termini e le modalità connesse alla realizzazione e gestione da parte di Hera di opere funzionali alla gestione del servizio idrico integrato e finanziate da SIS che ne sarà proprietaria fin dal momento della loro realizzazione; tali opere devono essere espressamente previste nel Piano degli Interventi nel territorio della Provincia di Rimini.

b) In attuazione del presente Accordo Quadro, le Parti procederanno a sottoscrivere specifici Accordi Attuativi sulla base dello "schema tipo" in allegato A). Ogni Accordo Attuativo, a seguito della sua sottoscrizione, costituisce parte attuativa ed integrante del presente Accordo Quadro. In ogni Accordo Attuativo sono individuate le singole opere da realizzarsi con il finanziamento di SIS; la somma degli importi delle opere citate in ogni Accordo Attuativo costituisce l'importo massimo dell'impegno di finanziamento di SIS per lo specifico Accordo Attuativo. Costituiranno allegati di ogni Accordo Attuativo i seguenti documenti:

- l'elenco delle singole opere oggetto di finanziamento da parte di SIS e per ciascuna l'importo del relativo quadro economico di spesa come previsto

nel Piano degli Interventi;

- il cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio di ciascun intervento;

- il quadro economico di ciascun intervento redatto ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010;

- una previsione dei flussi di finanziamento a carico di SIS distinta per anno;

- una previsione dei canoni annui di spettanza di SIS a titolo di recupero dei costi del capitale investito, nei termini previsti negli schemi regolatori predisposti da Atersir e approvati da AEEGSI.

Quanto contenuto nell'allegato di ciascun Accordo Attuativo non dà titolo a nessuna delle Parti di emettere fattura o altro documento valido per l'incasso.

c) Atersir si impegna a determinare ed a riconoscere, come componente delle tariffe idriche applicabili al territorio di Rimini, i corrispettivi di competenza di SIS (di seguito anche "canoni") quale finanziatore e proprietario delle opere al fine di consentire la copertura dei costi del capitale, secondo il principio del full cost recovery, nel rispetto delle normative tariffarie come fissate da AEEGSI, tenuto conto delle rinunce espressamente accettate da SIS come indicate nella deliberazione

Atersir n. 22/2014. L'entità dei canoni che SIS è autorizzata a fatturare ad HERA è periodicamente definita da Atersir, in base ai dati di consuntivo rendicontati da SIS, secondo gli stessi metodi, tempi e criteri definiti da AEEGSI per il calcolo dei costi di capitale riconosciuti al gestore del servizio idrico integrato e al netto delle rinunce di quote tariffarie espressamente accettate da SIS. In sede di sottoscrizione dei singoli Accordi Attuativi potranno essere definite quote di rinunce tariffarie diverse da quanto previsto nella deliberazione Atersir n. 22/2014.

Art. 3 - DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e termina in data pari alla scadenza dell'Accordo Attuativo, sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, che presenta scadenza più posticipata, al fine di consentire a SIS il completo recupero dei costi del capitale investito.

Tenuto conto della scadenza della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato al Gestore, di cui al punto a) delle premesse, Atersir si impegna ad inserire sia negli atti di gara per la scelta del nuovo Gestore, sia negli atti convenzionali di regolazione del servizio da sottoscrivere

con il soggetto affidatario, l'obbligo di subentro nelle obbligazioni e nei diritti previsti in capo al Gestore, nascenti e derivanti dal presente Accordo Quadro e dai successivi Accordi Attuativi.

Art. 4 - POTERI E FUNZIONI DI ATERSIR

Atersir, quale Ente d'Ambito, esercita nei confronti di SIS e di HERA tutti i poteri e le funzioni individuate dalle vigenti norme nazionali e regionali, alle quali integralmente le Parti intendono riportarsi; Atersir si impegna sin d'ora a determinare e riconoscere, nel calcolo della tariffa del servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, i canoni di competenza di SIS per la funzione di finanziatore e proprietario di beni strumentali alla gestione del servizio idrico integrato, in base a quanto previsto dalle deliberazioni di AEEGSI per il calcolo dei costi di capitale del gestore del servizio idrico integrato, al netto delle rinunce espressamente accettate da SIS.

Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni indicate nel presente articolo, ed in specifico, la determinazione dei canoni di spettanza di SIS per l'attività di soggetto finanziatore ed il recepimento dei relativi effetti nel calcolo della tariffa, Atersir procederà all'acquisizione della se-

guente documentazione nei modi e nei tempi di volta in volta previsti dall'Autorità per la trasmissione all'Ente d'Ambito da parte del gestore delle rendicontazioni periodiche di competenza:

Documentazione richiesta a SIS:

- 1) ultimo bilancio di esercizio approvato;
- 2) dettaglio del libro cespiti aggiornato alla data dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato relativo agli investimenti realizzati da HERA e finanziati da SIS;
- 3) trasmissione delle informazioni relative ai cespiti di cui al precedente punto 2) nelle stesse forme e modi richiesti da AEEGSI per i beni non di proprietà del Gestore e che determinano un canone per il proprietario, canone riconosciuto nella tariffa del servizio idrico integrato (modelli "file proprietario" secondo le deliberazioni AEEGSI emesse);

Documentazione richiesta ad Hera:

- 1) i cronoprogrammi di realizzazione e messa in esercizio di ciascuna opera con il relativo importo come previsto nel Piano degli Interventi;
- 2) la rendicontazione, nell'ambito della Relazione annuale di rendicontazione tecnico-economica del servizio idrico integrato, delle somme erogate a

SIS a titolo di canone per gli investimenti di cui al presente Accordo;

3) la rendicontazione delle somme spese per la realizzazione delle opere con l'indicazione degli importi fatturali a SIS.

ART. 5 COMPITI E RESPONSABILITÀ DI HERA

Per ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui all'articolo 2, il Gestore del servizio, svolgerà l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, acquisirà tutte le autorizzazioni ed i permessi, nonché i necessari diritti patrimoniali sui terreni interessati dalla realizzazione delle opere necessari a garantirne la piena cantierabilità; svolgerà le gare d'appalto necessarie per l'affidamento dei contratti di esecuzione lavori; curerà la direzione lavori ed il collaudo delle opere, tutto come meglio definito e dettagliato nei successivi articoli.

Per tutte le attività sopra indicate, HERA è responsabile della piena applicazione di tutte le normative vigenti in materia con particolare riguardo a quelle in tema di sicurezza dei cantieri e luoghi di lavoro, prevenzione antinfortunistica e protezione della salute dei lavoratori, di appalti e di ambiente.

ART. 6 PROGETTAZIONE DELLE OPERE

Per ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui all'articolo 2, il Gestore del servizio svolgerà la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, secondo le norme di legge vigenti, nel rispetto degli standard tecnici cogenti e di quelli normalmente utilizzati per la progettazione delle reti e degli impianti. La progettazione potrà essere sviluppata con proprio personale abilitato o mediante professionisti esterni iscritti all'Albo, individuati nel rispetto delle norme sugli appalti. Al Gestore verranno riconosciute tutte le spese sostenute a vario titolo comprese ed autorizzate nei quadri economici dei singoli interventi. Le spese tecniche per lo svolgimento delle attività di pianificazione e programmazione, progettazione, direzione dell'esecuzione, verifiche e collaudi, comprendenti sia gli onorari per affidamenti esterni, sia le spese per le medesime attività svolte da personale interno del Gestore, non potranno superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei quadri economici di ogni Accordo Attuativo al netto delle spese tecniche stesse, salvo casi particolari debitamente motivati ed autorizzati. Il Gestore, in ogni caso,

si impegna a presidiare il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza con particolare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed a tal fine svolgerà le attività di Responsabile dei Lavori e curerà lo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

SIS terrà regolare rendicontazione delle spese che verranno sostenute per personale interno per le attività di verifica, collaudo tecnico-amministrativo e controllo di propria competenza o per qualsiasi altro titolo. Le spese rendicontate rimarranno contenute all'interno nei quadri economici di spesa dei singoli interventi nei limiti previsti dal presente articolo.

ART. 7 OTTENIMENTO DELLA CANTIERABILITA' DELLE OPERE

Il Gestore è responsabile dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni, concessioni, permessi, consensi, nulla osta comunque denominati, da parte di tutti gli Enti interessati (a titolo puramente indicativo e non esaustivo Comuni, ARPA, AUSL, FF.SS., Consorzi di Bonifica, Provincia, soggetti gestori di strade o autostrade, soggetti gestori di sottoser-

vizi, ecc.), necessari alla corretta esecuzione delle opere nel pieno rispetto di tutte le norme, con particolare riguardo a quelle edilizie ed urbanistiche. Le autorizzazioni, concessioni, permessi, consensi, nulla osta comunque denominati dovranno essere intestati a SIS in qualità di soggetto proprietario delle opere. SIS si impegna, pertanto, a prestare il proprio consenso e a sottoscrivere le pratiche predisposte e istruite per la presentazione dal Gestore. Il Gestore potrà direttamente presentare le richieste di autorizzazioni, permessi, consensi, nulla osta che non necessitano di sottoscrizione da parte del proprietario dell'opera.

I diritti di proprietà o di servitù sui terreni interessati dalla realizzazione delle opere sorgeranno in via esclusiva in capo a SIS.

Gli atti di costituzione di diritti di servitù e gli atti di compravendita verranno stipulati da SIS, quale soggetto proprietario delle opere, mentre gli "accordi bonari" preordinati alla successiva stipula delle servitù, verranno definiti e concordati direttamente dal Gestore con i proprietari delle aree interessate dai lavori di posa delle nuove opere, nel rispetto degli atti tipo indivi-

duati in accordo fra SIS ed il Gestore.

Prima dell'avvio dei lavori di ogni singolo intervento HERA, si impegna ad inviare a SIS la dichiarazione di cantierabilità delle opere firmata dal Direttore dei Lavori (come prevista dall'art.106 del D.P.R. n. 207/2010) corredata da copia dei vari permessi, consensi, nulla osta ed autorizzazioni comunque denominate, necessari per la realizzazione delle opere e copia dei diritti intestati a SIS su tutti i terreni demaniali o disponibili interessati dalla realizzazione delle opere.

ARTICOLO 8 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui all'articolo 2, sarà realizzato da HERA nel rispetto delle vigenti norme di legge.

HERA svolgerà le attività e le funzioni di Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento dell'appalto e di esecuzione delle opere.

ARTICOLO 9 - ESECUZIONE DEI LAVORI

HERA curerà la direzione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.

HERA, in ogni caso, si impegna a presidiare il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza

con particolare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed a tal fine svolgerà le attività di Responsabile dei Lavori e curerà lo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

HERA, durante l'esecuzione dei lavori, si obbliga, a rispettare e fare rispettare dagli esecutori i Piani Particellari di Esproprio dei singoli interventi, sollevando SIS da ogni responsabilità verso terzi derivante dal loro mancato rispetto.

ARTICOLO 10 - COLLAUDO DELLE OPERE

HERA provvederà alla nomina del collaudatore statico per le opere strutturali ed alla nomina del collaudatore tecnico funzionale.

HERA curerà altresì la redazione del certificato di regolare esecuzione dei singoli interventi.

Nei casi in cui, in base alle norme vigenti, non sia possibile la redazione del certificato di regolare esecuzione, SIS provvederà alla nomina del collaudatore tecnico amministrativo così come previsto dalla vigente normativa sugli appalti pubblici.

Le opere, non appena positivamente collaudate, saranno affidate al Gestore del servizio idrico inte-

grato, mediante la sottoscrizione del Verbale di consegna (Allegato B).

Art. 11 VARIAZIONI AI QUADRI ECONOMICI DI SPESA DEI SINGOLI INTERVENTI

Qualora, nel corso delle attività di progettazione delle opere, o a seguito dell'effettuazione delle gare d'appalto, o nel corso dell'esecuzione, per alcuno degli interventi previsti in ciascun Accordo Attuativo, si presentino cause che possono determinare una variazione del quadro di spesa si applica quanto di seguito esposto:

a) varianti al quadro di spesa sono ammesse senza necessità di specifica autorizzazione da parte di Atersir o SIS, qualora le stesse non comportino un aumento del quadro economico di spesa di ciascun intervento. HERA dovrà dare informazioni delle eventuali variazioni apportate ai singoli quadri economici di spesa contestualmente alla trasmissione della relazione informativa trimestrale di cui al successivo art. 12;

b) all'interno di ciascun Accordo Attuativo la variazione in diminuzione dell'importo complessivo di un'opera potrà essere utilizzata per pari entità per variazioni in aumento dell'importo di una o più opere senza necessità di procedere alla sottoscri-

zione di atto modificativo fra le parti. HERA deve trasmettere a SIS ed Atersir, comunicazione relativa alla modifica dei valori dei quadri di spesa delle singole opere con evidenza dell'invarianza del totale dell'importo complessivamente finanziato da SIS; HERA dovrà inoltre dare informazione delle conseguenti variazioni apportate ai singoli quadri di spesa contestualmente alla trasmissione della relazione informativa trimestrale di cui al successivo art. 12;

c) la variazione in aumento del quadro di spesa di un'opera non compensata da variazioni in diminuzione di altre opere, sarà possibile solo a seguito di modifica dell'Accordo Attuativo condizionata alla disponibilità di SIS di procedere all'erogazione dell'ulteriore finanziamento. Si precisa che nel caso in cui le proposte di variazione degli Accordi Attuativi non dovessero essere autorizzate da Atersir oppure, il Gestore non dovesse comunicare per iscritto ad Atersir e SIS le suddette variazioni del quadro economico di spesa, SIS non sarà obbligata alla corresponsione di alcun ulteriore finanziamento rispetto al valore massimo definito nell'Accordo Attuativo e le maggiori spese eventualmente sostenute, rispetto al quadro economico

come autorizzato da Atersir, rimarranno esclusivamente a carico del Gestore. Resta inteso, pertanto, che SIS non è autorizzata a finanziare interventi di importo superiore a quelli autorizzati e/o non previsti nel Piano d'Ambito.

Art. 12 CONTROLLO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Le Parti concordano di prestarsi reciproca collaborazione per l'ottimale gestione sul territorio delle attività di propria competenza.

Fino al pieno affidamento dei nuovi beni al Gestore del servizio idrico integrato, mediante la sottoscrizione del verbale di consegna delle opere di cui all'allegato B), HERA si impegna a fornire a SIS una relazione trimestrale sull'andamento dei lavori al fine di consentire la verifica del rispetto degli adempimenti previsti a carico di HERA e quindi dell'entità delle erogazioni dei finanziamenti da parte di SIS.

La relazione trimestrale dovrà contenere, per ogni intervento, lo stato di avanzamento dei lavori, gli eventuali aggiornamenti dei cronoprogrammi valorizzati di attuazione e dei relativi flussi di erogazioni dei finanziamenti da parte di SIS.

ARTICOLO 13 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLE OPE-

**RE E RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DA PARTE
DI HERA**

SIS si impegna a reperire le fonti di finanziamento al fine di garantire l'adeguata copertura finanziaria necessaria per la realizzazione delle opere previste nel Piano degli interventi nel territorio della provincia di Rimini, oggetto del presente Accordo, entro i limiti di spesa previsti negli Accordi Attuativi che verranno sottoscritti.

Le spese sostenute da HERA potranno essere finanziate da SIS nei limiti delle somme previste nei quadri di spesa dei singoli interventi, come eventualmente variati a seguito della progettazione delle opere, dell'esito delle gare di appalto ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, o a seguito dell'approvazione di varianti in fase esecutiva nei modi e con i limiti indicati all'art. 11.

Il costo degli interventi è da considerarsi comprensivo di tutte le voci che concorrono alla realizzazione delle opere, ricomprese nel quadro economico di progetto (lavori, oneri sicurezza, espropri, servitù, spese notarili, incarichi professionali esterni, spese di personale interno, ecc.).

I lavori dovranno essere rendicontati da HERA con

le modalità previste per le opere realizzate dal Gestore, come previsto dalla convenzione e dal disciplinare tecnico e relativi allegati regolanti l'affidamento del Servizio Idrico Integrato ad HERA.

Premesso che HERA dovrà tenere e conservare una completa rendicontazione di tutte le spese sostenute, corredata dai relativi elementi probatori, al solo fine dell'erogazione delle rate di finanziamento da parte di SIS vale quanto di seguito indicato.

Il Gestore potrà conseguire il finanziamento relativo agli interventi realizzati nei seguenti termini e modi:

a) emissione entro il 30 aprile di ciascun esercizio della fattura relativa alle attività effettuate nel 1° trimestre di ciascun esercizio;

b) emissione entro il 31 luglio di ciascun esercizio della fattura relativa alle attività effettuate nel 2° trimestre di ciascun esercizio;

c) emissione entro il 30 ottobre di ciascun esercizio della fattura relativa alle attività effettuate nel 3° trimestre di ciascun esercizio;

d) emissione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo a quello di riferimento della fattura

relativa alle attività effettuate nel 4° trimestre.

Per ogni singolo intervento le fatture di Hera dovranno essere accompagnate da una rendicontazione "semplificata" indicante i costi complessivi sostenuti alla data di riferimento, distinte per singola voce aggregata del quadro di spesa, in funzione dell'aliquota IVA ad essa applicata (ad esempio:

Lavori, Spese Tecniche esterne ed aziendali, Spese eliografiche, notarili, soggette ad IVA; Spese per servitù e concessioni, non soggette ad IVA).

L'importo complessivo delle fatture emesse ed accompagnate da tale rendicontazione "semplificata" non potrà superare il 90% dell'importo complessivamente stanziato o modificato per ogni singolo intervento.

La fatturazione del restante 10% potrà avvenire solo a seguito della rendicontazione finale con la trasmissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, del relativo conto finale, dei disegni di as-built, della certificazione sugli impianti eseguiti, del certificato di conformità edilizia e agibilità delle opere e della documentazione riportante la puntuale rendicontazione di tutte le spese a vario titolo sostenute, ognuna accompagnata dai relativi documenti probatori (a titolo indica-

tivo: copia fatture, copia rendicontazioni costi personale interno sostenuti, ecc.).

Le fatture verranno pagate da SIS entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento fattura accompagnata dalla documentazione tecnica precedentemente descritta. In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine stabilito al comma precedente, SIS sarà tenuta al pagamento degli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. 231/2002.

In applicazione della Legge 136/2010, SIS si impegna ad effettuare i pagamenti di propria competenza nel rispetto delle disposizioni normative, HERA assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare a SIS, per ciascuna opera di cui all'allegato A) il CUP (codice unico di progetto) e si impegna altresì a inserire, a pena di nullità, nei contratti passivi soggetti alla L. 136/2010 la clausola di cui all'art. 3, comma 9.

Quanto stabilito nella Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e nel Disciplinare Tecnico, nelle parti relative agli obblighi del Gestore per quanto concerne la realizzazione e la rendicontazione tecnica degli interventi, trova applicazione nei confronti di HERA anche per gli in-

terventi finanziati da SIS, con ciò escludendosi oneri di verifica e controllo in capo a quest'ultima ulteriori rispetto a quanto già espressamente previsto nel presente atto.

ART. 14 ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE

A seguito del completamento delle opere, del loro collaudo e della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'allegato B (comprensivo di tutta la documentazione richiesta per legge), le stesse opere verranno gestite da HERA secondo le norme e le condizioni stabilite nella Convenzione di cui alla lettera a) delle premesse; in particolare per l'intera durata del presente Accordo, HERA:

a) si impegna a corrispondere i canoni per l'utilizzo dei beni realizzati e gestiti, ma finanziati da SIS in qualità di proprietario, così come determinati da Atersir quale componente della tariffa del servizio idrico integrato, nel rispetto dei termini e nelle modalità stabiliti dall'Autorità;

b) è responsabile e provvede con oneri interamente a carico del Gestore del SII alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di mantenere i beni in normale stato di manutenzione, in condizioni

di efficienza ed in buono stato di conservazione;

c) provvede con urgenza e con oneri interamente a carico del Gestore del SII agli interventi necessari per eliminare eventuali non conformità dei beni a tutte le normative con particolare riguardo a quella in materia ambientale e di sicurezza dei luoghi di lavoro, manlevando e tenendo indenne SIS da qualsiasi responsabilità al riguardo;

d) adotta tutte le misure previste dalla normativa vigente in tema di prevenzione antinfortunistica e protezione della salute dei lavoratori, con particolare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

e) assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni, a propri dipendenti o a terzi durante il loro utilizzo ed a causa di esso;

f) assume la piena responsabilità per l'osservanza delle normative citate nel comma precedente, nonché per l'applicazione di ogni misura prevista per la prevenzione di danni di qualunque genere derivanti dall'esercizio delle attività pericolose di cui all'articolo 2050 codice civile;

g) si impegna a garantire la copertura dei rischi,

sia in fase di realizzazione delle opere che di gestione delle stesse, per danni di qualunque causa determinati ai beni stessi e a terzi in generale, per tutta la durata dell'Accordo, attraverso idonee polizze assicurative e ne comunica gli estremi a SIS.

ART. 15 - MODALITÀ DI RECUPERO DEL FINANZIAMENTO

Al fine del recupero degli oneri di capitale relativi al finanziamento delle opere, SIS ha diritto al riconoscimento di un canone sino al totale recupero dei costi del capitale; il canone sarà determinato da Atersir e liquidato da HERA nel rispetto di quanto previsto all'art.2, lettera c).

Compatibilmente con i meccanismi tariffari indicati nel citato articolo 2, l'importo annuo di ciascun canone sarà ripartito in quattro rate trimestrali di uguale importo da fatturarsi da parte di SIS a HERA e da liquidarsi nei seguenti termini:

- emissione delle fatture entro il 30/04, 31/07, 30/10 e 31/01;
- pagamento entro 60 giorni fine mese data ricevimento fattura.

In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine stabilito al comma precedente, HERA sarà tenuta al pagamento degli interessi legali di mora

di cui al D.lgs. 231/2002.

Per tutta la durata del presente Accordo, l'ammortamento dei beni finanziati da SIS sarà effettuato da SIS, secondo i principi e le metodologie del nuovo metodo tariffario. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 14 lettera b) seguiranno invece il regime di trattamento dei beni del SII in gestione al Gestore, anche per quanto riguarda l'ammortamento dei beni ammortizzabili.

Art. 16 - MODIFICHE ALL'ACCORDO QUADRO

Ogni modifica del presente Accordo Quadro dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle Parti e nel rispetto delle norme disciplinanti il regime del servizio idrico integrato.

In caso di modifica del quadro normativo e tariffario di riferimento, tenuto conto di quanto previsto nelle premesse, le Parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari.

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI / CODICE ETICO

Le Parti danno atto che ciascuna di esse è titolare del trattamento dei dati personali delle altre parti di cui venga in possesso in ragione e conseguen-

za convenzione del presente Accordo e che tale trattamento è effettuato ai fini e per gli effetti dell'adempimento, per competenza, alla convenzione stessa. I dati personali saranno trattati dalle Parti nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dal "Codice della Privacy". A tal fine le stesse dichiarano di essersi scambiate le reciproche informative ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

Le Parti si danno inoltre atto di avere preso piena conoscenza ed accettato i principi e le norme previste nel Codice Etico e del Modello 231 aziendale di SIS e di HERA, visibili dai rispettivi siti web aziendali www.sisonline.it e www.gruppohera.it.

Art. 18 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nella Convenzione d'ambito per il servizio idrico integrato citata in premessa, nonché alle vigenti norme di legge.

Art. 19 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia tra le Parti, il Foro competente esclusivo è quello di Bologna. E' espressamente esclusa qualsiasi competenza arbitra-

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente Accordo verrà registrato in solo caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 21 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa se effettuata presso la sede legale dell'ente, via Pec, via fax, per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 22 - ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro i seguenti Allegati:

- allegato A: Schema "Accordo Attuativo";
- allegato B: Schema "Verbale di consegna delle opere realizzate".

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

ATERSIR

Il Direttore


Ing. Vito Belladonna

Il Presidente del C.d.A.

HERA S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Do

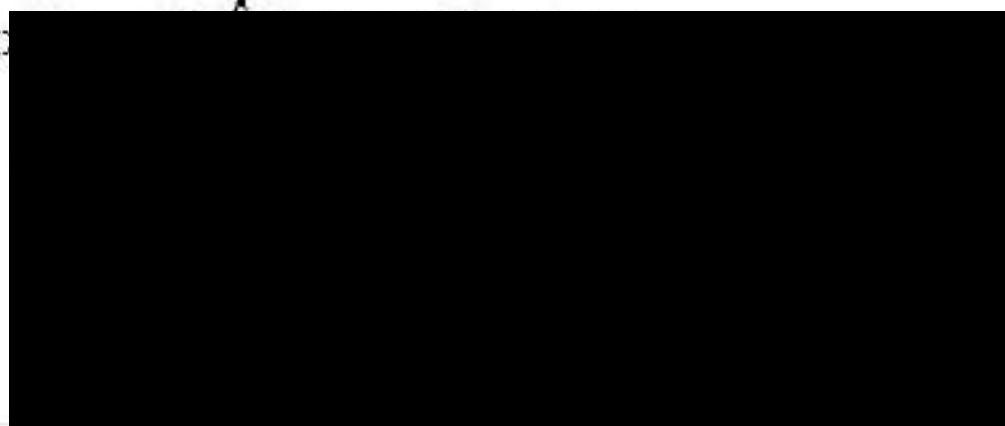

ALLEGATO A)

**N° ... ° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL
FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE
AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI RIMINI**

"

"

Addi

Tra le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna
Via Aldo Moro n. 64, c.f.91342750378, PEC dgater-
sir@pec.atersir.emr.it nella persona dell'Ing. Vito
Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il qua-
le interviene alla presente scrittura in forza dei
poteri conferiti con delibera del Consiglio
d'Ambito n. 51 del 10 novembre 2015, domiciliato ai
fini della presente Convenzione presso la sede di
Atersir ;

(di seguito **Atersir**)

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti
Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese
di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA
04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in
persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità
di Amministratore Delegato, il quale interviene al-

la presente scrittura in forza dei poteri conferiti
con delibera del Consiglio di Amministrazione del
28/04/2014, domiciliato ai fini della presente Con-
venzione presso la sede della Società

(nel seguito anche **HERA** o **Gestore**);

Società Italiana Servizi S.p.A. (S.I.S. S.p.A.),
con sede legale in Comune di Cattolica (RN) , Piaz-
za della Repubblica n. 12, 47841 Cattolica (RN)
iscritta C.C.I.A.A di Rimini e C.F. n. 82006370405,
P.IVA 01289310409, capitale sociale interamente
versato euro 36.959.282,00, PEC:
sis.spa@peccsicura.it, in persona del sig. Gianfran-
co Cenci, nella sua qualità di Presidente del
C.d.A., il quale interviene in virtù dei poteri
conferiti ed in esecuzione della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del 10/09/2015, domi-
ciliato ai fini della presente Convenzione presso
la sede della Società

(nel seguito **SIS**)

(nel seguito congiuntamente le **Parti**)

Premesso che

a) in data _____ è stato sottoscritto, tra
Atersir, SIS e Hera, l'Accordo Quadro per la rea-
lizzazione e il finanziamento di opere relative al
servizio idrico integrato nell'ambito territoriale

di Rimini;

b) ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro di cui alla lettera precedente, il presente atto costituisce parte attuativa ed integrante dello stesso.

Art.1- Premesse

Le premesse sono parti integranti del presente atto e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'atto medesimo.

Art. 2 - Oggetto

Con il presente atto le Parti danno attuazione a quanto previsto all'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro di cui alla lettera a) delle premesse.

In allegato 1) è riportato l'elenco delle singole opere oggetto di finanziamento da parte di SIS e di realizzazione da parte di Hera previste dal presente Accordo Attuativo; si dà atto che le suddette opere sono previste nel Piano degli interventi, documento di programmazione facente parte dello schema regolatorio per le tariffe dell'ambito territoriale di Rimini, come predisposto da Atersir con delibera n. _____ ed approvato da AEEGSI con deliberazione n. _____. Per ogni

opera è indicato l'importo del relativo quadro di spesa come previsto nel Piano degli Interventi

La somma degli importi delle opere in allegato 1) è pari ad euro _____ (importo in lettere), tale valore costituisce l'importo massimo dell'impegno di finanziamento di SIS per le suddette opere, fatto salvo quanto previsto all'art.11 dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro suddetto, costituiscono parte integrante del presente Accordo Attuativo i seguenti allegati:

1. l'elenco delle singole opere oggetto di finanziamento da parte di SIS e per ciascuna l'importo del relativo quadro economico di spesa come previsto nel Piano degli Interventi _____ ;
2. il cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio di ciascuna opera;
3. il quadro economico di spesa di ciascuna opera redatto ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010;
4. la previsione dei flussi di finanziamento a carico di SIS distinta per anno.
5. una previsione dei canoni annui di spettanza di SIS a titolo di recupero dei costi del capitale investito, nei termini previsti negli schemi regola-

tori predisposti da Atersir e approvati da AEEGSI.

Art. 3 Durata

Il presente Accordo ha efficacia, anche in via di ratifica, dalla data di inizio delle attività di realizzazione degli interventi e termina alla data del completo recupero da parte di SIS dei costi del capitale investito nei modi e termini di cui all'art. 15 dell'Accordo Quadro.

Tutte le disposizioni espresse nell'Accordo Quadro di cui alla lettera a) delle premesse, nessuna esclusa, trovano totale ed integrale applicazione nel presente Accordo Attuativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

ATERSIR

Il Direttore

Ing. Vito Belladonna

SIS S.p.A.

Il Presidente del C.d.A.

Gianfranco Cenci

HERA S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Dott. Stefano Venier

ALLEGATO B)

VERBALE DI CONSEGNA DELL' INTERVENTO/DEGLI INTERVEN-
TI DENOMINATO/I " "

Addì

Tra le parti

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti
Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese
di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA
04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in
persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità
di Amministratore Delegato, il quale interviene al-
la presente scrittura in forza dei poteri conferiti
con delibera del Consiglio di Amministrazione
28/04/2014, domiciliato ai fini della presente
Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito **HERA o Gestore**);

Società Italiana Servizi S.p.A. (S.I.S. S.p.A.),
con sede legale in Comune di Cattolica (RN) , Piaz-
za della Repubblica n. 12, 47841 Cattolica (RN)
iscritta C.C.I.A.A di Rimini e CF n. 82006370405,
P.IVA 01289310409, capitale sociale interamente
versato euro 36.959.282,00, PEC:
sis.spa@peccicura.it, in persona del sig. Gianiran-
co Cenci, nella sua qualità di Presidente del
C.d.A., il quale interviene in virtù dei poteri

conferiti ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10/09/2015, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito **SIS**)

(nel seguito congiuntamente le **Parti**)

Premesso che

a) in data _____ è stato sottoscritto, tra Atersir, SIS e Hera, l'Accordo Quadro per il finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Rimini (nel seguito **Accordo**) ;

b) le Parti hanno deciso di attuare l'intervento/gli interventi denominato/i " _____ " sottoscrivendo il relativo Accordo Attuativo in data _____ ed approvandone il relativo Progetto e Quadro economico, compresi gli ulteriori allegati previsti;

c) l'intervento _____ è stato realizzato _____ (tempi e modi di realizzazione dell'intervento)

d) HERA è il Gestore del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini in forza della convenzione di affidamento sottoscritte con l'Autorità di Ambito di Rimini (atto

sottoscritto in data 14/03/2002 avente scadenza il 14/03/2012, in regime di prorogatio);

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

1. Le premesse sono parti integranti del presente atto e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'atto medesimo.

2. Il Gestore con la firma del presente verbale accetta in consegna senza riserve le opere e si impegna ad assumerne la gestione alle condizioni, patti e termini di cui alle Convenzioni di affidamento del SII nel territorio della Provincia di Rimini e di cui all'Accordo in premessa.

3. SIS dichiara di ricevere, con la sottoscrizione del presente Verbale, tutta la documentazione attestante la rendicontazione dell'intervento eseguito e autorizza, pertanto, HERA ad emettere la relativa fattura a saldo prevista all'art. 13.

Letto, approvato e sottoscritto.

Si allega:

- 1) Collaudo delle opere
- 2) Documentazione di rendicontazione

SIS S.p.A.

Il Presidente del C.d.A.

Gianfranco Cenci

HERA S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Dott. Stefano Venier



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 12A

Addendum all'Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, SIS S.p.A.

**ADDENDUM ALL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E
LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO IN-
TEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI, SOTTO-
SCRITTO TRA HERA S.P.A., ATERSIR, S.I.S. S.P.A. IN DATA 19/11/2015**

Tra le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna Via Cairoli, 8/F – 40121 Bologna, PEC dgater-sir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 54 del 20/10/2014, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR

(nel seguito **ATERSIR**)

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito anche **HERA** o **Gestore**)

Società Italiana Servizi S.p.A. (S.I.S. S.p.A.), con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Piazza della Repubblica n. 12, 47841 Cattolica (RN) iscritta C.C.I.A.A di Rimini e CF n. 82006370405, P.IVA 01289310409, capitale sociale interamente versato euro 36.959.282,00, PEC: sis.spa@peccicura.it, in persona dell'ing. Roberto Giorgi, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

		(nel seguito SIS)
		(nel seguito congiuntamente le Parti)
	Premesso che	
	a)	in data 19/11/2015 è stato sottoscritto, tra ATERSIR, SIS e HERA, l'Accordo Quadro (nel seguito Accordo Quadro) per la realizzazione e il finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Rimini;
	b)	a seguito della delibera del Consiglio d'Ambito di Atersir n. 24 assunta in data 20/03/2019 è stato approvato il documento denominato <i>“Modalità di calcolo delle spese tecniche sostenute dal Gestore per la progettazione e la realizzazione delle opere previste nei programmi degli interventi del SII ai fini del riconoscimento tariffario”</i> che modifica l'attuale disciplina delle spese tecniche di cui all'articolo 6 dell'Accordo Quadro;
	c)	si rende pertanto necessario sostituire l'attuale articolo 6 dell'Accordo Quadro con il testo novellato di cui al presente Addendum.
	Tutto ciò premesso	
	si conviene e si stipula quanto segue.	
	Art.1 - Premesse	
	Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'atto medesimo.	
	Art. 2 – Modifica art. 6 dell'Accordo Quadro	
	L'articolo 6 – Progettazione delle opere dell'Accordo Quadro viene sostituito integralmente con il presente testo:	
	“Art. 6 – Progettazione delle opere.	
	Per ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui all'articolo 2, il	
	2	

	Gestore del servizio svolgerà la progettazione, secondo le norme di legge vigenti,	
	nel rispetto degli standard tecnici cogenti e di quelli normalmente utilizzati per la	
	progettazione delle reti e degli impianti. La progettazione potrà essere sviluppata	
	con proprio personale abilitato o mediante professionisti esterni iscritti all'Albo,	
	individuati nel rispetto delle norme sugli appalti. Al Gestore verranno riconosciute	
	tutte le spese sostenute a vario titolo comprese ed autorizzate nei quadri economici	
	dei singoli interventi. Le spese tecniche sostenute dal Gestore per la progettazione	
	e la realizzazione delle opere verranno riconosciute nei modi e limiti definiti nel	
	documento denominato <i>“Modalità di calcolo delle spese tecniche sostenute dal Ge-</i>	
	<i>store per la progettazione e la realizzazione delle opere previste nei programmi</i>	
	<i>degli interventi del SII ai fini del riconoscimento tariffario”</i> approvato da ATER-	
	SIR nella Delibera del Consiglio d'Ambito n. 24 del 20/03/2019. Il Gestore, in ogni	
	caso, si impegna a presidiare il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza	
	con particolare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e	
	successive modifiche e integrazioni ed a tal fine svolgerà le attività di Responsabile	
	dei Lavori e curerà lo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in	
	fase di progettazione.	
	Potranno essere riconosciute eventuali attività tecnico-amministrative svolte da SIS	
	a supporto del Gestore, fermo restando che le stesse dovranno essere ricomprese	
	nei limiti definiti nel summenzionato documento <i>“Modalità di calcolo delle spese</i>	
	<i>tecniche sostenute dal Gestore per la progettazione e la realizzazione delle opere</i>	
	<i>previste nei programmi degli interventi del SII ai fini del riconoscimento tariffario”</i>	
	sulla base di specifici accordi tra SIS e Gestore.	
	Art. 3 – Disposizioni transitorie.	
	Le Parti concordano che le modalità di calcolo delle spese tecniche contenute nel	

novellato art. 6 dell'Accordo Quadro si applicheranno agli Accordi Attuativi sottoscritti dopo la data di efficacia del documento denominato *“Modalità di calcolo delle spese tecniche sostenute dal Gestore per la progettazione e la realizzazione delle opere previste nei programmi degli interventi del SII ai fini del riconoscimento tariffario”*, ai sensi della Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 24 del 20/03/2019.

Le Parti riconoscono pertanto che le spese tecniche relative agli interventi contenuti in Accordi Attuativi già sottoscritti a tale data e/o loro Revisioni, continueranno ad essere calcolate sulla base delle disposizioni precedentemente in vigore, fatta sempre salva la facoltà di ATERSIR di concedere una deroga al limite ivi fissato.

Articolo 4 - Firma digitale

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

ATERSIR

Ing. Vito Belladonna

(firmato digitalmente)

S.I.S. S.p.A.

Ing. Roberto Giorgi

(firmato digitalmente)

HERA S.p.A.

Dott. Stefano Venier

(firmato digitalmente)



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 12B

Primo Accordo attuativo dell'Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, sottoscritto tra HERA S.p.A., ATERSIR, SIS S.p.A.

[22/12/2015]

**PRIMO ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL
FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE
AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI RIMINI**

**"INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DI
CATTOLICA (RN) "**

Addi 22/12/ 2015

Tra le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna
Via Aldo Moro n. 64, c.f.91342750378, PEC dgater-
sir@pec.atersir.emr.it nella persona del Dott.Vito
Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il qua-
le interviene alla presente scrittura in forza dei
poteri conferiti con delibera del Consiglio
d'Ambito n. 51 del 10/11/2015, domiciliato ai fini
del presente Accordo presso la sede di Atersir ;

(di seguito **Atersir**)

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti
Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese
di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA
04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in
persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità

di Amministratore Delegato, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2014, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede della Società

(nel seguito anche Hera o Gestore);

Società Italiana Servizi S.p.A. (S.I.S. S.p.A.), con sede legale in Comune di Cattolica (RN) , Piazza della Repubblica n. 12, 47841 Cattolica (RN) iscritta C.C.I.A.A di Rimini e CF n. 82006370405, P.IVA 01289310409, capitale sociale interamente versato euro 36.959.282,00, PEC: sis.spa@pecsicura.it, in persona del sig. Gianfranco Cenci, nella sua qualità di Presidente del C.d.A., il quale interviene in virtù dei poteri conferiti ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10/09/2015, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito SIS)

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che

a) in data 19/11/2015 è stato sottoscritto, tra Atersir, SIS e Hera, l'Accordo Quadro (nel seguito Accordo Quadro) per la realizzazione e il

finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Rimini;

b) ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro, il presente Accordo Attuativo (nel seguito **Accordo**) costituisce parte attuativa ed integrante dello stesso;

c) il Piano degli Interventi relativamente all'ambito territoriale di Rimini prevede tra gli interventi cofinanziati da SIS e realizzati dal Gestore l'Intervento di adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica (RN);

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1- Premesse

Le premesse sono parti integranti del presente Accordo e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'Accordo medesimo.

Art. 2 - Oggetto

Con il presente Accordo le Parti danno attuazione a quanto previsto all'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro.

Tutte le disposizioni espresse nell'Accordo Quadro,

nessuna esclusa, trovano totale ed integrale applicazione nel presente Accordo.

In particolare SIS si impegna a cofinanziare ed Hera si impegna a realizzare:

- Intervento di adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica (RN).

L'importo dell'opera oggetto del presente Accordo è pari a complessivi euro 2.877.000,00 (duemilioniottocentosettantasettemila/00), finanziato da Hera per euro 2.325.000,00 e da SIS per euro 552.000,00; tale ultimo valore costituisce l'importo massimo dell'impegno di finanziamento di SIS per la suddetta opera, fatto salvo quanto previsto all'art.11 dell'Accordo Quadro.

Le Parti si danno atto e concordano che l'Intervento di adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica (RN) è in corso di esecuzione. In considerazione di ciò, anche in deroga a quanto previsto all'art. 2 lettera b) ultimo capoverso dell'Accordo Quadro, con la sottoscrizione del presente Accordo Hera avrà titolo per fatturare a SIS gli interventi già eseguiti e in corso di esecuzione, con le modalità di cui all'art.13 dell'Accordo Quadro.

Art. 3 - Allegati

Ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro, costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. Cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio dell'intervento;
2. Quadro economico di spesa dell'opera redatto ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010.

Si ribadisce quanto espresso nell'Accordo Quadro in merito al puntuale recepimento delle disposizioni tariffarie di AEEGSI per quanto concerne la definitiva determinazione dei canoni e quindi anche per gli aspetti determinati dall'onere finanziario. L'entità definitiva dei canoni che SIS è autorizzata a fatturare ad Hera sarà definita da ATERSIR in base ai dati di consuntivo rendicontati da SIS.

Art. 4 Durata

Il presente Accordo ha efficacia, anche in via di ratifica, dalla data di inizio delle attività di realizzazione degli interventi e termina alla data del completo recupero da parte di SIS dei costi del capitale investito per gli stessi nei modi e termini di cui all'art. 15 dell'Accordo Quadro.

Letto, approvato e sottoscritto.

ATERSIR

Il Direttore

Ing. Vito Belladonna

18/0

[REDACTED]

Il Presidente

Gianfranco Cenci

[REDACTED]

HERA S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Dott. Stefano Venier

[REDACTED]

1	24/11/2015	L.Z.	L.Z.	L.M.	EMISSIONE
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROL (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) Ingegneria					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica (RN)					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO					
				N° ELABORATO (DOCUMENT N°)	N° COMMESSA (JOB N°) R.2150.11.04.00001 T.2150.11.04.00003
				ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME)
 HERA S.p.A. Holding Energia Acqua Ambiente Via Carlo Sforza Pichet 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.287.525 www.gruppo-hera.it		DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) CRONOPROGRAMMA			
		SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°) 1	DI (LAST) 4	

13

Garage
Bicycle

APPALTO ADEGUAMENTO DISTR. ARIA

GARA
LAWOR

COLLAUDI E CHIUSURA AMMINISTRATIVA

[illegible]

Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica (RN)

CRONOPROGRAMMA LAVORI APPALTO PRINCIPALE

SETTIMANE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

OPERE CIVILI

- Approntamento cantiere
- Demolizione
- Riporto vasca ossidazione esistente
- Sollevamento fanghi circolari
- Sollevamento microlo mixed liquor
- Arroio alla canalotta esistente ossidaz.
- Partizioni alle sedimentazioni finali
- Pozzetti intercalazione sedim. finale
- Pozzetto a valle sedimentaz. Primaria
- Collegamenti idraulici
- Locale soffianti
- Barriera antinquinamento
- Sistemazione area intermedia dei lavori
- Smontaggio cantiere

OPERE ELETTROMECCANICHE

- Demolizione biologica
- Scrubber
- Sollevamento fanghi circolari
- Sollevamento microlo mixed liquor
- Manufatto adiacente canalotta ossidaz.
- Adeguamento ossidazioni esistenti
- Pozzetti intercalazione sedim. finale
- Manufatto di part.2. alla sedim. finali
- Manufatto a valle sediment. primario
- Edificio soffianti
- Impianti elettrici e quadri comando
- Barriera antinquinamento
- Opere varie

VARIE

Prova di funzionamento

NOTE:

- * LE LAVORAZIONI RELATIVE AI COLLEGAMENTI IDRAULICI CON VASCA DI OSSIDAZIONE (FASE 4 - POSA OPERA ULTIMI 25 METRI TUBAZIONE) DEVONO AVERE LA DURATA MASSIMA DI UNA SETTIMANA
- ** GLI INTERVENTI LEGATI AL LOCALE SOFFIANTE E L'UTILIZZO DI UNA SOFFIANTE IN ESTERNO DEVONO AVERE LA DURATA MASSIMA DI 20 GIORNI
- *** GLI INTERVENTI SULL'IMPIANTO ELETTRICO DEVONO PREVEDERE UN FUORI SERVIZIO CONTINUATIVO MASSIMO DI 4 ORE

CRONOPROGRAMMA LAVORI APPALTO PIASTRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Collaudi

1	24/11/2015	L.Z.	L.Z.	L.M.	EMISSIONE
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROL. (CHCK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)					
Ingegneria					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)					
Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica (RN)					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO					
				N° ELABORATO (DOCUMENT N°)	N° COMMESSA (JOB N°)
					R.2150.11.04.00001 T.2150.11.04.00003
				ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME)
				DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)	
				QUADRO ECONOMICO	
		SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°)	DI (LAST)	
			1	3	

Interventi di: Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica (RN)

Quadro Economico Previsionale Complessivo

A) SOMME DI CONTRATTO (post gara appalto principale 2° stralcio)

A.1) Lavori a corpo	€	1.666.314,99	
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti ribasso	€	125.155,52	
Totale lavori a base d'appalto			€ 1.791.470,51

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.0) Lavori antecedenti 2013 esclusi dall'appalto principale	€	360.000,00	
B.1) Appalto piastre (vedasi dettaglio)	€	380.000,00	
B.2) Rilievi, accertamenti, indagini	€	-	
B.3) Allacciamento a pubblici servizi	€	5.000,00	
B.4) Imprevisti	€	82.000,00	
B.5) Occupazione aree e indennizzi	€	-	
B.6) Spese tecniche e generali	€	253.529,49	
B.7) Spese per analisi e collaudi	€	5.000,00	
Totale somme a disposizione			€ 1.085.529,49

TOTALE IMPORTO INVESTIMENTO € **2.877.000,00**

di cui Ente finanziatore Hera € **2.325.000,00**

di cui Ente finanziatore S.I.S. € **552.000,00**

Interventi di: Adeguamento del sistema di distribuzione dell'aria all'interno delle vasche di ossidazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica (RN)

Quadro Economico post gara

A) LAVORI A BASE D'APPALTO

A.1) Lavori a corpo	€	330.246,20	
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti ribasso	€	5.000,00	
Totale lavori a base d'appalto			€ 335.246,20

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) Imprevisti	€	15.000,00	
B.2) Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza	€	29.753,80	
Totale somme a disposizione			€ 44.753,80

TOTALE IMPORTO € **380.000,00**



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 13

Convenzione tra Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per
i servizi idrici e rifiuti e AMIR S.p.A.

**CONVENZIONE TRA AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA
ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI E AMIR S.P.A.**

Premesso che

1. L'art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 ha previsto che “a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012 [...]”;
2. in ottemperanza a quanto disposto dal predetto decreto legislativo, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto, con L.R. n. 23/2011:
 - a. a individuare l'intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale;
 - b. a istituire, con decorrenza 1° gennaio 2012, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (d'ora in poi ATERSIR o Agenzia), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato (d'ora in poi SII) e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo il subentro della stessa in tutti i rapporti giuridici delle sopresse forme di cooperazione e pertanto anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
 - c. a determinare gli organi dell'Agenzia, tra i quali i Consigli Locali e il Consiglio d'Ambito, assegnando: ai primi, la funzione di indivi-

	duare, anche aggregandoli, i bacini di affidamento, nelle more del	
	riallineamento delle scadenze delle attuali gestioni e di proporre al	
	Consiglio d'Ambito la forma di gestione dei servizi medesimi; al se-	
	condo, l'approvazione del Piano d'Ambito e l'assunzione delle deci-	
	sioni finali in ordine alle modalità di affidamento dei servizi;	
	3. AMIR S.p.A. è società, a totale capitale pubblico, proprietaria dei beni	
	strumentali alla gestione del servizio idrico integrato ubicati nei territori	
	dei Comuni soci;	
	4. con le deliberazioni nn. 18/2001 e 19/2001 della disciolta AATO 9 Ri-	
	mini, ai sensi della Legge Regionale n. 25/99, sono state salvaguardate	
	per il servizio idrico integrato le gestioni di AMIR SpA e SIS SpA, poi	
	confluite in HERA SpA relativamente ai soli rami d'azienda funzionali	
	alla gestione dei servizi pubblici locali, con decorrenza dal 31/12/2002;	
	5. Con uno specifico contratto d'affitto di ramo d'azienda, stipulato nel	
	2002, AMIR SpA ha regolato i rapporti con HERA SpA prevedendo che	
	gli ammortamenti dei beni in affitto confluiscono in uno specifico Fondo	
	di Ripristino Beni di Terzi (FRBT) accantonato dal gestore del S.I.I. e	
	disciplinando la destinazione di tale fondo, destinato a tenere indenne la	
	società patrimoniale dalla perdita di valore dei propri beni utilizzati dal	
	gestore nell'esecuzione del S.I.I.	
	6. in data 14 marzo 2002, veniva quindi stipulata apposita convenzione per	
	la prima attivazione del Servizio Idrico Integrato, approvata dalla di-	
	sciolta AATO n. 9 Rimini, e oggetto di successivo adeguamento con atto	
	del 14 marzo 2005;	

	7. l'affidamento del Servizio Idrico Integrato in capo al gestore HERA S.p.A. nella Provincia di Rimini risulta scaduto il 14/03/2012;	
	8. la gestione suddetta prosegue a tutt'oggi in regime di proroga, trattandosi di servizi essenziali alla collettività e dunque non suscettibili di interruzione;	
	9. l'art. 147, comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006 consente, qualora l'ambito territoriale ottimale del SII consista nell'intero territorio regionale, l'affidamento ad un gestore unico in ambiti comunque non inferiori ai territori provinciali o delle città metropolitane;	
	10. l'art. 3-bis, comma 1-bis del D.L. 13/08/2011, n. 138 prevede che siano gli enti di governo d'ambito (ATERSIR) a procedere all'affidamento, mediante la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, dando conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e motivandone le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;	
	11. la relazione di cui al punto precedente deve inoltre comprendere un Piano Economico-Finanziario, che contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti;	
	12. ATERSIR ha determinato, con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 48/2015 del 29 settembre 2015, di procedere alla scelta della forma di gestione e conseguentemente all'avvio delle procedure finalizzate al nuovo affidamento del SII nel bacino territoriale di Rimini, per il superamento dell'attuale regime di proroga;	

	13. la modalità di affidamento prescelta è quella costituita dalla gara per la concessione del servizio a terzi;	
	14. ATERSIR, con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.1/2018 del 31 gennaio 2018, ha dato mandato agli uffici tecnici per la redazione degli atti della procedura aperta per l'affidamento in concessione del SII per la provincia di Rimini ad esclusione del comune di Maiolo, inserendo il VRD aggiornato con Determinazione 124/2017 e allegando specifica documentazione tecnica corrispondente all'attuale stato di fatto del servizio posto a base di gara;	
	15. AMIR SpA ha formalizzato la propria disponibilità al finanziamento di infrastrutture relative al S.I.I. sia attraverso la stipula, in data 28/10/2010, di una convenzione con l'ex ATO9 di Rimini sia attraverso la sottoscrizione con ATERSIR in data 22/01/2015 di uno specifico accordo di programma quadro e di alcuni accordi attuativi che sono stati perfezionati nel corso degli anni successivi in coerenza con la pianificazione degli investimenti approvata dall'Ente di regolazione regionale; le succitate convenzioni, a fronte del finanziamento delle opere, prevedevano il riconoscimento alla patrimoniale di un canone annuale destinato alla copertura dei costi di capitale sostenuti per i finanziamenti, coperto dalla tariffa del servizio idrico integrato e pertanto calcolato secondo le regole stabilite dalle metodologie tariffarie vigenti; AEEGSI (oggi ARERA) a seguito di specifica istanza motivata formulata da ATERSIR, finalizzata a dimostrare come tali modalità di finanziamento risultano assolutamente coerenti con le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità rispetto agli obiettivi di piano, dimostrando l'esistenza di un	

	alla concessione in uso dei beni di proprietà delle società patrimoniali	
	per la gestione del SII; ai canoni dovuti alla patrimoniale per l'utilizzo	
	dei suoi beni e finalizzati al recupero dei costi di capitale per investi-	
	menti ante 2006 e post 2006; al finanziamento di nuovi investimenti al-	
	le condizioni previste da ARERA attraverso l'utilizzo delle risorse fi-	
	nanziarie derivanti dai suddetti canoni e dall'incasso del fondo di ripri-	
	stino beni di terzi.	
	Tutto ciò premesso, le parti	
	ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi	
	Idrici e Rifiuti (di seguito ATERSIR) con sede in Bologna via Cairoli n.	
	8/F PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito Belladonna,	
	nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in	
	forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 31 del	
	19 aprile 2018, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede	
	di ATERSIR	
	e	
	AMIR S.p.A. (di seguito AMIR), con sede legale in Rimini, Via Dario	
	Campana n. 63, iscritta al Registro Imprese di Rimini al n. 02349350401,	
	CF e P.IVA 02349350401, PEC: Amirspa@legalmail.it, in persona del Dott.	
	Alessandro Rapone, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale in-	
	terviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell'Assemblea degli	
	Azionisti del 30/04/2019, domiciliato ai fini della presente Convenzione	
	presso la sede della Società	
	convengono e stipulano quanto segue	
	Art. 1 Oggetto della Convenzione	
	6	

1.1 Con la presente convenzione, AMIR si obbliga a mettere a disposizione del soggetto incaricato della gestione del SII, di cui alla procedura di affidamento meglio precisata nelle premesse, i beni, gli impianti e le dotazioni patrimoniali di sua proprietà (o comunque dalla stessa detenuti) strumentali allo svolgimento del servizio idrico integrato, dietro pagamento di un canone, come previsto al punto 7 della presente convenzione.

1.2 L'Agenzia determina il canone che il soggetto incaricato della gestione del Servizio Idrico Integrato corrisponderà ad AMIR.

1.3 AMIR si impegna a finanziare investimenti infrastrutturali funzionali al S.I.I. utilizzando risorse provenienti dal canone nonché dagli incassi relativi alla restituzione del fondo di ripristino beni di terzi riferito alla gestione precedente.

Art. 2 Durata della Convenzione

La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione e scadenza alla data di cessazione dell'efficacia della convenzione di gestione - relativa al SII del bacino locale di Rimini, di cui alla procedura di affidamento indicata nelle premesse - fatte salve successive proroghe, anche tacite, della stessa, e comunque fino alla data di stipula di una nuova convenzione.

Art. 3 Dotazione del Gestore del SII

AMIR mette a disposizione del Gestore i beni strumentali al SII, identificati nell'allegato A, il quale assume valore di stato di consistenza per tutti gli effetti di legge.

Art. 4 Poteri e Funzioni dell'Agenzia

All'Agenzia spettano nei confronti di AMIR tutti i poteri e le funzioni indi-

	viduate dalle vigenti norme nazionali e regionali, alle quali integralmente le parti intendono riportarsi. L'Agenzia, inoltre:	
	a) Esercita le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e pertanto anche della messa in disponibilità del gestore dei beni funzionali alla produzione del SII;	
	b) Pianifica gli investimenti per il miglioramento o l'estensione delle dotazioni patrimoniali, ponendo a carico del gestore del servizio tutti gli oneri finanziari relativi, inclusi quelli di capitale; in particolare disciplina gli investimenti finanziati dalla società patrimoniale con specifici accordi attuativi in coerenza con quanto stabilito dal vigente accordo quadro.	
	c) Controlla il servizio e l'attività del gestore al fine di assicurare la corretta applicazione della tariffa, verifica il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti, valuta l'andamento economico finanziario della gestione e definisce tutte le attività necessarie per la puntuale attuazione del Piano d'Ambito.	
	Art. 5 Utilizzo dei beni	
	Il Gestore gestirà il SII utilizzando i beni oggetto di affidamento in conformità con le disposizioni della convenzione di gestione conseguente al perfezionamento della procedura di nuovo affidamento indicata nelle premesse.	
	Art. 6 Aggiornamento dell'elenco dei beni	
	L'allegato A, contenente l'elenco dei beni di proprietà di AMIR nella disponibilità del gestore, sarà aggiornato alla scadenza della gestione risultante dalle procedure di cui alle premesse, al momento della presa in carico del SII da parte del nuovo gestore, con l'aggiunta dei beni realizzati nel corso	

della riferita gestione finanziati dalla società patrimoniale ed entrati nella proprietà della stessa ai sensi del successivo art.13.

Art. 7 Canone

Nelle more del perfezionamento della procedura di affidamento di cui alle premesse, il canone annuale a favore di AMIR è stabilito in €

- per i beni realizzati fino al 31/12/2006: 1.702.682,00 €/anno in coerenza con quanto previsto dalla convenzione esistente e con quanto stabilito dalla vigente normativa di regolazione tariffaria fino alla scadenza degli attuali affidamenti.

- per i beni iscritti nel libro cespiti con data successiva al 31/12/2006, realizzati attraverso i finanziamenti regolati dagli accordi quadro ed attuativi il canone è quantificato in misura pari alla somma dei relativi ammortamenti, degli oneri finanziari (OF) e dell'80% degli oneri fiscali (OFisc) così come definiti dalla metodologia tariffaria vigente (il riferimento attuale è l'MTI-2 approvato con la deliberazione AEGGSI 664/2015/r/idr).

In ogni caso, successivamente alla data di stipula della convenzione di gestione del SII che seguirà l'esperimento della procedura di l'affidamento di cui alle premesse, il canone annuale a favore di AMIR per i beni messi a disposizione del Gestore sarà così determinato:

- quota per i beni iscritti nel libro cespiti con data anteriore al 31/12/2006 e per i beni realizzati in data successiva che non sono stati realizzati attraverso i finanziamenti regolati dagli accordi quadro ed attuativi citati in premessa: pari al totale dei relativi ammortamenti iscritti a bilancio in coerenza con quanto stabilito dall'art. 153 del Dlgs.152/2006;

	- quota per i beni iscritti nel libro cespiti con data successiva al 31/12/2006 e che sono stati realizzati attraverso i finanziamenti regolati dagli accordi quadro ed attuativi citati in premessa: fino al terzo anno dalla data di stipula della convenzione di gestione del SII il canone è quantificato in misura pari alla somma dei relativi ammortamenti (Amm), degli oneri finanziari (OF) e dell'80% degli oneri fiscali (OFisc) così come definiti dal metodo di regolazione tariffaria vigente; a partire dal quarto anno dalla data di stipula della convenzione di gestione del SII il canone sarà quantificato come somma degli ammortamenti, degli oneri finanziari (OF) al netto della componente relativa al time lag di cui all'art. 17.5 del MTI-2, e 50% degli oneri fiscali (OFisc).	
	In applicazione di quanto previsto al punto precedente, il Canone da corrispondersi nel primo anno di gestione del SII aggiudicato sulla base della procedura attualmente in corso, sarà quindi calcolato pro quota in ragione dei mesi/giorni decorrenti dal momento iniziale del nuovo affidamento fino al 31 dicembre dell'anno medesimo.	
	Art. 8 Termini di pagamento del canone	
	Il canone verrà corrisposto ad AMIR direttamente dal Gestore, venendo a ciò specificatamente delegato con la convenzione di gestione del SII, in due rate semestrali di pari importo, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno di gestione.	
	Art. 9 Ammortamenti	
	AMIR provvederà all'ammortamento dei cespiti messi a disposizione del Gestore, applicando le aliquote di cui all'art. 16.2 della delibera AEEGSI 664/2015/r/idr.	

	Art. 10 Dismissioni	
	La dismissione di beni trasferiti, o di componenti di essi, verrà tempestivamente comunicata ad AMIR da ATERSIR.	
	Art. 11 Controlli	
	AMIR ha la facoltà di effettuare verifiche sia di natura materiale sia di natura contabile sullo stato dei beni oggetto della messa in disponibilità per la gestione del SII.	
	Art. 12 Restituzione dei beni	
	Alla scadenza o risoluzione della presente convenzione che, ai sensi dell'art. 2 coincide con quella della concessione al gestore, fatte salve successive proroghe, anche tacite, tutte le opere e attrezzature costituite da reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali inizialmente affidate al Gestore saranno restituite ad AMIR, in condizioni di efficienza non inferiori a quelle in cui il Gestore li aveva ricevuti, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.	
	Eventuali addizioni, trasformazioni, sostituzioni, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti da parte del Gestore sui beni di Amir durante il periodo di concessione, saranno parimenti restituite ad AMIR senza oneri di indennizzo a carico di quest'ultima; AMIR si obbliga, ora per allora, a metterli a disposizione del gestore subentrante.	
	Art. 13 Nuovi investimenti AMIR	
	AMIR si impegna, a condizione dell'avvenuto incasso del FRBT, a finanziare investimenti infrastrutturali funzionali al SII del territorio definito dai comuni soci di AMIR utilizzando risorse provenienti dal canone, nonché dagli incassi relativi al fondo di ripristino beni di terzi. I beni realizzati tramite tali investimenti sono acquisiti in proprietà dalla società patrimoniale.	

	Previo incasso del Fondo di ripristino AMIR si impegna a finanziare la rea-	
	lizzazione di opere per un importo medio annuale non inferiore a 2.000.000	
	€ per tutta la durata della presente convenzione.	
	Le parti dichiarano espressamente che la presente convenzione afferisce	
	l'utilizzo dei beni strumentali al S.I.I. di proprietà di AMIR, per cui nel caso	
	in cui quest'ultima trasferisca, in tutto o in parte, i predetti beni, verrà auto-	
	maticamente trasferita al beneficiario la presente convenzione ed in partico-	
	lare l'obbligo di finanziamento di nuove opere.	
	Art. 14 Firma digitale.	
	Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione	
	con firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme	
	collegate. Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunica-	
	zione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i con-	
	traenti.	
	Art. 15 Spese di bollo e registrazione	
	Le spese di bollo inerenti alla presente Convenzione sono a carico di AMIR	
	e la stessa sarà registrata in caso d'uso.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Per AMIR S.p.A.	Per ATERSIR
	Dott. Alessandro Rapone	Ing. Vito Belladonna
	(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)
	Allegato A: Elenco dei beni strumentali al Servizio Idrico Integrato di pro-	
	prietà di AMIR messi a disposizione del gestore individuato da ATERSIR.	

Allegato A: Elenco dei beni strumentali al Servizio Idrico Integrato di proprietà di AMIR messi a disposizione del gestore individuato da ATERSIR

Amir S.p.A. Cespiti al 31/12/2018						
CATEGORIA: FABBRICATI INDUSTRIALI VARI E DIVERSI						
CODICE	N°	DESCRIZIONE	ANNO ENTRATA IN SERVIZIO	VALORE STORICO	FONDO D'AMM.TO AL 31/12/2018	VALORE RESIDUO AL 31/12/2018
FVA	79	PIAZZALE DEPOSITO MATERIALI POLVERIERA VIA DEI MULINI	1995	10.715,55	2.062,72	8.652,83
FVA	00150	PIAZZALE DEPOSITO MATERIALI POLVERIERA VIA DEI MULINI	2002	195.656,71	0,00	195.656,71
ISFO		TOTALE FABBRICATI INDUSTRIALI VARI DIVERSI AMMORTIZZATI DAL GESTORE		206.372,26	2.062,72	204.309,54
ISFO		TOTALE FABBRICATI INDUSTRIALI VARI E DIVERSI		206.372,26	2.062,72	204.309,54
CATEGORIA: IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI						
CODICE	N°	DESCRIZIONE	ANNO ENTRATA IN SERVIZIO	VALORE STORICO	FONDO D'AMM.TO AL 31/12/2018	VALORE RESIDUO AL 31/12/2018
ISFO	300111 951000	SERBATOI impianto sollevamento Cerasolo - Via P.P. Pasolini 17x - Coriano	1995	11.860,71	11.860,71	0,00
ISFO	300111 951001	SERBATOI imp. Sott. Grotta Rossa - Via Lenta 10 - Rimini	1995	11.373,78	11.373,78	0,00
ISFO	300111 951001/1	SERBATOI imp. Sott. Grotta Rossa sp. accessorio	1995	315,89	315,89	0,00
ISFO	300111 951001/2	SERBATOI imp. Sott. Grotta Rossa	2000	12,60	12,60	0,00
ISFO	300111 951002	SERBATOI Centrale Budrio - Via Caspinello, 57x - S. Giuliana - Rimini	1995	7.124,34	7.124,34	0,00
ISFO	300111 951003	SERBATOI Centrale SA - Via Danimarca - Rimini	1995	127.284,66	127.284,66	0,00
ISFO	300111 951003/1	SERBATOI Centrale SA	2000	19,72	19,72	0,00
ISFO	300111 951003/2	Sostituzione 2° rilevatore di livello vasche su collettore aspirazione pompe ISA (materiali costo personale)	2006	1.089,09	952,12	176,97
ISFO	300111 951004	SERBATOI Centrale SB - Via dei Mulini 53 AX - Rimini	1996	25.608,43	25.608,43	0,00
ISFO	300111 951006	SERBATOI Centrale Dogana - Strada Marzocchi 2100x - Verucchio	1999	25.738,55	25.738,55	0,00
ISFO	300111 951006/1	SERBATOI Centrale Dogana	2000	236,09	236,09	0,00
ISFO	300111 951005	SERBATOI Centrale Pietravecchia - Via Cava ponte verucchio - Villa Verucchio	1995	48.827,89	48.827,89	0,00
ISFO	300111 951005/1	SERBATOI Centrale Pietravecchia	2000	451,87	451,87	0,00
ISFO		SUB TOTALE SERBATOI		259.945,51	259.768,54	176,97
ISFO	300111 951007	OPERE CIVILI impianto Cerasolo Via P.P. Pasolini 17x - Coriano	1995	7.608,54	7.608,54	0,00
ISFO	300111 951008	OPERE CIVILI Centrale Budrio Via Caspinello 57x - S. Giuliana Rimini	1995	1.439,32	1.439,32	0,00
ISFO	300111 951009	OPERE CIVILI - edifici- recinzioni - Centrale SA Via Danimarca - Rimini	1996	130.046,66	130.046,66	0,00
ISFO	300111 951009/1	OPERE CIVILI - Centrale SA	2000	20,16	20,16	0,00
ISFO	300111 951010	OPERE CIVILI - edifici- recinzioni Centrale SB Via dei Mulini 53 AX - Rimini	1996	22.377,05	22.377,05	0,00
ISFO	300111 951011	OPERE CIVILI - edifici- recinzioni Centrale Dogana Strada Marzocchi 2100x - Verucchio	1999	15.976,82	15.976,82	0,00
ISFO	300111 951011/1	opere civili - Centrale Dogana	2000	147,79	147,79	0,00
ISFO	300111 951012	OPERE CIVILI+C24 - edifici- recinzioni Centrale Pietravecchia Via Cava ponte verucchio - Villa Verucchio	1999	12.268,98	12.268,98	0,00
ISFO	300111 951012/1	OPERE CIVILI - Centrale Pietravecchia	2000	113,49	113,49	0,00
ISFO	300111 951013	OPERE CIVILI - edifici- recinzioni impianto di misura Guadico Via Guadico 605 - Verucchio	1996	2.572,28	2.572,28	0,00
ISFO	300111 951013	OPERE CIVILI - sostituzione obli in plexiglass tetto ISA	2010	643,10	366,27	276,83
ISFO		SUB TOTALE OPERE CIVILI		193.214,19	192.937,36	276,83
ISFO	300111 951014	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - Centrale Cerasolo	1995	8.798,22	8.798,22	0,00
ISFO	300111 951015	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - Centrale G. Rossa	1995	15.051,02	15.051,02	0,00
ISFO	300111 951015/1	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - Centrale G. Rossa	2000	16,70	16,70	0,00
ISFO	300111 951016	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - Centrale Budrio	1995	9.296,85	9.296,85	0,00
ISFO	300111 951017	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - Centrale SA	1996	100.643,01	100.643,01	0,00
ISFO	300111 951017/1	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - Centrale SA	2000	16,01	16,01	0,00
ISFO	300111 951017/2	Sostituzione Pompa flussaggio sollevamento ISA (materiali costo personale)	2006	48,93	40,99	7,94
ISFO	300111 951018	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - Centrale SB	1996	28.837,29	28.837,29	0,00
ISFO	300111 951019	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Centrale Dogana	1999	17.756,26	17.756,26	0,00
ISFO	300111 951019/1	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Centrale Dogana	2000	175,12	175,12	0,00
ISFO	300111 951020	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Centrale Pietravecchia	2000	6.186,00	6.186,00	0,00
ISFO	300111 951020/1	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Centrale Pietravecchia	1995	54,74	54,74	0,00
ISFO	300111 071020	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - Centrale Cerasolo	2007	15.417,68	11.870,84	3.538,04
ISFO		SOSTITUZIONE POMPA AGGIUSTAMENTO - Centrale ISA	2008	324,52	226,28	98,24
ISFO		SOSTITUZIONE GIRANTE POMPA ABS AFFIN50 sott. ISB	2009	3.961,30	2.457,75	1.493,55
ISFO		SOSTITUZIONE DI N.2 VALVOLE DI RITEGNO A PALLA DN200	2009	1.233,80	785,27	448,53
ISFO		SOSTITUZIONE POMPA SOMMERSA FLYGT 3193 135KW	2009	5.159,60	3.294,06	1.875,54
ISFO		LAVORI DI COLLEGAMENTO CONDOTTA DI MANDATA SOLLEVAMENTO SA ALLA TUBAZIONE DI SPIRAZIONE DEL SOLLEVAMENTO ISA	2011	19.400,00	9.748,50	9.651,50
ISFO		SOSTITUZIONE POMPA SOMMERSA ABS MF404	2011	493,87	245,88	247,99
ISFO		SOSTITUZIONE DI UNA GIRANTE ABS POMPA AFFIN50-330 AL SOLLEVAMENTO ISB	2011	7.993,65	4.016,78	3.976,87
ISFO		SOSTITUZIONE POMPA FLUSSAGGIO GRUNDFOSS AL SOLLEVAMENTO ISA	2011	229,33	115,28	114,05
ISFO		IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO CERASOLO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2014 COME DA RIEPILOGO DONATI	2014	645,90	194,49	450,51
ISFO		IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DOGANA- MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2014 COME DA RIEPILOGO DONATI	2014	4.565,66	1.393,80	3.205,86
ISFO		IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO GROTTA ROSSA- MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2014 COME DA RIEPILOGO DONATI	2014	1.389,77	412,97	966,80
ISFO		IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2014 COME DA RIEPILOGO DONATI	2014	8.969,89	3.011,94	6.977,85
ISFO		SUB TOTALE IMPIANTI SOLLEVAMENTO		260.595,73	227.651,76	32.943,97
ISFO	300111 951021	QUADRI TRASFORMATORI Centrale Cerasolo	1995	5.000,46	5.000,46	0,00
ISFO	300111 951022	QUADRI TRASFORMATORI ecc Centrale SA	1996	20.822,73	20.822,73	0,00
ISFO	300111 951022/1	QUADRI TRASFORMATORI ecc Centrale SA	2000	4,00	4,00	0,00
ISFO	300111 071021	Centrale SA - Sostituzione del Trasformatore Servizi Ausiliari MT/BT 15000/400V	2007	10.311,27	8.290,32	2.020,95
ISFO	300111 951023	QUADRI TRASFORMATORI ecc Centrale SB	1996	9.725,44	9.725,44	0,00
ISFO	300111 951024	QUADRI TRASFORMATORI ecc Centrale Dogana	1999	6.671,19	6.671,19	0,00
ISFO	300111 951024/1	QUADRI TRASFORMATORI ecc Centrale Dogana	2000	61,71	61,71	0,00
ISFO		SUB TOTALE QUADRI TRASFORMATORI		52.597,80	50.576,85	2.020,95
ISFO	300111 951025	QUADRI ELETTRICI - IMPIANTI MESSA A TERRA ecc Centrale Cerasolo	1995	4.444,85	4.444,85	0,00
ISFO	300111 951026	QUADRI ELETTRICI - IMPIANTI MESSA A TERRA ecc Centrale Grotta Rossa	1995	3.811,46	3.811,46	0,00
ISFO	300111 951026/1	QUADRI ELETTRICI - IMPIANTI MESSA A TERRA ecc Centrale Grotta Rossa	2000	4,14	4,14	0,00
ISFO	300111 951027	QUADRI ELETTRICI - IMPIANTI MESSA A TERRA ecc Centrale Budrio	1995	1.531,99	1.531,99	0,00
ISFO	300111 951028	QUADRI ELETTRICI - IMPIANTI MESSA A TERRA ecc - Centrale SA	1996	92.906,90	92.906,90	0,00
ISFO	300111 951028/1	QUADRI ELETTRICI - IMPIANTI MESSA A TERRA ecc - Centrale SA	2000	14,53	14,53	0,00
ISFO	300111 951029	QUADRI ELETTRICI - IMPIANTI MESSA A TERRA ecc - Centrale SB	1996	29.904,99	29.904,99	0,00
ISFO	300111 951030	QUADRI ELETTRICI - IMPIANTI MESSA A TERRA ecc - Centrale Dogana	1999	6.182,18	6.182,18	0,00
ISFO	300111 951030/1	QUADRI ELETTRICI - IMPIANTI MESSA A TERRA ecc - Centrale Dogana	2000	64,59	64,59	0,00
ISFO	300111 951031	QUADRI ELETTRICI - IMPIANTI MESSA A TERRA ecc - Centrale Pietravecchia	2000	7.176,81	7.176,81	0,00
ISFO	300111 951031/1	QUADRI ELETTRICI - IMPIANTI MESSA A TERRA ecc - Centrale Pietravecchia	1996	68,24	68,24	0,00
ISFO		Centrale Cerasolo - Verifiche, rilievi e misure necessarie per l'adeguamento delle cabine MT alla Norma Enel DK 5600.	2007	213,94	164,80	49,14
ISFO		Centrale Dogana Verifiche, rilievi e misure necessarie per l'adeguamento delle cabine MT alla Norma Enel DK 5600	2007	490,86	376,23	112,63
ISFO		Centrale Dogana Sostituzione lampade d'emergenza sala quadri	2007	241,94	195,41	55,53
ISFO		Centrale Dogana Sostituzione gruppo di continuità UPS	2007	211,75	163,18	48,57
ISFO		Centrale Dogana Sostituzione sonda di livello vasca	2007	402,28	313,84	88,44
ISFO		Centrale ISA - Verifiche, rilievi e misure necessarie per l'adeguamento delle cabine MT alla Norma Enel DK 5600.	2007	782,73	603,09	179,67
ISFO		Centrale ISA - Sostituzione lampade d'emergenza sala quadri e pianiera corridoio esterno	2007	624,70	481,28	143,42
ISFO		Centrale ISA - Sostituzione fondo piezometrica e visualizzazione livello tomio	2007	1.447,13	1.115,04	332,09
ISFO		Centrale ISB - Verifiche, rilievi e misure necessarie per l'adeguamento delle cabine MT alla Norma Enel DK 5600.	2007	252,61	194,58	57,93
ISFO		Centrale ISB - sostituzione sonda o indicatori di livello	2007	838,43	491,86	346,57
ISFO		Centrale Pietravecchia - sostituzione aspiratore vano quadri	2007	310,37	239,09	71,28
ISFO		Centrale ISA - lavori adeguamento normativo DK5600	2008	10.803,68	7.600,43	3.203,25
ISFO		SUB TOTALE QUADRI ELETTRICI BT/MT		162.216,66	157.722,48	4.493,52
ISFO		IMPIANTI DI FILTRAZIONE centrale Budrio	1995	743,04	743,04	0,00
ISFO		SUB TOTALE IMPIANTI FILTRAZIONE		743,04	743,04	0,00
ISFO		STRUMENTAZIONE PER MISURAZIONI - Centrale Cerasolo	1995	541,33	541,33	0,00
ISFO		STRUMENTAZIONE PER MISURAZIONI - Centrale Cerasolo	2002	2.172,45	2.172,45	0,00
ISFO		STRUMENTAZIONE PER MISURAZIONI - Centrale Rovereta - Strada Rovereta - R.S.M.	1995	203,72	203,72	0,00

ISFO		STRUMENTAZIONE PER MISURAZIONI - Centrale Revereta	1997	2.555,79	2.555,79	0,00
ISFO		STRUMENTAZIONE PER MISURAZIONI - Centrale Dogana	1996	571,81	571,81	0,00
ISFO		STRUMENTAZIONE PER MISURAZIONI - Centrale Dogana	2000	5,29	5,29	0,00
ISFO		STRUMENTAZIONE PER MISURAZIONI - Centrale Pietrazzocca	1996	572,85	572,85	0,00
ISFO		STRUMENTAZIONE PER MISURAZIONI - Centrale Pietrazzocca	2000	5,30	5,30	0,00
ISFO		STRUMENTAZIONE PER MISURAZIONI - Montebello	2002	2.504,31	2.504,31	0,00
ISFO		STRUMENTAZIONE PER MISURAZIONI - Impianto di misurazione Guadiciolo - Via Guadiciolo 905 - Verucchio	1995	804,75	804,75	0,00
ISFO		SOSTITUZIONE MISURATORE DI PORTATA - Guadiciolo	2008	1.733,50	1.210,47	514,03
ISFO		INSTALLAZIONE MISURATORE DI PORTATA - fornitura e installazione	2012	27.422,92	11.942,71	15.480,21
ISFO		SUB TOTALE STRUMENTI DI MISURA		39.134,04	23.189,80	15.994,24
ISFO	300111 95103	SISTEMA DI TRASMISSIONE - Centrale di Cerasolo	1995	1.115,80	1.115,80	0,00
ISFO	300111 951040	SISTEMA DI TRASMISSIONE - Centrale Grotta Rossa	1995	762,88	762,88	0,00
ISFO	300111 951040/1	SISTEMA DI TRASMISSIONE - Centrale Grotta Rossa	200	1,26	1,26	0,00
ISFO	300111 951041	SISTEMA DI TRASMISSIONE - Centrale SA	1996	6.078,37	6.078,37	0,00
ISFO	300111 951041/1	SISTEMA DI TRASMISSIONE - Centrale SA	2000	1,00	1,00	0,00
ISFO	300111 951042	SISTEMA DI TRASMISSIONE - Centrale SB	1998	1.371,15	1.371,15	0,00
ISFO	300111 951043	SISTEMA DI TRASMISSIONE - Centrale Dogana	1996	2.246,87	2.246,87	0,00
ISFO	300111 951043/1	SISTEMA DI TRASMISSIONE - Centrale Dogana	1996	24,48	24,48	0,00
ISFO	300111 951044	SISTEMA DI TRASMISSIONE - Centrale Pietrazzocca		2.250,36	2.250,36	0,00
ISFO	300111 951044/1	SISTEMA DI TRASMISSIONE - Centrale Pietrazzocca	1995	24,52	24,52	0,00
ISFO		Sostituzione UPS sollevamento ISA (materiali costo personale)	2005	2.725,00	2.285,00	440,00
ISFO		Integrazione al PLC esistente con dispositivo comando pompe con Rls 452 e sonda Fimx 157 Sollevamento ISC (materiali costo personale)	2006	2.362,35	1.995,25	367,10
ISFO		Sostituzione dispositivi Radio/alimentazione telecomando sollevamento ISB (materiali costo personale)	2006	1.265,91	1.060,75	205,16
ISFO		SOLL. CERASOLO - Sostituzione dispositivi comunicazione radio telecomando (per l'adeguamento normativo ai sensi del DLG 349 del 12/06/1998) e riprogrammazione apparati radio.	2007	432,91	333,59	99,41
ISFO		SOLL. DOGANA - Sostituzione dispositivi comunicazione radio telecomando (per l'adeguamento normativo ai sensi del DLG 349 del 12/06/1998) e riprogrammazione apparati radio.	2007	415,41	322,35	93,06
ISFO		SOLL. GROTTA ROSSA - Sostituzione dispositivi comunicazione radio telecomando (per l'adeguamento normativo ai sensi del DLG 349 del 12/06/1998) e riprogrammazione apparati radio.	2007	415,41	322,35	93,06
ISFO		SOLL. ISA - Sostituzione dispositivi comunicazione radio telecomando (per l'adeguamento normativo ai sensi del DLG 349 del 12/06/1998) e riprogrammazione apparati radio.	2007	415,41	322,35	93,06
ISFO		SOLL. ISB - Sostituzione dispositivi comunicazione radio telecomando (per l'adeguamento normativo ai sensi del DLG 349 del 12/06/1998) e riprogrammazione apparati radio.	2007	415,41	322,35	93,06
ISFO		SOLL. PIETRAZZOCCA - Sostituzione dispositivi comunicazione radio telecomando (per l'adeguamento normativo ai sensi del DLG 349 del 12/06/1998) e riprogrammazione apparati radio.	2007	485,98	374,44	111,54
ISFO		SOLL. DOGANA - Sostituzione di n.2 duplicatori segnale a separazione galvanica	2008	495,35	346,50	148,85
ISFO		SOLL. ISB - Sostituzione periferia Telecomando	2009	5.905,60	3.759,53	2.147,07
ISFO		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COME DA FOGLIO RIEPILOGO AMIR IMPIANTO SOLL. CERASOLO	2013	3.567,24	1.514,58	2.052,66
ISFO		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COME DA FOGLIO RIEPILOGO AMIR IMPIANTO SOLL. ISA	2013	18.523,77	6.089,00	10.434,77
ISFO		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COME DA FOGLIO RIEPILOGO AMIR IMPIANTO SOLL. ISB	2013	5.649,67	2.081,92	3.567,75
ISFO		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COME DA FOGLIO RIEPILOGO AMIR IMPIANTO SOLL. DOGANA	2013	658,75	242,77	415,98
ISFO		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COME DA FOGLIO RIEPILOGO AMIR IMPIANTO SOLL. GROTTA ROSSA	2013	90,05	33,17	56,88
ISFO		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COME DA FOGLIO RIEPILOGO AMIR IMPIANTO SOLL. ISC	2013	8.213,90	3.026,82	5.187,08
ISFO		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COME DA FOGLIO RIEPILOGO AMIR IMPIANTO SOLL. PIETRAZZOCCA	2013	5.755,92	2.121,41	3.635,51
ISFO		SUB TOTALE SISTEMI DI TRASMISSIONE		69.797,49	46.231,77	29.475,72
ISFO		TOTALE SOLLEVAMENTI FOGNARI AMMORTIZZATI DA AMIR S.P.A.		1.036.203,66	952.821,66	85.382,00
ISFO	00010	OPERE EDILI SOLLEV. FOGNARI COSTRUITI IN VIA CAVICCIANO GEMMANO	2000	45.647,87	1.597,64	44.049,43
ISFO	00020	OPERE EDILI SOLLEVAMENTO FOGNARI COSTRUITI IN VIA LIBRA RIMINI	2000	9.349,93	334,24	9.015,69
ISFO	00030	OPERE EDILI SOLLEV. FOGNARIO COSTRUITO IN VIA S.AQUILINA RIMINI	2001	34.365,14	601,39	33.763,75
ISFO	00040	OPERE EDILI SOLLEV. FOGNARIO COSTRUITO VIA DEGLI ULIVI S.CLEMENTE	2001	41.457,24	725,50	40.731,74
ISFO	00050	SOLLEVAMENTO FOGNARIO COSTRUITO VIA DEGLI ULIVI S.CLEMENTE	2000	328,72	0,00	328,72
ISFO	00010	SOLLEVAMENTO FOGNARI COSTRUITI IN VIA CAVICCIANO GEMMANO	2000	19.096,07	804,89	18.291,27
ISFO	00020	SOLLEVAMENTO FOGNARI COSTRUITI IN VIA LIBRA - RIMINI	2000	2.495,89	124,83	2.371,06
ISFO	00030	SOLLEVAMENTO FOGNARIO COSTRUITO IN ZONA S.AQUILINA	2001	34.192,83	1.709,64	32.483,19
ISFO	00040	SOLLEVAMENTO FOGNARIO COSTRUITO IN VIA DEGLI ULIVI S.CLEMENTE	2001	16.616,58	830,83	15.785,75
ISFO		TOTALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI AMMORTIZZATI DAL GESTORE		203.748,27	6.878,87	196.869,40
ISFO		TOTALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI		1.241.952,07	959.700,47	282.251,60
CATEGORIA: IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE						
CODICE	N°	DESCRIZIONE	ANNO ENTRATA IN SERVIZIO	VALORE STORICO	FONDO D'AMM.TO AL 31/12/2016	VALORE RESIDUO AL 31/12/2016
IMDE		condutture e piping impianto S. Giustina - Via Fiumicino 19 - S.Giustina RN	1998	670.208,08	670.208,08	0,00
IMDE		condutture e piping impianto S. Giustina	1997	17.331,61	17.331,61	0,00
IMDE		condutture e piping impianto S. Giustina	2000	2.677,25	2.677,25	0,00
IMDE		condutture e piping impianto S. Giustina - fognature	2004	8.410,51	8.704,74	793,77
IMDE		sostituzione parte collettore - valvole di ritegno e guide pompe su sollevamento	2007	3.175,72	2.741,89	437,12
IMDE		Sostituzione piedi d'accoppiamento e tratto tubazioni mandata su pompe sollevamento fanghi chimici terziario	2007	2.884,08	2.487,56	396,52
IMDE		Sostituzione pompa dosatrice cloro fimo impianto S.Giustina	2008	5.424,00	4.271,49	1.152,60
IMDE		Sostituzione valvole Clapet su compressori aria deposito S.Giustina LA	2009	929,00	661,96	267,04
IMDE		Sostituzione valvole valve Clapet su compressori aria deposito S.Giustina LA	2009	271,50	193,42	78,08
IMDE		Sostituzione pompa dosatrice a fimo deposito S.Giustina LA	2009	5.165,00	3.680,11	1.484,89
IMDE		Sostituzione pompa dosatrice clorato fimo deposito S.Giustina LA	2009	5.465,00	3.893,86	1.571,14
IMDE		Sostituzione di n.2 valvole a farfalla DN100 su tubi biogas deposito S.Giustina LF	2009	335,00	239,12	95,88
IMDE		Sostituzione di pompa dosatrice rbb 50 a 70 dosaggio polietilene	2010	675,00	432,23	242,77
IMDE		Sostituzione di pompa dosatrice ORL XL 25.50 pp123 per pozzetto	2010	1.670,00	1.064,65	605,37
IMDE		Sostituzione elettropompa sommergibile con girante vortex	2010	388,45	247,69	140,80
IMDE		Sostituzione pompa F271T3V4 per cloro residuo	2010	405,85	315,95	179,70
IMDE		Sostituzione agitatore sommerso alla OX 4	2010	1.348,56	858,42	489,13
IMDE		Sostituzione pompa aggrottamento disidratazione	2010	240,60	157,25	89,35
IMDE		Sostituzione di un motore elettrico pompe	2010	963,00	633,68	329,32
IMDE		Sostituzione pompa dosatrice a 4 mandate per comp. Rotativo	2010	801,00	510,88	290,12
IMDE		Sostituzione 2 pompe per fanghi supero	2010	4.885,20	3.114,32	1.770,88
IMDE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE COMPONENTI COMPRESSORI HV TURBO	2011	2.860,85	1.800,13	1.060,72
IMDE		SOSTITUZIONE 2 AGITATORI SOMMERSI PER OX2 E DENITRO DEPURATORE S.GIUSTINA	2011	3.795,54	2.132,18	1.663,36
IMDE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE PLC COMPLETO AI COMPRESSORI HV TURBO	2011	3.032,30	1.705,65	1.326,65
IMDE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COME DA FOGLIO RIEPILOGO AMIR CODICE MACROIMPIANTO N.1	2013	55.946,15	23.036,53	32.909,62
IMDE		PIPING DA MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2014 COME DA RIEPILOGO DONATI	2014	12.455,50	4.203,72	8.251,78
IMDE		SUB TOTALE PIPING		812.859,99	757.202,18	55.657,81
IMDE		SERBATOI impianto S. Giustina	1996	747.754,12	747.754,12	0,00
IMDE		SERBATOI impianto S. Giustina	1997	3.271,77	3.271,77	0,00
IMDE		SERBATOI impianto S. Giustina	2000	355.374,14	355.374,14	0,00
IMDE		SERBATOI impianto S. Giustina - Attività di bonifica e rimozione cisterna interrata gasolio	2005	23.375,00	18.405,60	4.967,40
IMDE		SERBATOI sostituzione motore sedimentatore	2009	204,00	145,35	58,65
IMDE		SERBATOI sostituzione motore preispesatore deposito S. Giustina LA	2009	279,65	199,31	80,37
IMDE		SERBATOI FPO controllo tenuta biogas su caldaia biogas	2009	763,00	567,94	195,06
IMDE		SERBATOI ricondizione e sostituzione albero ruota preispesatori deposito S.Giustina LA	2009	593,00	422,56	170,44
IMDE		SERBATOI sostituzione 2 pompe estrazione schiuma secondari deposito S.Giustina LA	2009	4.512,00	3.214,80	1.297,20
IMDE		SERBATOI sostituzione agitatore vasca Denitro deposito S.Giustina LA	2009	2.364,70	1.654,63	679,67
IMDE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COME DA FOGLIO RIEPILOGO AMIR CODICE MACROIMPIANTO N.2	2013	4.471,22	1.844,37	2.626,85
IMDE		SERBATOI DA MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2014 COME DA RIEPILOGO DONATI	2014	5.931,95	2.002,05	3.929,90
IMDE		SUB TOTALE SERBATOI		1.148.918,58	1.134.879,84	14.038,74
IMDE		COPERTURA DEI PREISPES. IMPIANTO S. GIUSTINA VIA FIUMICINO, 19	1996	76.669,90	76.669,90	0,00
IMDE		COPERTURA DEI PREISPES. IMPIANTO S. GIUSTINA spese accessorie	2000	592,21	592,21	0,00
IMDE		SUB TOTALE COPERTURA DEI PREISPES.		77.262,11	77.262,11	0,00
IMDE		CAMPANE GASOMETRICHE IMPIANTO DEP.NE S. GIUSTINA VIA FIUMICINO	1998	85.527,27	85.527,27	0,00
IMDE		CAMPANE GASOMETRICHE IMPIANTO DEP.NE S. GIUSTINA spese accessorie	2000	600,48	600,48	0,00

IMDE		RIFACIMENTO GASOMETRO n.2 IMPIANTO DEP.NE S. GIUSTINA	2003	89.800,77	89.800,77	0,00
IMDE		RIFACIMENTO GASOMETRO n.1 IMPIANTO DEP.NE S. GIUSTINA	2004	82.447,41	82.447,41	0,00
IMDE		SOSTITUZIONE DI 3 VALVOLE DN100 PER COMPRESSORE BIOGAS	2010	863,80	843,83	309,47
IMDE		SOSTITUZIONE STRUMENTO REGOLATORE PER CALDAIA BIOGAS	2010	260,25	165,92	94,35
IMDE		SOSTITUZIONE DI 3 TRASMETTITORI GAS INFIAMMABILI PER BIOGAS	2010	1.140,00	726,75	413,25
IMDE		ADEGUAMENTI E MESSA A NORMA GASOMETRIE SEDIMENTATORI	2012	26.989,15	13.157,24	13.831,91
IMDE		SUB TOTALE GASOMETRI		267.678,31	253.029,85	14.648,46
IMDE		OPERE CIVILI - edifici - visibilità interna - recinzione impianto S.Giustina Via Fiumicino 19 - S.Giustina RN	1996	1.979.114,46	1.978.114,46	0,00
IMDE		OPERE CIVILI - edifici - impianto S.Giustina	1997	2.646,73	2.646,73	0,00
IMDE		OPERE CIVILI - edifici - impianto S.Giustina	2000	15.283,10	15.283,10	0,00
IMDE		OPERE CIVILI - lavori integrativi per prevenzione incendi S. Giustina	2004	42.298,32	42.298,32	0,00
IMDE		OPERE CIVILI - attività progettuali per adeguamenti edili CPI	2008	1.315,03	1.035,62	279,41
IMDE		OPERE CIVILI - adeguamenti interventi per CPI (lavori edili)	2008	17.998,40	13.826,87	3.730,73
IMDE		OPERE CIVILI - rifacimento completa piazzale deposito temporaneo rifiuti deposito S.Giustina	2009	18.493,86	13.176,96	5.316,90
IMDE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COME DA FOGLIO RIEPILOGO AMR CODICE MACROIMPIANTO N. 5	2013	144,25	50,51	84,74
IMDE		SUB TOTALE OPERE CIVILI		2.076.052,25	2.067.446,39	9.411,86
IMDE		IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - impianto S.Giustina	1996	209.124,65	209.124,65	0,00
IMDE		IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - impianto S.Giustina	2000	1.645,15	1.645,15	0,00
IMDE		IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - impianto S.Giustina	2002	804,50	804,50	0,00
IMDE		IMPIANTI ANTINCENDIO - impianto S.Giustina	2004	27.875,55	27.875,55	0,00
IMDE		assistenza a verifiche imp.5 elettrici necessari alla compilazione di elaborati per l'ottenimento dei CPI	2007	1.031,67	899,87	141,80
IMDE		assistenza per lo smaltimento della cisterna interrata del gasolio del gruppo elettrogeno diesel - adeguamenti per l'ottenimento dei CPI	2007	383,83	331,08	52,75
IMDE		installazione pompe aggotamento rilancio da foggiatura bianca a quella nera - zona reagenti impianto S.Giustina	2007	5.080,23	4.360,35	689,66
IMDE		sostituzione pompa aggotamento pozzetto uscita palasport	2007	1.105,63	954,60	152,43
IMDE		sostituzione pompa aggotamento vasca ipodrito impianto S.Giustina e sostituzione - valvola ritegno sollevamento drenaggi	2008	1.275,34	1.004,33	271,01
IMDE		sostituzione diffusori pozzetti in lamiera inox bugnata e lavorata compresa posa in opera - impianto S.Giustina	2008	376,19	266,21	79,98
IMDE		elettropompa per aggotamento vasca deposito S.Giustina	2008	248,22	196,25	52,97
IMDE		sostituzione pompa per aggotamento cunicolo deposito S.Giustina LA	2009	215,60	164,38	62,22
IMDE		sostituzione pompa per aggotamento pozzetto post-servizi deposito S.Giustina LF	2009	352,50	291,18	101,32
IMDE		sostituzione pompa aggotamento cunicolo zona reagenti deposito S.Giustina LA	2009	245,80	175,75	79,85
IMDE		SOSTITUZIONE 2 POMPE AGGOTTAMENTO MINVOTING DISIDRATAZIONE	2011	387,96	218,25	169,71
IMDE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COME DA FOGLIO RIEPILOGO AMR CODICE MACROIMPIANTO N. 6	2013	17.885,89	7.377,87	10.507,82
IMDE		SUB TOTALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		268.072,31	255.709,87	12.362,44
IMDE		QUADRI TRASFORMATORI - APPARECCHI DI INGRESSO ENEL ECC Impianto S.Giustina	1996	56.999,09	56.999,09	0,00
IMDE		QUADRI TRASFORMATORI - APPARECCHI DI INGRESSO ENEL ECC Impianto S.Giustina	2000	440,16	440,16	0,00
IMDE		QUADRI TRASFORMATORI - APPARECCHI DI INGRESSO ENEL ECC Impianto S.Giustina	2002	5.576,29	5.576,29	0,00
IMDE		SUB TOTALE SOTTOSTAZIONI DI TRASFORMAZIONE		63.017,54	63.017,54	0,00
IMDE		QUADRI ELETTRICI - IMPIANTI MESSA A TERRA - ecc. - impianto S.Giustina	1996	542.532,94	542.532,94	0,00
IMDE		QUADRI ELETTRICI - IMPIANTI MESSA A TERRA - ecc. - impianto S.Giustina	2000	4.191,48	4.191,48	0,00
IMDE		QUADRI ELETTRICI - IMPIANTI MESSA A TERRA - ecc. - impianto S.Giustina	2002	13.907,80	13.907,80	0,00
IMDE		Verifiche, rilievi e misure necessarie per l'adeguamento delle cabine MT alla Norma ENel DK 5600.	2007	3.826,37	3.300,27	526,10
IMDE		Sostituzione attuatore valvola try-pass aria forzione	2009	1.493,90	1.054,50	425,50
IMDE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COME DA FOGLIO RIEPILOGO AMR CODICE MACROIMPIANTO N. 8	2013	3.116,03	1.285,35	1.830,68
IMDE		SUB TOTALE RETI DISTRIBUZIONE S.T.		568.054,62	566.272,34	2.782,28
IMDE		STRUMENTAZIONE PER MISURAZIONI - Impianto S.Giustina	1996	157.821,62	157.821,62	0,00
IMDE		STRUMENTAZIONE PER MISURAZIONI - Impianto S.Giustina	1997	875,01	875,01	0,00
IMDE		STRUMENTAZIONE PER MISURAZIONI - Impianto S. Giustina	2000	400,93	400,93	0,00
IMDE		STRUMENTAZIONE PER MISURAZIONI - Impianto S. Giustina	2002	3.285,52	3.285,52	0,00
IMDE		Sonda Misura Ossigeno Dep. SG (materiali costo personale)	2006	2,60	2,39	0,21
IMDE		IMP. S. GIUSTINA Misuratori di portata reagenti ipodrito e Cisterna Fénico	2007	5.976,32	5.154,53	821,79
IMDE		sostituzione sonde ossigeno su vasca ossidazione	2007	2.079,00	1.793,19	285,81
IMDE		sostituzione sonde strumenti misura livello filtri 1-2-3-4- terziario	2007	3.305,00	3.370,65	637,35
IMDE		sostituzione sonde ricircolo fanghi su vasca ossidazione	2007	130,35	112,46	17,89
IMDE		sostituzione sonda livello pozzetto schiume sedimentari secondari	2007	451,43	369,39	82,04
IMDE		sostituzione sonda misura Dp filtri 3-4 terziario	2007	889,57	767,28	122,29
IMDE		sostituzione sensore analizzatore cloro residuo impianto S.Giustina	2008	1.150,80	906,26	244,54
IMDE		sostituzione centralina e sensore unità acidificazione impianto S.Giustina	2008	2.044,20	1.609,86	434,34
IMDE		sostituzione sonde ossigeno deposito S.Giustina LA	2009	1.155,56	855,96	344,60
IMDE		sostituzione misuratore di portata soll. Fanghi chimici deposito S.Giustina LF	2009	3.306,21	2.419,84	976,37
IMDE		sostituzione misuratore di portata incoala fanghi deposito S.Giustina LF	2009	2.062,50	1.483,81	588,69
IMDE		sostituzione misuratore di pressione biogas deposito S.Giustina LF	2009	1.047,95	746,70	301,25
IMDE		sostituzione pompa ricircolo misura ipodrito terziario deposito S.Giustina LA	2009	246,80	175,75	79,65
IMDE		sostituzione misuratore di livello soll. fanghi deposito S.Giustina LF	2009	1.164,40	829,64	334,76
IMDE		SOSTITUZIONE TERMOCOPIA E VALVOLA CALDAIE FANGHI DEPURATORE S. GIUSTINA	2011	1.787,46	1.005,45	782,01
IMDE		SOSTITUZIONE TRASMETTITORE FMU90 PER LIVELLO SILOS FANGHI S. GIUSTINA	2011	1.009,88	566,05	441,81
IMDE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COME DA FOGLIO RIEPILOGO AMR CODICE MACROIMPIANTO N. 9	2013	10.769,33	4.454,73	6.344,60
IMDE		SUB TOTALE STRUMENTAZIONE PER MISURAZIONI		201.729,22	169.008,02	12.721,20
IMDE		SISTEMA DI TRASMISSIONE - Impianto S.Giustina	1999	119.968,29	119.968,29	0,00
IMDE		SISTEMA DI TRASMISSIONE - Impianto S.Giustina	2000	926,65	926,65	0,00
IMDE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COME DA FOGLIO RIEPILOGO AMR CODICE MACROIMPIANTO N. 10	2013	2.361,23	974,00	1.387,23
IMDE		SUB TOTALE SISTEMA DI TRASMISSIONE		123.267,18	121.899,95	1.367,23
IMDE		CENTRALINO TELEFONICO E IMPIANTO DEPURAZIONE S. GIUSTINA VIA FUMICINO 19	1996	5.185,21	5.185,21	0,00
IMDE		CENTRALINO TELEFONICO E IMPIANTO DEPURAZIONE S. GIUSTINA	2000	40,05	40,05	0,00
IMDE		SUB TOTALE CENTRALINO TELEFONICO		5.226,26	5.226,26	0,00
IMDE		IMPIANTI DI FILTRAZIONE - Impianto S.Giustina	1996	1.091.894,15	1.091.894,15	0,00
IMDE		IMPIANTI DI FILTRAZIONE - Impianto S.Giustina	1997	721,55	721,55	0,00
IMDE		IMPIANTI DI FILTRAZIONE - Impianto S.Giustina	1998	2.599,35	2.599,35	0,00
IMDE		IMPIANTI DI FILTRAZIONE - Impianto S. Giustina	1999	917,77	917,77	0,00
IMDE		IMPIANTI DI FILTRAZIONE - Impianto S.Giustina	2000	6.338,91	6.338,91	0,00
IMDE		IMPIANTI DI FILTRAZIONE - Impianto S.Giustina	2002	68.110,66	68.110,66	0,00
IMDE		IMPIANTI DI FILTRAZIONE - Impianto S.Giustina	2003	18.690,89	18.690,89	0,00
IMDE		Posa in opera nuovo mixer su vasca di controllo trattamento terziario Dep. SG (installato da Flygt) (materiali costo personale)	2006	2.852,34	2.867,15	285,19
IMDE		Sostituzione pompa dosatrice ipodrito trattamento terziario SG	2007	4.295,31	3.704,72	590,59
IMDE		Sostituzione completa dei diffusori aria sulle vasche d'ossidazione n.1 e n.4 Dep. SG	2007	24.085,86	20.774,87	3.311,99
IMDE		Sostituzione nubi di pressatura su macchine disidratanti	2007	3.245,01	2.801,40	446,61
IMDE		Sostituzione Pompa vuoto impianto Bottini	2007	1.105,63	963,58	162,05
IMDE		Sostituzione mixer vasca ossidazione e sostituzione pompa calceda lavaggio griglia Bottini	2008	3.744,00	2.946,40	795,60
IMDE		Sostituzione motore pompa impianto Bottini	2009	350,90	249,39	109,62
IMDE		Sostituzione pompa aggotamento cunicolo terziario	2010	240,80	193,43	87,17
IMDE		SOSTITUZIONE FILTRO AUTOPULENTE DELL'IMPIANTO TRATTAMENTO BOTTINI	2011	7.162,30	4.028,78	3.133,52
IMDE		SOSTITUZIONE CELLA DI CARICO PESA PONTE IMPIANTO BOTTINI	2011	1.467,12	836,46	630,64
IMDE		SOSTITUZIONE AGITATORE SOMMERSO GMD800101 A 0X1 DEPURATORE S. GIUSTINA	2011	1.421,38	799,50	621,88
IMDE		F.P.O. PLC SCHNEIDER AL QUADRO GRIGLIA INGRESSO DEPURATORE S. GIUSTINA	2011	2.332,63	1.312,13	1.020,50
IMDE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COME DA FOGLIO RIEPILOGO AMR CODICE MACROIMPIANTO N. 12	2013	19.864,97	4.407,21	6.276,96
IMDE		FILTRAZIONE E APPARECCHIATURE DA MANUTENZIONI STRAORDINARIE COME DA RIEPILOGO DONATI	2014	11.118,05	3.752,33	7.365,72
IMDE		FILTRAZIONE E APPARECCHIATURE DA MANUTENZIONI STRAORDINARIE COME DA RIEPILOGO DONATI (NUOVE ACQUISIZIONI)	2014	15.365,91	5.183,69	10.183,62
IMDE		SUB TOTALE IMPIANTI DI FILTRAZIONE		1.276.498,49	1.241.465,73	35.032,76
IMDE		IMPIANTI DI COGENERAZIONE e gruppi elettrogeni Impianto S.Giustina	1996	436.896,16	436.896,16	0,00
IMDE		IMPIANTI DI COGENERAZIONE e gruppi elettrogeni Impianto S.Giustina	2000	6.425,63	6.425,63	0,00
IMDE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COME DA FOGLIO RIEPILOGO AMR CODICE MACROIMPIANTO N. 13	2013	11.341,50	4.678,36	6.663,14
IMDE		SUB TOTALE IMPIANTI DI COGENERAZIONE		454.667,31	448.804,17	6.663,14
IMDE		IMPIANTI DI COMPRESSIONE E FILTRAZIONE GAS - CENTRALE TERMICA - APPARECCHIATURE DIGESTORE				
IMDE		ANAEROBICO - IM.TO S. GIUSTINA VIA FUMICINO 19	1996	224.049,75	224.049,75	0,00
IMDE		IMPIANTI DI COMPRESSIONE E FILTRAZIONE GAS - CENTRALE TERMICA - APPARECCHIATURE DIGESTORE				
IMDE		ANAEROBICO - IM.TO S. GIUSTINA VIA FUMICINO 19	2000	1.730,16	1.730,16	0,00
IMDE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COME DA FOGLIO RIEPILOGO AMR CODICE MACROIMPIANTO N. 14	2013	3.331,16	1.334,12	1.987,04
IMDE		TOTALE IMPIANTI DI COMPR. E FILTRAZ. GAS		229.111,07	227.154,03	1.957,04
IMDE		PESA IMPIANTO S. GIUSTINA VIA FUMICINO, 19	1997	6.463,55	6.463,55	0,00
IMDE		SUB TOTALE IMPIANTI PESA		6.463,55	6.463,55	0,00
IMDE		RADDOPPIO LINEA ACQUE - 1° STRALCIO	2008	767.379,37	620.681,23	187.318,14
IMDE		SUB TOTALE IMPIANTI RADDOPPIO LINEA ACQUE		767.379,37	620.681,23	167.318,14
IMDE		ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DENITRIFICAZIONE - IMP.TO S.GIUSTINA	2008	684.579,72	685.105,54	179.473,18
IMDE		IMPIANTO DI DENITRIFICAZIONE - IMP. TO S.GIUSTINA- sistemazione mixer-vasche	2007	27.988,29	21.725,76	5.862,49
IMDE		lavori spm's 2008	2008	7.088,00	5.581,80	1.506,20
IMDE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA PROPELLER PL 7055 DENITRO DEPURATORE S.GIUSTINA	2011	5.562,26	3.126,76	2.433,48
IMDE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COME DA FOGLIO RIEPILOGO AMR CODICE MACROIMPIANTO N. 17	2013	502,06	207,08	294,98
IMDE		SUB TOTALE ADEGUAMENTO DENITRIFICAZIONE		835.320,29	695.749,96	189.570,33
IMDE	00010	ADEGUAMENTO IMPIANTO BELLARIA	2005	401.285,51	401.285,51	0,00

IMDE	00010	ADEGUAMENTO IMPIANTO BELLARIA	2008	22.901,47	21.938,93	962,54
IMDE		SUB TOTALE ADEGUAMENTO IMPIANTO BELLARIA		423.786,98	423.224,44	562,54
IMDE		TOTALE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE AMMORTIZZATI DA AMIR S.P.A.		9.677.202,43	9.153.091,26	524.111,17
IMDE	00320	AREA DI MQ. 13.520 VIA FORNACE - BELLARIA	2001	458.505,81	8.025,44	450.480,37
IMDE	00330	AREA DI MQ. 350 VIA FORNACE - BELLARIA	2001	12.194,63	213,41	11.981,22
IMDE	00340	AREA DI MQ. 5.975 VIA FORNACE - BELLARIA	2001	31.175,80	545,58	30.630,22
IMDE	00010	OPERE CIVILI, EDIFICI, RECINZIONI IMPIANTO DI DEPURAZIONE BELLARIA	2001	379.430,32	6.729,72	372.700,60
IMDE	00020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE BELLARIA	2002	8.507,95	0,00	8.507,95
IMDE	00010	IMP. DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE PRESSO IL DEPURATORE DI BELLARIA	2001	759.308,55	56.948,14	702.360,41
IMDE		TOTALE IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE AMMORTIZZATI DAL GESTORE		1.650.214,08	72.462,29	1.577.751,77
IMDE		TOTALE IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE		11.327.416,49	9.225.553,55	2.101.862,94
CATEGORIA: CONDOTTE FOGNARIE						
CODICE	N°	DESCRIZIONE	ANNO ENTRATA IN SERVIZIO	VALORE STORICO	FONDO D'AMM.TO. AL 31/12/2018	VALORE RESIDUO AL 31/12/2018
COND		COLLETTORE AUSA (ml 4738) - Gres da confine RSM a coll. Grotta Rossa (Via Lontra)	1992	382.686,96	190.134,56	172.552,40
COND		COLLETTORE AUSA	2000	3.009,37	1.468,75	1.540,62
COND		COLLETTORE AUSA	2002	8.191,73	3.361,92	4.829,81
COND		COLLETTORE AUSA	2003	1.478,27	591,36	886,91
COND		COLLETTORE OX MARECCHIA (ml 18.487) Gres PRVF da confine S.Leo a sollevamento SB (via dei Mulini)	1996	1.263.664,37	537.354,66	626.309,71
COND		COLLETTORE OX MARECCHIA, spese accessorie	1997	1.370,68	661,74	688,94
COND		COLLETTORE OX MARECCHIA, (m. 314+1310) PRVF - attraversamento torrente Mazzocco e 50% imp conf. S.Leo	1998	189.445,92	92.279,18	97.166,74
COND		COLLETTORE OX MARECCHIA, spese accessorie	1999	5.834,52	2.818,08	3.016,44
COND		COLLETTORE OX MARECCHIA, (ml. 1310) PRVF - 50% dal terr. Mazzocco a S.Leo	2000	112.010,37	53.729,42	58.280,95
COND		COLLETTORE OX MARECCHIA, ml. 2530,21 da Libano a P. S. M. Maddalena	2002	111.993,55	44.797,44	67.196,11
COND		COLLETTORE OX MARECCHIA, ml. 780,231 - Pietrucola di S.Leo	2002	74.282,93	29.697,60	44.585,33
COND		COLLETTORE OX MARECCHIA, spese accessorie	2002	6.125,84	2.490,40	3.635,44
COND		COLLETTORE OX MARECCHIA,	2003	17.692,09	8.812,80	10.219,29
COND		COLLETTORE OX MARECCHIA, da Libano a P. S. M. Maddalena - spese accessorie	2004	5.804,52	2.104,10	3.700,42
COND		COLLETTORE OX MARECCHIA, Pietrucola di S.Leo	2004	5.329,10	1.998,60	3.330,50
COND		COLLETTORE OX MARECCHIA, spese accessorie Part. Antonio accordo	2006	22.682,01	7.436,65	15.445,36
COND		COLLETTORE OX MARECCHIA, spese accessorie n.d. n.d. Enrico Francesi	2009	1.908,65	497,50	1.411,15
COND		COLLETTORE SX MARECCHIA (ml +2008+1145) - da confine S. Arcangelo a Sollevamento SC all'interio dell'impianto di S. Giustina	1998	210.990,27	107.825,55	103.164,72
COND		COLLETTORE SX MARECCHIA, (ml. 936) gres	1997	103.249,65	51.137,01	52.112,64
COND		COLLETTORE SX MARECCHIA, spese accessorie	1998	3.437,09	1.693,54	1.743,55
COND		COLLETTORE SX MARECCHIA, spese accessorie	1999	5.189,95	2.497,60	2.692,35
COND		COLLETTORE SX MARECCHIA, spese accessorie	2000	1.965,97	943,88	1.022,09
COND		COLLETTORE SX MARECCHIA, (ml 4199) Gres - da S. Arcangelo a S. Michele	2002	101.047,83	40.419,20	60.628,63
COND		COLLETTORE SX MARECCHIA, (ml 957,4+1040+1807,4) Gres - da S. Arcangelo a S. Michele (tratto E-F-F-2)	2002	104.101,78	41.690,84	62.410,94
COND		COLLETTORE SX MARECCHIA, Spese accessorie	2003	19,47	7,83	11,64
COND		COLLETTORE SX MARECCHIA, Tratto Poggio Berni - Toriana gres ml. 2462,82	2004	33.938,15	12.246,27	21.691,88
COND		COLLETTORE SX MARECCHIA, - gres ml 683,30+724 in Comune di Toriana - tratto H-I - L (PTTA E.R.)	2004	184.588,95	59.666,19	104.922,76
COND		COLLETTORE SX MARECCHIA, - tratto S. Michele S. Andrea ml 2072,51 gres	2004	584.889,68	128.649,37	226.229,51
COND		COLLETTORE SX MARECCHIA, - Completamento coll. in Toriana ml 448,01 - in C. di Poggio Berni ml. 1704,10+229,10 gres	2004	482.913,93	178.681,33	314.232,60
COND		COLLETTORE SX MARECCHIA, -spese servizi P. Berni- Toriana	2006	3.679,08	997,75	2.681,33
COND		COLLETTORE SX MARECCHIA, -estrazione in località S. Marino di P. Berni	2006	7.400,00	2.405,00	4.995,00
COND		COLLETTORE SX MARECCHIA, -spese per ind. Servizi - registrati servizi	2007	2.731,92	1.119,60	1.612,32
COND		COLLETTORE SX MARECCHIA, -	2008	4.904,30	1.348,71	3.555,59
COND		COLLETTORE SX MARECCHIA, - spese accessorie Pasquini Giuseppe	2009	24.494,82	8.118,20	16.376,62
COND		CONDOTTA DI SCARICO (ml.3.687) cemento - acciaio - pre - condotta di uscita dall'impianto di S. Giustina	1996	600.105,38	308.207,25	291.898,13
COND		CONDOTTA DI SCARICO+077 sp.accessoria	1997	1.497,65	744,58	753,07
COND		CONDOTTA DI SCARICO sp.accessoria	1998	116,43	57,33	59,10
COND		CONDOTTA DI SCARICO sp.accessoria	1999	22,67	10,50	12,17
COND		CONDOTTA DI SCARICO sp.accessoria	2000	181,94	87,38	94,56
COND		CONDOTTA DI SCARICO sp.accessoria	2003	11.207,51	4.483,04	6.724,47
COND		COLLETTORE GUALDO ICCIOLO+CB2 (ml.1000) gestignia - da guidoiccio RSM a confine RSM in OX Marecchia	1996	84.206,41	32.488,44	51.717,97
COND		COLLETTORE GUALDO ICCIOLO sp.accessoria	1997	1.131,84	565,45	566,39
COND		COLLETTORE GUALDO ICCIOLO	2003	5.064,63	3.225,92	1.838,71
COND		Ausa in acciaio (PTTA E.R.)	2004	579.666,00	208.911,43	370.754,57
COND		COLLETTORE MARANO tratto Faenza Ospedaleto ml. 7591,32 gres + 2 attraversamenti su fiume Marano ml. 112	2004	1.027.280,07	372.502,41	654.777,66
COND		COLLETTORE MARANO maggiori indennità servizi	2006	17.696,01	5.568,20	12.127,81
COND		COLLETTORE MARANO procedure esproprio - esageo	2006	7.533,07	2.448,29	5.084,78
COND		COLLETTORE MARANO procedure esproprio - esageo	2007	20.884,41	8.294,79	12.589,62
COND		COLLETTORE MARANO procedure esproprio - esageo	2008	45.928,36	12.066,21	33.862,15
COND		SUB TOTALE - OPERE IDRAULICHE FISSE		6.205.423,40	2.674.091,13	3.531.332,27
COND		condotta di mandata imp.Soll. Cerasolo (ml.3.583 DN 400) - ghisa - via P.P. Paszani 17x - Coriano	1985	217.122,13	127.615,15	89.506,98
COND		Condotta di mandata imp.Soll.Grotta Rossa(ml.2.775 DN 450) ghisa -Via Lontra 10 - Rimini	1985	182.223,21	107.183,68	75.039,53
COND		Condotta di mandata imp.Soll.Grotta Rossa spese accessorie	2000	197,79	104,47	93,32
COND		condutture impianto di misura Rovereta -Sineda Rovereta - R.S.M.	1985	1.685,82	893,88	791,93
COND		condotta di madata Centrale SA (ml.4.770 +600 DN 1200) ghisa -Via Danimarca - Rimini	1996	1.125.369,95	659.185,46	466.184,49
COND		condotta di madata Centrale SA	1998	876,60	463,34	413,26
COND		condotta di madata Centrale SA	2000	174,32	93,06	81,26
COND		condotta di madata Centrale SA	2002	607,97	273,60	334,37
COND		condotta di madata Centrale SA	2003	6,29	2,88	3,41
COND		condotta di mandata Centrale SB (ml. 1.004 DN 600) ghisa -Via dei Mulini 51 AX - Rimini	1996	77.090,72	44.982,80	32.107,92
COND		condotta di mandata Centrale Dogana (ml. 212 DN 400) ghisa -Strada Marecchia 2103x - Verucchio	1996	46.812,40	27.321,37	19.491,03
COND		condotta di mandata Centrale Dogana	1997	1.697,00	963,75	733,25
COND		condotta di mandata Centrale Dogana	2000	433,63	231,12	202,51
COND		condotta di mandata Centrale Pietrazzocco - Via Casa ponte verucchio - Villa Verucchio	1996	24.030,65	14.025,19	10.005,46
COND		condotta di mandata Centrale Pietrazzocco - spese accessorie	2000	222,29	118,64	103,65
COND		sollevamento (SB) sostituzione parte di collettore pompe e guida di scorrimento pompe	2007	5.144,18	1.478,80	3.665,38
COND		sollevamento Cerasolo sostituzione parte di collettore pompe e guida di scorrimento pompe	2007	2.176,87	625,83	1.551,04
COND		condotta mandata sa 3001040040	2008	3.512,36	922,64	2.589,72
COND		SUB TOTALE - PIPING		1.669.383,24	906.537,75	762.845,49
COND		PONTE SOSPESO SUL FIUME MARECCHIA DA SOLL. SB A IMPIANTO S. GIUSTINA	1998	100.576,47	53.751,40	46.825,07
COND		SUB TOTALE - CONDOTTE - OPERE IDRAULICHE FISSE		100.576,47	53.751,40	46.825,07
COND		RETE FOGNARIA SALUDEGIO	2010	123.200,00	26.190,00	97.010,00
COND		SUB TOTALE RETE FOGNARIA SALUDEGIO		123.200,00	26.190,00	97.010,00
COND		RETE FOGNARIA VIA DOGANA, COMUNE DI VERUCCHIO	2015	144.983,28	12.684,28	132.299,00
COND		SUB TOTALE RETE FOGNARIA VERUCCHIO		144.983,28	12.684,28	132.299,00
		POTENZIAMENTO DEPURATORE S. GIUSTINA E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE COMUNE BELLARIA-IGEA MARINA E PARTE SETT.LE COMUNE RIMINI - LAVORI ANNO 2008	2015	75.389,83	8.586,70	66.803,13
		POTENZIAMENTO DEPURATORE S. GIUSTINA E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE COMUNE BELLARIA-IGEA MARINA E PARTE SETT.LE COMUNE RIMINI - LAVORI ANNO 2007	2015	89.389,89	8.071,63	81.318,26
		POTENZIAMENTO DEPURATORE S. GIUSTINA E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE COMUNE BELLARIA-IGEA MARINA E PARTE SETT.LE COMUNE RIMINI - LAVORI ANNO 2005	2015	37.535,13	3.284,33	34.250,80
		POTENZIAMENTO DEPURATORE S. GIUSTINA E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE COMUNE BELLARIA-IGEA MARINA E PARTE SETT.LE COMUNE RIMINI - LAVORI ANNO 2009	2015	24.875,65	2.150,37	22.725,28
		POTENZIAMENTO DEPURATORE S. GIUSTINA E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE COMUNE BELLARIA-IGEA MARINA E PARTE SETT.LE COMUNE RIMINI - LAVORI ANNO 2010	2015	84.852,30	5.674,59	79.177,71
		POTENZIAMENTO DEPURATORE S. GIUSTINA E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE COMUNE BELLARIA-IGEA MARINA E PARTE SETT.LE COMUNE RIMINI - LAVORI ANNO 2011	2015	166.614,60	14.586,23	152.028,37
		POTENZIAMENTO DEPURATORE S. GIUSTINA E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE COMUNE BELLARIA-IGEA MARINA E PARTE SETT.LE COMUNE RIMINI - LAVORI ANNO 2012	2015	394.147,96	34.487,85	359.660,11
		POTENZIAMENTO DEPURATORE S. GIUSTINA E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE COMUNE BELLARIA-IGEA MARINA E PARTE SETT.LE COMUNE RIMINI - LAVORI ANNO 2013	2015	1.629.190,06	150.063,47	1.479.126,59

		POTENZIAMENTO DEPURATORE S. GIUSTINA E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE COMUNE BELLARIA-IGEA MARINA E PARTE SETT.LE COMUNE RIMINI - LAVORI ANNO 2014	2015	3.181.486,55	279.755,08	2.875.731,48
		POTENZIAMENTO DEPURATORE S. GIUSTINA E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE COMUNE BELLARIA-IGEA MARINA E PARTE SETT.LE COMUNE RIMINI - LAVORI ANNO 2015	2015	1.420.442,56	124.288,71	1.296.153,85
		POTENZIAMENTO DEPURATORE S. GIUSTINA E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE COMUNE BELLARIA-IGEA MARINA E PARTE SETT.LE COMUNE RIMINI - LAVORI ANNO 2015	2015	9.682,89	562,68	8.440,32
COND		SUB-TOTALE DEPURATORE S. GIUSTINA E CONDOTTE BELLARIA-IGEA MARINA		7.242.828,82	633.551,72	6.609.276,31
COND		TOTALE CONDOTTE FOGNARIE AMMORTIZZATE DA AMIR S.P.A.		15.506.374,41	4.386.796,28	11.119.578,14
COND	00010	ML 94 DI CONDOTTE FOGNARIE DN<= 90 MM.	1999	0.514,56	1.058,61	5.455,85
COND	00020	ML 94 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 200-250 MM.	1999	1.198,86	189,18	928,68
COND	00030	ML 63,65 DI CONDOTTE FOGNARIE DN <=90 MM.	1999	20.785,17	3.574,34	17.380,83
COND	00040	ML 303 DI CONDOTTE FOGNARIE DN >90<200 MM.	1999	34.891,28	8.659,82	29.221,45
COND	00050	ML 341,38 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 200-250 MM.	1999	38.931,82	8.328,45	32.605,47
COND	00060	ML 302,38 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 300-350 MM.	1999	39.512,75	9.420,83	33.091,92
COND	00070	ML 126 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 400-500 MM.	1999	23.713,25	3.853,40	19.859,85
COND	00080	ML 99,2 DI CONDOTTE FOGNARIE DN >90<200 MM.	1999	3.687,73	589,26	3.098,47
COND	00090	ML 65,50 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 200-250 MM.	1999	6.444,12	1.047,17	5.396,95
COND	00100	ML 572 DI CONDOTTE FOGNARIE DN <=90 MM.	1999	4.874,84	792,18	4.082,66
COND	00110	ML 51,40 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 300-350 MM.	2000	8.182,23	715,95	7.466,28
COND	00120	ML 176,48 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 400-500 MM.	2000	42.531,87	3.721,55	38.810,42
COND	00130	ML 40 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 300-350 MM.	2000	0.807,83	585,70	6.212,23
COND	00140	ML 201 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 600-800 MM.	2000	82.510,80	7.219,70	75.291,10
COND	00150	ML 712 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 300-350 MM.	2000	12.379,23	1.063,18	11.296,05
COND	00160	ML 57.852 DI CONDOTTE FOGNARIE NERE DN 250-300 MM.	2001	548.285,39	13.707,13	534.578,26
COND	00170	ML 24.286 DI CONDOTTE FOGNARIE NERE DN 250-300 MM.	2001	286.813,42	7.170,34	279.643,08
COND	00180	ML 38.500 DI CONDOTTE FOGNARIE BIANCHE DN 250-300 MM.	2001	188.602,03	4.715,05	183.886,98
COND	00190	ML 65,00 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 400-500 MM.	2001	16.031,10	358,78	13.680,32
COND	00200	ML 103 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 400-500 MM.	2001	0.994,05	248,35	9.685,70
COND	00210	ML 150 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 200-250 MM.	2001	12.351,80	308,88	12.043,00
COND	00220	ML 120 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 300-350 MM.	2001	23.884,73	587,37	23.297,36
COND	00230	ML 95,50 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 200-250 MM.	2002	12.474,28	0,00	12.474,28
COND	00240	ML 251,08 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 300-350 MM.	2002	17.251,88	0,00	17.251,88
COND	00250	ML 150 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 400-500 MM.	2002	27.003,80	0,00	27.003,80
COND	00260	ML 211 DI CONDOTTE FOGNARIE DN >90<200 MM.	2002	59.885,42	0,00	59.885,42
COND	00270	ML 557 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 200-250 MM.	2002	83.080,12	0,00	83.080,12
COND	00280	ML 980 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 200-250 MM.	2002	19.549,29	0,00	19.549,29
COND	00290	ML 82 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 300-350 MM.	2002	13.989,94	0,00	13.989,94
COND	00310	ML 158,90 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 400-500 MM.	1999	21.667,13	3.518,28	18.137,84
COND	00320	ML 110 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 600-800 MM.	1999	20.702,04	3.364,06	17.337,98
COND	00330	ML 95 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 800-800 MM.	1999	3.904,41	834,47	3.269,94
COND	00340	ML 80 DI CONDOTTE FOGNARIE DN <=90 MM.	2000	12.074,78	1.058,54	11.016,22
COND	00350	ML 189,50 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 600-800 MM.	2001	38.279,12	981,88	38.287,14
COND	00370	ML 82,40 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 800-1200 MM.	2001	125.288,88	3.132,22	122.156,66
COND	00380	ML 92,50 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 400-500 MM.	2002	21.821,15	0,00	21.821,15
COND	00390	ML 42 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 600-800 MM.	2002	12.586,24	0,00	12.586,24
COND	00400	ML 22 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 800-1200 MM.	2002	3.745,03	0,00	3.745,03
COND	00410	ML 117,50 DI CONDOTTE FOGNARIE DN 800-1200 MM.	2001	17.870,97	448,73	17.424,20
COND		TOTALE CONDOTTE FOGNARIE AMMORTIZZATE DAL GESTORE		1.922.926,72	92.891,47	1.840.035,25
COND		TOTALE CONDOTTE FOGNARIE		17.429.301,13	4.489.687,75	12.939.613,39

CATEGORIA: CONDOTTE IDRICHE

CODICE	N°	DESCRIZIONE	ANNO ENTRATA IN SERVIZIO	VALORE STORICO	FONDO D'AMM.TO AL 31/12/2018	VALORE RESIDUO AL 31/12/2018
RETE	00210	ML 511 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI CENTRI ABITATI	1995	60.724,20	15.724,60	34.999,70
RETE	00210	CONDOTTE IN FUNZIONE NEL 1996	1996	3.187,33	865,20	2.312,13
RETE	00220	ML 1830 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1995	27.189,89	8.438,78	18.750,91
RETE	00220	CONDOTTE IN FUNZIONE NEL 1996	1996	20.689,85	5.586,25	15.103,64
RETE	00230	ML 3325 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. IN COMUNI VALCONCA	1995	93.486,86	28.974,85	64.482,01
RETE	00240	ML 330 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1996	87.486,49	23.624,57	63.873,92
RETE	00250	ML 320 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1996	92.166,87	24.882,12	67.273,95
RETE	00260	ML 248 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALCONCA	1995	178.238,80	48.124,48	130.114,32
RETE	00270	ML 140 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE A SANTARCANGELO	1996	6.878,12	1.587,11	5.021,01
RETE	00280	ML 1325 DI CONDOTTE DN <= 80 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1997	84.263,72	23.172,64	61.091,18
RETE	00290	ML 3.363 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1997	121.350,92	33.371,52	87.979,40
RETE	00300	ML 110 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALCONCA	1997	10.086,80	2.773,87	7.312,93
RETE	00310	ML 130 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEL COMUNE DI VERUCCHIO	1997	5.688,23	5.567,01	4.131,22
RETE	00320	ML 956 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALMARECCHIA	1997	19.750,65	5.431,42	14.319,23
RETE	00330	ML 1.575,20 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1998	118.913,89	32.151,24	84.762,45
RETE	00340	ML 2.238,85 DI CONDOTTE DN <= 80 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1998	88.083,71	24.223,04	63.860,67
RETE	00350	ML 283 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1998	17.287,31	4.748,53	12.518,78
RETE	00360	ML 7.013,45 DI CONDOTTE DN <= 80 MM. COSTRUITE NEI COMUNI EX VALCONCA	1998	171.782,15	47.242,85	124.549,30
RETE	00370	ML 491,30 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTR. NEI COMUNI UNIONE VALCONCA	1998	24.231,17	6.863,88	17.367,29
RETE	00380	ML 701,50 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEL COMUNE DI VERUCCHIO	1998	45.435,73	12.484,84	32.940,89
RETE	00390	ML 1.982 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALMARECCHIA	1998	95.101,39	28.152,88	66.948,51
RETE	00400	ML 1.087,79 DI CONDOTTE DN <= 80 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1999	85.038,92	19.007,75	76.031,13
RETE	00410	ML 4.331,90 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1999	221.754,53	44.360,91	177.483,62
RETE	00420	ML 2 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1999	123,73	24,75	88,98
RETE	00430	ML 3.035 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI EX VALCONCA	1999	139.654,54	27.930,91	111.723,63
RETE	00440	ML 666 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTR. NEI COMUNI EX VALCONCA	1999	25.758,41	5.151,68	20.606,73
RETE	00450	ML 2305,50 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTR. NEI COMUNI UNIONE VALCONCA	1999	68.344,90	13.688,99	54.675,91
RETE	00460	ML 653,68 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE A SANTARCANGELO	1999	34.338,13	6.867,63	27.470,50
RETE	00470	ML 330,80 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEL COMUNE DI VERUCCHIO	1999	20.378,87	5.875,76	29.503,11
RETE	00480	ML 3.165,70 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTR. NEI COMUNI VALMARECCHIA	1999	164.453,79	32.680,75	131.563,04
RETE	00490	ML 110 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI MEDIA VALCONCA	1999	3.936,24	787,25	3.148,99
RETE	00500	ML 1470 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEL COMUNE DI SAN LEÒ	1999	49.163,20	9.832,64	39.330,55
RETE	00510	ACQUISTO DI ML 8.785 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. ACQ. MONTENAGGIO	2000	348,87	34,88	313,99
RETE	00520	ACQUISTO DI ML 32 DI CONDOTTE DN <= 80 MM. ACQUEDOTTO MONTENAGGIO	2000	1,98	0,20	1,78
RETE	00530	ACQUISTO DI ML 1.813 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. ACQ. MONTENAGGIO	2000	124,96	12,49	112,47
RETE	00540	ACQUISTO DI ML 1.027 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. ACQ. MONTENAGGIO	2000	106,08	10,60	95,48
RETE	00550	ML 1.830,19 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI CENTRI ABITATI	2000	122.361,23	12.226,12	110.125,11
RETE	00560	ML 2.438,85 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	2000	126.655,65	12.665,59	113.990,29
RETE	00570	ML 4.529,00 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI EX VALCONCA	2000	238.549,99	23.884,98	214.664,83
RETE	00580	CONDOTTE DEL DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI COMUNI EX VALCONCA	2000	976,10	97,61	878,49
RETE	00590	ML 2814,60 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTR. NEI COMUNI UNIONE VALCONCA	2000	86.418,94	8.641,89	77.777,05
RETE	00600	ML 240,75 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE A SANTARCANGELO	2000	12.537,42	1.253,75	11.283,67
RETE	00610	ML 95,40 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEL COMUNE DI VERUCCHIO	2000	3.511,28	361,12	3.150,16
RETE	00620	ML 2185,70 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALMARECCHIA	2000	120.508,18	12.050,81	108.457,37
RETE	00630	ML 389,50 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI MEDIA V. CONCA	2000	16.443,12	1.644,32	14.798,80
RETE	00640	ML 2280 DI CONDOTTE DN <= 80 MM. COSTRUITE NEI COMUNI S. LEÒ NOVAFELTRIA	2000	37.125,82	3.712,86	33.412,96
RETE	00690	ML 956,15 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	2001	80.411,59	2.018,29	78.401,30
RETE	00700	ML 180,35 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	2001	73.321,87	1.830,55	71.391,32
RETE	00710	ML 21,09 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI CENTRI ABITATI	2001	4.859,44	121,49	4.737,95
RETE	00720	ML 4.529,00 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI EX VALCONCA	2001	153.703,28	3.842,58	149.860,70
RETE	00730	ML 615,78 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI UNIONE VALCONCA	2001	44.188,49	1.104,88	43.081,83
RETE	00740	ML 2.170,85 DI CONDOTTE DN <= 80 MM. COSTRUITE A SANTARCANGELO	2001	99.388,58	2.484,86	96.913,62
RETE	00750	ML 1.027,70 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEL COMUNE DI VERUCCHIO	2001	56.181,69	1.404,54	54.777,15
RETE	00760	ML 3.081,10 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALMARECCHIA	2001	134.260,57	3.366,51	130.894,05

RETE	00770	ML 554 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI MEDIA VALCONCA	2001	45.858,63	1.148,47	44.712,16
RETE	00780	ML 1.801,30 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI S. LEO NOVAFELTRIA	2001	38.381,12	983,78	38.387,34
RETE	00790	ML 82,50 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEL COMUNE DI BELLARIA	2001	18.683,60	489,59	19.094,01
RETE	01200	ML 450,40 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	2002	27.653,21	0,00	27.653,21
RETE	01210	ML 1.170,40 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	2002	87.013,97	0,00	87.013,97
RETE	01220	ML 3.098,80 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI EX VALCONCA	2002	157.787,26	0,00	157.787,26
RETE	01230	ML 977,85 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI UNIONE VALCONCA	2002	70.017,89	0,00	70.017,89
RETE	01240	ML 371,39 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE A SANTARCANGELO	2002	21.280,08	0,00	21.280,08
RETE	01250	ML 2.20 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEL COMUNE DI VERUCCHIO	2002	50.630,98	0,00	50.630,98
RETE	01260	ML 784,50 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALMARECCHIA	2002	32.812,88	0,00	32.812,88
RETE	01270	ML 1.247,39 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI S. LEO NOVAFELTRIA	2002	58.847,75	0,00	58.847,75
RETE	00410	ML 84 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1995	5.079,84	885,45	2.154,39
RETE	00420	ML 12 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1995	221,05	83,54	157,51
RETE	00430	ML 4 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1995	1.727,15	486,57	1.230,58
RETE	00430	CONDOTTE IN FUNZIONE NEL 1996	1996	2.588,62	738,73	2.089,89
RETE	00440	ML 120 DI CONDOTTE DN >300<400 MM. COSTRUITE AL SENATELLO	1996	6.125,88	1.970,52	6.155,35
RETE	00450	ML 125 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1996	42.983,68	15.283,04	31.700,04
RETE	00460	ML 46 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1997	3.982,03	1.095,05	2.887,04
RETE	00470	ML 16 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1997	887,92	238,70	629,22
RETE	00480	ML 5 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1997	23.887,15	6.571,73	17.325,42
RETE	00490	ML 4 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1997	292,58	80,48	212,12
RETE	00500	ML 4 DI CONDOTTE DN >300<400 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1997	7.143,58	1.964,49	5.179,09
RETE	00510	ML 1 DI CONDOTTE DN 900 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1997	93.973,25	3.842,63	10.130,62
RETE	00520	ML 2 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI EX VALCONCA	1997	119,32	32,01	84,31
RETE	00530	ML 3 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI COMUNI EX VALCONCA	1997	178,17	48,45	127,72
RETE	00540	ML 6 DI CONDOTTE DN >200<300 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALCONCA	1997	477,49	131,28	346,12
RETE	00550	ML 2 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEL COMUNE DI VERUCCHIO	1997	970,62	266,92	703,70
RETE	00560	ML 26 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEL COMUNE DI VERUCCHIO	1997	0,00	0,00	0,00
RETE	00570	ML 21,95 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1998	1.445,18	397,43	1.047,75
RETE	00580	ML 10 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1998	10.673,61	2.770,24	7.383,27
RETE	00590	ML 4,7 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1998	332,54	91,48	241,08
RETE	00600	ML 50 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1998	15.380,22	4.224,06	11.136,16
RETE	00610	ML 14,70 DI CONDOTTE DN 900 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1998	1.591,51	437,69	1.153,82
RETE	00620	ML 2.534,80 DI CONDOTTE DN 500 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1998	59.982,53	18.485,21	43.487,32
RETE	00630	ML 43,90 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALCONCA	1998	2.259,88	621,23	1.637,85
RETE	00640	ML 3,20 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALMARECCHIA	1998	265,99	73,15	192,84
RETE	00650	ML 351,70 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI COM. VALMARECCHIA	1998	31.753,18	8.732,13	23.021,05
RETE	00660	ML 2,55 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1999	165,89	33,17	132,72
RETE	00670	ML 4,15 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1999	488,84	93,76	375,08
RETE	00680	ML 10,5 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1999	480,23	98,05	384,18
RETE	00690	ML 24,5 DI CONDOTTE DN >200<300 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1999	1.913,78	382,75	1.531,03
RETE	00700	ML 0,15 DI CONDOTTE DN 900 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1999	23.860,33	4.772,08	19.088,25
RETE	00710	ML 32 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALCONCA	1999	7.134,47	1.428,88	5.705,59
RETE	00720	ML 12 DI CONDOTTE DN >300<400 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALCONCA	1999	3.294,28	658,85	2.635,44
RETE	00730	ML 15 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEL COMUNE DI SARCANGELO	1999	1.747,95	349,60	1.398,35
RETE	00740	ML 309,30 DI CONDOTTE DN >200<300 MM. COSTRUITE IN COMUNE SARCANGELO	1999	0,00	0,00	0,00
RETE	00750	ACQUISITO D.M. 12.992 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. ACP. MONTEMARZIO	2000	1.999,00	189,88	1.789,11
RETE	00760	ML 9,90 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	2000	2.028,27	202,83	1.825,44
RETE	00770	ML 122,5 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	2000	0,00	0,00	0,00
RETE	00780	ML 131,8 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	2000	0,00	0,00	0,00
RETE	00790	ML 138,50 DI CONDOTTE DN >200<300 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	2000	82.872,25	8.287,23	74.585,02
RETE	00800	ML 17,10 DI CONDOTTE DN >300<400 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	2000	12.457,77	1.245,77	11.212,00
RETE	00810	ML 349 DI CONDOTTE DN 500 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	2000	109.111,42	10.911,15	98.200,27
RETE	00820	ML 11 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI EX VALCONCA	2000	605,63	60,56	544,97
RETE	00830	ML 23 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI COMUNI EX VALCONCA	2000	1.243,98	124,40	1.119,58
RETE	00840	ML 4,5 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALMARECCHIA	2000	5.377,20	537,72	4.839,48
RETE	00850	ML 10 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALMARECCHIA	2000	1.477,43	147,75	1.329,68
RETE	00860	ML 54 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEL COMUNE DI BELLARIA	2000	8.253,99	625,40	5.628,59
RETE	00870	ML 3,39 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	2001	384,28	7,11	277,17
RETE	00880	ML 7,50 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	2001	4.441,85	111,04	4.330,51
RETE	00890	ML 400,70 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	2001	41.024,28	1.025,81	39.998,75
RETE	00940	ML 122,50 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	2001	24.830,60	621,27	24.209,33
RETE	00950	ML 4,20 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALCONCA	2001	48.044,89	1.201,12	46.843,77
RETE	00960	ML 2,50 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALCONCA	2001	117,12	2,93	114,19
RETE	00970	ML 15 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEL COMUNE SARCANGELO	2001	22.630,40	565,61	22.055,39
RETE	01200	ML 26,40 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	2002	3.039,40	0,00	3.039,40
RETE	00320	ML 1.800 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1995	210.983,36	52.248,02	167.737,34
RETE	00320	CONDOTTE IN FUNZIONE NEL 1996	1996	247,80	52,70	195,20
RETE	00330	ML 8,748 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1995	431.223,22	102.415,82	328.807,70
RETE	00330	CONDOTTE IN FUNZIONE NEL 1996	1996	12.348,13	2.624,00	9.724,13
RETE	00340	ML 942 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI AB.	1995	123.360,74	29.295,88	94.064,84
RETE	00340	CONDOTTE IN FUNZIONE NEL 1996	1996	28.487,41	6.281,84	22.205,57
RETE	00350	ML 3.708 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1995	370.958,22	90.240,00	280.718,13
RETE	00350	CONDOTTE IN FUNZIONE NEL 1996	1996	15.164,71	3.222,51	11.942,20
RETE	00360	ML 120 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE IN COMUNE DI VERUCCHIO	1995	18.734,87	4.687,08	15.047,81
RETE	00370	ML 2.344 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1996	244.967,55	52.063,47	192.904,08
RETE	00380	ML 743 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1995	127.227,85	27.035,85	100.192,00
RETE	00390	ML 4.628 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1999	208.856,91	44.381,88	164.474,03
RETE	00400	ML 1.431 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1996	152.944,82	32.309,50	119.735,12
RETE	00410	CONDOTTE DN >300<400 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1996	5.517,82	1.172,36	4.344,05
RETE	00420	ML 138 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALCONCA	1995	10.786,93	2.287,99	8.478,94
RETE	00430	ML 560 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALCONCA	1995	39.185,55	8.908,81	22.238,74
RETE	00430	ML 1.585 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALCONCA	1995	80.403,55	19.210,74	71.192,82
RETE	00440	ML 598 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE A SANTARCANGELO	1995	84.278,74	15.265,73	49.011,01
RETE	00440	CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE A SANTARCANGELO	1996	2.488,80	528,38	1.958,22
RETE	00450	ML 756 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE A SANTARCANGELO	1995	44.183,41	10.493,58	33.689,83
RETE	00450	CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE A SANTARCANGELO	1996	5.461,71	2.510,62	7.451,09
RETE	00450	CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE A SANTARCANGELO	1997	7.819,88	1.798,53	6.021,13
RETE	00460	ML 318 DI CONDOTTE DN >350<400 MM. COSTRUITE AL SENATELLO	1996	30.794,45	6.505,33	24.218,12
RETE	00470	ML 3.298 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1997	243.388,35	58.979,31	187.409,04
RETE	00480	ML 2.488 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1997	160.595,75	38.507,63	123.658,72
RETE	00490	ML 2.437 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1997	246.779,89	56.759,40	190.020,99
RETE	00500	ML 1.174 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1997	105.624,93	24.385,75	81.639,18
RETE	00510	ML 165 DI CONDOTTE DN >200<300 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1997	47.069,14	10.825,92	36.243,22
RETE	00520	ML 24 DI CONDOTTE DN >300<400 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1997	6.877,42	1.581,82	5.295,60
RETE	00530	ML 20 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALCONCA	1997	9.195,80	2.115,03	7.080,77
RETE	00540	ML 1.142 DI CONDOTTE DN >200<300 MM. COSTRUITE NEI COMUNI UNIONE VALCONCA	1997	188.534,79	24.963,60	83.571,79
RETE	00560	ML 2 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEL COMUNE VERUCCHIO	1997	985,76	226,73	759,03
RETE	00570	ML 27 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEL COMUNE DI VERUCCHIO	1997	15.684,22	3.147,37	10.536,85
RETE	00580	ML 2.213,20 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1998	196.982,90	47.175,01	149.387,88
RETE	00590	ML 1.935,25 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1998	123.034,76	29.528,34	93.506,35
RETE	00600	ML 4.486,55 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1998	441.741,64	108.017,97	335.723,57
RETE	00610	ML 1.971,45 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1998	114.719,79	27.539,58	87.180,20
RETE	00620	ML 1.095 DI CONDOTTE DN >200<300 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1998	179.847,22	43.163,33	136.683,89
RETE	00630	ML 46 DI CONDOTTE DN >300<400 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1998	6.136,51	1.472,72	4.663,79
RETE	00640	ML 360,50 DI CONDOTTE DN 900 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1998	80.330,78	14.239,39	45.091,39
RETE	00650	ML 100 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI COMUNI EX VALCONCA	1998	20.083,83	4.822,32	15.270,71
RETE	00660	ML 2.564,85 DI CONDOTTE DN >200<300 MM. COSTR. NEI COMUNI EX VALCONCA	1998	277.835,96	68.880,83	211.155,03
RETE	00670	ML 320,55 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI UNIONE VALCONCA	1998	17.743,64	4.258,32	13.484,72
RETE	00680	ML 238,90 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTR. NEI COMUNI UNIONE VALCONCA	1998	13.887,55	3.313,81	10.483,74
RETE	00690	ML 45,85 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEL COMUNE DI VERUCCHIO	1998	5.585,21	868,37	2.711,84
RETE	00700	ML 180 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEL COMUNE DI VERUCCHIO	1998	16.181,90	3.878,86	12.283,04
RETE	00710	ML 845,45 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1999	81.894,71	18.849,88	61.145,63
RETE	00720	ML 1.164,63 DI CONDOTTE DN <= 90 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1999	93.722,98	16.461,52	77.321,46
RETE	00730	ML 2.811,50 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1999	292.704,50	51.225,26	241.481,22
RETE	00740	ML 2.207,20 DI CONDOTTE DN >90<200 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1999	205.448,29	38.953,45	169.494,84
RETE	00750	ML 1.312,45 DI CONDOTTE DN >200<300 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	1999	141.304,82	24.728,37	116.576,55
RETE	00760	ML 5.896,80 DI CONDOTTE DN >200<300 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	1999	520.370,00	91.064,75	429.305,25
RETE	00770	ML 696,40 DI CONDOTTE DN 900 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA				

RETE	00810	CONDOTTE DEL DN. >90<=200 MM. COSTRUITE NEI COMUNI UNIONE VALCONCA	1999	2.150,35	376,31	1.774,04
RETE	00820	ML 57,65 DI CONDOTTE DN. <=90 MM. COSTRUITE A SANTARCANGELO	1999	5.503,65	963,14	4.540,51
RETE	00830	ML 1260 DI CONDOTTE DN. >90<=200 MM. COSTRUITE A SANTARCANGELO	1999	130.780,58	22.883,09	107.897,49
RETE	00840	ML 1.706,95 DI CONDOTTE DN. >200<=300 MM. COSTRUITE A SANTARCANGELO	1999	274.230,30	47.960,30	226.240,00
RETE	00850	ML 188,58 DI CONDOTTE DN. <=90 MM. COSTRUITE NEL COMUNE DI VERUCCHIO	1999	18.494,43	3.236,53	15.257,90
RETE	00860	ML 888,16 DI CONDOTTE DN. >90<=200 MM. COSTRUITE NEL COMUNE DI VERUCCHIO	1999	77.824,48	13.619,28	64.205,20
RETE	00870	ML 109,8 DI CONDOTTE DN. <=90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALMARECCHIA	1999	12.181,84	2.131,88	10.049,96
RETE	00880	CONDOTTE DN. >90<=200 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALMARECCHIA	1999	6.182,49	1.083,68	5.108,81
RETE	00890	ML 2.425,35 DI CONDOTTE DN. <=90 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	2000	271.795,01	29.102,58	248.692,43
RETE	00900	ML 415,30 DI CONDOTTE DN. <=90 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	2000	33.601,87	2.656,16	30.945,71
RETE	00910	ML 5.881,35 DI CONDOTTE DN. >90<=200 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	2000	523.708,75	44.515,25	479.193,50
RETE	00920	ML 1.809,85 DI CONDOTTE DN. >90<=200 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	2000	150.620,59	12.862,74	137.757,85
RETE	00930	ML 985,96 DI CONDOTTE DN. >200<=300 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	2000	198.688,05	13.488,40	145.199,65
RETE	00940	ML 536,46 DI CONDOTTE DN. >200<=300 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	2000	41.301,75	3.510,85	37.791,90
RETE	00950	ML 3.384,10 DI CONDOTTE DN. 800 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	2000	0,00	0,00	0,00
RETE	00960	ML 312,60 DI CONDOTTE DN. 500 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	2000	45.307,18	3.851,11	41.456,07
RETE	00970	ML 2.620,85 DI CONDOTTE DN. <=90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI EX VALCONCA	2000	125.191,87	19.641,24	114.549,63
RETE	00980	ML 2.505,90 DI CONDOTTE DN. >90<=200 MM. COSTRUITE NEI COMUNI EX VALCONCA	2000	145.901,51	12.401,63	133.499,88
RETE	00990	ML 488,58 DI CONDOTTE DEL DN. <=90 MM. COSTR. NEI COMUNI UNIONE VALCONCA	2000	29.838,73	2.519,29	27.319,44
RETE	01000	ML 551,75 DI CONDOTTE DEL DN. >90<=200 MM. COSTR. NEI COMUNI UNIONE VALCONCA	2000	38.484,54	3.304,48	36.110,06
RETE	01010	ML 42,90 DI CONDOTTE DN. <=90 MM. COSTRUITE A SANTARCANGELO	2000	4.894,54	418,63	4.475,91
RETE	01020	ML 417,20 DI CONDOTTE DN. >90<=200 MM. COSTRUITE A SANTARCANGELO	2000	13.730,96	1.167,13	12.563,83
RETE	01030	CONDOTTE DEL DN. >200<=300 MM. COSTRUITE A SANTARCANGELO	2000	399,44	33,19	367,25
RETE	01040	ML 119,50 DI CONDOTTE DN. <=90 MM. COSTRUITE NEL COMUNE DI VERUCCHIO	2000	9.137,88	778,73	8.361,15
RETE	01050	ML 473,05 DI CONDOTTE DN. >90<=200 MM. COSTRUITE NEL COMUNE DI VERUCCHIO	2000	39.078,92	3.321,88	35.756,04
RETE	01060	ML 5,3 DI CONDOTTE DN. <=90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALMARECCHIA	2000	1.110,34	94,38	1.015,96
RETE	01070	ML 957,10 DI CONDOTTE DN. >90<=200 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALMARECCHIA	2000	62.263,69	5.292,41	56.971,28
RETE	01120	ML 3.168,35 DI CONDOTTE DN. <=90 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	2001	246.014,64	4.960,30	243.054,34
RETE	01130	ML 1.328,10 DI CONDOTTE DN. <=90 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	2001	90.121,35	1.802,43	88.318,92
RETE	01140	ML 4.404,90 DI CONDOTTE DN. >90<=200 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	2001	523.543,99	10.470,87	513.073,12
RETE	01150	ML 7.851,20 DI CONDOTTE DN. >90<=200 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	2001	801.317,84	18.008,38	783.309,46
RETE	01160	ML 1.021,30 DI CONDOTTE DN. >200<=300 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	2001	103.773,62	3.275,47	100.498,15
RETE	01170	ML 275,60 DI CONDOTTE DN. 800 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	2001	83.562,55	1.671,25	81.891,30
RETE	01180	ML 150 DI CONDOTTE DN. <=90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI EX VALCONCA	2001	26.130,43	522,61	25.607,82
RETE	01190	ML 1885,50 DI CONDOTTE DN. >90<=200 MM. COSTRUITE NEI COMUNI EX VALCONCA	2001	177.755,03	3.555,10	174.199,93
RETE	01200	ML 990,70 DI CONDOTTE DEL DN. <=90 MM. COSTR. NEI COMUNI UNIONE VALCONCA	2001	44.240,03	884,80	43.355,23
RETE	01210	ML 1371 DI CONDOTTE DEL DN. >90<=200 MM. COSTR. NEI COMUNI UNIONE VALCONCA	2001	69.675,80	1.273,47	68.402,33
RETE	01220	ML 57,25 DI CONDOTTE DN. >90<=200 MM. COSTRUITE A SANTARCANGELO	2001	6.273,10	125,46	6.147,64
RETE	01230	CONDOTTE DN. >90<=200 MM. COSTRUITE NEL COMUNE DI VERUCCHIO	2001	35.907,02	719,14	35.187,88
RETE	01240	ML 596 DI CONDOTTE DN. <=90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI MEDIA VALCONCA	2001	47.970,12	958,46	47.011,66
RETE	01250	ML 1.175 DI CONDOTTE DN. >90<=200 MM. COSTRUITE NEI COMUNI MEDIA VALCONCA	2001	15.742,83	314,86	15.427,97
RETE	01260	ML 2,58 DI CONDOTTE DN. <=90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALMARECCHIA	2001	15.977,00	319,54	15.657,46
RETE	01860	ML 438,89 DI CONDOTTE DN. <=90 MM. COSTRUITE IN CENTRI AB.	2002	48.755,02	0,00	48.755,02
RETE	01870	ML 11,00 DI CONDOTTE DN. <=90 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	2002	742,64	0,00	742,64
RETE	01880	ML 2.893,90 DI CONDOTTE DN. >90<=200 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	2002	385.396,19	0,00	385.396,19
RETE	01890	ML 1.579,55 DI CONDOTTE DN. >90<=200 MM. COSTRUITE IN PERIFERIA	2002	113.195,89	0,00	113.195,89
RETE	01900	ML 7,80 DI CONDOTTE DN. >200<=300 MM. COSTRUITE NEI CENTRI AB.	2002	787,00	0,00	787,00
RETE	01910	ML 482 DI CONDOTTE DN. <=90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI EX VALCONCA	2002	31.814,42	0,00	31.814,42
RETE	01920	ML 4.413,88 DI CONDOTTE DN. >90<=200 MM. COSTRUITE NEI COMUNI EX VALCONCA	2002	409.883,23	0,00	409.883,23
RETE	01930	ML 636 DI CONDOTTE DEL DN. <=90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI UNIONE VALCONCA	2002	42.018,36	0,00	42.018,36
RETE	01940	ML 1398 DI CONDOTTE DEL DN. >90<=200 MM. COSTR. NEI COMUNI UNIONE VALCONCA	2002	91.516,74	0,00	91.516,74
RETE	01950	ML 230,70 DI CONDOTTE DN. <=90 MM. COSTRUITE A SANTARCANGELO	2002	14.043,56	0,00	14.043,56
RETE	01960	ML 54,46 DI CONDOTTE DN. >90<=200 MM. COSTRUITE NEL COMUNE DI VERUCCHIO	2002	7.439,33	0,00	7.439,33
RETE	01970	CONDOTTE DN. <=90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALMARECCHIA	2002	206,66	0,00	206,66
RETE	01980	CONDOTTE DN. >90<=200 MM. COSTRUITE NEI COMUNI VALMARECCHIA	2002	7.228,10	0,00	7.228,10
RETE	01990	CONDOTTE DN. <=90 MM. COSTRUITE NEI COMUNI DELLA MEDIA VALCONCA	2002	281,65	0,00	281,65
RETE	02000	CONDOTTE DN. >90<=200 MM. COSTRUITE NEL COMUNE DI SILEO NOVAFELTRIA	2002	25,82	0,00	25,82

RETE		TOTALE CONDOTTE IDRICHE AMMORTIZZATE DAL GESTORE		17.596.650,82	2.515.472,23	15.081.177,79
RETE		TOTALE CONDOTTE IDRICHE		17.596.650,82	2.515.472,23	15.081.177,79

CATEGORIA: IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO

CODICE	N°	DESCRIZIONE	ANNO ENTRATA IN SERVIZIO	VALORE STORICO	FONDO D'AMM.TO AL 31/12/2018	VALORE RESIDUO AL 31/12/2018
ISPO	00231	AREA DI MQ 317 IN VIA S. CRISTINA - RIMINI	1999	3.382,65	478,77	2.881,88
ISPO	00061	CENTRALE DI SOLLEVAMENTO MIRAMARE - VIA PARIGI	1997	3.863,23	743,66	3.119,57
ISPO	00071	CENTRALE DI SOLLEVAMENTO CA' BEZZI - VIA MONTEVECCHIO	1999	1.388,61	191,60	1.177,01
ISPO	00081	CENTRALE DI SOLLEVAMENTO MONTECIECO - VIA S. CRISTINA	1995	21.710,05	4.909,03	16.771,02
ISPO	00081	CENTRALE MONTECIECO MANUT. STRAORDIN. LAVORI 1995	1995	30.107,43	5.755,66	24.311,75
ISPO	00111	CENTRALE DI SOLLEVAMENTO CORPOLO - VIA BARACCHI	1998	15.741,33	3.000,22	12.711,11
ISPO	00150	NUOVA CABINA ELETTRICA CENTRALE SIBELLA - CORIANO	1999	10.255,85	1.435,84	8.820,01
ISPO	00170	NUOVA CABINA ELETTRICA CENTRALE SIBELLA - CORIANO	2000	20.492,95	1.434,61	19.058,34
ISPO	00180	CENTRALE SIBELLA - CORIANO VIA LA PASTORA	2001	17.080,58	298,51	16.781,67
ISPO	00071	IMPIANTO DI SOLLEVAM. CENTRALE DI SPINTA MIRAMARE	1997	61.345,58	27.608,87	33.741,69
ISPO	00071	IMPIANTO DI SOLLEVAM. CENTRALE DI SPINTA MIRAMARE	1995	21.955,75	7.684,63	14.271,23
ISPO	00081	IMPIANTO DI SOLLEVAM. CENTRALE DI SPINTA CA' BEZZI	1996	7.648,38	4.208,62	3.441,76
ISPO	00081	LAVORI DI AMPLIAMENTO 1997 CENTRALE CA' BEZZI	1997	2.321,06	1.045,84	1.275,22
ISPO	00081	IMPIANTO DI SOLLEVAM. CENTRALE DI SPINTA CA' BEZZI	1998	4.321,67	1.582,69	2.938,08
ISPO	00091	IMPIANTO DI SOLLEVAM. CENTRALINO DI SPINTA MONTECIECO	1995	42.995,79	27.947,27	15.048,52
ISPO	00091	LAVORI DI AMPLIAMENTO 1996 CENTRALINO MONTECIECO	1996	3.722,84	2.047,43	1.675,21
ISPO	00091	LAVORI DI AMPLIAMENTO 1997 CENTRALINO MONTECIECO	1997	13.124,43	6.965,88	7.218,45
ISPO	00111	IMPIANTO DI SOLLEVAM. CENTRALE DI SPINTA ZONA ARTIGIANALE	1996	2.377,84	1.307,70	1.070,05
ISPO	00111	LAVORI DI AMPLIAMENTO 1997 CENTRA ZONA ARTIGIANALE	1997	10.949,58	6.277,32	7.672,26
ISPO	00111	IMPIANTO DI SOLLEVAM. CENTRALE DI SPINTA ZONA ARTIGIANALE	1998	6.030,11	2.110,64	3.919,57
ISPO	00160	NUOVI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO CENTRALE DI SPINTA CA' BEZZI	1999	104.225,24	28.068,55	78.189,69
ISPO	00170	IMPIANTO DI SOLLEVAM. CENTRALE DI SPINTA MIRAMARE	1999	9.727,18	2.431,80	7.295,38
ISPO	00180	IMPIANTO DI SOLLEVAM. CENTRALE DI SPINTA ZONA ARTIGIANALE	1999	5.300,27	1.325,67	3.974,60
ISPO	00200	NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO CENTRALE DI SPINTA SIBELLA	1999	71.732,08	17.903,02	53.799,06
ISPO	00210	NUOVA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO CENTRALE DI SPINTA TRARIVI	1999	11.181,62	2.736,40	8.386,22
ISPO	00230	NUOVI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ALLA CENTRALE DI SPINTA CA' BEZZI	2000	4.788,52	719,28	4.070,24
ISPO	00240	MANUT. STRA. IMPIANTO DI SOLLEVAM. CENTRALE DI SPINTA MIRAMARE	2000	635,42	95,31	540,11
ISPO	00250	MANUT. STRAOR. IMP. DI SOLLEV. CENTRALE DI SPINTA ZONA ARTIGIANALE	2000	3.536,23	530,43	3.005,80
ISPO	00250	NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO CENTRALE DI SPINTA SIBELLA	2000	18.451,55	2.767,74	15.683,81
ISPO	00270	NUOVA CENTRALE DI SOLLEV. CENTRALE E SERV. TRARIVI	2000	7.238,10	1.085,72	6.152,38
ISPO	00290	POTENZIAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAM. CENTRALINO DI SPINTA M. CIECO	2001	8.681,76	443,68	8.418,07
ISPO	00300	MANUT. STRA. IMP. DI SOLLEVAM. CENTRALE ZONA ARTIGIANALE	2001	6.489,94	324,50	6.165,44
ISPO	00310	NUOVA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO CENTRALE DI SPINTA SIBELLA	2001	4.620,06	231,00	4.389,06
ISPO		TOTALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO AMMORTIZZATI DAL GESTORE		568.770,57	162.800,91	397.969,66
ISPO		TOTALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO		568.770,57	162.800,91	397.969,66

CATEGORIA: POZZI

CODICE	N°	DESCRIZIONE	ANNO ENTRATA IN SERVIZIO	VALORE STORICO	FONDO D'AMM.TO AL 31/12/2018	VALORE RESIDUO AL 31/12/2018
P022	00290	AREA DI MQ. 45.530 IN STRADA VICINALE MOLINO II LO C. S. MARTINO IN R.	1999	426.703,92	29.669,28	396.834,64
P022	00300	AREA DI MQ. 2.990 IN COMUNE DI SASSOFELTRIO (PU) POZZO TASSONA	2000	8.864,88	620,65	8.244,23
P022	00310	AREA DI MQ. 1.820 IN COMUNE DI RIMINI CAMPO POZZI POLVERIERA	2001	109,80	1,92	107,88
P022	00670	OPERE CIVILI NUOVO CAMPO POZZI ZONA VIA MOLINO RONCI	2009	80.411,89	9.628,81	74.782,88
ISPO		TOTALE POZZI AMMORTIZZATI DAL GESTORE		516.090,39	36.120,56	479.969,83
ISPO		TOTALE POZZI		516.090,39	36.120,56	479.969,83
CATEGORIA: SERBATOI						
CODICE	N°	DESCRIZIONE	ANNO ENTRATA IN SERVIZIO	VALORE STORICO	FONDO D'AMM.TO AL 31/12/2018	VALORE RESIDUO AL 31/12/2018
SERB	00031	SERBATOIO DI COVIGNANO VECCHIO : VIA COVIGNANO	1998	136.249,24	28.612,96	111.636,28
SERB	00051	SERBATOIO S. MARTINO IN XX : VIA S. CRISTINA	1998	3.009,39	579,21	2.430,18
SERB	00061	SERBATOIO 8000 MC. COVIGNANO : VIA DELLE FRAGOLE	1995	213.440,86	48.567,80	164.883,06
SERB	00061	MANUT. STRAORD. SERBATOIO 8000	1996	476.022,26	91.634,29	384.387,97
SERB	00061	LAVORI DI AMPLIAMENTO EDILE 1967 SERBATOIO 8000	1967	181.542,68	34.946,84	146.595,84
SERB	00061	SERBATOIO 8000 MC. COVIGNANO : VIA DELLE FRAGOLE	1999	4.718,35	908,27	3.810,08
SERB	00081	SERBATOIO A TERRA MIRAMARE : VIA PARIGI	1998	6.097,83	1.173,70	4.923,33
SERB	00091	SERBATOIO S. PAOLO : VIA S. PAOLO	1997	3.850,72	741,29	3.109,43
SERB	00111	SERBATOIO CORPOLO : VIA DELLE SELVE - CORPOLO	1995	11.716,09	2.665,39	9.050,70
SERB	00111	COSTRUZIONE SERBATOIO VIA DELLE SELVE CORPOLO	1996	8.688,61	1.672,55	7.016,06
SERB	00111	LAVORI DI AMPLIAMENTO EDILE 1967 SERBATOIO VIA DELLE SELVE	1967	4.757,60	915,86	3.841,74
SERB	00111	SERBATOIO CORPOLO : VIA DELLE SELVE - CORPOLO	1999	32.807,67	6.315,42	26.492,14
SERB	00121	SERBATOIO S. CRISTINA : VIA S. CRISTINA	1995	26.692,26	6.072,49	20.619,77
SERB	00121	COSTRUZIONE SERBATOIO S. CRISTINA	1998	21.957,48	4.228,81	17.728,67
SERB	00121	SERBATOIO S. CRISTINA : VIA S. CRISTINA	1998	1.355,70	260,67	1.094,73
SERB	00140	ACQUISTO SERBATOIO DI MONTENAGGIO MC. 110 TOTALI	2000	581,17	40,68	540,49
SERB	00150	ACQUISTO SERBATOIO TOMBA MC. 23 TOTALI - ACQUEDOTTO M. MAGGIO	2000	121,52	8,51	113,01
SERB	00160	ACQUISTO MANUFATTO E OPERE CIVILI SORGENTE TOMBA	2000	31,75	2,23	29,52
SERB	00170	ACQUISTO MANUFATTO E OPERE CIVILI SORGENTE CECOLI	2000	15,90	1,12	14,78
SERB	00180	ACQUISTO SERBATOIO PIEVE VECCHIO MC. 10 TOTALI	2000	62,83	3,88	49,14
SERB	00190	ACQUISTO SERBATOIO PIEVE NUOVO MC. 25 TOTALI	2000	132,08	9,24	122,84
SERB	00200	ACQUISTO SERBATOIO PALAZZO MC. 15 TOTALI	2000	79,25	5,55	73,70
SERB	00210	ACQUISTO SERBATOIO CENTRALINA MONTENAGGIO MC. 6	2000	31,72	2,23	29,49
SERB	00220	ACQUISTO SERBATOIO CALGIANO MC. 19 TOTALI	2000	100,38	7,63	92,75
SERB	00230	ACQUISTO SERBATOIO MONTORISO MC. 31 TOTALI	2000	98,12	4,07	94,05
SERB	00240	ACQUISTO SERBATOIO VIACUPA MC. 15 TOTALI	2000	79,25	5,55	73,70
SERB	00250	ACQUISTO SERBATOIO GAMBUTI MC. 110 TOTALI	2000	581,17	40,68	540,49
SERB	00260	ACQUISTO SERBATOIO CASTELLO CIMA MC. 2 TOTALI	2000	10,57	0,73	9,84
SERB	00270	ACQUISTO SERBATOIO CASTELLO MC. 83 TOTALI	2000	438,52	30,69	407,83
SERB	00280	ACQUISTO SERBATOIO VALLE MC. 1 TOTALI	2000	6,28	0,36	4,92
SERB	00290	ACQUISTO SERBATOIO MAMMO MC. 50 TOTALI	2000	264,17	18,49	245,68
SERB	00300	SERBATOIO CORPOLO : VIA DELLE SELVE - CORPOLO	2000	5.487,87	384,16	5.103,81
SERB	00310	SERBATOIO S. CRISTINA - FORTITURA SCALE INOX	2000	4.131,66	72,30	4.059,36
SERB	00320	SERBATOIO CORPOLO : VIA DELLE SELVE	2000	4.131,66	72,30	4.059,36
SERB	00330	TORRE PIEZOMETRICA ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INTERNI AL CANT	2001	12.916,47	228,07	12.688,40
SERB	00661	SERBATOIO PARADISO VIA SCUOLE CORIANO	2002	38.936,17	0,00	38.936,17
SERB	01060	MANUTENZIONE STRAORDINARIA -2002 SERBATOIO BELVEDERE	2002	2.472,22	0,00	2.472,22
SERB	00011	MANUT. STRAORD. IMP. DI SOLLEVAM. SERB. PENSILE TORRE PEDRERA	2000	15.486,13	2.318,82	13.167,31
SERB	00031	IMPIANTO DI SOLLEVAM. SERBATOIO COVIGNANO VECCHIO	1998	63.684,05	22.254,43	41.329,62
SERB	00060	SERBATOIO MC. 8.000 VIA DELLE FRAGOLE COVIGNANO	1995	219.432,44	120.687,82	98.744,62
SERB	00060	LAVORI DI AMPLIAMENTO 1997 SERBATOIO 8000 COVIGNANO	1997	3.178,75	1.430,46	1.748,29
SERB	00071	IMPIANTO DI SOLLEVAM. SERBATOIO PENSILE MIRAMARE	1996	3.030,49	1.235,67	2.294,82
SERB	00081	IMPIANTO DI SOLLEVAM. SERBATOIO AL PIANO TERRA MIRAMARE	1998	1.577,58	562,16	1.025,42
SERB	00091	IMPIANTO DI SOLLEVAM. SERBATOIO S. PAOLO : VIA S. PAOLO	1997	1.973,50	388,07	1.585,43
SERB	00101	IMPIANTO DI SOLLEVAM. SERBATOIO ZONA ARTIGIANALE	1998	4.570,83	1.569,78	2.971,05
SERB	00111	IMPIANTO DI SOLLEVAM. SERBATOIO CORPOLO	1995	48.486,05	31.515,91	16.970,14
SERB	00111	IMPIANTO DI SOLLEVAM. SERBATOIO CORPOLO	1996	3.009,46	1.063,32	1.946,14
SERB	00120	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SERBATOIO SERRA MARIGNANO	1995	11.065,45	7.189,26	3.871,17
SERB	00120	LAVORI DI AMPLIAMENTO 1996 SERB. SERRA MARIGNANO	1996	1.090,99	599,83	490,76
SERB	00120	LAVORI DI AMPLIAMENTO 1997 SERBATOIO SERRA MARIGNANO	1997	4.219,00	1.668,55	2.320,45
SERB	00120	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SERBATOIO SERRA MARIGNANO	1998	5.277,44	1.847,09	3.430,35
SERB	00140	NUOVO IMPIANTO DI SICUREZZA. SERBATOIO MC. 8.000	1999	10.623,15	2.665,80	7.957,35
SERB	00150	IMPIANTO DI SOLLEVAM. SERBATOIO COVIGNANO VECCHIO	1999	373,86	93,42	280,24
SERB	00160	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI MONITORAGGIO BIODIDO SERBATOIO 8000	2001	5.412,72	270,64	5.142,08
SERB	00170	LAVORI DI AMPLIAMENTO 2002 SERBATOIO 8000 COVIGNANO	2002	67.056,59	0,00	67.056,59
SERB	00180	IMP. DI SOLLEVAMENTO SERBATOIO BELVEDERE MORGIANO	2002	28.657,21	0,00	28.657,21
ISPO		TOTALE SERBATOI AMMORTIZZATI DAL GESTORE		1.702.527,16	426.308,79	1.276.218,37
ISPO		TOTALE SERBATOI		1.702.527,16	426.308,79	1.276.218,37
CATEGORIA: PRESE D'ACQUA						
CODICE	N°	DESCRIZIONE	ANNO ENTRATA IN SERVIZIO	VALORE STORICO	FONDO D'AMM.TO AL 31/12/2018	VALORE RESIDUO AL 31/12/2018
ALLA	00280	ALLACCI/DERIVAZIONI A N. 1261 UTENTI ANNO 1995	1995	433.176,88	134.284,82	298.892,06
ALLA	00280	ALLACCI A5 UTENTI ANNO (OPERE IN CORSO 1995)	1995	12.169,89	3.295,85	8.884,04
ALLA	00290	ALLACCI/DERIVAZIONI A N. 216 UTENTI ANNO 1995	1995	74.850,66	23.203,69	51.646,97
ALLA	00300	ALLACCI/DERIVAZIONI A N. 28 UTENTI ANNO 1995	1995	2.991,59	927,39	2.064,20
ALLA	00310	ALLACCI/DERIVAZIONI A N. 164 UTENTI ANNO 1995	1995	40.834,75	12.565,78	27.968,97
ALLA	00310	ALLACCI A5 UTENTI ANNO (OPERE IN CORSO 1995)	1995	2.260,33	610,31	1.650,02
ALLA	00320	ALLACCI/DERIVAZIONI A N. 75 UTENTI ANNO 1995	1995	8.238,29	2.119,85	4.718,44
ALLA	00320	ALLACCI A5 UTENTI ANNO (OPERE IN CORSO 1995)	1995	230,5	63,61	171,89
ALLA	00330	ALLACCI/DERIVAZIONI A N. 4 UTENTI ANNO 1995	1995	754,1	232,86	518,24
ALLA	00340	ALLACCI/DERIVAZIONI A N. 958 UTENTI (ANNO 1995)	1996	381.102,74	102.867,75	278.234,99
ALLA	00350	ALLACCI/DERIVAZIONI A N. 143 UTENTI (ANNO 1996)	1996	78.183,72	21.109,62	57.074,10
ALLA	00360	ALLACCI/DERIVAZIONI A N. 15 UTENTI (ANNO 1996)	1996	8.129,36	2.192,51	5.927,85
ALLA	00370	ALLACCI/DERIVAZIONI A N. 98 UTENTI (ANNO 1996)	1996	96.857,11	19.361,44	41.905,67
ALLA	00380	ALLACCI/DERIVAZIONI A N. 66 UTENTI (ANNO 1996)	1996	31.052,65	8.364,20	22.688,45
ALLA	00390	ALLACCI/DERIVAZIONI A N. 55 UTENTI (ANNO 1996)	1996	12.642,38	3.413,45	9.228,93
ALLA	00400	ALLACCI/DERIVAZIONI A N. 15 UTENTI (ANNO 1996)	1996	8.289,13	2.238,06	6.051,05
ALLA	00410	ALLACCI/DERIVAZIONI A N. 988 UTENTI (ANNO 1997)	1997	437.995,38	98.542,21	339.423,17
ALLA	00420	ALLACCI/DERIVAZIONI A N. 193 UTENTI (ANNO 1997)	1997	144.502,21	32.513,00	111.989,21
ALLA	00430	ALLACCI/DERIVAZIONI A N. 18 UTENTI (ANNO 1997)	1997	17.031,51	3.892,11	13.139,40
ALLA	00440	ALLACCI/DERIVAZIONI A N. 90 UTENTI (ANNO 1997)	1997	81.644,71	18.370,08	63.274,63
ALLA	00450	ALLACCI/DERIVAZIONI A N. 39 UTENTI (ANNO 1997)	1997	28.351,85	6.378,98	21.972,87
ALLA	00460	ALLACCI/DERIVAZIONI A N. 46 UTENTI (ANNO 1997)	1997	31.736,28	7.141,10	24.595,18
ALLA	00470	ALLACCI/DERIVAZIONI A N. 22 UTENTI (ANNO 1997)	1997	11.624,73	2.615,58	9.009,15

ALLA	00480	ALLACCI DERIVAZIONI A N.838 UTENTI (ANNO 1998)	1998	523.050,33	91.533,82	431.516,51
ALLA	00490	ALLACCI DERIVAZIONI A N.136 UTENTI (ANNO 1998)	1998	91.692,52	10.804,20	75.116,32
ALLA	00500	ALLACCI DERIVAZIONI A N.111 UTENTI (ANNO 1998)	1998	59.734,88	10.453,59	49.281,29
ALLA	00510	ALLACCI DERIVAZIONI A N.142 UTENTI (ANNO 1998)	1998	121.188,65	21.207,90	99.980,75
ALLA	00520	ALLACCI DERIVAZIONI A N.91 UTENTI (ANNO 1998)	1998	47.414,63	8.297,66	39.117,07
ALLA	00530	ALLACCI DERIVAZIONI A N.74 UTENTI (ANNO 1998)	1998	50.089,66	8.765,68	41.323,98
ALLA	00540	ALLACCI DERIVAZIONI A N.45 UTENTI (ANNO 1998)	1998	23.889,81	4.177,22	19.692,59
ALLA	00550	ALLACCI DERIVAZIONI A N.3 UTENTI (ANNO 1998)	1998	1.569,06	274,00	1.294,06
ALLA	00560	ALLACCI DERIVAZIONI A N.644 UTENTI (ANNO 1999)	1999	533.774,76	68.721,85	465.052,91
ALLA	00570	ALLACCI DERIVAZIONI A N.124 UTENTI (ANNO 1999)	1999	89.786,46	11.223,55	78.562,91
ALLA	00580	ALLACCI DERIVAZIONI A N.86 UTENTI (ANNO 1999)	1999	71.579,83	8.947,48	62.632,35
ALLA	00590	ALLACCI DERIVAZIONI A N.153 UTENTI (ANNO 1999)	1999	185.695,59	20.638,95	144.456,64
ALLA	00600	ALLACCI DERIVAZIONI A N.69 UTENTI (ANNO 1999)	1999	86.197,15	8.274,85	57.922,30
ALLA	00610	ALLACCI DERIVAZIONI A N.75 UTENTI (ANNO 1999)	1999	83.636,29	10.479,63	73.156,66
ALLA	00620	ALLACCI DERIVAZIONI A N.46 UTENTI (ANNO 1999)	1999	23.392,17	2.904,02	20.488,15
ALLA	00630	ALLACCI DERIVAZIONI A N.18 UTENTI (ANNO 1999)	1999	11.689,00	1.583,62	9.665,38
ALLA	00640	ALLACCI DERIVAZIONI A N.17 UTENTI (ANNO 1999)	1999	15.459,75	1.932,47	13.527,28
ALLA	00650	ALLACCI DERIVAZIONI A N.726 UTENTI (ANNO 2000)	2000	705.670,19	52.905,27	652.744,92
ALLA	00660	ALLACCI DERIVAZIONI A N.110 UTENTI (ANNO 2000)	2000	187.371,25	12.562,84	154.818,41
ALLA	00670	ALLACCI DERIVAZIONI A N.125 UTENTI (ANNO 2000)	2000	120.456,51	9.004,24	111.422,27
ALLA	00680	ALLACCI DERIVAZIONI A N.102 UTENTI (ANNO 2000)	2000	189.826,02	12.738,95	157.089,07
ALLA	00690	ALLACCI DERIVAZIONI A N.51 UTENTI (ANNO 2000)	2000	84.505,65	4.837,88	59.667,77
ALLA	00700	ALLACCI DERIVAZIONI A N.124 UTENTI (ANNO 2000)	2000	119.741,43	8.989,61	110.750,84
ALLA	00710	ALLACCI DERIVAZIONI A N.72 UTENTI (ANNO 2000)	2000	34.612,20	2.595,91	32.016,29
ALLA	00720	ALLACCI DERIVAZIONI A N.75 UTENTI (ANNO 2000)	2000	34.414,33	2.581,08	31.833,25
ALLA	00730	ALLACCI DERIVAZIONI A N.115 UTENTI (ANNO 2000)	2000	143.353,79	10.751,53	132.602,26
ALLA	01040	ALLACCI DERIVAZIONI AD UTENTI (ANNO 2001)	2001	689.596,59	17.239,66	672.346,93
ALLA	01050	ALLACCI DERIVAZIONI AD UTENTI (ANNO 2001)	2001	185.180,15	4.129,50	161.050,65
ALLA	01060	ALLACCI DERIVAZIONI AD UTENTI (ANNO 2001)	2001	107.604,85	2.890,12	104.714,73
ALLA	01070	ALLACCI DERIVAZIONI AD UTENTI (ANNO 2001)	2001	223.778,47	5.584,48	218.194,01
ALLA	01080	ALLACCI DERIVAZIONI AD UTENTI (ANNO 2001)	2001	70.657,91	1.798,45	68.859,46
ALLA	01090	ALLACCI DERIVAZIONI AD UTENTI (ANNO 2001)	2001	73.231,96	1.830,80	71.401,16
ALLA	01100	ALLACCI DERIVAZIONI AD UTENTI (ANNO 2001)	2001	69.388,45	1.734,71	67.653,74
ALLA	01110	ALLACCI DERIVAZIONI AD UTENTI (ANNO 2001)	2001	36.424,92	910,62	35.514,30
ALLA	01120	ALLACCI DERIVAZIONI AD UTENTI (ANNO 2001)	2001	189.640,05	4.211,00	185.429,05
ALLA	01130	ALLACCI DERIVAZIONI AD UTENTI (ANNO 2002)	2002	370.486,23	0,00	370.486,23
ALLA	01140	ALLACCI DERIVAZIONI AD UTENTI (ANNO 2002)	2002	103.694,87	0,00	103.694,87
ALLA	01150	ALLACCI DERIVAZIONI AD UTENTI (ANNO 2002)	2002	30.605,80	0,00	30.605,80
ALLA	01160	ALLACCI DERIVAZIONI AD UTENTI (ANNO 2002)	2002	70.647,15	0,00	70.647,15
ALLA	01170	ALLACCI DERIVAZIONI AD UTENTI (ANNO 2002)	2002	33.656,96	0,00	33.656,96
ALLA	01180	ALLACCI DERIVAZIONI AD UTENTI (ANNO 2002)	2002	28.291,33	0,00	28.291,33
ALLA	01190	ALLACCI DERIVAZIONI AD UTENTI (ANNO 2002)	2002	8.490,11	0,00	8.490,11
ALLA	01200	ALLACCI DERIVAZIONI AD UTENTI (ANNO 2002)	2002	39.788,85	0,00	39.788,85
ALLA	01210	ALLACCI DERIVAZIONI AD UTENTI (ANNO 2002)	2002	72.104,34	0,00	72.104,34
ALLA		SUB-TOTALE ALLACCI IDRICI		7.835.099,20	952.576,67	6.882.522,53
ALLA	00010	N. 114 ALLACCIAMENTI ALLE FOGNATURE ESEGUITI A PRIVATI	1999	77.238,20	6.758,34	70.479,86
ALLA	00020	N. 133 ALLACCIAMENTI ALLE FOGNATURE ESEGUITI A PRIVATI	2000	117.626,02	7.313,75	109.796,27
ALLA	00030	N. 1 ALLACCIAMENTO ALLE FOGNATURE ESEGUITO A PRIVATI	2000	406,42	29,34	380,08
ALLA	00040	N. 13 ALLACCIAMENTI ALLE FOGNATURE ESEGUITI A PRIVATI	2000	8.710,84	608,84	8.102,00
ALLA	00050	N. 3 ALLACCIAMENTI ALLE FOGNATURE ESEGUITI A PRIVATI	2000	1.943,69	121,48	1.822,21
ALLA	00060	N. 8 ALLACCIAMENTI ALLE FOGNATURE ESEGUITI A PRIVATI	2000	6.218,92	388,88	5.830,03
ALLA	00070	N. 17 ALLACCIAMENTI ALLE FOGNATURE ESEGUITI A PRIVATI	2000	12.325,76	770,36	11.555,40
ALLA	00080	N. 130 ALLACCIAMENTI ALLE FOGNATURE ESEGUITI A PRIVATI	2001	112.405,61	2.810,02	109.595,59
ALLA	00090	N. 8 ALLACCIAMENTI ALLE FOGNATURE ESEGUITI A PRIVATI	2001	12.188,77	304,17	11.884,60
ALLA	00100	N. 18 ALLACCIAMENTI ALLE FOGNATURE ESEGUITI A PRIVATI	2001	12.608,72	315,22	12.293,50
ALLA	00110	N. 8 ALLACCIAMENTI ALLE FOGNATURE ESEGUITI A PRIVATI	2001	6.450,96	161,28	6.289,68
ALLA	00120	N. 1 ALLACCIAMENTO ALLE FOGNATURE ESEGUITO A PRIVATI	2001	299,67	7,49	292,18
ALLA	00130	N. 4 ALLACCIAMENTI ALLE FOGNATURE ESEGUITI A PRIVATI	2001	3.236,40	80,91	3.155,49
ALLA	00140	N. 28 ALLACCIAMENTI ALLE FOGNATURE ESEGUITI A PRIVATI	2001	16.457,96	411,45	16.046,51
ALLA	00150	N. 71 ALLACCIAMENTI ALLE FOGNATURE ESEGUITI A PRIVATI	2002	70.853,85	0,00	70.853,85
ALLA	00160	N. 3 ALLACCIAMENTI ALLE FOGNATURE ESEGUITO A PRIVATI	2002	9.161,03	0,00	9.161,03
ALLA	00170	N. 19 ALLACCIAMENTI ALLE FOGNATURE ESEGUITI A PRIVATI	2002	17.103,20	0,00	17.103,20
ALLA	00180	N. 4 ALLACCIAMENTI ALLE FOGNATURE ESEGUITI A PRIVATI	2002	4.788,28	0,00	4.788,28
ALLA	00190	N. 1 ALLACCIAMENTO ALLE FOGNATURE ESEGUITO A PRIVATI	2002	2.765,47	0,00	2.765,47
ALLA	00200	N. 4 ALLACCIAMENTI ALLE FOGNATURE ESEGUITO A PRIVATI	2002	4.361,19	0,00	4.361,19
ALLA	00210	N. 1 ALLACCIAMENTO ALLE FOGNATURE ESEGUITO A PRIVATI	2002	2.782,02	0,00	2.782,02
ALLA	00220	N. 2 ALLACCIAMENTI ALLE FOGNATURE ESEGUITI A PRIVATI	2002	1.487,43	0,00	1.487,43
ALLA	00230	N. 19 ALLACCIAMENTI ALLE FOGNATURE ESEGUITI A PRIVATI	2002	13.743,80	0,00	13.743,80
ALLA		SUB-TOTALE ALLACCI FOGNARI		515.438,69	20.875,42	495.563,27
ALLA		TOTALE ALLACCI AMMORTIZZATI DAL GESTORE		8.350.529,29	972.652,09	7.377.877,20
ALLA		TOTALE ALLACCI		8.350.529,29	972.652,09	7.377.877,20
CATEGORIA: CONTATORI						
CODICE	N°	DESCRIZIONE	ANNO ENTRATA IN SERVIZIO	VALORE STORICO	FONDO D'AMM. TO AL 31/12/2018	VALORE RESIDUO AL 31/12/2018
CONT	00280	N. 3502 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1995 COMUNE DI RIMINI	1995	82.111,54	53.372,48	28.739,06
CONT	00290	N. 927 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1995 COMUNI VALCONCA	1995	21.735,41	14.128,01	7.607,40
CONT	00300	N. 102 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1995 COMUNE DI MORCIANO	1995	2.391,60	1.564,54	837,06
CONT	00310	N. 682 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1995 COMUNE DI SARCANGELO	1995	15.521,94	10.069,24	5.452,70
CONT	00320	N. 217 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1995 COMUNE DI VERUCCHIO	1995	5.089,61	3.307,20	1.782,41
CONT	00330	N. 5 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1995 COMUNE DI TORRIANA	1995	117,24	78,18	41,06
CONT	00340	N. 2.584 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1996 COMUNE DI RIMINI	1996	67.721,62	37.248,88	30.472,74
CONT	00350	N. 914 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1996 COMUNI VALCONCA	1996	16.886,26	9.287,46	7.598,80
CONT	00360	N. 176 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1996 COMUNE DI MORCIANO	1996	2.558,30	1.415,96	1.142,34
CONT	00370	N. 731 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1996 COMUNE DI SARCANGELO	1996	17.261,76	9.493,98	7.767,77
CONT	00380	N. 222 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1996 COMUNE DI VERUCCHIO	1996	4.714,47	2.592,97	2.121,50
CONT	00390	N. 147 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1996 COMUNI VALMARECCHIA	1996	3.379,63	1.858,78	1.520,85
CONT	00400	N. 573 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1996 COMUNI MEDIA VALCONCA	1996	5.184,89	2.851,89	2.333,00
CONT	00410	N. 3.473 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1997 COMUNE DI RIMINI	1997	69.693,61	31.361,85	38.331,76
CONT	00420	N. 723 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1997 COMUNI VALCONCA	1997	12.967,97	6.835,60	7.132,37
CONT	00430	N. 38 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1997 COMUNE DI MORCIANO	1997	591,76	266,31	325,45
CONT	00440	N. 663 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1997 COMUNE DI SANTARCANGELO	1997	13.365,60	6.014,52	7.351,08
CONT	00450	N. 171 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1997 COMUNE DI VERUCCHIO	1997	4.387,29	1.974,28	2.413,01
CONT	00460	N. 138 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1997 COMUNI VALMARECCHIA	1997	3.608,04	1.623,60	1.984,44
CONT	00470	N. 80 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1997 COMUNI MEDIA VALCONCA	1997	1.714,19	771,39	942,80
CONT	00480	N. 5 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1997 COMUNI DEL SENATELLO	1997	385,4	173,43	211,97
CONT	00490	N. 3.494 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1998 COMUNE DI RIMINI	1998	66.288,55	29.193,96	43.074,59
CONT	00500	N. 458 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1998 COMUNI VALCONCA	1998	7.625,09	2.668,78	4.956,31
CONT	00510	N. 206 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1998 COMUNI UNIONE VALCONCA	1998	3.607,84	1.262,73	2.345,11
CONT	00520	N. 484 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1998 COMUNE DI SANTARCANGELO	1998	9.292,98	3.252,55	6.040,43
CONT	00530	N. 228 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1998 COMUNE DI VERUCCHIO	1998	4.173,18	1.468,62	2.712,56
CONT	00540	N. 138 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1998 COMUNI VALMARECCHIA	1998	2.412,08	944,23	1.567,85
CONT	00550	N. 26 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1998 COMUNI MEDIA VALCONCA	1998	735,24	257,32	477,92
CONT	00560	N. 2 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1998 COMUNI DEL SENATELLO	1998	332,4	116,34	216,06
CONT	00570	N. 710 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1998 COMUNE DI SAN LEO	1998	999,49	349,82	649,67
CONT	00580	N. 3.410 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1999 COMUNE DI RIMINI	1999	83.977,04	15.984,25	47.992,79
CONT	00590	N. 496 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1999 COMUNI VALCONCA	1999	6.783,56	1.685,90	5.097,66
CONT	00600	N. 219 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1999 COMUNI UNIONE VALCONCA	1999	5.208,78	1.302,20	3.906,58
CONT	00610	N. 543 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1999 COMUNE DI SANTARCANGELO	1999	11.384,12	2.841,03	8.523,09
CONT	00620	N. 308 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1999 COMUNE DI VERUCCHIO	1999	4.960,64	1.240,15	3.720,49
CONT	00630	N. 181 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1999 COMUNI VALMARECCHIA	1999	3.339,61	834,75	2.504,86

CONT	00640	N.82 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1999 COMUNI MEDIA VALCONCA	1999	901,54	225,38	676,16
CONT	00650	N.278 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1999 COMUNE DI SAN LEO	1999	3.485,62	863,80	2.621,72
CONT	00660	N.162 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 1999 COMUNE DI BELLARIA	1999	2.295,50	573,87	1.721,63
CONT	00670	N. 3.275 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2000 COMUNE DI RIMINI	2000	61.910,13	9.286,52	52.623,61
CONT	00680	N. 584 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2000 COMUNI VALCONCA	2000	8.210,21	1.231,53	6.978,68
CONT	00690	N. 387 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2000 COMUNI UNIONE VALCONCA	2000	5.431,75	854,77	4.576,98
CONT	00700	N. 643 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2000 COMUNE DI SANTARCANGELO	2000	11.193,43	1.679,01	9.514,42
CONT	00710	N.408 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2000 COMUNE DI VERUCCHIO	2000	7.526,29	1.128,84	6.397,35
CONT	00720	N.397 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2000 COMUNI VALMARECCHIA	2000	7.060,63	1.069,09	5.991,54
CONT	00730	N.72 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2000 COMUNI MEDIA VALCONCA	2000	942,6	141,39	801,21
CONT	00740	N.387 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2000 COMUNI DI SAN LEO NOVAFELTRIA	2000	4.311,16	646,88	3.664,28
CONT	00750	N.1.159 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2000 COMUNE DI BELLARIA	2000	22.758,99	3.413,85	19.345,14
CONT	00980	N. 2.854 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2001 COMUNE DI RIMINI	2001	98.225,09	2.811,25	95.413,84
CONT	00990	N. 616 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2001 COMUNI EX VALCONCA	2001	13.065,26	663,20	12.402,02
CONT	01000	N. 252 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2001 COMUNI UNIONE VALCONCA	2001	4.200,91	210,05	3.990,86
CONT	01010	N. 732 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2001 COMUNE DI SANTARCANGELO	2001	12.497,86	624,88	11.872,97
CONT	01020	N.375 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2001 COMUNE DI VERUCCHIO	2001	7.437,57	371,88	7.065,69
CONT	01030	N.176 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2001 COMUNI VALMARECCHIA	2001	3.306,08	165,30	3.140,78
CONT	01040	N. 1 CONTATORE UTENTI ACQUA ANNO 2001 ADD. DEL SENATELLO	2001	108,57	5,43	103,14
CONT	01050	N.89 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2001 COMUNI MEDIA VALCONCA	2001	1.177,13	58,86	1.118,27
CONT	01060	N.553 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2001 COMUNI DI SAN LEO NOVAFELTRIA	2001	7.063,31	363,17	6.700,14
CONT	01070	N.512 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2001 COMUNE DI BELLARIA	2001	15.506,44	775,32	14.731,12
CONT	01080	N. 4.513 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2002 COMUNE DI RIMINI	2002	83.694,31	0,00	83.694,31
CONT	01090	N. 346 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2002 COMUNI EX VALCONCA	2002	7.127,38	0,00	7.127,38
CONT	01100	N. 195 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2002 COMUNI UNIONE VALCONCA	2002	4.909,11	0,00	4.909,11
CONT	01110	N. 526 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2002 COMUNE DI SANTARCANGELO	2002	9.137,77	0,00	9.137,77
CONT	01120	N.302 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2002 COMUNE DI VERUCCHIO	2002	5.191,01	0,00	5.191,01
CONT	01130	N.80 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2002 COMUNI VALMARECCHIA	2002	578,79	0	578,79
CONT	01140	N.85 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2002 COMUNI MEDIA VALCONCA	2002	1.227,78	0,00	1.227,78
CONT	01150	N.321 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2002 COMUNI DI SAN LEO NOVAFELTRIA	2002	4.787,56	0,00	4.787,56
CONT	01160	N.515 CONTATORI UTENTI ACQUA ANNO 2002 COMUNE DI BELLARIA	2002	10.293,63	0,00	10.293,63
CONT		TOTALE CONTATORI AMMORTIZZATI DAL GESTORE		926.377,40	279.695,36	646.682,04
CONT		TOTALE CONTATORI		926.377,40	279.695,36	646.682,04
CATEGORIA: TERRENI						
CODICE	N°	DESCRIZIONE	ANNO ENTRATA IN SERVIZIO	VALORE STORICO	FONDO D'AMM.TO AL 31/12/2018	VALORE RESIDUO AL 31/12/2018
AREE		Terrano impianto S.Giustina		1.649.288,62	0,00	1.649.288,62
AREE		Terrano impianto Gogara		42.352,80	0,00	42.352,80
AREE		Terrano impianto Pietrascocca		11.643,78	0,00	11.643,78
AREE		Terrano impianto Grotta rossa		2.143,90	0,00	2.143,90
AREE		Terrano impianto Budrio		891,02	0,00	891,02
AREE		TOTALE TERRENI		1.706.319,32	0,00	1.706.319,32



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 14

Convenzione tra Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per
i servizi idrici e rifiuti e SIS S.p.A.

**CONVENZIONE TRA AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA
ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI E SOCIETÀ ITA-
LIANA SERVIZI S.P.A. (in forma abbreviata S.I.S. S.p.A.)**

Premesso che

1. L'art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 ha previsto che *“a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012 [...]”*;
2. in ottemperanza a quanto disposto dal predetto decreto legislativo, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto, con L.R. n. 23/2011:
 - a. a individuare l'intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale;
 - b. a istituire, con decorrenza 1° gennaio 2012, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (d'ora in poi ATERSIR o Agenzia), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato (d'ora in poi SII) e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo il subentro della stessa in tutti i rapporti giuridici delle sopresse forme di cooperazione e pertanto anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;

	c. a determinare gli organi dell'Agenzia, tra i quali i Consigli Locali e il Consiglio d'Ambito, assegnando: ai primi, la funzione di individuare, anche aggregandoli, i bacini di affidamento, nelle	
	more del riallineamento delle scadenze delle attuali gestioni e di proporre al Consiglio d'Ambito la forma di gestione dei servizi medesimi; al secondo, l'approvazione del Piano d'Ambito e	
	l'assunzione delle decisioni finali in ordine alle modalità di affidamento dei servizi;	
	3. S.I.S. S.p.A. è società, a totale capitale pubblico, proprietaria dei beni strumentali alla gestione del servizio idrico integrato ubicati nei territori dei Comuni soci;	
	4. con le deliberazioni nn. 18/2001 e 19/2001 della disciolta AATO 9 Rimini, ai sensi della Legge Regionale n. 25/99, sono state salvaguardate per il servizio idrico integrato le gestioni di AMIR SpA e S.I.S. SpA, poi confluite in HERA SpA relativamente ai soli rami d'azienda funzionali alla gestione dei servizi pubblici locali, con decorrenza dal 31/12/2002;	
	5. con uno specifico contratto d'affitto di ramo d'azienda, stipulato nel 2002, S.I.S. ha regolato i rapporti con HERA prevedendo che gli ammortamenti dei beni in affitto confluiscono in uno specifico Fondo di Ripristino Beni di Terzi (FRBT) accantonato dal gestore del S.I.I. e disciplinando la destinazione di tale fondo;	
	6. in data 14 marzo 2002, veniva quindi stipulata apposita convenzione per la prima attivazione del Servizio Idrico Integrato, approvata dalla disciolta AATO n. 9 Rimini, e oggetto di successivo adeguamento con atto del 14 marzo 2005;	

	7. l'affidamento del Servizio Idrico Integrato in capo al gestore HERA S.p.A. nella Provincia di Rimini risulta scaduto il 14/03/2012;	
	8. la gestione suddetta prosegue a tutt'oggi in regime di proroga, trattandosi di servizi essenziali alla collettività e dunque non suscettibili di interruzione;	
	9. l'art. 147, comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006 consente, qualora l'ambito territoriale ottimale del SII consista nell'intero territorio regionale, l'affidamento ad un gestore unico in ambiti comunque non inferiori ai territori provinciali o delle città metropolitane;	
	10. l'art. 3-bis, comma 1-bis del D.L. 13/08/2011, n. 138 prevede che siano gli enti di governo d'ambito (ATERSIR) a procedere all'affidamento, mediante la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, dando conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e motivandone le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;	
	11. la relazione di cui al punto precedente deve inoltre comprendere un Piano Economico-Finanziario, che contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti;	
	12. ATERSIR ha determinato, con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 48/2015 del 29 settembre 2015, di procedere alla scelta della forma di gestione e conseguentemente all'avvio delle procedure finalizzate al nuovo affidamento del SII nel bacino territoriale di Rimini, per il superamento dell'attuale regime di proroga;	

	13. la modalità di affidamento prescelta è quella costituita dalla gara per la concessione del servizio a terzi;	
	14. ATERSIR, con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.1/2018 del 31 gennaio 2018, ha dato mandato agli uffici tecnici per la redazione degli atti della procedura aperta per l'affidamento in concessione del SII per la provincia di Rimini ad esclusione del comune di Maiolo, inserendo il VRD aggiornato con Determinazione 124/2017 e allegando specifica documentazione tecnica corrispondente all'attuale stato di fatto del servizio posto a base di gara;	
	15. S.I.S. ha formalizzato la propria disponibilità al finanziamento di infrastrutture relative al S.I.I. attraverso la sottoscrizione con ATERSIR in data 19/11/2015 di uno specifico accordo di programma quadro e di alcuni accordi attuativi che sono stati perfezionati nel corso degli anni successivi in coerenza con la pianificazione degli investimenti approvata dall'Ente di regolazione regionale; le succitate convenzioni, a fronte del finanziamento delle opere, prevedevano il riconoscimento alla patrimoniale di un canone annuale destinato alla copertura dei costi di capitale sostenuti per i finanziamenti, coperto dalla tariffa del servizio idrico integrato e pertanto calcolato secondo le regole stabilite dalle metodologie tariffarie vigenti; AEEGSI (oggi ARERA) a seguito di specifica istanza motivata formulata da ATERSIR, finalizzata a dimostrare come tali modalità di finanziamento risultano assolutamente coerenti con le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità rispetto agli obiettivi di piano, dimostrando l'esistenza di un vantaggio economico per l'utenza, ha	

	accolto le suddette istanze dando il proprio assenso all'impostazione adottata dall'Ente di regolazione;	
	16. a seguito della scadenza contrattuale dell'attuale affidamento del SII e in vista del nuovo affidamento, essendo necessario disporre di un nuovo Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. Emilia Romagna 23/12/2011, ATERSIR, con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 47 del 29 settembre 2015 ha approvato il Piano d'Ambito del SII per il territorio provinciale di Rimini, che contiene il programma degli investimenti 2014-2039, successivamente modificato con deliberazione CAMB/2016/8 del 29 gennaio 2016 e con CAMB/2017/9 del 27 febbraio 2017, e aggiornato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 76 del 10 dicembre 2018, prevedendo, in coerenza con il vigente quadro normativo e tariffario, il finanziamento da parte delle società patrimoniali di nuove opere da realizzare;	
	17. la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 47 del 29 settembre 2015 di cui sopra precisava altresì che i corrispettivi per l'utilizzo dei beni di terzi venissero rideterminati in coerenza con le disposizioni normative e tariffarie in vigore al momento della predisposizione degli atti relativi all'affidamento;	
	18. con deliberazione assunta nell'Assemblea ordinaria dei soci del 17/10/2018, S.I.S. SpA ha manifestato la propria disponibilità a destinare risorse al finanziamento di nuovi interventi del SII;	
	19. ATERSIR e S.I.S. SpA con spirito di mutua collaborazione ritengono opportuno sottoscrivere uno strumento convenzionale che regoli il rapporto tra l'Agenzia e la Società patrimoniale in particolare in relazione:	

	convengono e stipulano quanto segue	
	Art. 1 Oggetto della Convenzione	
	1.1 Con la presente convenzione, S.I.S. si obbliga a mettere a disposizione del soggetto incaricato della gestione del SII, di cui alla procedura di affidamento meglio precisata nelle premesse, i beni, gli impianti e le dotazioni patrimoniali di sua proprietà (o comunque dalla stessa detenuti) strumentali allo svolgimento del servizio idrico integrato, dietro pagamento di un canone, come previsto all'art. 7 della presente convenzione.	
	1.2 L'Agenzia determina il canone che il soggetto incaricato della gestione del Servizio Idrico Integrato corrisponderà ad S.I.S.	
	1.3 S.I.S. si impegna a finanziare investimenti infrastrutturali funzionali al S.I.I. utilizzando risorse provenienti dal canone nonché dagli incassi relativi alla restituzione del fondo di ripristino beni di terzi riferito alla gestione precedente.	
	Art. 2 Durata della Convenzione	
	La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione e scadenza alla data di cessazione dell'efficacia della convenzione di gestione relativa al SII del bacino locale di Rimini - di cui alla procedura di affidamento indicata nelle premesse - fatte salve successive proroghe, anche tacite, della stessa, e comunque fino alla data di stipula di una nuova convenzione.	
	Art. 3 Dotazione del Gestore del SII	
	S.I.S. mette a disposizione del Gestore i beni strumentali al SII, identificati nell'allegato A, il quale assume valore di stato di consistenza per tutti gli effetti di legge.	

Art. 4 Poteri e Funzioni dell'Agenzia

All'Agenzia spettano nei confronti di S.I.S. tutti i poteri e le funzioni individuate dalle vigenti norme nazionali e regionali, alle quali integralmente le parti intendono riportarsi. L'Agenzia, inoltre:

- a) Esercita le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e pertanto anche della messa in disponibilità del gestore dei beni funzionali alla produzione del SII;
- b) Pianifica gli investimenti per il miglioramento o l'estensione delle dotazioni patrimoniali, ponendo a carico del gestore del servizio tutti gli oneri finanziari relativi, inclusi quelli di capitale; in particolare disciplina gli investimenti finanziati dalla società patrimoniale con specifici accordi attuativi in coerenza con quanto stabilito dal vigente accordo quadro.
- c) Controlla il servizio e l'attività del gestore al fine di assicurare la corretta applicazione della tariffa, verifica il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti, valuta l'andamento economico finanziario della gestione e definisce tutte le attività necessarie per la puntuale attuazione del Piano d'Ambito.

Art. 5 Utilizzo dei beni

Il Gestore gestirà il SII utilizzando i beni oggetto di affidamento in conformità con le disposizioni della convenzione di gestione conseguente al perfezionamento della procedura di nuovo affidamento indicata nelle premesse.

Art. 6 Aggiornamento dell'elenco dei beni

L'elenco dei beni di proprietà di S.I.S. nella disponibilità del gestore, allegato

to alla presente Convenzione, sarà aggiornato alla scadenza della gestione risultante dalla procedura di nuovo affidamento indicata nelle premesse, al momento della presa in carico del SII da parte del nuovo gestore, con l'aggiunta dei beni realizzati nel corso della riferita gestione finanziati dalla società patrimoniale ed entrati nella proprietà della stessa ai sensi del successivo art.13.

Art. 7 Canone

Nelle more del perfezionamento della procedura di affidamento indicata nelle premesse, il canone annuale a favore di S.I.S. è stabilito in:

- per i beni realizzati fino al 31/12/2006: 1.692.000 €/anno in coerenza con quanto previsto dalla convenzione esistente e con quanto stabilito dalla vigente normativa di regolazione tariffaria fino alla scadenza degli attuali affidamenti.
- per i beni iscritti nel libro cespiti con data successiva al 31/12/2006, realizzati attraverso i finanziamenti regolati dagli accordi quadro ed attuativi, il canone è quantificato in misura pari alla somma dei relativi ammortamenti, degli oneri finanziari (OF) e dell'80% degli oneri fiscali (OFisc) così come definiti dalla metodologia tariffaria vigente (il riferimento attuale è l'MTI-2 approvato con la deliberazione AEGGSI 664/2015/r/idr).

In ogni caso, successivamente alla data di stipula della convenzione di gestione del SII che seguirà l'esperimento della procedura di l'affidamento di cui ai punti 11 e seguenti delle premesse, il canone annuale a favore di S.I.S. per i beni messi a disposizione del Gestore sarà così determinato:

- quota per i beni iscritti nel libro cespiti che non sono stati realizzati

	attraverso i finanziamenti regolati dagli accordi quadro ed attuativi	
	citati in premessa: pari al totale dei relativi ammortamenti iscritti a	
	bilancio in coerenza con quanto stabilito dall'art. 153 del	
	Dlgs.152/2006;	
	– quota per i beni iscritti nel libro cespiti che sono stati realizzati attra-	
	verso i finanziamenti regolati dagli accordi quadro ed attuativi citati	
	in premessa: fino al terzo anno dalla data di stipula della convenzio-	
	ne di gestione del SII il canone è quantificato in misura pari alla	
	somma dei relativi ammortamenti (Amm), degli oneri finanziari	
	(OF) e dell'80% degli oneri fiscali (OFisc) così come definiti dal	
	metodo di regolazione tariffaria vigente; a partire dal quarto anno	
	dalla data di stipula della convenzione di gestione del SII il canone	
	sarà quantificato come somma degli ammortamenti, degli oneri fi-	
	nanziari (OF) al netto della componente relativa al time lag di cui	
	all'art. 17.5 del MTI-2, e 50% degli oneri fiscali (OFisc).	
	In applicazione di quanto previsto al punto precedente, il Canone da corri-	
	spondersi nel primo anno di gestione del SII aggiudicato sulla base della	
	procedura attualmente in corso, sarà quindi calcolato pro quota in ragione	
	dei mesi/giorni decorrenti dal momento iniziale del nuovo affidamento fino	
	al 31 dicembre dell'anno medesimo.	
	Art. 8 Termini di pagamento del canone	
	Il canone verrà corrisposto a S.I.S. direttamente dal Gestore, venendo a ciò	
	specificatamente delegato con la convenzione di gestione del SII, in due rate	
	semestrali di pari importo, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di	
	ciascun anno di gestione.	

	Art. 9 Ammortamenti	
	S.I.S. provvederà all'ammortamento dei cespiti messi a disposizione del Gestore, applicando le aliquote di cui all'art. 16.2 della delibera AEEGSI 664/2015/r/idr.	
	Art. 10 Dismissioni	
	La dismissione di beni trasferiti, o di componenti di essi, verrà tempestivamente comunicata a S.I.S. da ATERSIR.	
	Art. 11 Controlli	
	S.I.S. ha la facoltà di effettuare verifiche sia di natura materiale sia di natura contabile sullo stato dei beni oggetto della messa in disponibilità per la gestione del SII.	
	Art. 12 Restituzione dei beni	
	Alla scadenza o risoluzione della presente convenzione che, ai sensi dell'art. 2 coincide con quella della concessione al gestore, fatte salve successive proroghe, anche tacite, tutte le opere e attrezzature costituite da reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali inizialmente affidate al Gestore saranno restituite a S.I.S., in condizioni di efficienza non inferiori a quelle in cui il Gestore li aveva ricevuti, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.	
	Eventuali addizioni, trasformazioni, sostituzioni, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti da parte del Gestore sui beni di S.I.S. durante il periodo di concessione, saranno parimenti restituite a S.I.S., che si obbliga, ora per allora, a metterli a disposizione del gestore subentrante.	
	Art. 13 Nuovi investimenti S.I.S.	
	S.I.S. si impegna finanziare investimenti infrastrutturali funzionali al SII del territorio definito dai comuni soci di S.I.S., remunerati secondo le modalità	

	di cui all'art. 7 del presente atto. I beni realizzati tramite tali investimenti sono acquisiti in proprietà dalla società patrimoniale. Successivamente al nuovo affidamento del SII nel bacino territoriale di Rimini, S.I.S. si impegna a finanziare la realizzazione di opere per un importo medio annuale non inferiore a 2.000.000 € per tutta la durata della presente convenzione.	
	Art. 14 Firma digitale	
	Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.	
	Art. 15 Spese di bollo e registrazione	
	Le spese di bollo inerenti alla presente Convenzione sono a carico di S.I.S. e la stessa sarà registrata in caso d'uso.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Per S.I.S. S.p.A.	Per ATERSIR
	Sig. Gianfranco Cenci	Ing. Vito Belladonna
	(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)
	<u>Allegati</u>	
	Allegato A: Elenco dei beni strumentali al Servizio Idrico Integrato di proprietà di S.I.S. messi a disposizione del gestore individuato da ATERSIR.	

Allegato A: Elenco dei beni strumentali al Servizio Idrico Integrato di proprietà di S.I.S. messi a disposizione del gestore individuato da ATERSIR

ANNO CAPITALIZZAZIONE	DENOMINAZIONE	CATEGORIA	SERVIZIO	VU	COSTO STORICO		ANNO 2017					ANNO 2018				
					(MIRA 2016)		AMMORT.	FONDO AMM.	VALORE NETTO	QUOTA CONTR.	CONTR. RESIDUO	AMMORT.	VALORE NETTO	QUOTA CONTR.	CONTR. RESIDUO	
1997	LAVORI ADEGUAM. FABBRICATO POTABILIZZATORE 1997	Fabbricati	A	43	80.615,13	-	2.015,38	-	39.200,79	35.672,17	-	2.015,38	33.456,79	-	-	
1998	LAVORI ADEGUAM. FABBRICATO POTABILIZZATORE 1998	Fabbricati	A	43	89.216,25	-	1.980,48	-	29.709,90	37.628,73	-	1.980,48	35.846,27	-	-	
2000	LAVORI ADEGUAM. FABBRICATO POTABILIZZATORE 2000	Fabbricati	A	43	44.075,87	-	1.101,90	-	16.829,50	23.300,15	-	1.101,90	22.250,25	-	-	
2000	SISTEMAZ. STRADA IMPIANTO SOLLEVAM. ABBAZIA	Fabbricati	F	43	22.245,85	-	667,58	-	10.010,70	10.010,57	-	667,58	9.343,19	-	-	
2000	OPERE MURARIE DEPURATORE CATTOLICA (2000)	Fabbricati	D	43	2.411,12	-	72,33	-	1.084,90	1.085,06	-	72,33	1.012,73	-	-	
1999	DEPURATORE DI MISANO ADRIATICO	Fabbricati	D	43	384.781,30	-	11.542,54	-	173.138,10	188.280,14	-	11.542,54	183.748,60	-	-	
1999	DEPURATORE DI CATTOLICA	Fabbricati	D	43	1.000.946,27	-	30.928,99	-	450.434,85	430.015,06	-	30.928,99	399.986,09	-	-	
1999	VASCHE IMHOFF MONTESCUDO (N. 4)	Fabbricati	D	43	8.211,75	-	188,38	-	2.795,25	2.689,81	-	188,38	2.482,28	-	-	
1999	VASCHE IMHOFF MONTEGRUOLO (N. 7)	Fabbricati	D	43	18.835,77	-	365,07	-	5.325,05	5.004,70	-	365,07	4.728,63	-	-	
1999	N.2 VASCHE IMHOFF, N.5 IMPIANTI DEPURAZ. MONDANO	Fabbricati	D	43	40.060,86	-	1.201,83	-	16.027,45	17.210,06	-	1.201,83	15.006,25	-	-	
1999	OPERE MURARIE COLLETTORI FOGNARI MISANO ADRIATICO	Fabbricati	F	43	52.032,82	-	1.361,58	-	23.423,70	22.301,96	-	1.361,58	20.930,38	-	-	
1999	OPERE MURARIE COLLETTORI REFLU. MORDANO, MONTEFIO	Fabbricati	F	43	50.908,55	-	1.797,28	-	28.968,90	25.738,68	-	1.797,28	23.939,40	-	-	
1999	OPERE MURARIE SOLLEVAMENTI FOGNARI COMUNE MISANO A.	Fabbricati	F	43	57.074,25	-	1.712,23	-	25.893,45	24.519,06	-	1.712,23	22.806,83	-	-	
1999	OPERE MURARIE SOLLEVAMENTI FOGNARI COMUNE CATTOLIC	Fabbricati	F	43	591.379,10	-	20.741,37	-	311.120,55	297.016,51	-	20.741,37	276.275,14	-	-	
1999	LAVORI ADEGUAMENTO FABBRICATO POTABILIZZATORE	Fabbricati	A	43	5.448,55	-	161,01	-	2.415,15	3.300,84	-	161,01	3.126,83	-	-	
2001	FABBRICATO OPERE CIVILI DEPURATORE RICCIONE	Fabbricati	D	43	1.595.306,45	-	58.689,19	-	850.337,85	1.016.692,52	-	58.689,19	958.003,33	-	-	
2002	OPERE MURARIE SEDIMENTATORI CATTOLICA 2002	Fabbricati	D	43	43.170,13	-	1.295,10	-	19.778,95	23.099,08	-	1.295,10	21.800,98	-	-	
1999	TERRENO AMPLIAMENTO DEPURATORE CATTOLICA	Terreni	D	-	145.682,38	-	-	-	21.862,35	114.418,95	-	-	114.418,96	-	-	
1999	TERRENI SOLLEVAMENTI DEPURATORE MISANO ADRIATICO	Fabbricati	D	43	295.014,85	-	8.550,44	-	129.250,69	129.795,67	-	8.550,44	121.245,23	-	-	
1999	TERRENI N.3 DEPURATORI COMUNE MONDANO	Terreni	D	-	8.747,08	-	-	-	1.012,05	5.299,18	-	-	5.299,18	-	-	
1999	TERRENI SOLLEVAMENTI DEPURATORE CATTOLICA	Fabbricati	D	43	105.538,85	-	5.586,29	-	83.843,00	84.950,17	-	5.586,29	79.363,87	-	-	
1999	Terreno sollevamento Brescia a S. Giovanni in M.	Fabbricati	D	43	136,77	-	3,80	-	57,00	57,78	-	3,80	53,98	-	-	
2001	TERRENI DEPURATORE DI RICCIONE	Fabbricati	D	43	903.301,32	-	28.889,04	-	433.485,60	500.724,02	-	28.889,04	471.824,98	-	-	
2004	OPERE MURARIE SERBATOI - QUOTA PROP. SIS SPA	Serbatoi	A	50	368.263,15	-	7.108,28	-	108.578,91	156.915,82	-	7.108,28	149.210,58	-	-	
1998	TERRENI SERBATOI	Serbatoi	A	50	111.676,40	-	2.233,57	-	33.503,55	49.139,46	-	2.233,57	46.904,89	-	-	
1997	LAVORI IMPERMEABILIZ. SERBATOIO VILLA ALTA RICCI	Serbatoi	A	50	9.839,84	-	192,80	-	2.892,08	4.819,87	-	192,80	4.627,07	-	-	
1999	INTERVENTI AI SERBATOI (1999)	Serbatoi	A	50	2.263,53	-	45,27	-	879,05	1.267,89	-	45,27	1.222,32	-	-	
2000	INTERVENTI AI SERBATOI (2000)	Serbatoi	A	50	10.275,45	-	205,51	-	3.062,85	6.165,28	-	205,51	5.959,77	-	-	
2001	INTERVENTI AI SERBATOI (2001)	Serbatoi	A	50	338.213,70	-	6.764,27	-	101.464,05	223.221,11	-	6.764,27	216.456,84	-	-	
1998	IMPIANTI DI FILTRAZIONE	Impianti di filtrazione	A	12	91.825,42	-	-	-	47.648,22	-	-	-	-	-	-	-
1999	INTERVENTI SULLE RETI IDRICHE COMUNALI (1999)	Rete	A	43	39.290,27	-	966,51	-	14.347,62	12.434,57	-	966,51	11.478,06	-	-	
1997	INTERVENTI SULLE RETI IDRICHE COMUNALI (1997)	Rete	A	43	229.625,40	-	5.740,94	-	58.100,90	58.100,45	-	5.740,94	52.359,51	-	-	
1999	INTERVENTI SULLE RETI IDRICHE COMUNALI (1999)	Rete	A	43	1.100.825,01	-	29.515,73	-	442.735,95	501.767,35	-	29.515,73	472.251,62	-	105.940,48	
1999	CONDOTTE FOGNARIE DA CRV E COMUNI CONSORZIATI	Rete	F	43	10.081.812,16	-	251.545,35	-	3.779.179,50	4.738.107,41	-	251.545,35	4.486.562,11	-	-	
1999	INTERVENTI SULLE RETI IDRICHE COMUNALI (1999)	Rete	A	43	1.572.016,00	-	39.300,43	-	389.509,74	746.708,06	-	39.300,43	707.408,11	-	79.937,90	
2000	INTERVENTI SULLE RETI IDRICHE COMUNALI (2000)	Rete	A	43	1.161.480,88	-	29.037,25	-	435.588,74	580.744,83	-	29.037,25	551.707,63	-	114,78	
2000	INTERVENTI RETI FOGNARIE EX CRV	Rete	F	43	132.451,35	-	3.311,28	-	49.869,20	66.225,73	-	3.311,28	62.914,45	-	-	
2001	INTERVENTI SULLE RETI IDRICHE COMUNALI (2001)	Rete	A	43	474.831,85	-	11.870,80	-	179.062,05	273.028,25	-	11.870,80	261.157,45	-	27.952,24	
2001	CONDOTTE FOGNARIE EX CRV (2001)	Rete	F	43	524.997,85	-	15.512,68	-	234.180,25	358.091,49	-	15.512,68	343.478,81	-	-	
2001	CONDOTTE FOGNARIE COMUNE RICCIONE	Rete	F	43	6.073.434,17	-	201.833,85	-	3.527.534,00	4.340.825,20	-	201.833,85	4.138.991,35	-	-	
2002	INTERVENTI RETI IDRICHE COMUNALI 2002	Rete	A	43	1.204.420,27	-	34.110,51	-	494.802,39	636.707,37	-	34.110,51	601.896,86	-	49.450,00	
2002	CONDOTTE FOGNARIE EX CRV	Rete	F	43	548.114,25	-	8.702,85	-	128.191,47	213.219,55	-	8.702,85	204.517,09	-	110.514,82	
2002	CONDOTTE FOGNARIE COMUNE RICCIONE	Rete	F	43	8.548,76	-	238,67	-	3.460,71	5.087,38	-	238,67	5.008,71	-	-	
1998	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	Impianti sollevamento acqua	A	8	549.357,81	-	-	-	159.820,18	0,00	-	-	0,00	-	-	-
1999	ELETTROPOMPE PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO (1999)	Impianti generici	A	10	8.799,00	-	-	-	2.970,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
1997	LAVORI AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (1997)	Impianti sollevamento acqua	A	8	129.897,60	-	-	-	58.321,50	-	-	-	-	-	-	-
1999	ELETTROPOMPE PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO (1999)	Impianti generici	A	10	2.372,88	-	-	-	1.861,00	-	-	-	-	-	-	-
1999	SOLLEVAMENTI FOGNARI COMUNE S. GIOVANNI IN M.	Impianti sollevamento fognari	F	8	19.647,21	-	-	-	13.556,57	-	-	-	-	-	-	-
1999	RICOSTRUZ. SOLLEVAM. DE AMICIS E ABBAZIA	Impianti sollevamento fognari	F	8	45.784,91	-	-	-	31.581,38	-	-	-	-	-	-	-
1999	SOLLEVAMENTI ACQUE NERE, BIANCHE E MISTE CATTOLICA	Impianti sollevamento fognari	F	8	308.394,58	-	-	-	273.512,34	-	-	-	-	-	-	-
1999	SOLLEVAMENTI ACQUE NERE, BIANCHE E MISTE MISANO A.	Impianti sollevamento fognari	F	8	107.130,12	-	-	-	73.919,79	-	-	-	-	-	-	-
2000	SERBATOIO CENTRALINA DUECINAMICA	Impianti sollevamento fognari	F	8	3.896,84	-	-	-	2.788,80	-	-	-	-	-	-	-
2001	Lavori agli impianti di sollevamento (2001)	Impianti sollevamento acqua	A	8	41,95	-	1,63	-	27,00	-	-	-	-	-	-	-
1997	IMPIANTI DI CLORAZIONE SU RETI IDRICHE (1997)	Impianti generici	A	20	38.037,30	-	-	-	3.803,74	-	-	-	-	-	-	-
2000	ADEGUAM. L. 4/90 IMP. ELETTRICO VENTILATORI CATTO	Impianti depurazione	D	12	5.249,13	-	-	-	4.869,31	-	-	-	-	-	-	-
1998	IMPIANTI DI CLORAZIONE SU RETI IDRICHE (1998)	Impianti generici	A	20	24.686,33	-	-	-	7.405,91	0,00	-	-	0,00	-	-	-
2000	ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DEPURATORE CATTOLICA	Impianti depurazione	D	12	50.762,29	-	-	-	49.269,80	-	-	-	-	-	-	-
1999	IMPIANTI DI CLORAZIONE SU RETI IDRICHE (1999)	Impianti generici	A	20	14.226,87	-	-	-	7.113,03	-	-	-	-	-	-	-
1999	ELETTROPOMPA PLASTOMEC PD-240 PER ACQUE	Impianti generici	A	10	695,09	-	-	-	280,54	-	-	-	-	-	-	-
2001	IMPIANTI/MACCHINARI DEPUR. FOGNATURA EX CRV 2001	Impianti depurazione	D	12	123.515,25	-	-	-	117.719,55	-	-	-	-	-	-	-
2002	GRIGLIA A GRADINI DEPURATORE CATTOLICA	Impianti depurazione	D	12	30.866,43	-	-	-	36.668,43	-	-	-	-	-	-	-
2001	APPARECCHIATURE ELETTROMECC. DEPURATORE RICCIONE	Impianti depurazione	D	12	1.812.570,15	-	-	-	1.811.280,09	-	-	-	-	-	-	-

ANNO CAPITALIZZAZIONE	DENOMINAZIONE	CATEGORIA	SERVIZIO	VU	COSTO STORICO	ANNO 2017					ANNO 2018			
					(MIRA 2018)	AMMORT.	FONDO AMM.	VALORE NETTO	QUOTA CONTR.	CONTR. RESIDUO	AMMORT.	VALORE NETTO	QUOTA CONTR.	CONTR. RESIDUO
2001	MOTORE BIOGAS-BIOFILTRO DEPURATORE RICCIONE	Impianti depurazione	D	12	130.316,81	-	-	131.402,87	-	-	-	-	-	-
2001	COPERTURA DEPURATORE RICCIONE	Impianti depurazione	D	12	202.465,98	-	-	198.165,37	-	-	-	-	-	-
2001	APPARECCHI ELETTROMECCANICHE DEPUR. RICCIONE	Impianti depurazione	D	12	13.544,34	-	-	13.247,12	-	-	-	-	-	-
1999	MISURATORI DI PORTATA IMPIANTO CATTOLICA	Impianti depurazione	D	12	34.723,29	-	-	25.754,26	0,00	-	-	0,00	-	-
1999	MACCHINARI CLORAZIONE E LETTI ESSICAMENTO	Impianti depurazione	D	12	1.800,40	-	-	1.187,02	-	-	-	-	-	-
1999	IMPIANTO ELETTRICO DEPURATORE CATTOLICA	Impianti generali	D	20	130.823,88	-	-	103.484,88	0,00	-	-	0,00	-	-
1999	MACCHINARI TRATTAMENTO BOTTINI DEPUR. CATTOLICA	Impianti depurazione	D	12	10.286,29	-	-	7.829,34	0,00	-	-	0,00	-	-
1999	MACCHIN. SOLLEVAMENTO FANGHIACQUE DEPUR. CATTOLIC	Impianti depurazione	D	12	9.889,98	-	-	7.189,82	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHINARI TORCIA BIOGAS DEPURATORE CATTOLICA	Impianti depurazione	D	12	5.434,93	-	-	4.010,86	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHINARI SGRIGLIATORE IMPIANTO CATTOLICA	Impianti depurazione	D	12	19.811,03	-	-	14.693,94	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHIN. COMPRESSORI OSSIDAZ. DEPUR. CATTOLICA	Impianti depurazione	D	12	43.584,26	-	-	32.326,44	0,00	-	-	0,00	-	-
1999	MACCHIN. CENTRALE TERMICA DEPUR. CATTOLICA	Impianti depurazione	D	12	21.882,87	-	-	18.230,37	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHIN. OSSIDAZ/NITRIFICAZ/DEFOSFAT. DEPUR. CATTOL	Impianti depurazione	D	12	119.015,21	-	-	86.040,48	0,00	-	-	0,00	-	-
1999	MACCHIN. DENITRIFICAZIONE IMPIANTO CATTOLICA	Impianti depurazione	D	12	12.864,77	-	-	9.541,80	0,00	-	-	0,00	-	-
1999	MACCHINARI SEDIMENTATORI DEPURATORE CATTOLICA	Impianti depurazione	D	12	10.890,33	-	-	8.885,11	0,00	-	-	0,00	-	-
1999	MACCHIN. SGRIGLIAT./DISSABBIATORE/DISOLIATORE CATT	Impianti depurazione	D	12	58.156,84	-	-	43.135,42	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHIN. GASOMETRO IMPIANTO CATTOLICA	Impianti depurazione	D	12	89.482,09	-	-	73.044,17	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHIN. DIGESTORI PRIMA E SECONDA DEPUR. CATTOLIC	Impianti depurazione	D	12	48.436,98	-	-	38.804,98	0,00	-	-	0,00	-	-
1999	MACCHIN. STOCCAGGIO E DOSAGGIO IPOCLORITO CATTOLIC	Impianti depurazione	D	12	9.237,39	-	-	6.851,37	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHIN PRE/POST ISPESSITORI DEPUR. CATTOLICA	Impianti depurazione	D	12	20.421,54	-	-	15.149,83	0,00	-	-	0,00	-	-
1999	MACCHINARI FANGHI DEPURATORE CATTOLICA	Impianti trattamento fanghi	D	12	22.600,90	-	-	18.783,09	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHIN. DISIDRATAZ. FANGHI DEPUR. CATTOLICA	Impianti trattamento fanghi	D	12	50.285,84	-	-	38.984,86	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHIN. DENITRIF/SEDIMENT/OSSIDAZ. CATTOLICA	Impianti depurazione	D	12	3.212,82	-	-	3.866,30	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHIN SEDIMENT. FINALI 1-2-3-4 DA 25 MT CATTOLIC	Impianti depurazione	D	12	80.095,43	-	-	61.248,08	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHIN SEDIMENT. PRIMARI 1-2 DA 34 MT CATTOLICA	Impianti depurazione	D	12	73.019,54	-	-	54.189,60	-	-	-	-	-	-
1999	IMPIANTO ELETTRICO DEPURATORE MISANO A.	Impianti generali	D	20	49.006,82	-	-	38.343,91	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHINARI OSSIDAZ. N. 2-3 DEPURATORE MISANO	Impianti depurazione	D	12	37.256,25	-	-	27.832,96	0,00	-	-	0,00	-	-
1999	MACCHIN. SOLLEVAM. INTERMEDIO DEPUR. MISANO	Impianti depurazione	D	12	10.191,45	-	-	7.569,00	0,00	-	-	0,00	-	-
1999	MACCHIN SGRIGLIATORE DISSABBIATORE DEPUR. MISANO	Impianti depurazione	D	12	5.623,82	-	-	4.175,19	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHIN STOCC. IPOCLORITO/CLORAZIONE DEPUR. MISANO	Impianti depurazione	D	12	3.977,97	-	-	2.580,48	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHINARI FANGHI DEPURATORE MISANO	Impianti trattamento fanghi	D	12	9.175,24	-	-	6.805,25	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHINARI DRENAGGI DEPURATORE MISANO	Impianti depurazione	D	12	1.293,94	-	-	969,72	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHIN. SOLLEV. GALLEGGIANTI DEPUR. MISANO	Impianti depurazione	D	12	1.145,53	-	-	879,31	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHIN. DISIDRATAZ. FANGHI DEPUR. MISANO	Impianti trattamento fanghi	D	12	42.888,81	-	-	31.217,27	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHIN. DOSAGISTOCC. CLORURO FERRICO DEPUR. MISAN	Impianti depurazione	D	12	3.287,61	-	-	3.921,82	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHIN. RIPARTIZ. SEDIMENTATORI FINALI SOLLEV. MI	Impianti depurazione	D	12	10.879,23	-	-	8.080,13	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHIN. OSSIDAZIONE N. 4 DEPUR. MISANO	Impianti depurazione	D	12	38.347,34	-	-	28.969,80	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHIN. DENITRIF. N. 4 MIXER DEPUR. MISANO	Impianti depurazione	D	12	20.286,71	-	-	15.864,07	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHIN. MISUR. PORTATA INGRESSO DENITRIF. DEPURAT	Impianti depurazione	D	12	7.200,13	-	-	5.564,84	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHIN. SILOS ISPESSIM. FANGHI DEPUR. MISANO	Impianti trattamento fanghi	D	12	8.909,17	-	-	6.887,50	0,00	-	-	0,00	-	-
1999	MACCHIN. SEDIMENT. FINALE 18 MT. DEPUR. MISANO	Impianti depurazione	D	12	15.263,57	-	-	11.320,89	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHIN. SEDIMENT. FINALE 28 MT. DEPUR. MISANO	Impianti depurazione	D	12	51.832,26	-	-	38.239,94	-	-	-	-	-	-
1999	Adegua. Imp. Elettrici depur. Misano-Catolica +	Impianti generali	D	20	138.378,71	-	-	102.635,49	-	-	-	-	-	-
1999	MACCHIN. COLLETTAMENTO MORGIANO/MONTEFIORE/S.GIOVA	Impianti depurazione	D	12	8.716,85	-	-	8.485,29	0,00	-	-	0,00	-	-
1999	MACCHINARI COLLETTORI FOGNARI DEPUR. MISANO	Impianti depurazione	D	12	85.046,23	-	-	45.288,38	0,00	-	-	0,00	-	-
2002	GRIGLIA+CENTRALINA ABBAZIA MORGIANO	Impianti depurazione	D	12	23.731,19	-	-	23.731,19	-	-	-	-	-	-
2000	IMPIANTO NEBULIZZAZIONE	Impianti generali	D	20	3.616,20	-	-	2.882,16	-	-	-	-	-	-
2001	LINEA ASPIRAZIONE DEPUR. CATTOLICA	Impianti depurazione	D	12	20.451,69	-	-	18.408,53	-	-	-	-	-	-
2002	SGRIGLIATORE IDRASCREEN GF8000 dep. Catolica	Impianti depurazione	D	12	33.853,20	-	-	33.853,20	-	-	-	-	-	-
2002	SILENZIATORE PER DEPURATORE DI CATTOLICA	Impianti depurazione	D	12	18.090,00	-	-	18.090,00	-	-	-	-	-	-
2002	SGRIGLIATORE AUTOMATICO VENTENA ASENITI	Impianti depurazione	D	12	32.000,00	-	-	32.000,00	-	-	-	-	-	-
2002	IMP/CAPTAZ E TRATTAMENTO CON BIOFILTRO	Impianti depurazione	D	12	43.644,00	-	-	43.644,00	-	-	-	-	-	-
2002	COPERTURA DEPURATORE RICCIONE 2002	Impianti depurazione	D	12	504.820,81	-	-	504.820,81	-	-	-	-	-	-
1996	ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA 1996	Allacci	A	40	147.991,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA 1997	Allacci	A	40	262.215,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA 1998	Allacci	A	40	518.880,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA 1999	Allacci	A	40	417.090,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA 2000	Allacci	F	40	26.226,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA 2000	Allacci	A	40	317.816,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA 2001	Allacci	A	40	289.532,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA 2001	Allacci	F	40	17.194,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	ALLACCI RETE IDRICA 2002	Allacci	A	40	270.196,22	8.916,54	129.280,83	131.001,85	-	-	8.916,54	123.076,31	-	-

ANNO CAPITALIZZAZIONE	DENOMINAZIONE	CATEGORIA	SERVIZIO	VU	COSTO STORICO		ANNO 2017					ANNO 2018			
					(NERA 2016)	AMMORT.	FONDO AMM.	VALORE NETTO	QUOTA CONTR.	CONTR. RESIDUO	AMMORT.	VALORE NETTO	QUOTA CONTR.	CONTR. RESIDUO	
2002	ALLACCI RETE FOGNARIA 2002	Atacci	F	43	90.025,83	3.234,05	46.905,30	47.605,65	-	-	3.234,05	44.459,60	-	-	
2007	NUOVA FOGN. BIANCA VIA REGGELLO RICCIONE	Condotta	FB	43	82.831,80	4.141,89	38.347,95	38.347,96	-	-	4.141,89	35.206,07	-	-	
2007	NUOVE FOGN. NERE S.GIOVANNI IN M.	Condotta	FN	43	227.256,47	-	-	227.256,47	-	-	-	227.256,47	-	-	
2008	NUOVA FOGN. BIANCA VIA LAVAGNA RICCIONE	Condotta	FB	43	46.433,07	2.321,66	19.734,11	24.577,36	-	-	2.321,66	22.055,54	-	-	
2008	NUOVA FOGN. BIANCA CELSA-SANTAMONICA MISANO	Condotta	FB	43	270.523,60	13.326,18	114.872,53	142.024,89	-	-	13.326,18	128.486,71	-	-	
2008	NUOVA FOGN. BIANCA VIALE ROMAGNA RICCIONE	Condotta	FB	43	56.164,16	2.758,10	23.443,85	26.082,21	-	-	2.758,10	26.284,11	-	-	
2008	NUOVE FOGN. NERE S.GIOVANNI IN M.	Condotta	FN	43	321.696,29	-	-	321.696,29	-	-	-	321.696,29	-	-	
2008	SOTTOPASSO FOGNARIO VIA CIGLIO MISANO	Impianti sotterraneo	FB	3	66.017,79	-	-	66.017,79	-	-	-	66.017,79	-	-	
2009	NUOVA FOGN. BIANCA VIA EMILIA ROMAGNA CATTOLICA	Condotta	FB	43	597.899,70	25.854,98	224.212,35	343.752,37	-	-	25.854,98	313.887,39	-	-	
2009	NUOVA FOGN. BIANCA COMP. C2-12 E VIA RATO MISANO	Condotta	FB	43	212.366,36	10.518,42	79.658,15	122.111,79	-	-	10.518,42	111.463,37	-	-	
2009	NUOVA FOGN. BIANCA VIA DEL GIGLIO	Condotta	FB	43	342.416,97	17.120,90	128.406,75	196.890,42	-	-	17.120,90	179.769,52	-	-	
2009	NUOVE FOGN. NERE LOC. CASAROLA	Condotta	FN	43	80.983,06	-	-	80.983,06	-	-	-	80.983,06	-	-	
2009	NUOVA FOGN. BIANCA VIA MACCHIAVELLO RICCIONE	Condotta	FB	43	138.394,70	6.915,24	51.864,30	79.525,16	-	-	6.915,24	72.609,92	-	-	
2009	NUOVA FOGN. BIANCA VIA MOLINO RICCIONE	Condotta	FB	43	34.145,24	1.707,02	12.882,85	18.630,57	-	-	1.707,02	17.923,55	-	-	
2009	NUOVA FOGN. BIANCA VIALE LODI RICCIONE	Condotta	FB	43	45.871,87	2.303,60	15.482,00	23.816,27	-	-	2.303,60	21.082,67	-	-	
2009	NUOVA FOGN. BIANCA 1 LOTTO 1 STRALCIO RICCIONE	Condotta	FB	43	523.654,50	15.162,72	321.370,40	166.101,36	-	-	15.162,72	188.576,66	-	-	
2009	NUOVA FOGN. BIANCA 1 LOTTO 2 STRALCIO RICCIONE	Condotta	FB	43	453.947,18	23.197,36	173.860,20	266.709,62	-	-	23.197,36	243.572,29	-	-	
2009	NUOVA FOGN. BIANCA 1 LOTTO 3 STRALCIO RICCIONE	Condotta	FB	43	118.624,33	5.931,22	44.484,15	68.208,98	-	-	5.931,22	62.277,74	-	-	
2009	NUOVA FOGN. BIANCA 1 LOTTO 4 STRALCIO RICCIONE	Condotta	FB	43	299.935,72	14.996,78	112.475,85	172.453,89	-	-	14.996,78	157.485,31	-	-	
2009	NUOVA FOGN. BIANCA 1 LOTTO 5 STRALCIO RICCIONE	Condotta	FB	43	498.791,14	24.939,58	187.048,70	288.804,88	-	-	24.939,58	281.865,32	-	-	
2009	NUOVA FOGN. BIANCA 2 LOTTO 1 STRALCIO RICCIONE	Condotta	FB	43	553.614,10	28.680,78	222.805,25	341.328,15	-	-	28.680,78	311.647,45	-	-	
2009	NOVE FOGN. BIANCHE VIALE VIRGLIO RICCIONE	Condotta	FB	43	43.666,67	2.443,44	16.325,80	25.099,43	-	-	2.443,44	25.655,99	-	-	
2009	NUOVE FOGN. BIANCHE VIALE TORTONA RICCIONE	Condotta	FB	43	143.119,81	716,00	5.370,00	8.233,81	-	-	716,00	7.517,81	-	-	
2009	TOMBINAMENTO FOSSO VIE CAMINI MATTEOTTI	Condotta	FB	43	109.024,84	5.451,24	40.884,30	62.690,10	-	-	5.451,24	97.237,66	-	-	
2009	NUOVA FOGN. BIANCA 1 LOTTO 3 STR. PARTE 1 RICCIONE	Condotta	FB	43	526.712,45	26.335,62	197.517,15	302.659,68	-	-	26.335,62	276.524,06	-	-	
2010	REAL FOGN. BIANCA VIA CADUTI DEL MARE 1 STR. CATTOLICA	Condotta	FB	43	425.085,46	21.254,28	158.162,82	266.893,26	-	-	21.254,28	244.424,08	-	-	
2010	REAL FOGN. BIANCA LITORENEA SUD MISANO	Condotta	FB	43	725.250,17	35.312,59	256.031,25	459.506,42	-	-	35.312,59	417.560,92	-	-	
2010	NUOVA FOGN. BIANCA 2 LOTTO 4 STRALCIO RICCIONE	Condotta	FB	43	515.641,34	15.932,06	103.558,39	196.150,89	-	-	15.932,06	183.218,53	-	-	
2010	NUOVA FOGN. BIANCA VIALE ALLENDE CATTOLICA	Condotta	FB	43	174.110,99	8.706,54	56.589,01	108.819,44	-	-	8.706,54	100.113,90	-	-	
2010	POTENZ. FOGN. BIANCA VIALE BRAMANTE RICCIONE	Condotta	FB	43	56.787,82	2.788,40	16.124,80	34.864,82	-	-	2.788,40	32.086,42	-	-	
2010	POTENZ. FOGN. BIANCA VIALE TORRICELLI RICCIONE	Condotta	FB	43	79.452,05	3.972,60	25.824,90	49.657,55	-	-	3.972,60	45.684,95	-	-	
2011	ADEG. FUNZ. FOGN. BIANCA VIA DON MINZONI MISANO	Condotta	FB	43	269.891,31	13.444,56	73.645,08	181.501,67	-	-	13.444,56	188.057,11	-	-	
2011	COLL. FOGN. BIANCA VIALE BOCCACCIO RICCIONE	Condotta	FB	43	69.691,40	3.484,27	15.163,48	47.537,65	-	-	3.484,27	43.453,39	-	-	
2011	REAL FOGN. NERA S.MARIA MADALENA	Condotta	FN	43	17.582,83	-	-	17.582,83	-	-	-	17.582,83	-	-	
2012	FOGN. BIANCA VIA QUASIMODO RICCIONE	Condotta	FB	43	42.994,84	2.149,94	9.874,73	31.174,17	-	-	2.149,94	29.024,23	-	-	
2012	FOGN. BIANCA VIA FALCONARA RICCIONE	Condotta	FB	43	42.281,42	2.113,07	9.508,81	30.630,54	-	-	2.113,07	28.526,47	-	-	
2012	FOGNATURA VIA ROMA MONDANO	Condotta	FB	43	23.047,42	1.152,37	5.185,66	16.709,39	-	-	1.152,37	15.557,02	-	-	
2012	FOGN. BIANCA VIA GALLIPOLI RICCIONE	Condotta	FB	43	54.279,47	2.713,97	12.212,86	39.562,64	-	-	2.713,97	36.838,67	-	-	
2012	ALLACCI FOGNATURA CAMPO SPORTIVO MONDANO	Condotta	F	43	53.304,35	-	2.865,21	50.636,17	-	-	-	50.636,17	-	-	
2013	RIPR. CONDITTA VIENNA CATTOLICA	Condotta	FB	43	38.729,53	1.936,02	6.775,07	39.008,44	-	-	1.936,02	28.672,42	-	-	
2013	FOGN. BIANCA VIA LEONCAVALLO MISANO	Condotta	FB	43	25.826,05	1.341,30	4.894,50	20.700,23	-	-	1.341,30	19.448,93	-	-	
2013	RIPR. SCARICO RIO ALBERELLO MISANO	Condotta	F	43	13.635,47	-	-	13.635,47	-	-	-	13.635,47	-	-	
2013	MANUT. STR. FOGNATURE 1 STRALCIO RICCIONE	Condotta	F	43	50.183,89	-	-	50.183,89	-	-	-	50.183,89	-	-	
2013	REAL FOGN. VIA MASSAIA RICCIONE	Condotta	F	43	6.302,11	-	-	6.302,11	-	-	-	6.302,11	-	-	
2014	NUOVA FOGN. BIANCA 2 LOTTO 3 STRALCIO RICCIONE	Condotta	FB	43	342.401,59	17.120,08	42.800,22	282.401,69	-	-	17.120,08	265.381,61	-	-	
2014	FOGN. BIANCA CADUTI DEL MARE 2 LOTTO CATTOLICA	Condotta	FB	43	164.231,56	8.211,58	28.528,62	138.491,10	-	-	8.211,58	127.279,54	-	-	
2014	SEPAR. FOGN. VIA DEI TIGLI MORGIANO	Condotta	F	43	73.729,94	3.686,04	9.210,11	60.619,79	-	-	3.686,04	67.133,75	-	-	
2014	REAL FOGN. BIANCA VIA GORETTI E VARIE VIE CATTOLICA	Condotta	FB	43	163.843,29	8.192,16	22.980,40	151.670,73	-	-	8.192,16	142.478,57	-	-	
2014	FOGN. BIANCA SANTELLA 1 MISANO	Condotta	FB	43	90.032,21	4.802,60	12.000,51	79.263,10	-	-	4.802,60	74.440,50	-	-	
2014	FOGN. BIANCA VIA LEONCAVALLO 2 STRALCIO MISANO	Condotta	FB	43	68.448,52	3.422,42	6.566,08	58.470,04	-	-	3.422,42	53.047,62	-	-	
2014	RIPR. SCARICO RIO ALBERELLO 2 STRALCIO MISANO	Condotta	F	43	47.634,52	-	-	47.634,52	-	-	-	47.634,52	-	-	
2014	MANUT. STR. FOGNATURE 2 STRALCIO PARTE 1 RICCIONE	Condotta	F	43	42.617,28	-	-	42.617,28	-	-	-	42.617,28	-	-	
2014	FOGN. BIANCA VIA MERCATORE CATTOLICA	Condotta	FB	43	17.646,31	892,40	2.200,02	14.559,89	-	-	892,40	13.677,49	-	-	
2014	MANUT. STR. FOGNATURE 2 STRALCIO PARTE 2 RICCIONE	Condotta	F	43	14.772,62	-	-	14.772,62	-	-	-	14.772,62	-	-	
2014	FOGN. BIANCA VIA TAGGIA RICCIONE	Condotta	FB	43	17.962,30	896,10	2.245,27	14.810,93	-	-	896,10	13.320,63	-	-	
2014	FOGN. BIANCA SANTELLA 2 MISANO	Condotta	FB	43	44.492,10	2.224,60	3.581,51	38.709,99	-	-	2.224,60	38.481,39	-	-	
2015	FOGN. BIANCA VIA MAHINI MISANO ADRIATICO	Condotta	FB	43	99.393,50	4.969,68	7.454,62	89.484,14	-	-	4.969,68	84.484,16	-	-	
2015	COLL. FOGN. BIANCA VIA GALILEI SOM	Condotta	FB	43	12.246,52	662,32	883,48	11.021,88	-	-	662,32	11.259,59	-	-	
2015	RIPR. COLL. FOGN. BIANCA V. CARAVAGGIO MICHELANGELO MISANO	Condotta	FB	43	35.594,35	1.825,22	2.743,63	32.025,51	-	-	1.825,22	31.088,59	-	-	
2015	MANUT. STR. FOGNATURE RICCIONE ANNO 2015	Condotta	F	43	132.352,69	-	-	132.352,69	-	-	-	132.352,69	-	-	
2015	RIPR. SCARICO TAVOLLO SOM	Condotta	F	43	10.810,42	540,52	810,78	9.729,38	-	-	540,52	9.188,86	-	-	
2016	ADEGUAMENTO TERMINALE SCARICO AZZARITA RICCIONE	Condotta	FB	43	30.084,91	3.983,29	1.078,62	73.136,04	-	-	3.983,29	69.161,79	-	-	

ANNO CAPITALIZZAZIONE	DENOMINAZIONE	CATEGORIA	SERVIZIO	VU	COSTO STORICO		ANNO 2017					ANNO 2018			
					(MIRA 2016)		AMMORT.	FONDO AMM.	VALORE NETTO	QUOTA CONTR.	CONTR. RESIDUO	AMMORT.	VALORE NETTO	QUOTA CONTR.	CONTR. RESIDUO
2016	REFAC. SGARICO FOGN. S. MARIA PIETRAFITTA S. GIOVANNI IN M.	Condote	FB	43	26.649,78	-	1.332,49	-	895,24	24.551,05	-	1.332,49	23.318,56	-	-
2016	PROLUNG. SGARICHI ALBERELLO MISANO ADRIATICO	Condote	FB	43	29.146,06	-	1.457,45	-	728,73	29.562,89	-	1.457,45	25.555,43	-	-
2016	PROLUNG. SGARICHI RD. COSTA RICCIONE	Condote	FB	43	41.435,14	-	2.071,75	-	1.535,80	38.327,59	-	2.071,75	36.255,74	-	-
2016	LAVORI FOGNATURA BIANCA VIA AOSTA RICCIONE	Condote	FB	43	40.496,77	-	2.024,54	-	1.512,42	37.459,51	-	2.024,54	35.434,97	-	-
2016	LAVORI RIFACIMENTO FOGN. BIANCA VIA LAZIO RICCIONE	Condote	FB	43	24.990,90	-	1.247,55	-	823,77	23.019,58	-	1.247,55	21.832,03	-	-
2016	MANUTENZIONE VASOHE PRIMA PIOGGIA RICCIONE	Condote	FB	43	20.802,73	-	1.040,14	-	520,07	19.262,52	-	1.040,14	18.202,38	-	-
2009	IMP. SOLLEVAMENTO SOTTOP. VIA DEI MULI RICCIONE	Impianti sollevamento	FB	8	103.316,39	-	5.165,92	-	36.744,49	59.409,07	-	5.165,92	54.242,15	-	-
2009	OPERE ADEG. IMP. ELETTR. SOTTORASSI	Impianti sollevamento	FB	8	24.125,00	-	-	-	24.125,00	-	-	-	24.125,00	-	-
2008	COPERTURA DEPURATORE CATTOLICA	Impianti depurazione	D	12	473.556,46	-	-	-	473.556,46	-	-	-	473.556,46	-	-
2016	INT. AMPLIAMENTO E RISTR. DEPURATORE CATTOLICA	Impianti depurazione	D	12	173.350,72	-	-	-	173.350,72	-	-	-	173.350,72	-	-
SIS - IMMOBILIZZAZIONE DAL 01/01/17 AL 31/12/2018															
2017	POTENZ. ADEG. RETE FOGN. VERRAZZANO RICCIONE	Condote	F	43	262.647,35	-	9.091,18	-	154.555,18	-	-	16.192,37	336.373,01	-	-
2018	MANUTENZIONE VASOHE PRIMA PIOGGIA RICCIONE	Condote	FB	43	4.153,00	-	-	-	4.153,00	-	-	155,83	4.045,17	-	-
TOTALE					51.022.476,58	-	1.289.697,22	-	19.371.264,74	24.492.532,72	-	18.922,80	366.127,11	-	371.104,31
2018	INTERVENTO ADEG. E RISTR. DEP. CATTOLICA - F. ACCORDO ATTUATIVO	Impianti depurazione	D		408.900,00	-	30.645,00	-	15.322,50	362.832,50	-	30.645,00	331.987,50	-	-



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 15

Contratto di fornitura reciproca di risorsa idrica ad uso potabile
tra i Gestori dei servizi idrici
HERA S.p.A. e Azienda Autonoma di Stato
per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino

Contratto di fornitura reciproca di risorsa idrica ad uso potabile tra i Gestori dei servizi idrici HERA S.p.A. e Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino (il "Contratto").

Addi 18/09/2017

Tra

L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino (nel seguito, per brevità, anche **A.A.S.S.**) con sede legale nella Repubblica di San Marino in Via Andrea di Superchio, n. 16, codice operatore economico SM 02463, cod. fisc. 91029270401 /part. I.V.A. 3202220400 , PEC evalli.aass@legalmail.it, sito internet www.aass.sm, per la quale interviene il gcom. Federico Crescentini in qualità di Presidente e Legale Rappresentante domiciliato, ai fini del presente contratto , presso la sede dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino, in esecuzione dei poteri conferiti con deliberazioni dell' On.le Congresso di Stato n. 38 in data 26/06/2017 e del Consiglio di Amministrazione n.75 in data 6/06/2017

e

La Società **Hera S.p.A.**, con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, cod. fisc./part. I.V.A. 04245520376, capitale sociale interamente versato di euro 1.489.538.745,00, PEC heraspa@pec.gruppohera.it, sito internet www.gruppohera.it, per la quale interviene l'Amministratore delegato Dott. Stefano Venier, domiciliato per la carica presso la sede sociale , in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27/04/2017 (nel seguito, per brevità, anche **Hera** e con **A.A.S.S.**, congiuntamente le Parti e singolarmente la Parte)

PREMESSO

a) che Hera è ed interviene nel presente accordo in qualità di Gestore del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini in forza della convenzione di affidamento sottoscritta con l'Autorità/Agenzia di Ambito di Rimini, atto sottoscritto in data 14/03/2002 avente scadenza il 14/03/2012, tuttora vigente in regime di prorogatio in virtù di deliberazione dell'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir) n. 25 del 21/12/2012 fino alla decorrenza del nuovo affidamento;

b) A.A.S.S. è ed interviene nel presente accordo in qualità di Gestore del servizio idrico integrato nella Repubblica di San Marino in forza di legge 25/05/1981 n. 41 e Decreto Delegato 27/04/2012 n. 44;

c) che Hera è subentrata nella "Convenzione tra l'AMIR S.p.A. di Rimini e l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino per la fornitura idrica al serbatoio di Galazzano (Serravalle)" sottoscritta in data 18/12/1996, integrata con Atto aggiuntivo sottoscritto in data 26/01/1998, avente scadenza il 31/12/2016;

d) che permane la necessità per le Parti di regolare la reciproca fornitura di acqua potabile al fine di alimentare le rispettive reti di distribuzione per la fornitura agli utenti del Servizio Idrico Integrato negli ambiti di competenza;

e) che la Regione Emilia Romagna, con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 131 del 02/07/2013 ratificava l'Accordo di Collaborazione fra la Regione Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino sottoscritto in data 10/06/2013. L'art. 6 di tale accordo disciplina, nello specifico, la collaborazione in materia di servizi idrici, favorendo gli scambi di servizi idrici tra i territori della Regione Emilia Romagna (RER) e la Repubblica di San Marino (RSM). Tale disposizione

prevede che ogni scambio di servizi idrici tra i territori della RER e della RSM sia regolato da "prescrizioni dettate d'intesa tra la RER e la RSM che, sulla base della disponibilità della risorsa, tenuto conto delle rispettive esigenze e delle caratteristiche tecniche degli impianti, disciplinano i quantitativi erogabili, il minimo di risorsa assicurabile in caso di crisi idrica, il quantitativo massimo giornaliero, il conferimento dei reflui, la ripartizione degli oneri di gestione degli impianti impiegati e di quelli relativi all'eventuale realizzazione di reti o impianti, nonché la ripartizione dei costi di salvaguardia e protezione delle risorse idriche".

Si prevede, inoltre, che gli importi da corrispondere per le prestazioni in materia di servizi idrici siano computati dall'Atersir;

f) che la Legge Regionale n. 23 del 23/12/2011 della Regione Emilia Romagna ha costituito l'Atersir per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato a livello regionale, funzioni già esercitate dalle Autorità di Ambito Territoriali Ottimali; Atersir è, dunque, subentrata nelle convenzioni di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui alla lettera a) delle premesse;

g) che l'art. 21, commi 13 e 19 del D.L. n. 201/2011, così come convertito dalla L. 214/2011, ha trasferito all'Autorità per l'Energia elettrica e il gas (oggi Autorità per l'Energia elettrica il gas e il sistema idrico nel seguito anche AEEGSI), le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, tra cui l'approvazione del metodo tariffario;

h) che con deliberazione n. 2259/2016 del 21/12/2016 la Regione Emilia Romagna ha fissato i quantitativi di risorsa idrica di cui Hera potrà disporre;

i) che il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino ha assunto la delibera n. 33/2021 del 06/12/2016 avente ad oggetto la "Fornitura idrica tra la Regione

Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino”;

m) che il Congresso di Stato con delibera N°38 del 26/06/2017 ha autorizzato il Presidente dell' A.A.S.S. alla sottoscrizione del presente Contratto.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Valore delle premesse e Legge che regola il contratto

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Le Parti concordano espressamente che il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana, fatti salvi i richiami espressi ad altre leggi contenuti nel presente Contratto ovvero le norme di applicazione necessaria di diritto sammarinese.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Il presente Contratto ha per oggetto la reciproca fornitura di risorsa idrica ad uso potabile tra le Parti, nei termini meglio precisati nel prosieguo.

Art. 3 – Durata del Contratto

Il presente Contratto ha efficacia dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017 fatto salvo il diritto delle Parti di prorogare, mediante accordo scritto, la durata dello stesso fino al 31/12/2018 e fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 22.

Art. 4 – Precedenti accordi

Le Parti convengono che ogni precedente contratto o accordo fra le stesse regolante anche parzialmente l'oggetto del presente Contratto è da intendersi privo di ogni effetto nei confronti delle Parti e superato da quest'ultimo con decorrenza dal 01/01/2017.

Art. 5 – Punti di fornitura

I volumi d'acqua forniti da A.A.S.S. ad Hera, e viceversa, saranno resi disponibili nei punti di consegna indicati nell'allegato 1.

La descrizione dei punti di fornitura e la loro estrazione cartografica a diversa

scala sono riportate rispettivamente negli allegati 3 e 4 .

Art. 6 – Piano delle forniture

La programmazione operativa delle forniture sarà concordata tra le Parti entro il mese di marzo dell'anno al quale le stesse forniture si riferiscono e comunicata formalmente tramite email ai referenti delle Parti indicati all'articolo 11. In corso d'anno le Parti concorderanno i momenti di verifica sullo stato delle forniture. La programmazione operativa potrà essere modificata, in accordo tra le Parti, per motivi connessi alla disponibilità di risorsa all'origine e/o per motivi connessi alla funzionalità impiantistica e/o per sviluppi del sistema infrastrutturale d'approvvigionamento.

Nel caso di modifiche normative e/o di provvedimenti - anche *pro-tempore* - emanati dalle Autorità competenti che determinino l'impossibilità di utilizzo delle fonti di approvvigionamento e comportino una modifica alla pianificazione programmata, la Parte interessata da tali modifiche informerà l'altra Parte nel minor tempo possibile e potrà proporre all'altra Parte le necessarie modifiche al Contratto. L'altra Parte si impegna a manifestare per iscritto la propria accettazione ovvero la mancata accettazione delle modifiche proposte [entro 30 giorni] dal ricevimento delle stesse. In caso di mancata accettazione e di mancato raggiungimento di un diverso accordo tra le Parti, ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere dal Contratto comunicando la propria volontà con 30 giorni di preavviso, senza che l'altra Parte possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo per l'avvenuto recesso.

In ogni caso, la fornitura, prefissata nel Piano di fornitura, dovrà soddisfare, per quanto possibile, le richieste connesse alle reti acquedottistiche gestite da Hera nel Comuni di San Leo e Verucchio, in Provincia di Rimini, così come le richieste

connesse alle reti acquedottistiche gestite da A.A.S.S.

Le Parti concordano che nella fattura relativa al punto di consegna Torello venga inserito anche l'importo economico relativo al consumo di energia elettrica, fornita da A.A.S.S., per la spillatura di emergenza, denominata Pietracuta, effettuata da Hera dal punto di consegna di Romagna Acque PDC 67.1 Uscita pozzetto Torello per Siepi/Pietracuta.

Art. 7 – Requisiti di fornitura

Oltre ai volumi definiti nel piano delle forniture di cui all'articolo 6, in condizioni di normale esercizio delle reti gestite sia da A.A.S.S. sia da Hera, ciascuna Parte garantirà in ciascun punto di consegna il rispetto di tutti i requisiti di fornitura specificati nell'allegato 2 in termini di:

- campo (minimo-massimo) di portata istantanea (l/s) delle consegne in rete (presenza del range di pressione minima e massima);
- campo (minimo-massimo) di volume giornaliero d'acqua (mc/g) reso disponibile alla sezione di misura;
- requisiti qualitativi specifici ulteriori a quelli previsti dalla vigente normativa italiana, con riferimento ai volumi di acqua forniti da A.A.S.S. a Hera, e a quelli previsti dalla vigente normativa della Repubblica di San Marino, con riferimento ai volumi di acqua forniti da Hera a A.A.S.S.

Nei casi in cui non dovesse risultare possibile garantire i volumi necessari a soddisfare le richieste delle reti acquedottistiche e/o i requisiti di fornitura specificati per ciascun punto di consegna nell'allegato 2 in termini di portate e/o qualità, la Parte interessata si impegna a:

- comunicare all'altra Parte, con il massimo preavviso possibile, la necessità di eventuali riduzioni dei volumi di fornitura rispetto a quelli definiti nel piano di

fornitura di cui al precedente articolo 6, specificando l'entità delle riduzioni, le cause delle riduzioni ed i tempi previsti per il ripristino delle normali condizioni di fornitura;

- concordare con l'altra Parte eventuali diverse allocazioni quantitative della risorsa idrica sui punti di consegna rispetto alle condizioni di normale fornitura in modo da minimizzare gli impatti negativi sul sistema di distribuzione; gli oneri aggiuntivi derivanti da una diversa allocazione dei volumi saranno a carico della Parte erogatrice;

- ripristinare le normali condizioni di fornitura nei tempi più brevi possibili, compatibilmente con i soli vincoli di carattere tecnico.

Qualora i quantitativi di fornitura dovessero ridursi a causa di eventi imprevedibili o per cause di forza maggiore, le Parti convengono che non potranno essere richiesti indennizzi di sorta.

Art. 8 - Misura dei volumi forniti

I volumi forniti saranno assunti pari a quelli misurati presso i punti di consegna mediante lettura dei contatori, indicati nell'allegato 1.

I misuratori saranno mantenuti in perfetta efficienza a cura e spese di entrambe le Parti, ciascuna per competenza gestionale, come definito nell'allegato 1.

La modalità di gestione dei misuratori magnetici, con particolare riferimento alle verifiche periodiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento, è eseguita dalle Parti nel rispetto delle proprie Procedure di qualità.

Per i misuratori di piccoli diametro ($\leq 2''$), l'attività di verifica e controllo della corretta operatività si considererà assolta da ciascuna Parte con esame visivo/funzionale, ad intervalli non superiori a 24 mesi.

I rapporti di verifica saranno trasmessi da ciascuna Parte all'altra Parte in

formato digitale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sono stati effettuati.

Eventuali anomalie riscontrate a seguito di tali verifiche saranno tuttavia tempestivamente comunicate fra le Parti. In caso di dubbi motivati riguardo al corretto funzionamento dei misuratori, le Parti si riservano la possibilità di chiedere verifiche supplementari.

Qualora, a seguito delle verifiche di cui al precedenti commi del presente articolo, si rilevino errori di misura superiori al 5%, si potrà chiedere il ricalcolo dei volumi contabilizzati per il periodo intercorrente tra la data dell'ultima verifica effettuata con esito positivo o la data in cui si è evidenziato il mal funzionamento dell'apparato di misura e la data di ripristino delle condizioni di corretta misurazione attestata da nuova verifica.

Per la fatturazione relativa ai punti di consegna saranno assunti i volumi registrati mediante il sistema di telelettura, quando presenti, o i valori derivanti dalle letture manuali effettuate sui singoli contatori. Tali valori potranno comunque essere oggetto di verifica mediante letture in contraddittorio, se espressamente richiesto dalle Parti, una volta all'anno. Tali letture dei contatori saranno utilizzate per eventuali conguagli.

Le Parti si riservano di effettuare autonomamente la lettura sul Punto di consegna, con analisi dello scostamento e richiesta di contraddittorio.

Art.9 – Requisiti qualitativi, loro verifica e gestione delle non conformità

L'acqua fornita dalle Parti dovrà avere ai punti di consegna le caratteristiche di qualità, prescritte per l'acqua destinata al consumo umano, dalla normativa italiana con riferimento ai volumi di acqua forniti da A.A.S.S. a Hera e dalla normativa della Repubblica di San Marino con riferimento ai volumi di acqua

forniti da Hera a A.A.S.S., fatte salve le condizioni aggiuntive particolari eventualmente indicate per ciascun punto di consegna nell'allegato 2.

Tutti i limiti di parametro indicati nell'allegato 2 sono da intendersi validi fatte salve eventuali diverse disposizioni che dovessero essere emanate, anche medio-tempore, dalle Autorità competenti per cui troverà applicazione l'articolo 22 che segue.

La qualità dell'acqua fornita sarà rilevata nei punti di campionamento indicati nell'allegato 1 per ciascun punto di consegna. Ciascun punto di campionamento sarà mantenuto in efficienza a cura e spese di entrambe le Parti, ciascuna per competenza gestionale, come definito nell'allegato 1.

Al fine di verificare la qualità dell'acqua fornita e il rispetto dei requisiti qualitativi previsti nell'allegato 2, le Parti effettueranno i controlli che ognuna riterrà più opportuni in termini di profili analitici e frequenze. Tuttavia si concorda un numero minimo di quattro campionamenti annuali, da eseguirsi in contraddittorio ogni trimestre.

Le Parti si impegnano a riconoscere mutuamente valide, assumendosi l'onere di fornire eventuale prova contraria, le determinazioni analitiche effettuate dai laboratori interni di ciascuna Parte o da laboratori esterni certificati e accreditati sui parametri oggetto di controllo.

Ciascuna Parte invierà i rapporti di prova relativi alla verifica del rispetto della qualità dell'acqua fornita e dei requisiti qualitativi previsti nell'allegato 2 all'altra Parte mediante trasmissione per via telematica entro 20 giorni dal campionamento cui si riferiscono i certificati analitici, qualora richiesti e in forma scritta.

Eventuali situazioni di non conformità qualitativa rilevate da una Parte saranno

in ogni caso prontamente segnalate in forma scritta all'altra Parte.

La Parte cui è stata comunicata un'eventuale situazione di non conformità si impegna a:

- accertare tempestivamente l'effettiva sussistenza e le cause di non conformità;

- ripristinare le normali condizioni di fornitura nei tempi più brevi possibili, compatibilmente con i soli vincoli di carattere tecnico e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di anomalia, dandone evidenza scritta.

A conclusione degli interventi ritenuti necessari alla risoluzione della problematica segnalata, come verifica dell'efficacia delle azioni intraprese, la Parte a cui è ascrivibile la situazione di non conformità qualitativa rilevata, ripeterà l'esame del/dei campione/i e della relativa indagine analitica.

In particolare, in caso di non conformità dei volumi di acqua forniti da A.A.S.S. a Hera ai parametri cogenti delle parti A e/o B dell'Allegato 1 del D. Lgs. 31/01, ovvero in caso di non conformità dei volumi di acqua forniti da Hera a A.A.S.S. ai parametri cogenti indicati nel D.D. n. 84/2016 l'azione risolutiva deve essere conclusa in conformità alle rispettive normative e comunicata nel più breve tempo possibile, dal ricevimento della comunicazione di anomalia, e comunque entro 7 giorni naturali consecutivi.

In caso di non conformità dei volumi di acqua forniti da A.A.S.S. a Hera ai parametri della parte C, dell'Allegato 1 del D. Lgs. 31/01, ovvero in caso di non conformità dei volumi di acqua forniti da Hera a A.A.S.S. ad analoghi parametri cogenti indicati nel D.D. n. 84/2016 l'azione risolutiva deve essere conclusa e comunicata nel più breve tempo possibile, dal ricevimento della comunicazione

di anomalia, e comunque entro 14 giorni naturali consecutivi.

Tempistiche diverse da quelle riportate verranno di volta in volta concordate tra le Parti in caso di valori anomali di particolare rilevanza.

A ripristino della conformità analitica, la Parte a cui era imputabile la situazione di non conformità invierà una comunicazione scritta all'altra Parte contenente le seguenti informazioni:

- impianto/rete in cui è stata rilevata la non conformità;
- cause della non conformità;
- azioni intraprese;
- data del prelievo analitico;
- esito dell'analisi ed eventuale valore dei parametri analizzati con invio dei rapporti di prova o dati approvati.

Tali comunicazioni potranno essere effettuate telefonicamente e successivamente confermate via mail al/ai referenti di cui all'articolo 11, entro i termini prima indicati.

Nel caso in cui il rilevamento della non conformità sia stato notificato dalle competenti Autorità Sanitarie ad Hera oppure ad A.A.S.S., questi ultimi provvederanno ad informare i relativi sindaci e/o per quanto riguarda San Marino le autorità territorialmente competenti.

Qualora vengano rilevate anomalie sistematiche, ovvero ripetute e consecutive presso lo stesso punto di campionamento, riconducibili alla stessa causa e/o legate a carenze di sistema, A.A.S.S. e Hera valuteranno congiuntamente le possibili alternative azioni correttive da adottare al fine di evitare il ripetersi dell'anomalia.

Dovendo il servizio di distribuzione di acqua potabile essere effettuato con

continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell'anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata, le cui tempistiche dovranno essere comunicate in anticipo da una Parte all'altra, con particolare riferimento a crisi qualitative della risorsa al punto di consegna e conseguentemente presso la rete di distribuzione, ovvero in tutti i casi di superamento dei livelli qualitativi previsti dalla normativa applicabile, non eliminabili nell'immediato con l'adozione di azioni correttive appropriate e risolutive, verranno applicate le disposizioni di legge in materia. A.A.S.S. e/o Hera, appurato il superamento e/o evidenziato l'inquinamento da sostanze pericolose per la salute pubblica, ne daranno immediata informazione alle relative Autorità competenti.

Solo in caso in cui sia accertato che l'acqua al punto di consegna sia inadatta al consumo umano, per comprovata evidenza di gravissimo inquinamento da sostanze pericolose che potrebbero avere effetto immediato sulla salute pubblica, la Parti potranno interrompere temporaneamente la fornitura della risorsa prodotta, in attesa, da parte delle Autorità Competenti, di indicazioni sull'adozione di azioni per limitare/escludere il rischio per la salute pubblica, fermo restando in ogni caso l'applicazione delle disposizioni di legge in materia.

In ogni caso A.A.S.S. dovrà comunicare ad Hera, e viceversa, nei tempi più brevi possibili dall'accertamento:

- qualsiasi situazione di inquinamento/contaminazione dell'acqua fornita di cui dovesse essere a conoscenza qualunque ne sia la causa;
- eventuali modifiche sostanziali delle caratteristiche chimiche, fisiche, microbiologiche ed organolettiche dell'acqua fornita conseguenti alla modifica dell'acqua all'origine e/o dei trattamenti di potabilizzazione

effettuati e/o forniture con autobotte.

Su tutti i punti di consegna, se non diversamente indicato nell'allegato 2, si intendono comunque assicurate le seguenti condizioni:

- per il parametro "Clorito" valori non superiori a 500 µg/l (cinquecento microgrammi per litro);
- per il parametro "Triometani totale" (THM) valori non superiori a 15 µg/l (quindici microgrammi per litro);
- per il parametro "Manganese" valori non superiori a 30 µg/l (trenta microgrammi per litro);
- per il parametro "Cloro residuo libero" le Parti si impegnano a garantire la corretta cloro copertura presso i propri punti di consegna con valori di range fissati nell'allegato 2;
- per il parametro "Turbidità" valori non superiori a 1 NTU (uno NTU).

Art. 10 – Note informative sui rischi residui ed ambientali

Negli impianti la cui titolarità della gestione è in capo a Hera, elencati nell'allegato 5a, per la durata del presente Contratto, è consentito l'accesso da parte di personale di A.A.S.S. solamente per svolgere attività connesse alle forniture idriche regolate dal Contratto. In tali impianti i lavoratori di A.A.S.S. e quelli di soggetti terzi incaricati da A.A.S.S. dovranno seguire le procedure di sicurezza finalizzate ad eliminare e/o a rendere marginali i rischi indicati nel DUVRI (documento unico di valutazione rischi interferenziali) redatto da Hera ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. Tale DUVRI è riportato nell'allegato 5.

Negli impianti la cui titolarità della gestione è in capo a A.A.S.S., come elencati nell'allegato 5a, per la durata del presente Contratto, è consentito l'accesso da parte di personale Hera solamente per svolgere attività connesse alle forniture

Idriche regolate dal Contratto. In tali impianti i lavoratori Hera e quelli di soggetti terzi incaricati da Hera dovranno seguire le procedure di sicurezza finalizzate ad eliminare e/o a rendere marginali i rischi indicati nel DUVRI (documento unico di valutazione rischi interferenziali) redatte da A.A.S.S. Tale DUVRI è riportato nell'allegato 5.

Ciascuna Parte si impegna a comunicare preventivamente all'altra Parte eventuali modifiche allo stato degli impianti di propria titolarità, anche transitorie, che possono avere influenza sulle modalità di accesso ed utilizzo dei luoghi, con particolare riferimento a tutte le situazioni che possono impattare sulla sicurezza dei lavoratori.

Art. 11 – Referenti

Per l'attuazione e il controllo del presente Contratto le Parti indicano i seguenti referenti:

per A.A.S.S.:

referente principale: Oscar Mina, Capo Servizio Acqua-Gas, tel. 0549883668, e-mail: oscar.mina@aass.sm.

referente sostituto: Mirco Fabbri, responsabile reti, tel. 0549883657, e-mail: mirco.fabbri@aass.sm.

per Hera:

referente principale: Francesco Maffini (tel. 0532.780140 e-mail: francesco.maffini@gruppohera.it)

referente sostituto: Mirco Boschetti (tel. 0541 908356 e-mail: mirco.boschetti@gruppohera.it)

L'eventuale sostituzione dei referenti dovrà essere comunicata da una Parte all'altra in forma scritta.

Art. 12 – Mancato rispetto dei requisiti di fornitura, risarcimento danni e forza maggiore

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare tutte le misure e i comportamenti necessari al fine di evitare l'accadimento di fatti che possano essere causa di danno o di responsabilità verso terzi e/o Enti per una Parte.

Ciascuna Parte, pertanto, si impegna sin da ora ad indennizzare e tenere indenne l'altra Parte nel caso di danni ad essa derivanti quale conseguenza del proprio inadempimento alle obbligazioni previste a suo carico ai sensi del presente Contratto.

Ferme restando le altre disposizioni del presente Contratto, nel caso di Forza Maggiore che renda impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del presente Contratto, la Parte impossibilitata ad adempiere alle proprie obbligazioni dovrà:

(i) comunicare tempestivamente il verificarsi di tale evento di Forza Maggiore fornendo una previsione circa la sua durata ed il probabile impatto sull'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto (assieme a tutte le evidenze ragionevolmente richieste a supporto dell'esistenza di tale evento di Forza Maggiore);

(ii) adoperarsi in buona fede e sollecitamente per adottare le misure necessarie a risolvere o mitigare le circostanze che hanno dato luogo all'evento di Forza Maggiore;

(iii) comunicare tempestivamente (e comunque non oltre 24 ore dalla cessazione) all'altra Parte la conclusione dell'evento di Forza Maggiore.

Qualora l'evento di Forza Maggiore renda parzialmente o temporaneamente impossibile l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto, e tale evento

di Forza Maggiore perduri per un periodo di [6 (sei) mesi] consecutivi, ciascuna

Parte potrà recedere dal Contratto dietro preavviso scritto di [45 (quarantacinque)] giorni all'altra Parte, salvo laddove, prima della data di risoluzione proposta, il relativo evento di Forza Maggiore cessi e non continui in tale data di risoluzione proposta.

Al fini del presente Contratto, si intende evento di Forza Maggiore un atto, fatto o circostanza imprevedibile non direttamente imputabile alla Parte che lo invoca che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza, adottando tutte le ragionevoli misure di natura tecnica e commerciale, e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, alluvioni, valanghe e frane di pendii, mareggiate, danni provocati da terzi, black-out elettrici, rilevanti inquinamenti della risorsa, periodi siccitosi.

Art. 13 – Tariffe

Alle forniture d'acqua regolate dal presente Contratto si applicherà una tariffa onnicomprensiva di tutti gli oneri per ciascun metro cubo d'acqua fornita da Hera a A.A.S.S. e viceversa da A.A.S.S. a Hera, così di seguito concordata e determinata in considerazione dell'evoluzione tariffaria stabilita da Atersir per l'ambito territoriale di Rimini.

Per la fornitura di acqua da Hera a A.A.S.S., Hera applicherà le seguenti tariffe:

- per l'anno 2017: € 0,728 (euro zero virgola settecentoventotto) / m3;
- per l'anno 2018: € 0,786 (euro zero virgola settecentottantasei) / m3.

Le Parti prendono atto che le tariffe relative all'anno 2018 potranno subire le revisioni previste dall'attuale metodo tariffario che stabilisce gli aggiornamenti tariffari per gli anni 2016 – 2017 con possibilità di revisione per l'anno 2018, che

le Parti si impegnano ad applicare, operando i conseguenti congruagli.

In considerazione dei maggiori costi energetici e di trattamento sostenuti da A.A.S.S. per la fornitura di acqua da A.A.S.S. a Hera, A.A.S.S. applicherà un incremento tariffario di € 0,077/ m3 rispetto alla tariffa applicata da Hera a A.A.S.S. indicata sopra e quindi:

Per la fornitura di acqua da A.A.S.S. a Hera, A.A.S.S. applicherà le seguenti tariffe:

- per l'anno 2017: € 0,805 (euro zero virgola ottocentocinque) / m3;
- per l'anno 2018: € 0,863 (euro zero virgola ottocentosessantatre) / m3.

Art. 14 – Modalità di pagamento

I corrispettivi dovuti per le forniture di cui al presente Contratto saranno pagati sulla base di fatture mensili emesse, nel rispetto della normativa che regola i rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino.

Il pagamento sarà effettuato a saldo entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese.

Eventuali fatture ritenute irregolari dovranno essere contestate in forma scritta.

In tali casi i termini di pagamento resteranno sospesi, per la sola parte oggetto della contestazione, fino a quando le contestazioni non saranno state risolte. Il superamento dei termini di pagamento prima definiti per effetto di eventuali sospensioni per contestazioni non darà luogo all'applicazione di interessi di mora.

Le Parti si obbligano al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii. e s'impegnano ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse

pubbliche. Le fatture in particolare, dovranno essere pagate con bonifico bancario sui conti correnti che le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente per iscritto.

Art. 15 – Trasferimento dati

Qualora sia presente un sistema di telerilevamento le Parti provvederanno a fornire i dati giornalieri relativi alle forniture idriche.

Art. 16 –Contestazioni ed inadempimenti

Eventuali controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Contratto, che dovessero sorgere fra le Parti, verranno dapprima verificate in contraddittorio con gli uffici competenti interni e le Parti concorderanno tempi e modi di soluzione delle criticità. Qualora non si raggiunga un accordo bonario in merito ed una Parte risulti inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente Contratto, l'altra potrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito. La diffida, da inviarsi mediante raccomandata A/R o mediante PEC, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro il termine indicato, la Parte alla quale è stato sollevato l'addebito dovrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'esatto adempimento. Decorso inutilmente il termine indicato e persistendo l'inadempimento contrattuale, la Parte non inadempiente potrà far valere, nei confronti della Parte inadempiente, i propri diritti secondo le vigenti norme in materia di responsabilità contrattuale, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 17.

Art. 17 –Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti – ivi inclusi i

procedimenti cautelari e di urgenza - sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Art. 18 - Spese contrattuali

Le Parti provvederanno alla registrazione del presente contratto sulla base delle rispettive legislazioni fiscali, con spese a carico della Parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico delle Parti in uguale misura.

Art. 19 - Trattamento dei dati

Le Parti si danno atto che ciascuna di esse è titolare del trattamento dei dati personali dell'altra Parte di cui venga in possesso in ragione e conseguenza del presente Contratto e che tale trattamento è effettuato ai fini e per gli effetti dell'adempimento, per competenza, dello stesso. I dati personali saranno trattati dalle Parti nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dalla legge applicabile a ciascuna Parte. A tal fine le stesse dichiarano di essersi scambiate le reciproche informative.

Art. 20 - Allegati

Fanno parte integrale e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:

Allegato 1: Punti di consegna, di misura e di campionamento

Allegato 2: Requisiti di fornitura

Allegato 3: Descrizione punti di consegna

Allegato 4: Estratto cartografico a diversa scala dei punti di consegna

Allegato 5: DUVRI (documento unico di valutazione rischi interferenziali)

Allegato 5a: Identificazione dei rischi specifici presso gli impianti nei quali è prevista una attività ordinaria da parte del personale delle due società.

Le Parti convengono che entro il periodo di validità contrattuale gli allegati potranno essere sottoposti a verifica in relazione ad aspetti emergenti che

saranno di volta in volta valutati.

Art. 21 - Recapiti

Le Parti danno atto che ogni comunicazione riguardante il presente contratto dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata indirizzata ai seguenti recapiti:

Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino :

Via Andrea di Superchio, n. 16 - Repubblica di San Marino

PEC : evalli.aass@legalmail.it

HERA S.p.A. :

Viale C.Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna

PEC : heraspa@pec.gruppohera.it

Art. 22 - Modifiche contrattuali - Recepimento della normativa

Il presente Contratto potrà essere modificato tra le Parti solamente per iscritto.

Le Parti si danno atto che Hera interviene nel presente Contratto in quanto Gestore affidatario del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini, quest'ultimo tuttora vigente in regime di *prorogatio* in virtù di deliberazione Atersir n. 25 del 21/12/2012 fino alla decorrenza del nuovo affidamento. Nel caso in cui in vigenza del presente Contratto l'Atersir dovesse affidare il Servizio Idrico Integrato (di seguito "SII") nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini a soggetto diverso da Hera, Hera non si assumerà alcun obbligo, onere o responsabilità in relazione all'eventuale subentro del nuovo Gestore nel presente Contratto, essendo noto alle Parti che la regolazione del SII è un'attività di esclusiva competenza di ATERSIR .

Nel caso di modifiche normative o regolamentari di carattere imperativo, le

stesse si intenderanno automaticamente inserite nel Contratto, anche in sostituzione delle clausole concordate tra le Parti. Fermo restando quanto sopra, qualora si verifichi una modifica normativa che renda impossibile in tutto o in parte, per una delle Parti o per entrambe, adempiere alle obbligazioni stabilite ai sensi del Contratto, che siano parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che siano tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni in base alle quali il Contratto è stato stipulato e le disposizioni di legge o regolamentari non siano suscettibili di inserimento automatico, la Parte interessata da tale modifica potrà proporre all'altra Parte modifiche al Contratto. L'altra Parte si impegna a manifestare per iscritto la propria accettazione ovvero la mancata accettazione delle modifiche proposte [entro 30 (trenta) giorni] dal ricevimento delle stesse. In caso di mancata accettazione e di mancato raggiungimento di un diverso accordo tra le Parti, ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere dal Contratto comunicando la propria volontà con 30 (trenta) giorni di preavviso, senza che l'altra Parte possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo per l'avvenuto recesso.

Letto, approvato e sottoscritto:

per Hera S.p.A.

L'Ammministratore Delegato
[Redacted Signature]
(Dott. Stefano Veneri)

per Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di
San Marino

Il Presidente

(Geom. Federico Crescentini)

[Redacted Signature]



Contratto di Fornitura - ALLEGATO n° 1 - Elenco dei punti di consegna (PDC)

Competenza gestionale PDC	Denominazione PDC	Ubicazione PDC	Comune PDC	Sito PDC
A.A.S.S.	Capacci	VIA SERRA VENTOSO e STRADA FORFALINETTO, BORGO MAGGIORE	VERUCCHIO	Pozzetto sito nell'ex impianto Hera denominato Capacci
A.A.S.S.	Lazzara	VIA LAZZARA, 1058 e STRADA GENGA AGUZZA, ACQUAVIVA	VERUCCHIO	Pozzetto stradale
A.A.S.S.	Piava Corona	VIA SAN GIOVANNI IN CORTI, 881 e VIA ZORO, CHIESANUOVA	VERUCCHIO	Pozzetto stradale
A.A.S.S.	Torello	VIA TORELLO e VIA DEGLI ACERI, ACQUAVIVA	SAN LEO	Pozzetto stradale
A.A.S.S.	Ventoso	VIA PROV. LE SAN MARINO e DECINA GUALDARA, BORGO MAGGIORE	VERUCCHIO	Pozzetto stradale
HERA	Monte Olivo (Boscho)	VIA MONTE OLIVO, DERASOLDI	CORIANO	Pozzetto stradale
HERA	Serra Marignano	VIA SANTA CRISTINA, GALAZZANO	RIMINI	Volto arii rogato con e da cartello Hera Serra Marignano
HERA	Dogana 1	STRADA DI FONDOVALLE	RIMINI	Pozzetto stradale
HERA	Dogana 2 (prodiposizione)	STRADA DI FONDOVALLE	RIMINI	Pozzetto stradale

Contratto di Fornitura - ALLEGATO n° 1 - Elenco dei punti di misura (PDM)

Competenza gestionale del PDM	Denominazione PDC	Ubicazione PDM	Numero PDM	Tipo installazione di portello	Tipo di lettura	Verifica volumetrica richiedi
A.A.S.S.	Capacci	presso il pozzetto PDC sito nell'ex impianto Hera denominato Capacci	373482	Meccanico	manuale	ogni due anni
A.A.S.S.	Lazzara	presso pozzetto stradale	6181	Meccanico	manuale	ogni due anni
A.A.S.S.	Piava Corona	presso pozzetto stradale	469372	Meccanico	manuale	ogni due anni
A.A.S.S.	Torello	presso pozzetto stradale	373321	Meccanico	manuale	ogni due anni
A.A.S.S.	Ventoso	presso pozzetto stradale	251586	Meccanico	manuale	ogni due anni
A.A.S.S.	Monte Olivo (Boscho)	presso il basalto a bordo strada di fronte al pozzetto PDC	35612005151E15000	Elettromagnetico	manuale	ogni due anni
HERA	Serra Marignano	presso il cartello Hera Serra Marignano	393009000000000000	Elettromagnetico	manuale	ogni due anni
HERA	Dogana 1	presso pozzetto stradale	36512000000424807	Meccanico	manuale	ogni due anni
HERA	Dogana 2 (prodiposizione)	presso pozzetto stradale	3851300000000427039	Meccanico	manuale	ogni due anni

Contratto di Fornitura - ALLEGATO n° 1 - Elenco dei punti di campionamento (PdC)

Competenza gestionale PdC	Denominazione PDC	Ubicazione PdC	Codice KERA PdC	Codice RSM PdC	GPS PdC
HERA	Capacci	presso il pozzetto in prossimità del PDC e dal cartello a Hera Capacci	RN1VE0001RE7020	TH01-S221	N43 57.523 E12 25.864
A.A.S.S.	Lazzara	presso il pozzetto stradale	RN1VE0001RE7024	TH02-S221	N43 57.473 E12 25.183
A.A.S.S.	Piava Corona	presso il pozzetto stradale	RN1VE0001RE7023	TH03-S221	N43 56.013 E12 24.932
A.A.S.S.	Torello	presso il pozzetto stradale	RN1VE0001RE7022	TH6-S13RSM	N43 57.300 E12 24.260
A.A.S.S.	Ventoso	presso il pozzetto stradale	RN1VE0001RE7021	TH24-S221	N43 57.428 E12 26.220
HERA	Monte Olivo (Boscho)	non fornito presso il cartello Hera Monte Olivo	RN1COR004SER000	TH05-S331	N43 57.648 E12 30.550
HERA	Serra Marignano	non fornito presso il cartello Hera Serra Marignano	RN1R10005SER000	TH06-S331	N43 56.182 E12 27.768
HERA	Dogana 1	non programmato	non codificato	TH07-S23RSM	
HERA	Dogana 2 (prodiposizione)	non programmato	non codificato	TH08-S33RSM	

Contratto di Fornitura - ALLEGATO n° 2 - Requisiti di fornitura

Competenza gestionale della quantità e qualità dell'acqua erogata	Denominazione punto di consegna	Ubicazione punto di consegna	Comune	Parametri quantitativi specifici				Parametri qualitativi specifici								Torbidità (NTU)	
				portata (l/sec)		volume giornaliero (mc/g)		clorito (µg/l)		THM (µg/l)		Mn (µg/l)		cloro residuo libero (mg/l) Cl2			
				min	max	min	max	Limite	Nota	Limite	Nota	Limite	Nota	Limite	Nota	Limite	Nota
A.A.S.S.	Capacci	VIA SERRA VENTOSO e STRADA FORFALENETTO, BORGO MAGGIORE	VERUCCHIO	/	/	4	15	<500		<15	(3)	<30		0,02<Cl2<0,3	(1)	1,00	
A.A.S.S.	Lazzara	VIA LAZZARA, 1056 e STRADA GENNA AGUZZA, ACQUAVIVA	VERUCCHIO	/	/	1	4	<500		<15		<30		0,05<Cl2<0,3	(1)	1,00	
A.A.S.S.	Pieve Corona	VIA SAN GIOVANNI IN CORTE, 801 e VIA ZORO, CHIESANUOVA	VERUCCHIO	/	/	40	240	<500		<15	(3)	<30		0,02<Cl2<0,3	(1)	1,00	
A.A.S.S.	Toralla	VIA TGRELLO e VIA DEGLI ACERI, ACQUAVIVA	SAN LEO	/	/	50	102	<500		<15	(3)	<30		0,02<Cl2<0,3	(1)	1,00	
A.A.S.S.	Ventoso	VIA PROV. LE SAN MARINO e DECINA GUALDARIA, BORGO MAGGIORE	VERUCCHIO	/	/	4	45	<500		<15	(3)	<30		0,02<Cl2<0,3	(1)	1,00	
HERA	Monte Olivo (Bosche)	VIA MONTE OLIVO, CERASOLO	CORIANO	0	25	350	1150	<500		<15		<30		0,05<Cl2<0,3	(1)	1,00	
HERA	Serra Marignano	VIA SANTA CRISTINA, GALAZZANO	RIMINI	0	13	420	1200	<500		<15		<30		0,05<Cl2<0,3	(1)	1,00	
HERA	Dogana 1	STRADA DI FONDOVALLE	RIMINI	/	/	7	28	<500		<15		<30		0,05<Cl2<0,3	(1)	1,00	
HERA	Dogana 2 (predispesizione)	STRADA DI FONDOVALLE	RIMINI	/	/	/	/	<500		<15		<30		0,05<Cl2<0,3	(1)	1,00	

NB: I valori dei parametri quantitativi e qualitativi sono indicativi e riferiti a condizioni di esercizio ordinaria

Parametro qualitativo o quantitativo	Nota utilizzata	
	/	Nessuna specifica rilevante
Cloro residuo	(1)	La Azienda si impegna a garantire valori di cloro residuo libero adeguato al rispetto prioritario dei limiti previsti per i parametri clorito e THM. Dovrà essere in ogni caso garantita la conformità microbiologica dell'acqua fornita, così come definito dall'allegato I parti A e C del D.Lgs 31/01.
Cloriti	(2)	Presenza di altre idratazioni a valle di di rete lungo la rete di distribuzione
THM	(3)	Presenza di altre idratazioni a valle di di rete lungo la rete di distribuzione




Punto di Consegna da A.A.S.S.R.S.M. a Hera

Denominazione Punto di Consegna: **Capacci**

Ubicazione: Via Serra Ventoso o Strada Forfaltenetto in località Borgo Maggiore

Comune: Verucchio

Contatore in gestione a A.A.S.S.RSM: presso pozzetto PDC

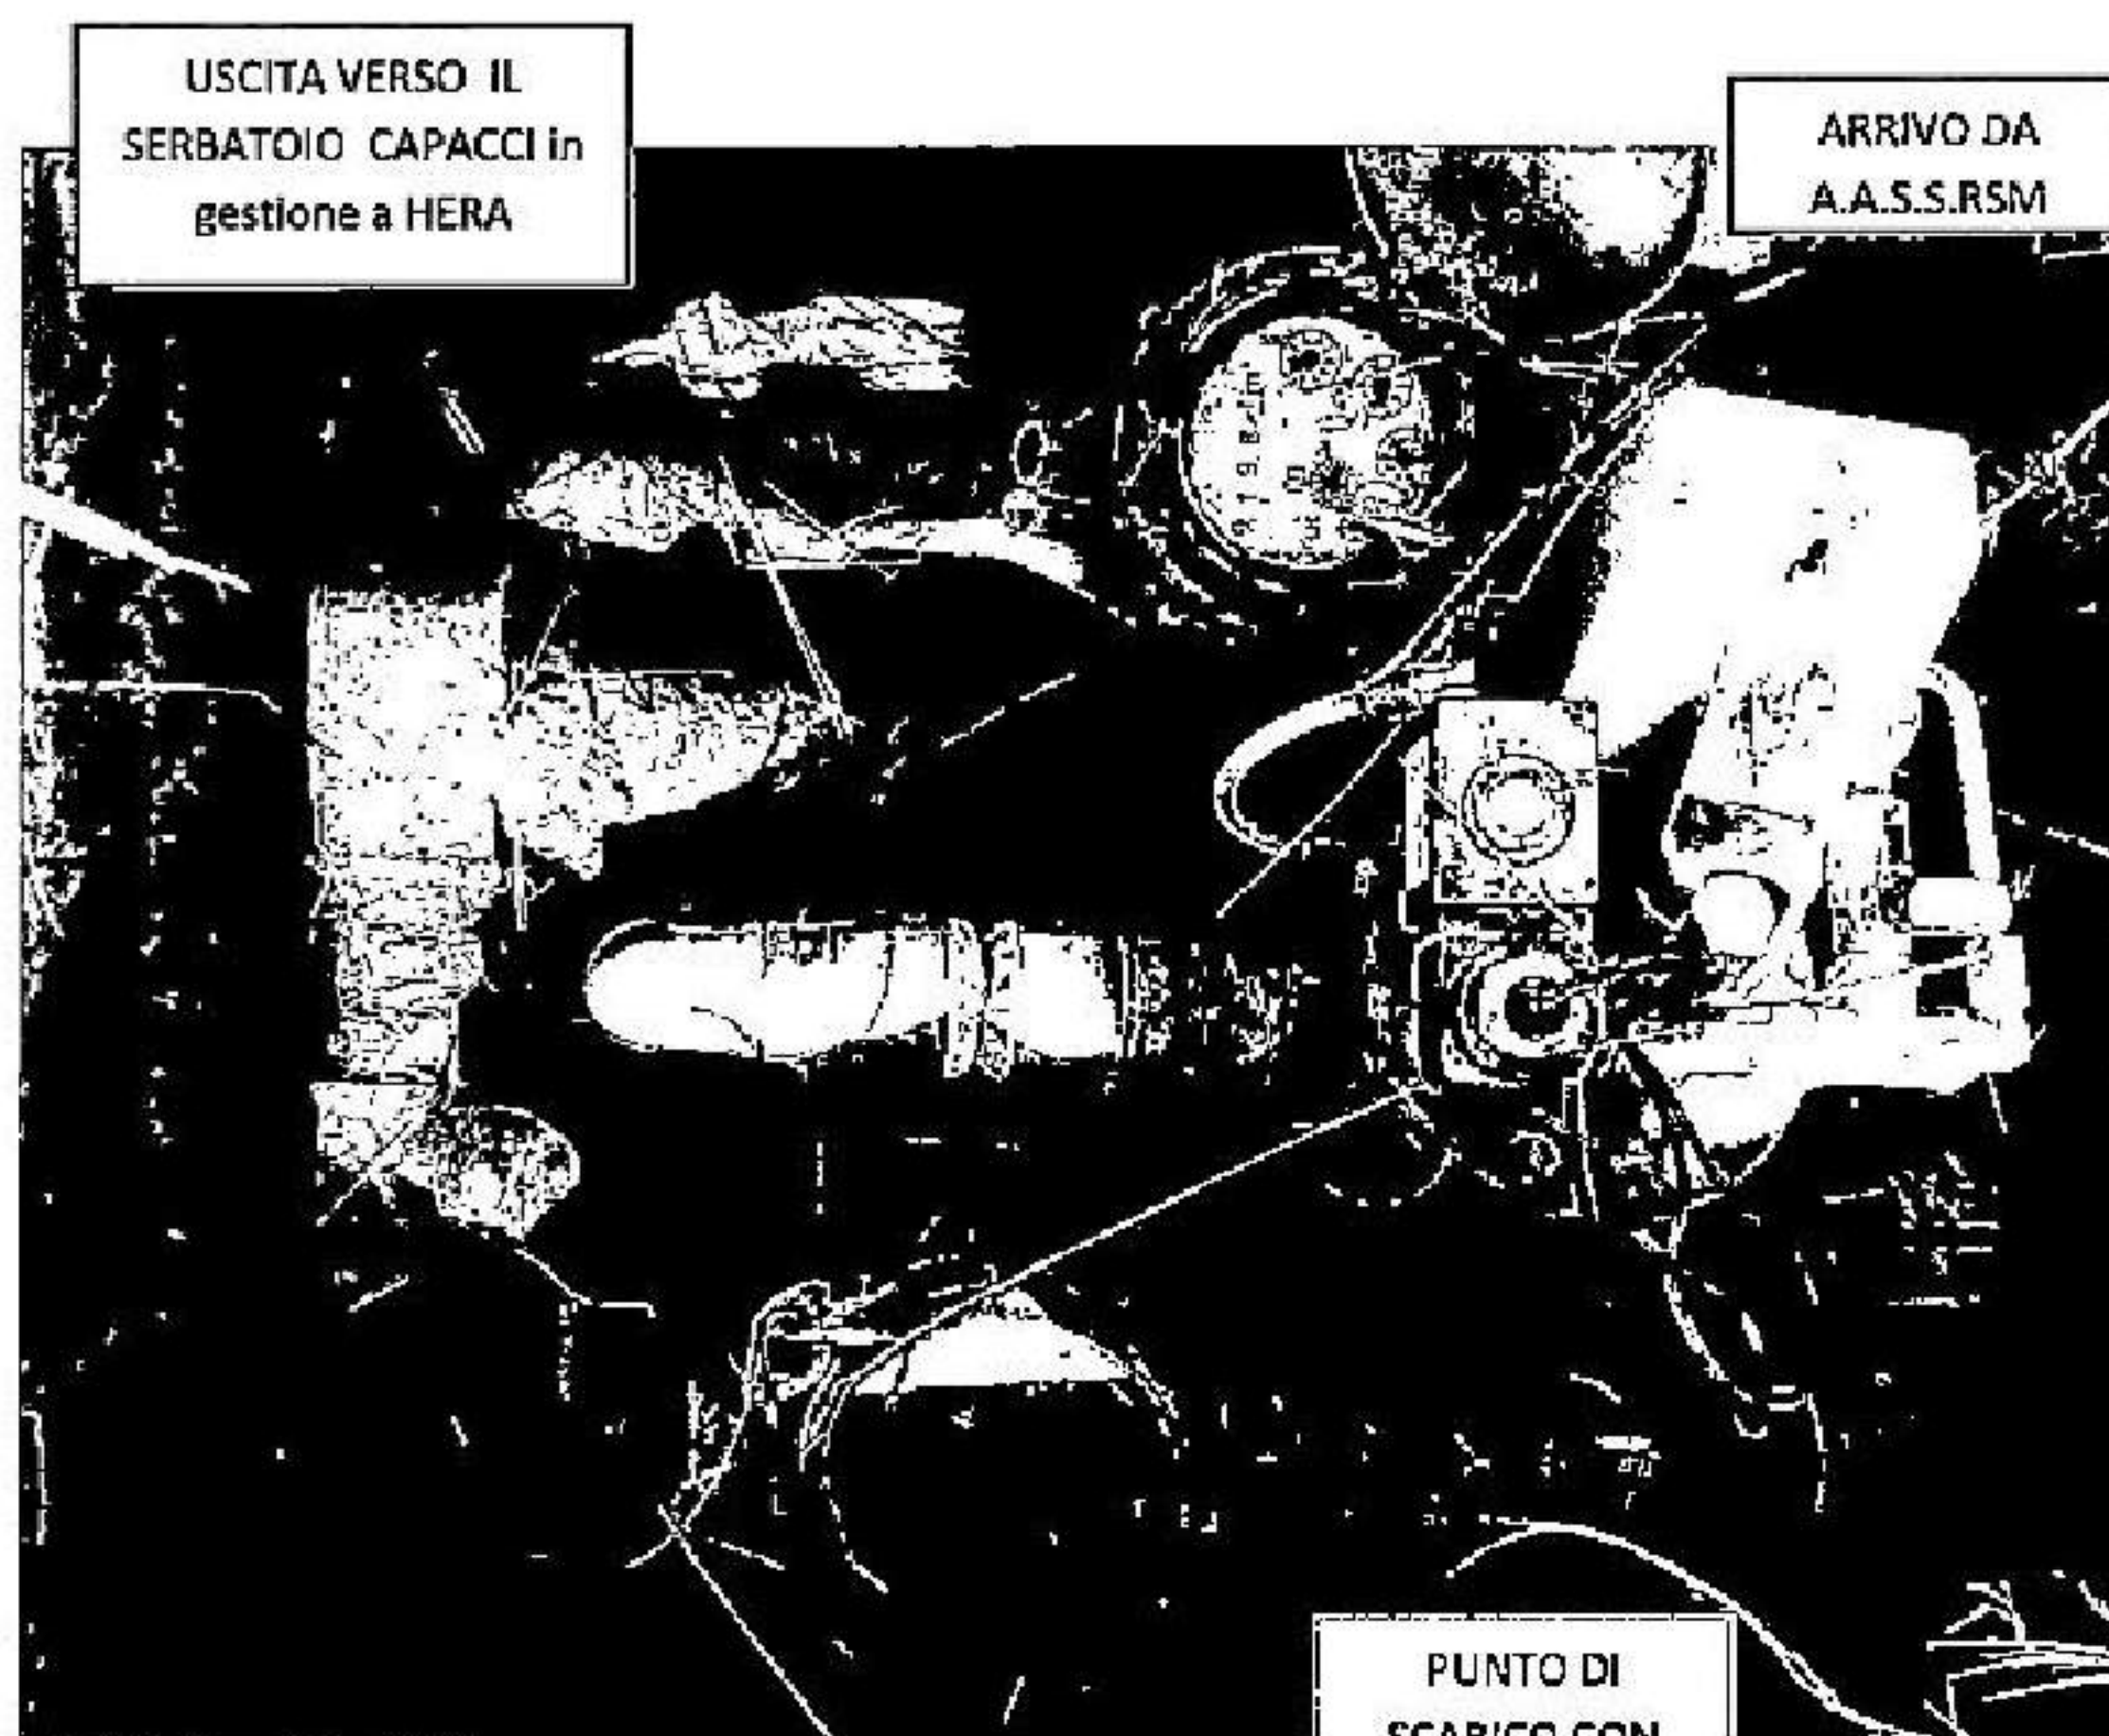


USCITA VERSO IL
SERBATOIO CAPACCI in
gestione a HERA

ARRIVO DA
A.A.S.S.RSM

PUNTO DI
SCARICO CON
VALVOLA
AUTOMATICA IN
GESTIONE A
A.A.S.S.RSM

Coordinate Punto di campionamento: N 43 57.502 E 012 25.927

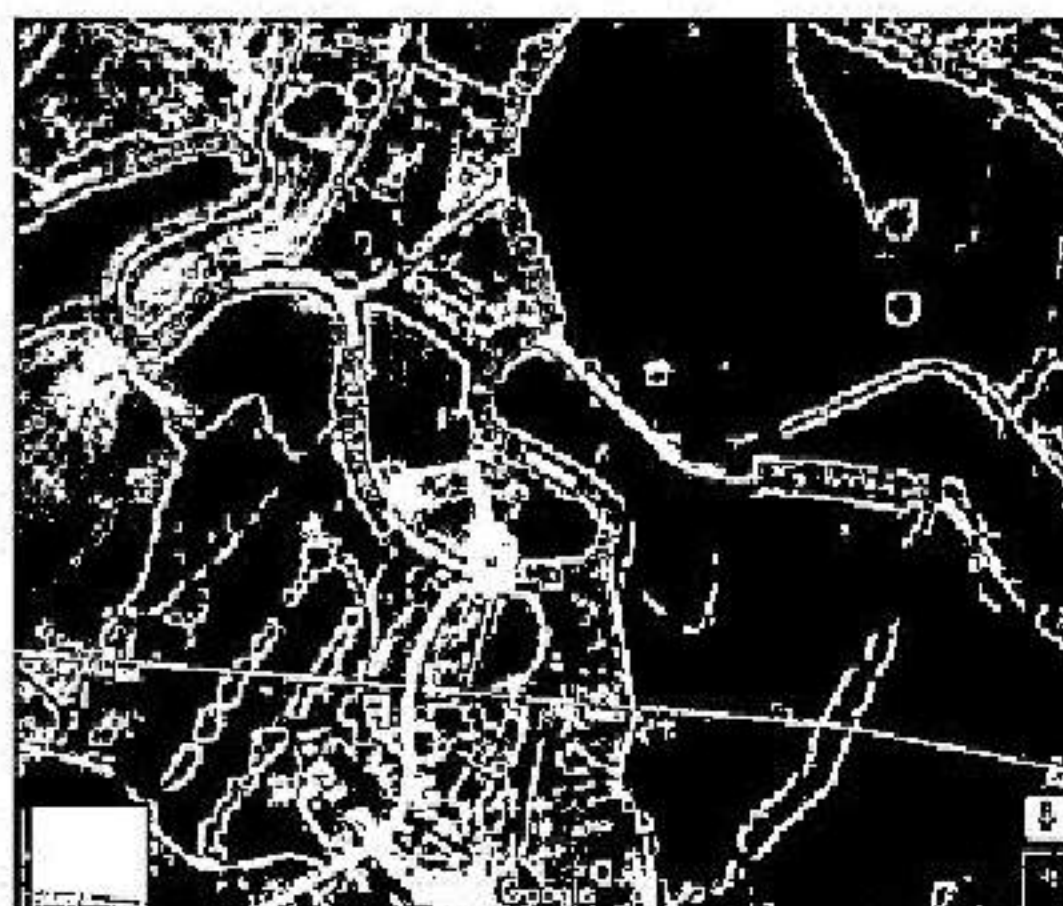

Il Punto di Consegna e il Punto di Misura Capacci sono ubicati presso il pozzetto a bordo strada in Via Serra Ventoso o Strada Forfalenetto, in località Borgo Maggiore (in prossimità al serbatoio interrato Hera denominato Capacci). Ciascun componente sarà mantenuto in efficienza a cura e spese di A.A.S.S.RSM. Diversamente, il punto di Campionamento, per le verifiche analitiche relative alla conformità e qualità dell'acqua fornita, è predisposto in altro pozzetto, in adiacenza al punto di fornitura, ed è in gestione ad Hera.

Presso il Punto di fornitura nessun dispositivo di telecontrollo è al momento allestito, né è presente utenza elettrica.

La fornitura di acqua potabile dalla Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino verso il serbatoio in gestione ad Hera denominato Capacci, approvvigiona, a gravità, la rete di pubblico acquedotto in distribuzione nelle località Capacci, Ventoso e Gà Gacci, in comune di Verucchio.

Presso il serbatoio Capacci, allestita e gestita da Hera, è presente una stazione Low Power, alimentata a batteria, per la trasmissione alla sala telecontrollo Hera del segnale del livello stoccaggio prodotto reagente e stato della batteria che alimenta la pompa dosatrice.

Il mantenimento del corretto grado di cloro copertura della rete idrica, sottesa al punto di consegna, è garantito da Hera mediante trattamento di disinfezione con reagente a base di cloro (ipoclorito), il cui dosaggio, in funzione della portata, è attuato con cloratore a batteria e contatore lancia impulsi presso il serbatoio di Capacci.

I quantitativi mensili erogati, sulla base della serie storica, risultano variabili dai 130 ai 440 mc, così come i volumi annui di fornitura oscillano fra i 2.000 e i 4.000 mc/anno


Punto di Consegna da A.A.S.S.R.S.M. a Hera

Denominazione Punto di Consegna: **Lazzara**



Ubicazione: Via Lazzara, 1058 o Strada Genga Aguzza_Acquaviva

Comune: Verucchio

Contatore in gestione a A.A.S.S.RSM: presso pozzetto PDC

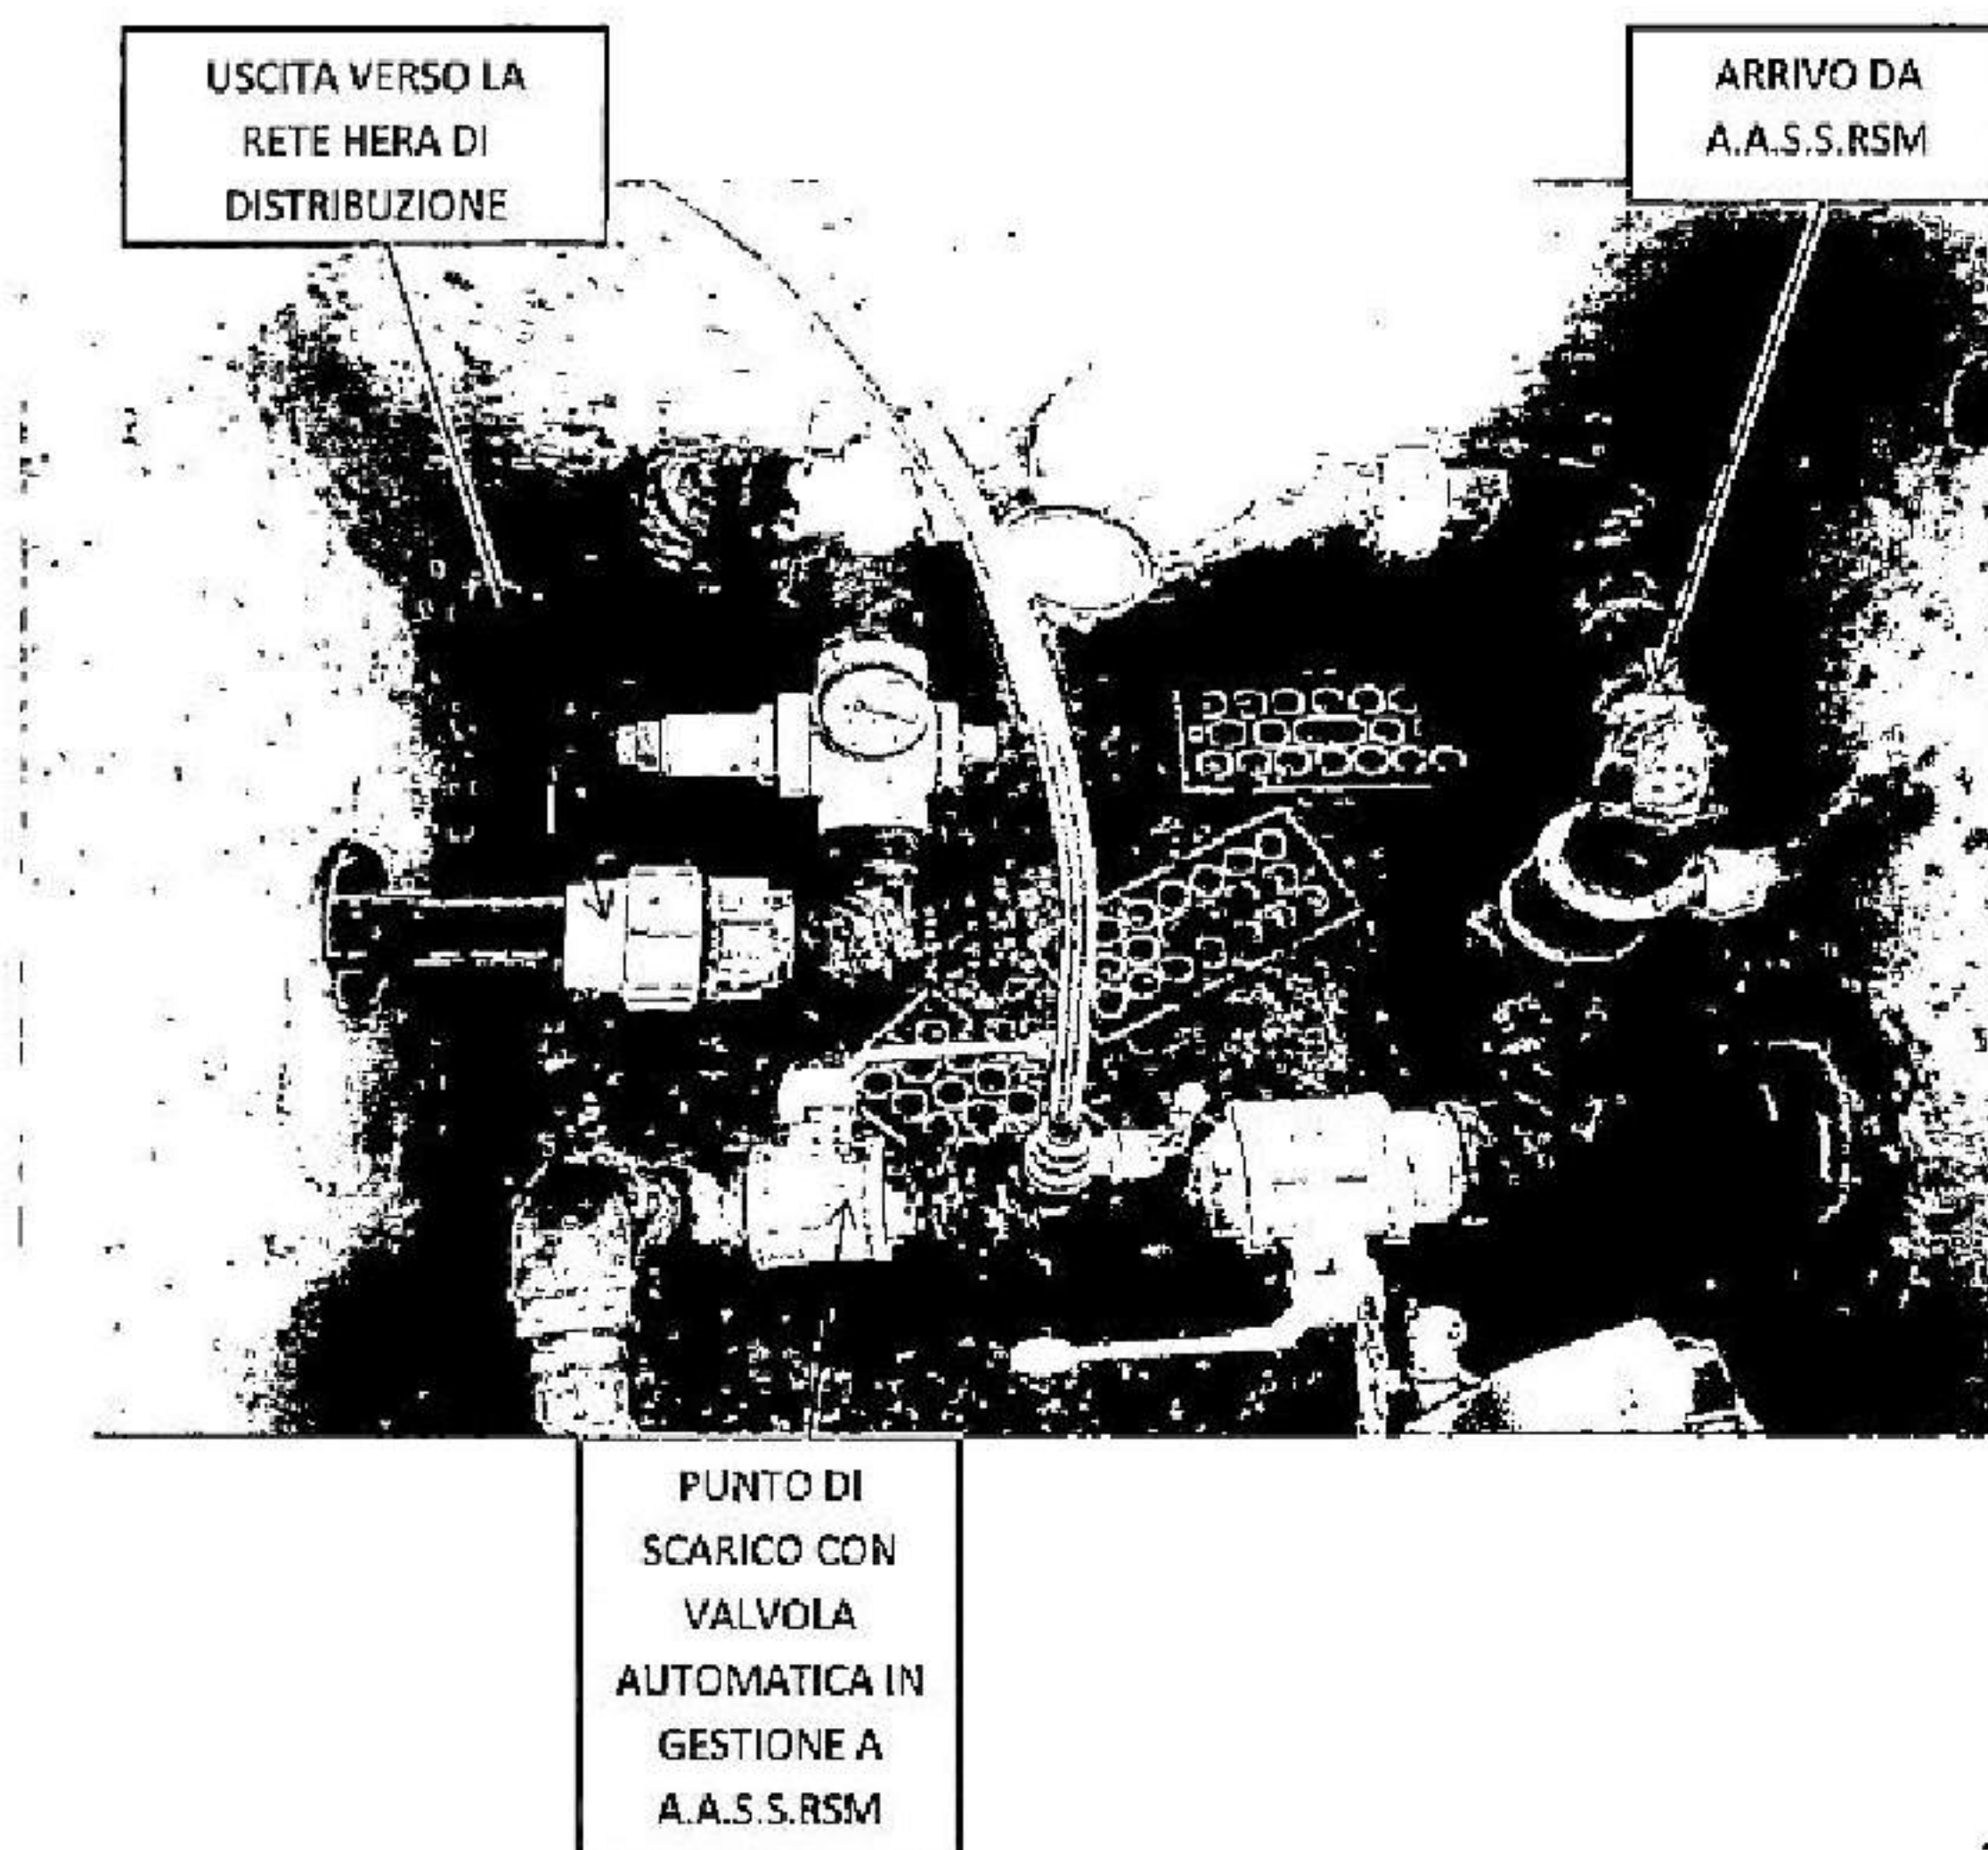

Coordinate Punto di campionamento: N43 57.473 E12 25.185

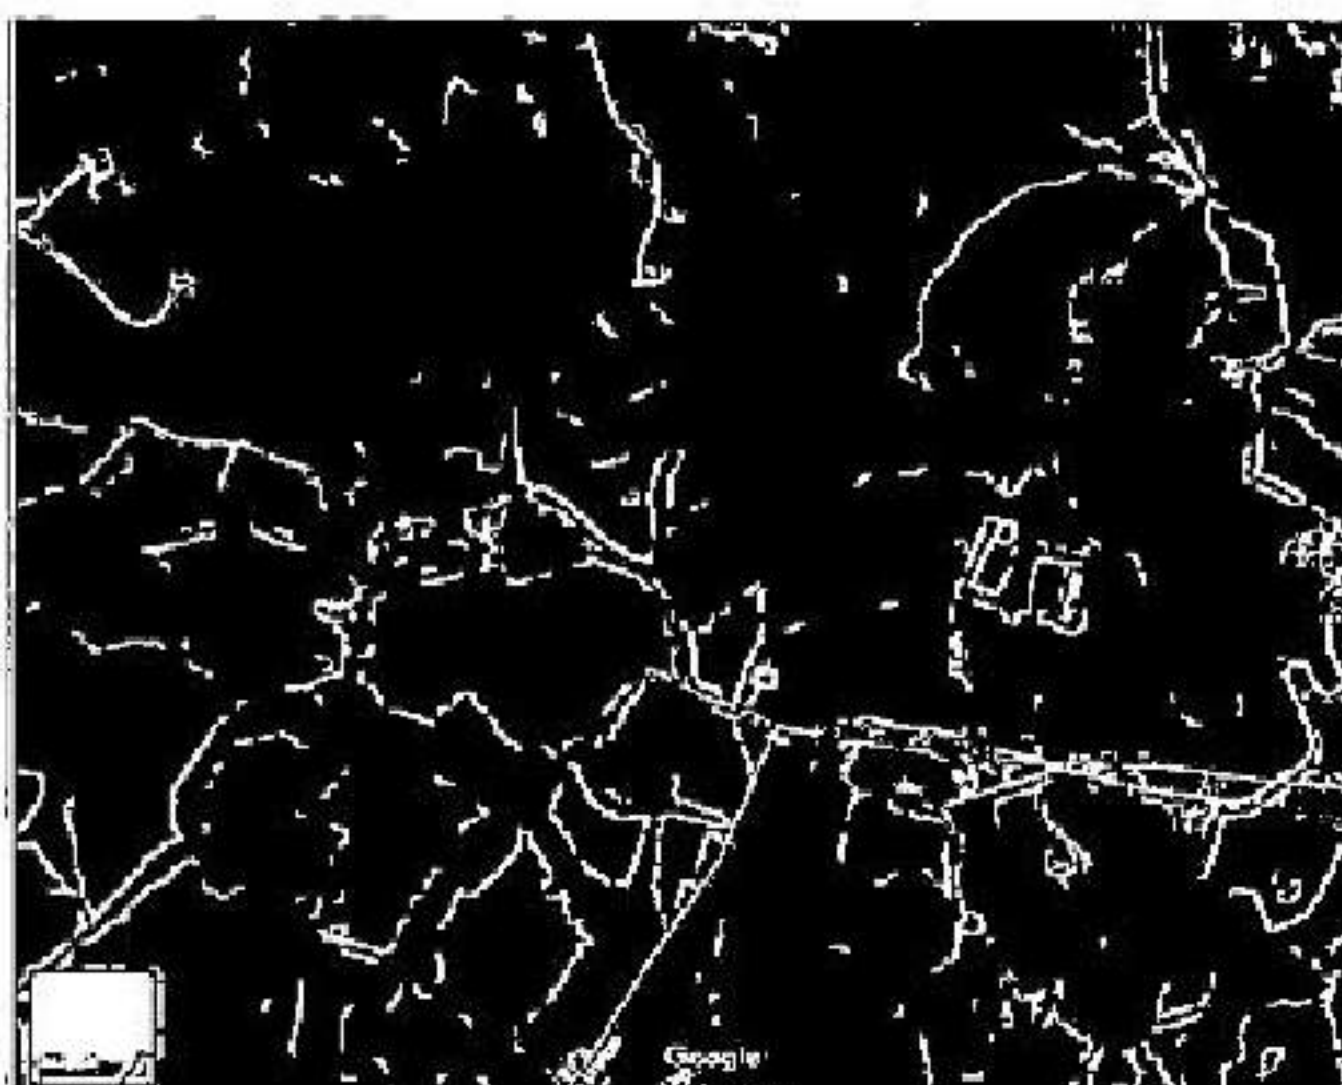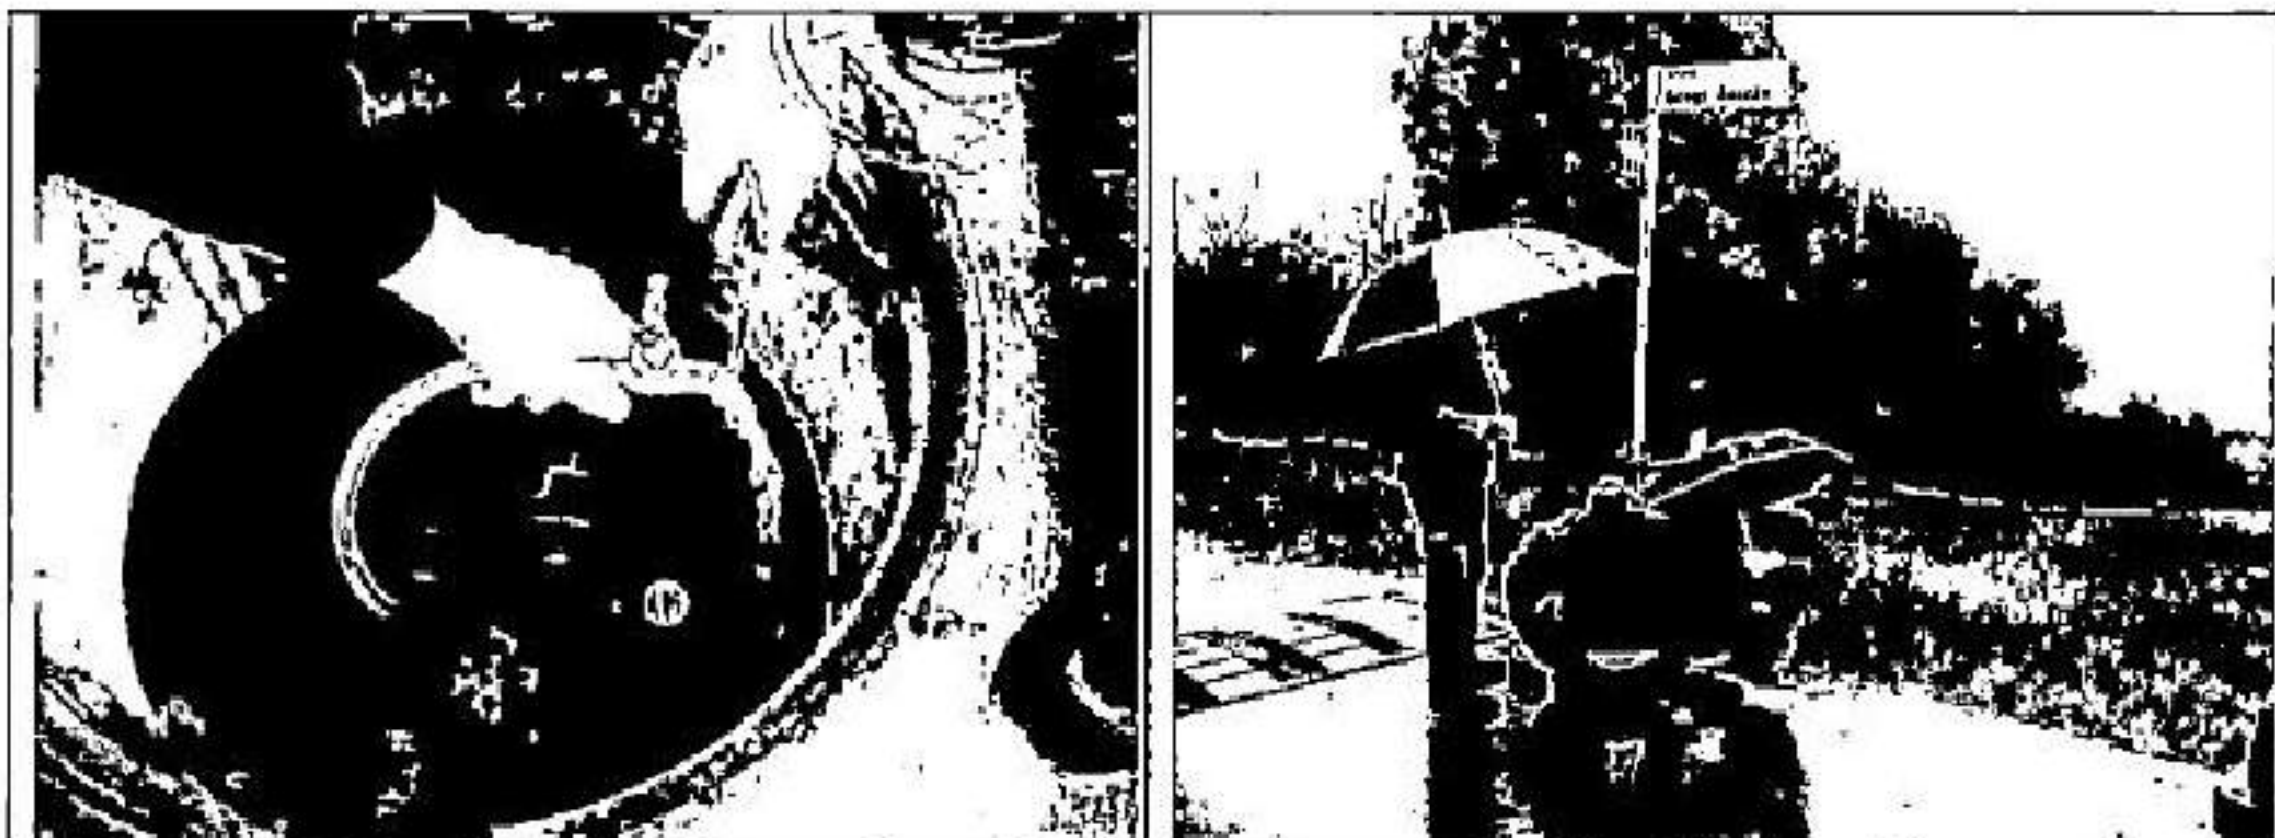

Il Punto di Consegna Lazzara, il punto di Misura e il Punto di Campionamento, per le verifiche analitiche relative alla conformità e qualità dell'acqua fornita, sono ubicati presso il pozzetto a bordo strada in Via Lazzara, 1058 o Strada Genga Aguzza, in località Acquaviva.

Ciascun componente sarà mantenuto in efficienza a cura e spese di A.A.S.S.RSM.

Presso il Punto di fornitura nessun dispositivo di telecontrollo è al momento allestito, né è presente utenza elettrica.

La fornitura di acqua potabile dalla Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino verso la rete idrica in gestione ad Hera, approvvigiona, a gravità, un numero ridotto di utenze in via Gualdo e Via Lazzara, in località Acquaviva, in comune di Verucchio.

Il mantenimento del corretto grado di cloro copertura della rete idrica, sottesa al punto di consegna, è garantito da A.A.S.S.RSM. mediante trattamento di disinfezione con reagente a base di cloro (ipoclorito), il cui dosaggio, è attuato con cloratore presso il serbatoio di Gaviano Ventoso. I quantitativi mensili erogati, sulla base della serie storica, risultano variabili dai 30 ai 100 mc, così come i volumi annui di fornitura oscillano fra i 560 e i 680 mc/anno


Punto di Consegna da A.A.S.S.R.S.M. a Hera

Denominazione Punto di Consegna: **Pieve Corena**

Ubicazione: Via San Giovanni In Corte, 801 o Via Zoro, Chiesanuova

Comune: Verucchio

Contatore in gestione a A.A.S.S.RSM: presso pozzetto PDC

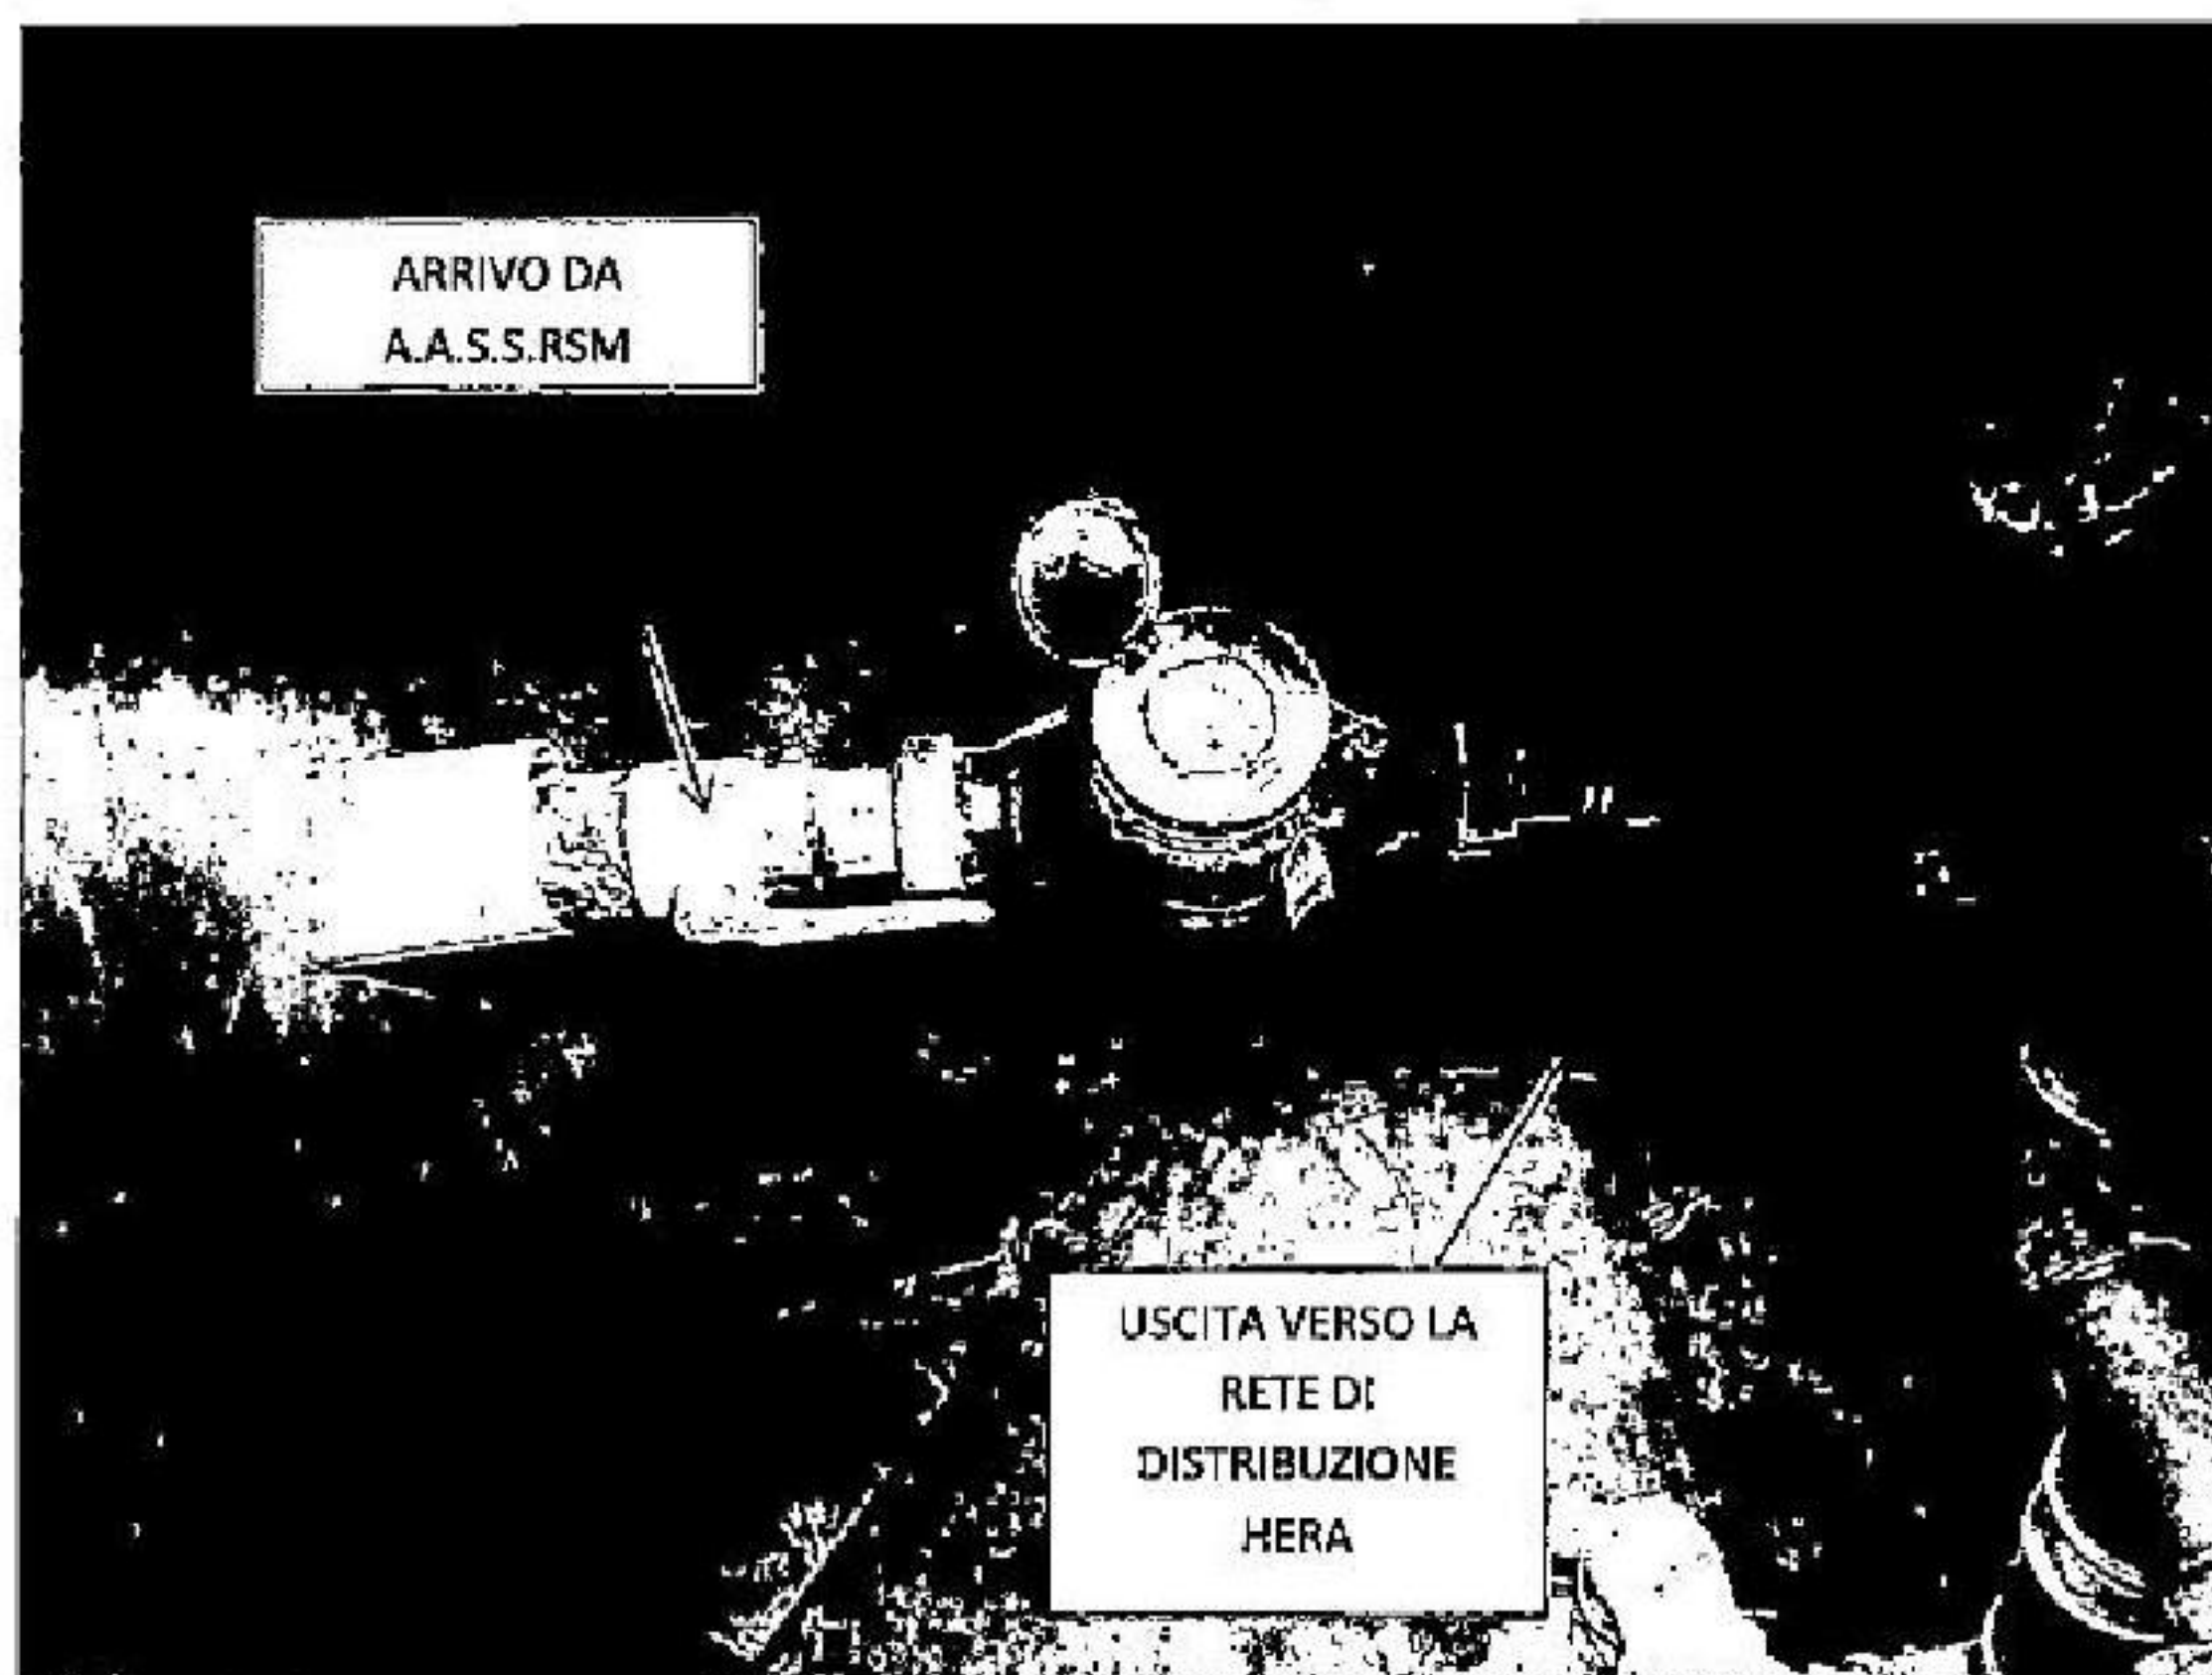

Coordinate Punto di campionamento: N43 54.013 E12 24.932



Il Punto di Consegna Pieve Corena, il Punto di Misura e il Punto di Campionamento, per le verifiche analitiche relative alla conformità e qualità dell'acqua fornita, sono ubicati presso il pozzetto a bordo strada in Via San Giovanni In Corte, 801 o Via Zoro, Chiesanuova.

Ciascun componente sarà mantenuto in efficienza a cura e spese di A.A.S.S.RSM..

Presso il Punto di fornitura nessun dispositivo di telecontrollo è al momento allestito, né è presente utenza elettrica.

La fornitura di acqua potabile dalla Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino verso il serbatoio in gestione ad Hera denominato Cossure, approvvigiona, a gravità, la rete di distribuzione in località Cossure e Pieve Corena, in comune di Verucchio.

Il mantenimento del corretto grado di cloro copertura della rete idrica sottesa al punto di consegna è garantito da Hera mediante trattamento di disinfezione con reagente a base di cloro (ipoclorito), il cui dosaggio in funzione della portata in ingresso al serbatoio Cossure, è attuato con cloratore a batteria e contatore lancia impulsi.


Parte della fornitura acquistata da Hera presso il PDC Pieve Corena alimenta la rete di pubblico acquedotto in comune di San Leo, precisamente in località Montemaggio. La risorsa viene sollevata da centrale di pompaggio verso il serbatoio Hera denominato Montemaggio, ove integra la produzione di acqua prelevata da fonti locali e subisce trattamento di disinfezione.

Presso il serbatoio Cossure, allestita e gestita da Hera, è presente una stazione Low Power, alimentata a batteria, per la trasmissione alla sala telecontrollo Hera del segnale del livello stoccaggio prodotto reagente e stato della batteria che alimenta la pompa dosatrice.

I quantitativi mensili erogati, sulla base della serie storica, risultano variabili dai 1.200 ai 7.200 mc, così come i volumi annui di fornitura oscillano fra i 38.000 e i 51.000 mc/anno.

Punto di Consegna da A.A.S.S.R.S.M. a Hera

Denominazione Punto di Consegna: Torello
Ubicazione: Via Torello o Via Degli Aceri_Acquaviva
Comune: San Leo
Matricola contatore in gestione a A.A.S.S.RSM: presso pozzetto PDC

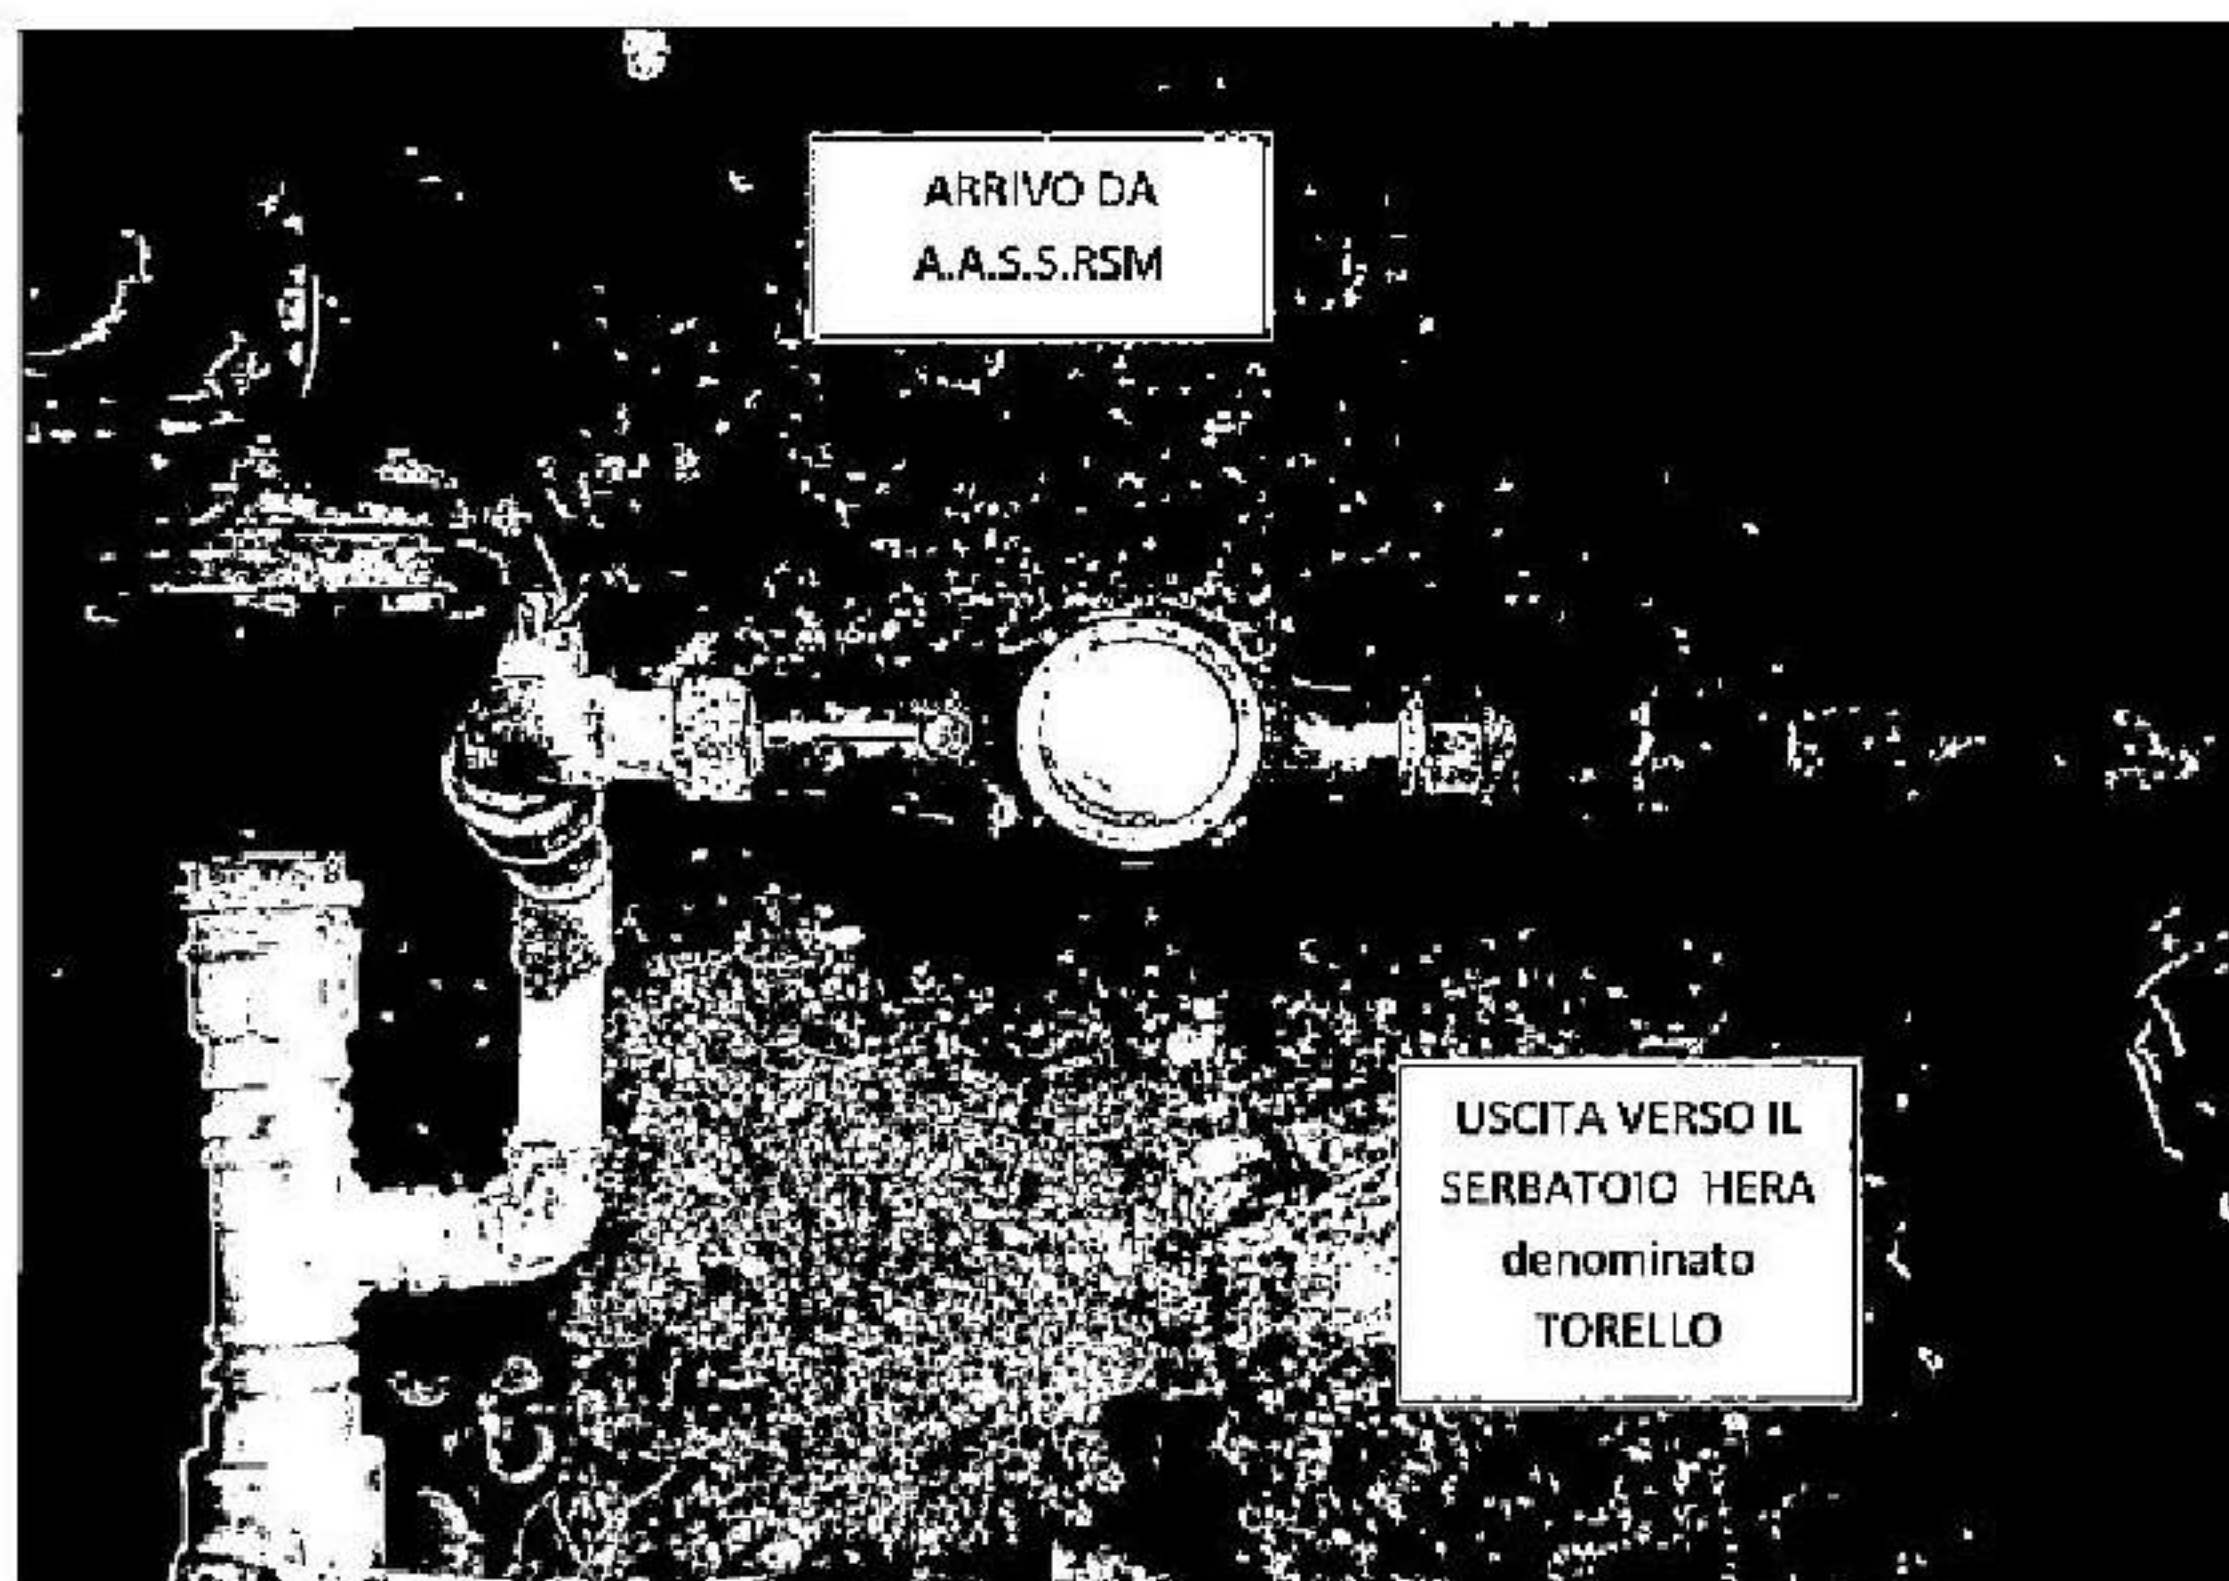

Coordinate Punto di campionamento: N43 57.300 E12 24.260



Il Punto di Consegna Torello e il Punto di Misura sono ubicati presso il pozzetto a bordo strada in Via Torello, comune di San Leo.

Il punto di Campionamento, per le verifiche analitiche relative alla conformità e qualità dell'acqua fornita, è predisposto presso il pozzetto in Via Degli Aceri, località Acquaviva.

Ciascun componente sarà mantenuto in efficienza a cura e spese di A.A.S.S.RSM.

Presso il Punto di fornitura nessun dispositivo di telecontrollo è al momento allestito, né è presente utenza elettrica.

La fornitura di acqua potabile dalla Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino verso il serbatoio in gestione ad Hera denominato Torello, approvvigiona, a gravità, la rete di pubblico acquedotto in distribuzione nella località Torello, in comune di San Leo. La presenza di interconnessione con la rete alimentata dal serbatoio Monte di Pietracuta, assicura il fabbisogno idrico, soprattutto nel periodo estivo.

Il mantenimento del corretto grado di cloro copertura della rete idrica sottesa al punto di consegna è garantito da Hera mediante trattamento di disinfezione con reagente a base di cloro (ipoclorito), il cui dosaggio in funzione della portata in ingresso al serbatoio Torello, è attuato con cloratore a batteria e contatore lancia impulsi.


I quantitativi mensili erogati, sulla base della serie storica, risultano variabili dai 1.000 ai 3.000 mc, così come i volumi annui di fornitura oscillano fra i 15.000 e i 30.000 mc/anno

Punto di Consegna da A.A.S.S.R.S.M. a Hera

Denominazione Punto di Consegna: Ventoso
Ubicazione: Via Provinciale San Marino o Decima Gualdaria, Borgo Maggiore
Comune: Verucchio
Matricola contatore in gestione a A.A.S.S.RSM: presso pozzetto PDC



Coordinate Punto di campionamento: N43 57.428 E12 26.229

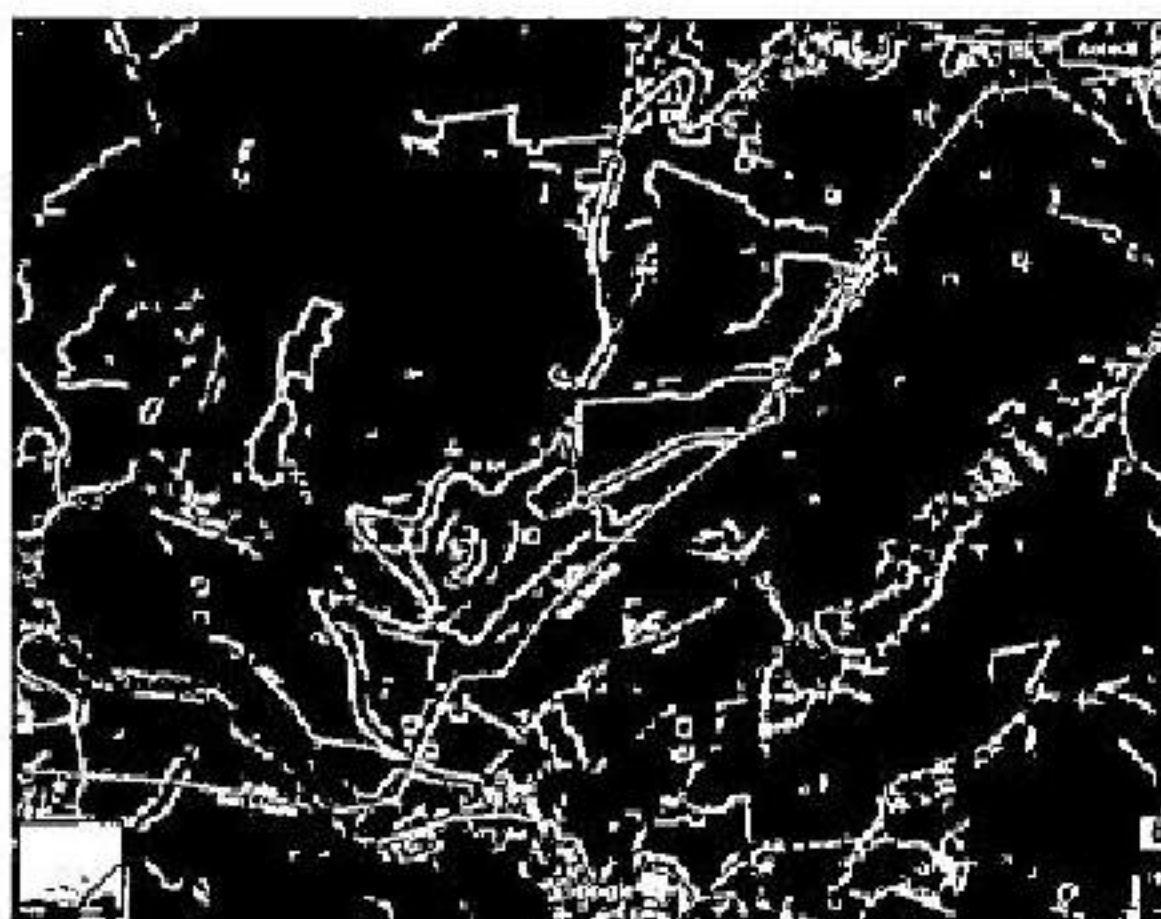

Il Punto di Consegna Ventoso e il Punto di Misura sono ubicati presso il pozzetto a bordo strada in Via Provinciale San Marino o Decima Gualdaria, Borgo Maggiore. In pozzetto limitrofo è predisposto il Punto di Campionamento per le verifiche analitiche relative alla conformità e qualità dell'acqua fornita.

Ciascun componente sarà mantenuto in efficienza a cura e spese di A.A.S.S.RSM.

Presso il Punto di fornitura nessun dispositivo di telecontrollo è al momento allestito, né è presente utenza elettrica.

La fornitura di acqua potabile, dalla Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino verso il serbatoio in gestione ad Hera denominato Ventoso, approvvigiona, a gravità, la rete di distribuzione di pubblico acquedotto in via Laghi Ventoso e via Decima Gualtiera o Provinciale San Marino, in comune di Verucchio.


Presso il serbatoio Ventoso, allestita e gestita da Hera, è presente una stazione Low Power, alimentata a batteria, per la trasmissione alla sala telecontrollo Hera del segnale del livello stoccaggio prodotto reagente e stato della batteria che alimenta la pompa dosatrice.

Il mantenimento del corretto grado di cloro copertura della rete idrica sottesa al punto di consegna è garantito da Hera mediante trattamento di disinfezione con reagente a base di cloro (ipoclorito), il cui dosaggio, in funzione della portata in ingresso al serbatoio Ventoso, è attuato con cloratore a batteria e contatore lancia impulsi.


I quantitativi mensili erogati, sulla base della serie storica, risultano variabili dai 115 ai 1.200 mc, così come i volumi annui di fornitura oscillano fra i 3.400 e i 6.000 mc/anno

Punto di Consegna da Hera a A.A.S.S.R.S.M.

Denominazione Punto di Consegna: Monte Olivo
Ubicazione: Via Monte Olivo, Cerasolo
Comune: Coriano
Matricola contatore in gestione a A.A.S.S.RSM: presso pozzetto PDC

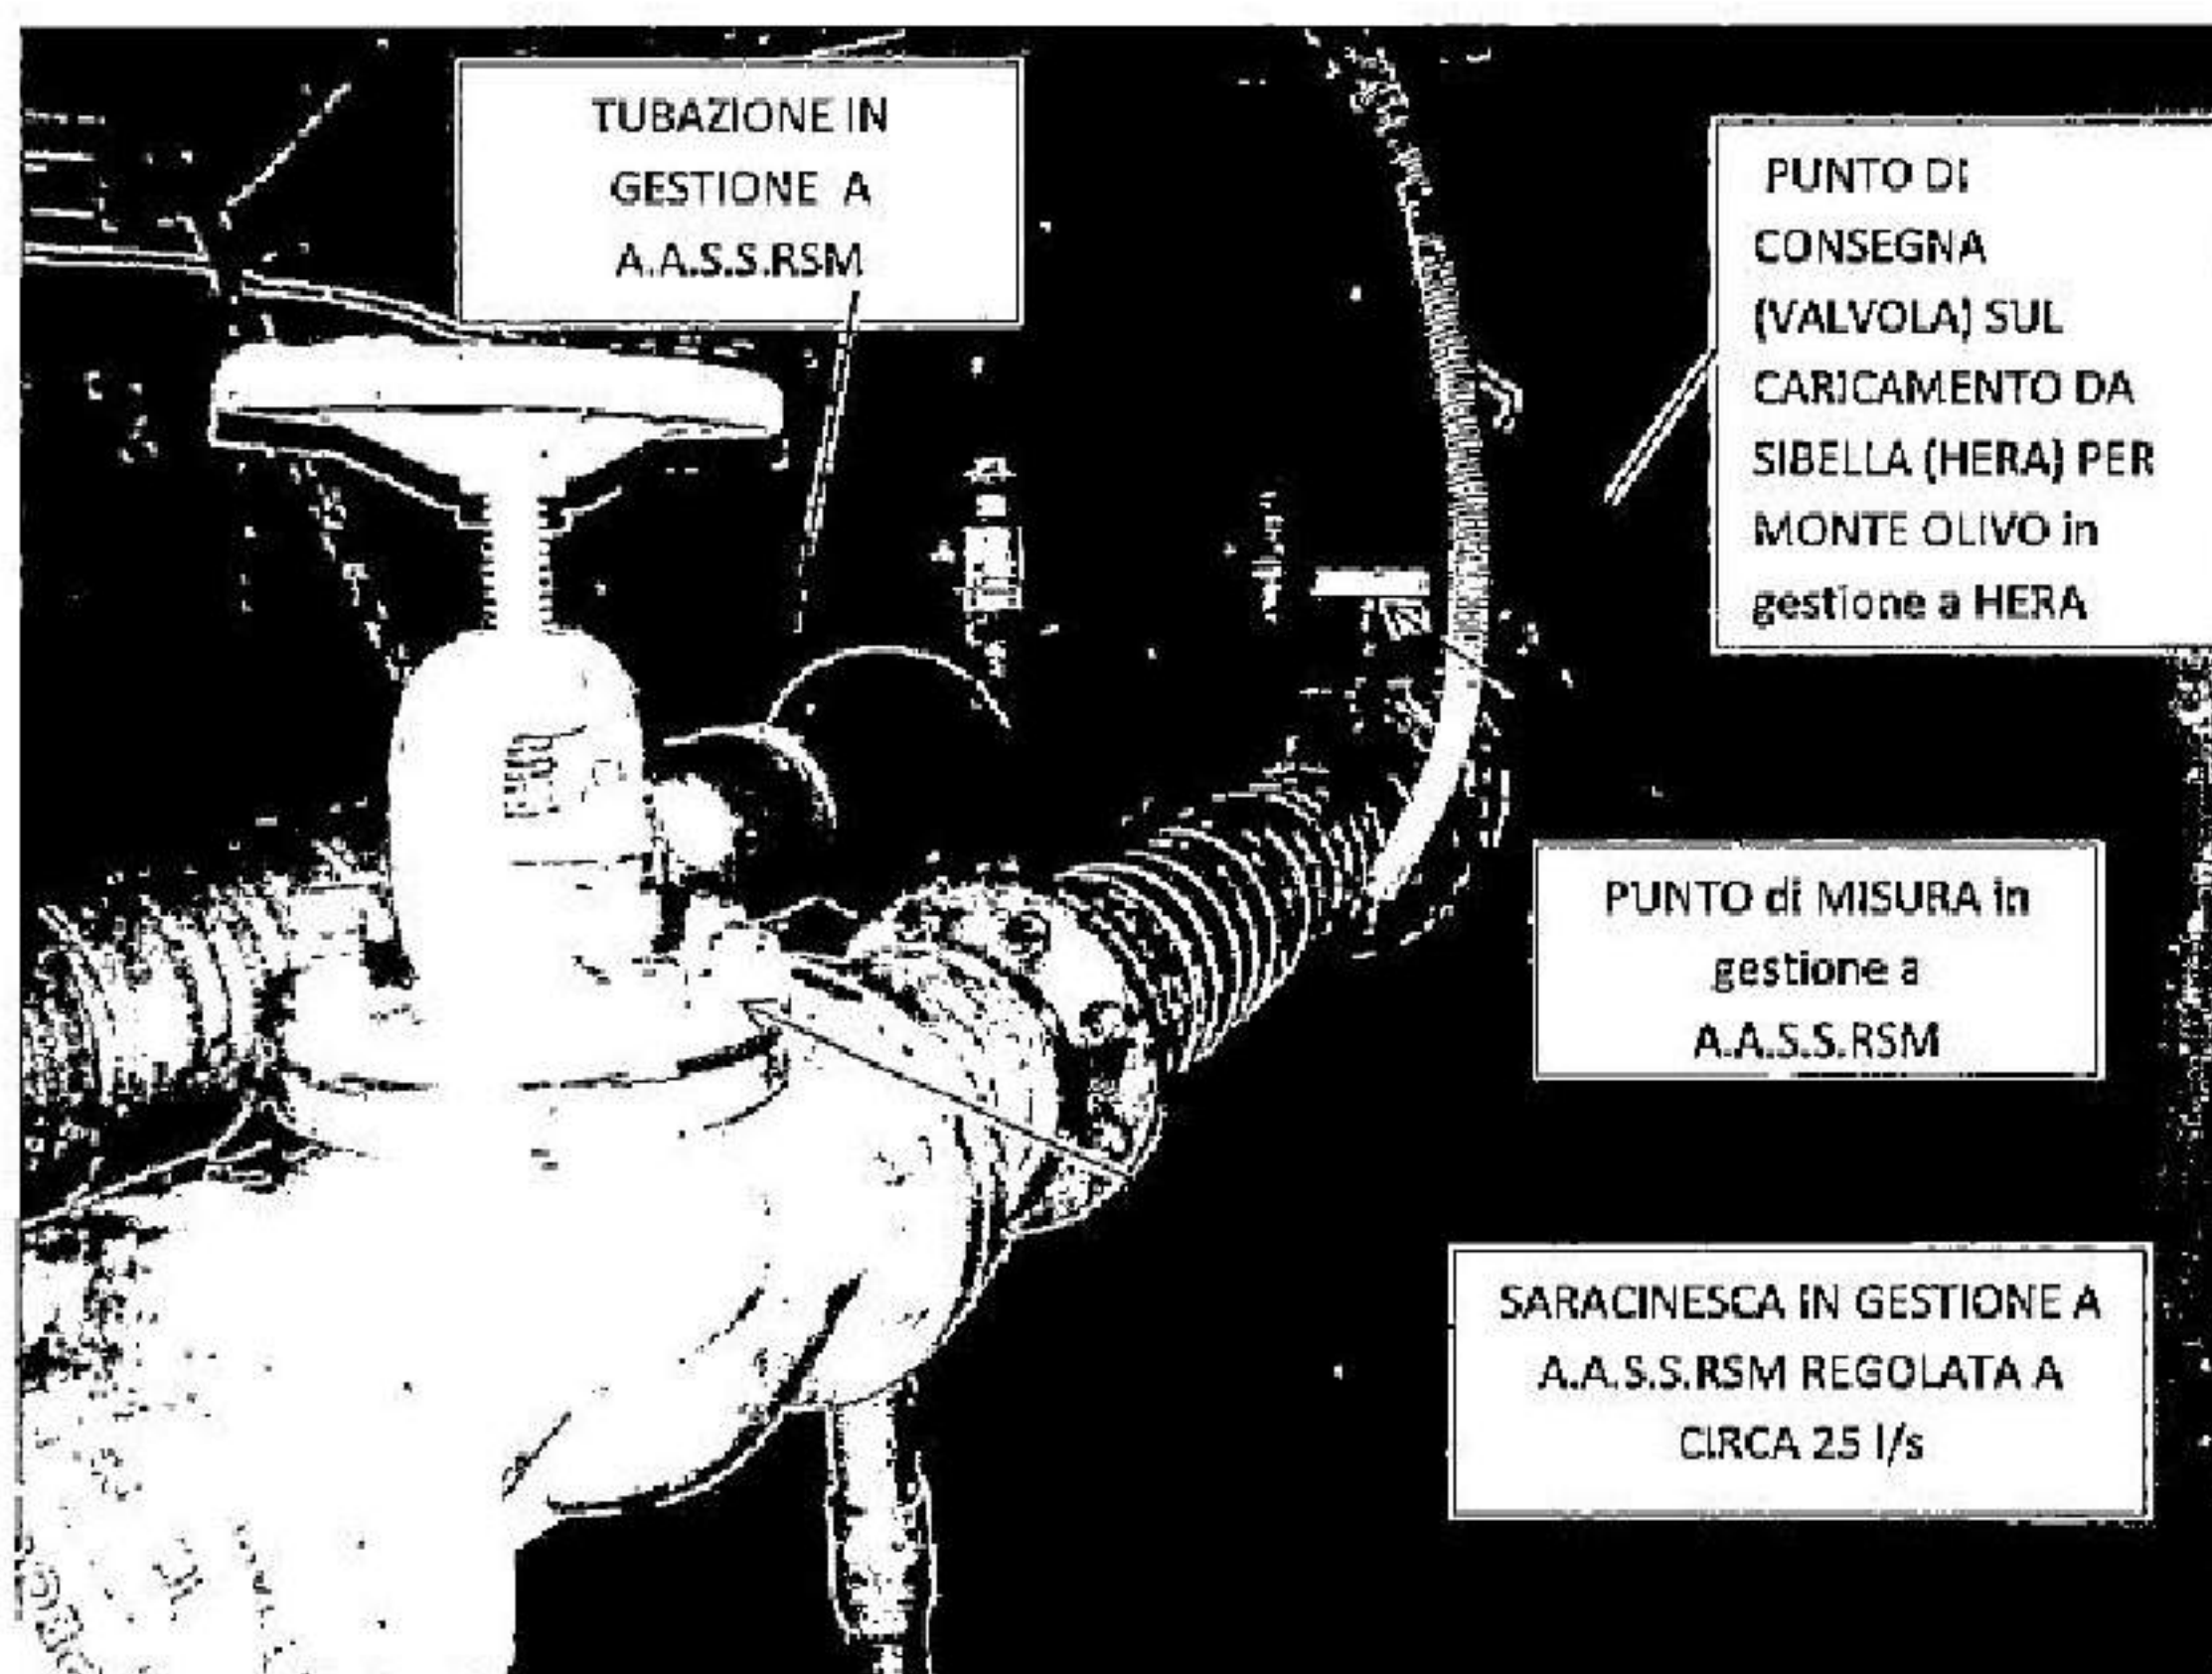

Coordinate Punto di campionamento: N43 57.648 E12 30.550
presso il serbatoio Hera Monte Olivo

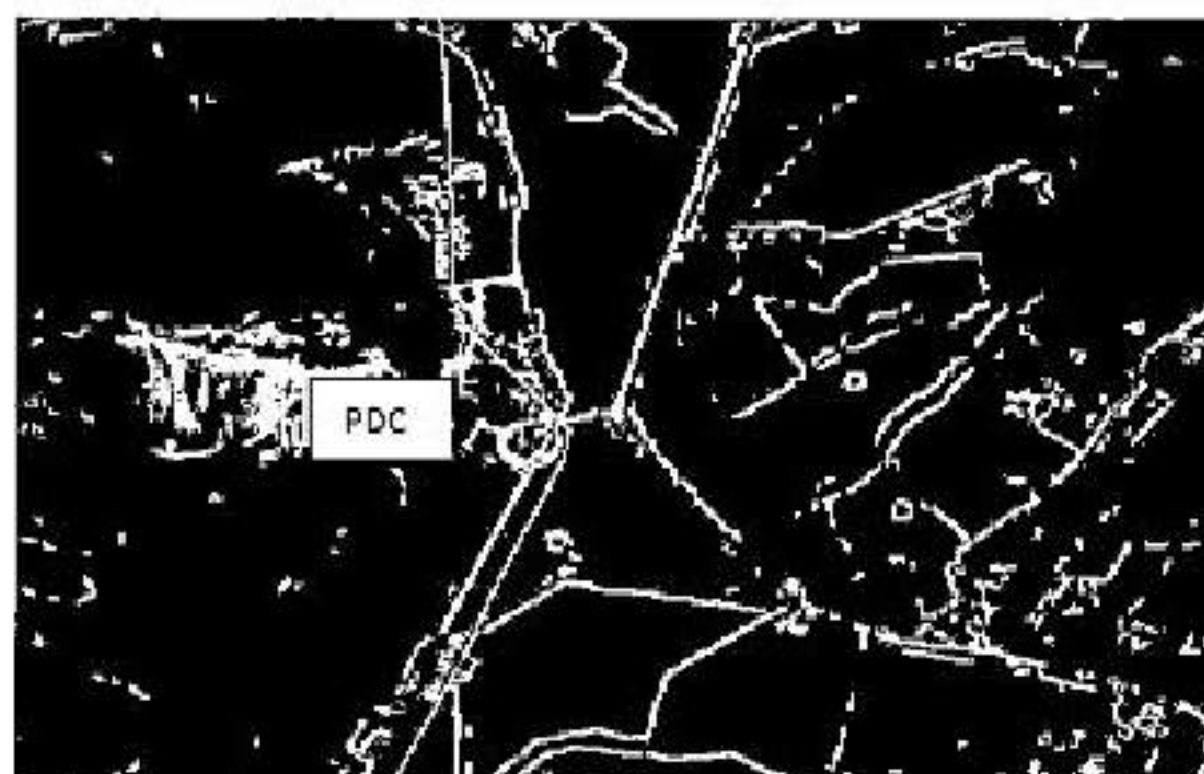

Il Punto di Consegna Monte Olivo e il Punto di Misura sono ubicati in pozzetto a bordo strada in Via Monte Olivo, in angolo con via Lamaticcie, località Gerasolo, in comune di Coriano. Per la lettura dei volumi erogati è predisposto, sopra strada, un bauetto con visualizzatore elettronico, liberamente accessibile ed utilizzabile dalle Parti. La gestione del misuratore magnetico, con relativa alimentazione e centralina elettrica, è di competenza di A.A.S.S., mentre è in gestione ad HERA la valvola di regolazione del flusso idrico. Il Punto di Campionamento, per le verifiche analitiche relative alla conformità e qualità dell'acqua fornita, è invece ubicato presso il serbatoio in gestione ad Hera, denominato Monte Olivo, a cui ne compete il mantenimento in efficienza.

Presso il serbatoio Hera sono presenti utenza elettrica e dispositivi di telecontrollo, tuttavia non dedicati alla trasmissione a remoto della misura dei volumi consegnati.

La fornitura di acqua potabile da Hera alla Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino, approvvigiona il serbatoio, in gestione alla A.A.S.S., denominato Bosche. Il mantenimento del corretto grado di cloro copertura presso il punto di consegna è garantito da Hera mediante trattamento di disinfezione con reagente a base di cloro (Blossido), il cui dosaggio in funzione della portata è attuato presso il serbatoio Cà Bezzi. L'acqua viene quindi sollevata al serbatoio Sibella e successivamente rilanciata verso Monte Olivo. Sulla tubazione di caricamento vasca del serbatoio Monte Olivo, Ghisa DN 250 in pressione, è presente lo stacco con Punto di Consegna per A.A.S.S..

La portata max garantita è di 25 l/s, con quantitativi mensili variabili da 6.000 mc a 31.000 mc e volume annuo di circa 300.000 mc


Punto di Consegna da Hera a A.A.S.S.R.S.M.

Denominazione Punto di Consegna: Serra Marignano


Ubicazione: Via Santa Cristina_Galazzano

Comune: Rimini

Matricola contatore in gestione a HERA: presso serbatoio Hera denominato Serra Marignano

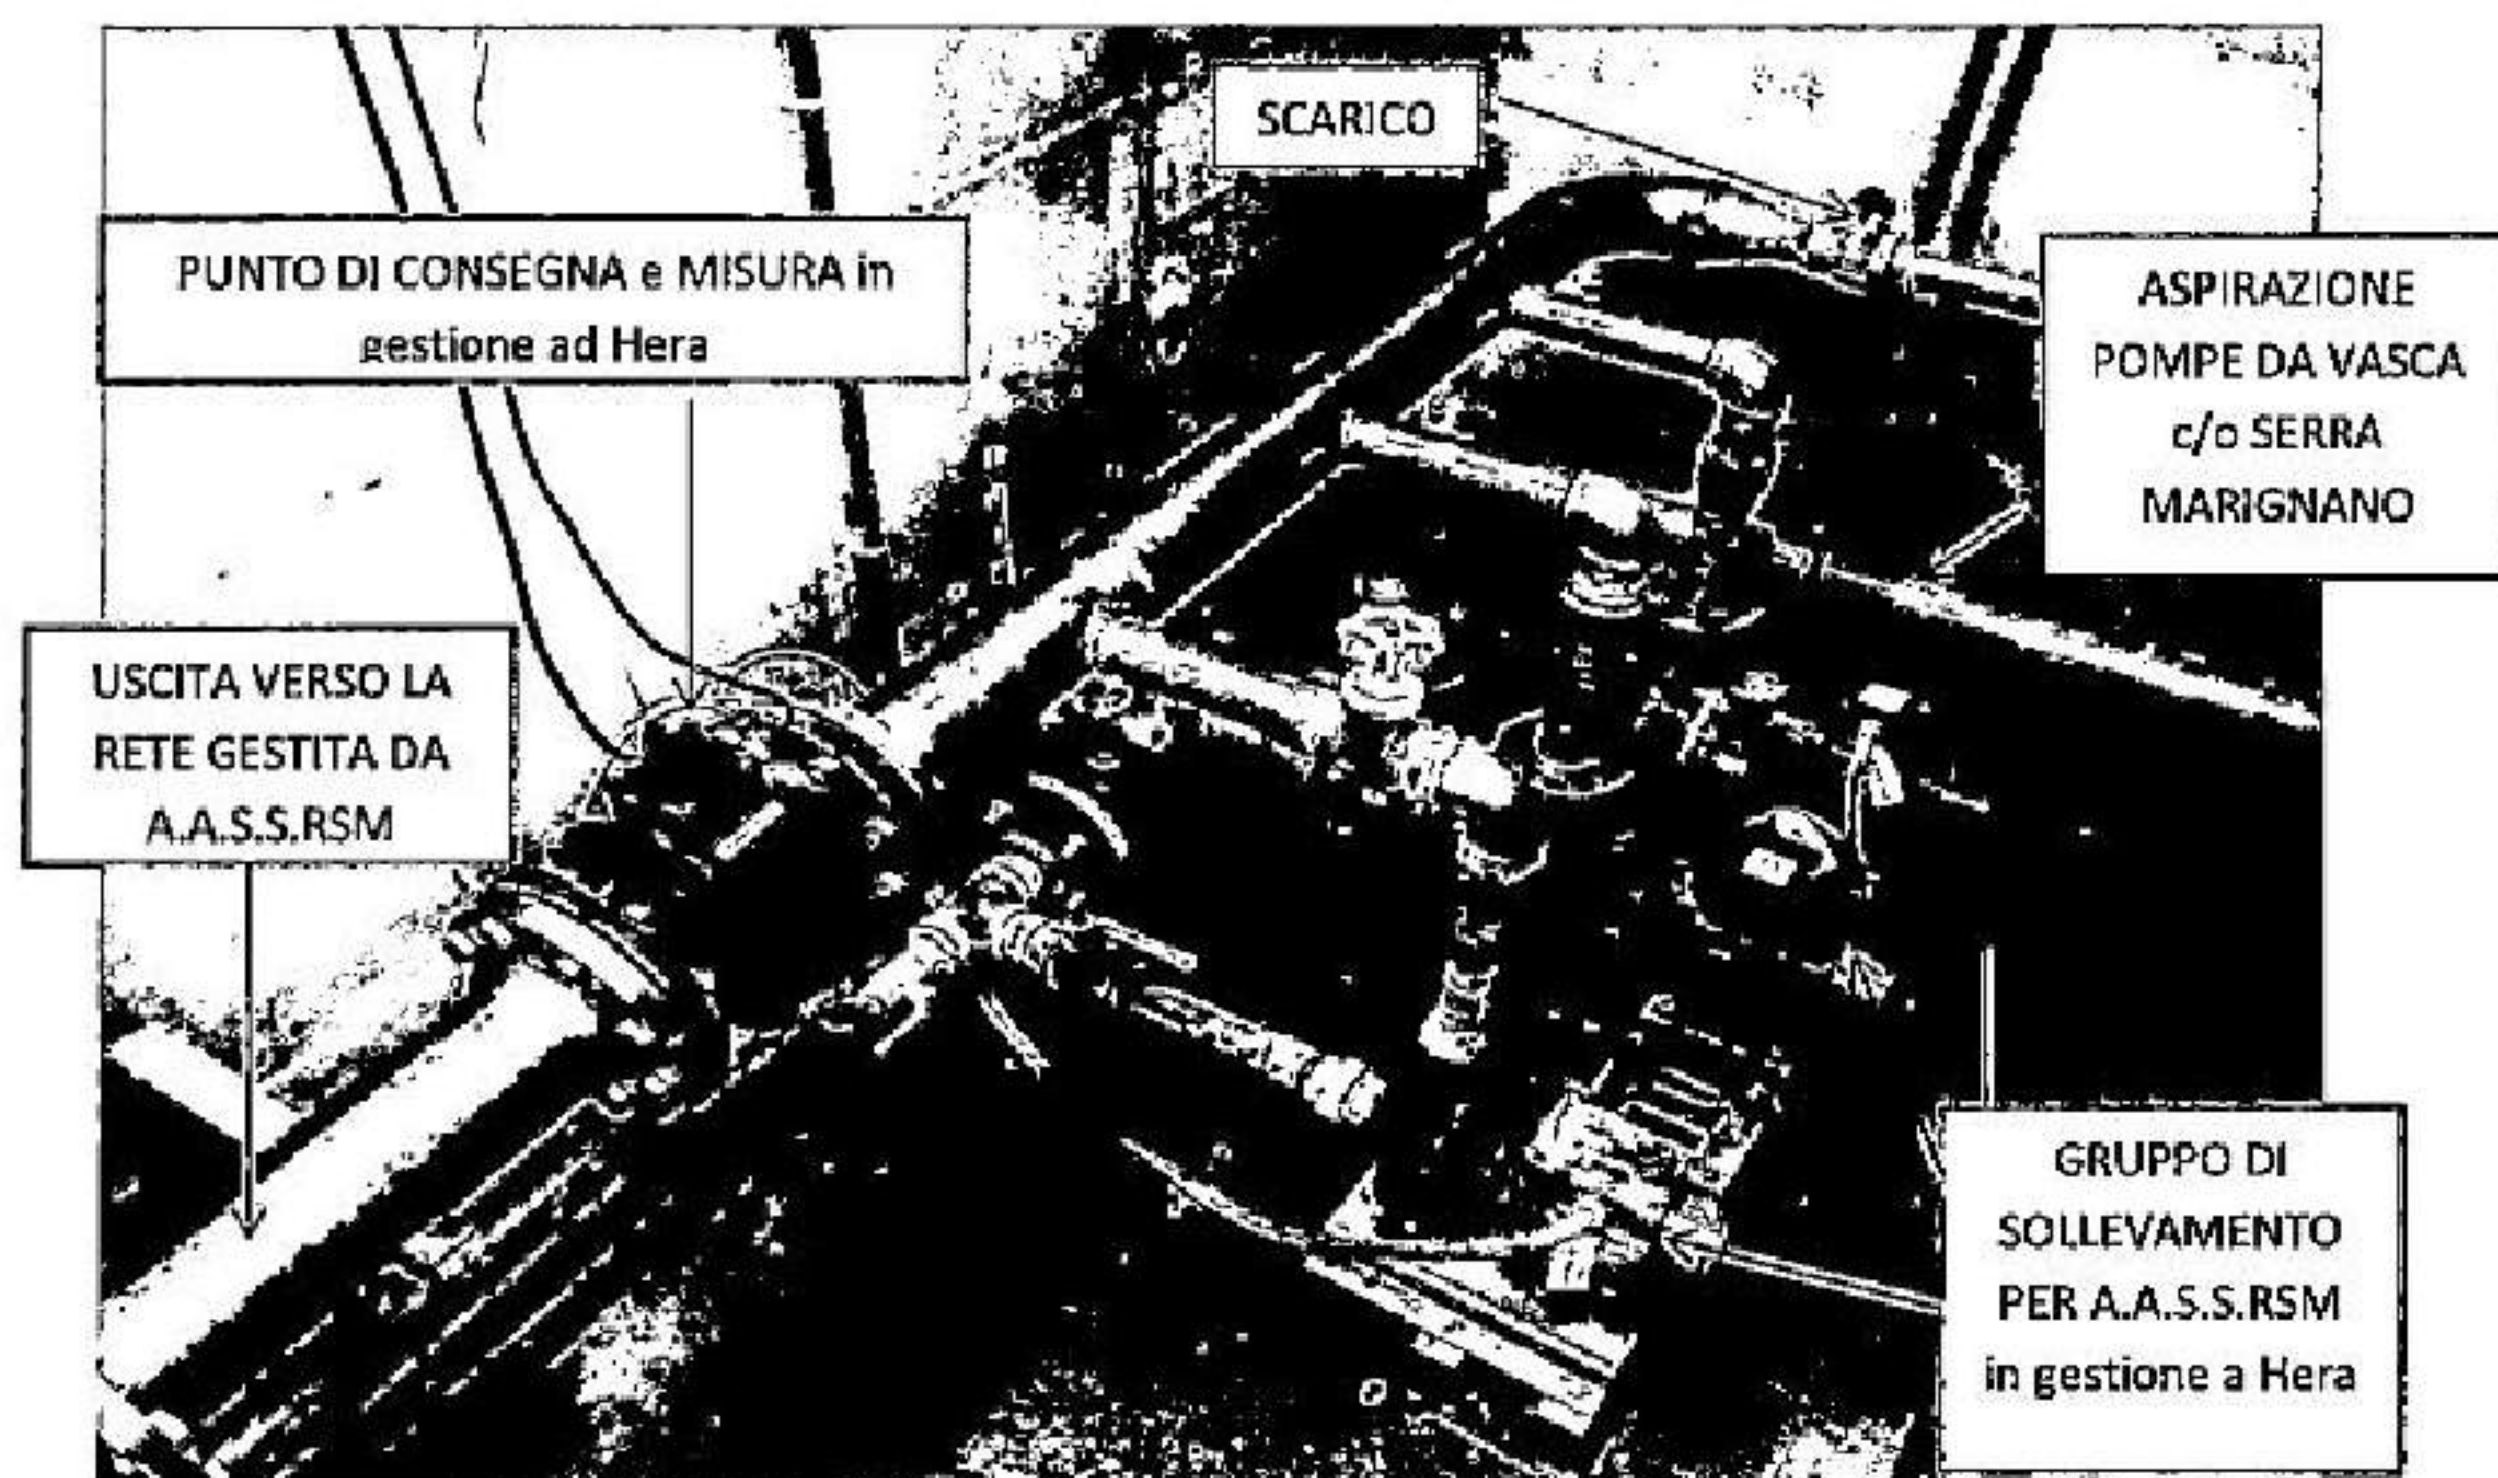

Coordinate Punto di campionamento: N43 58.482 E12 27.768

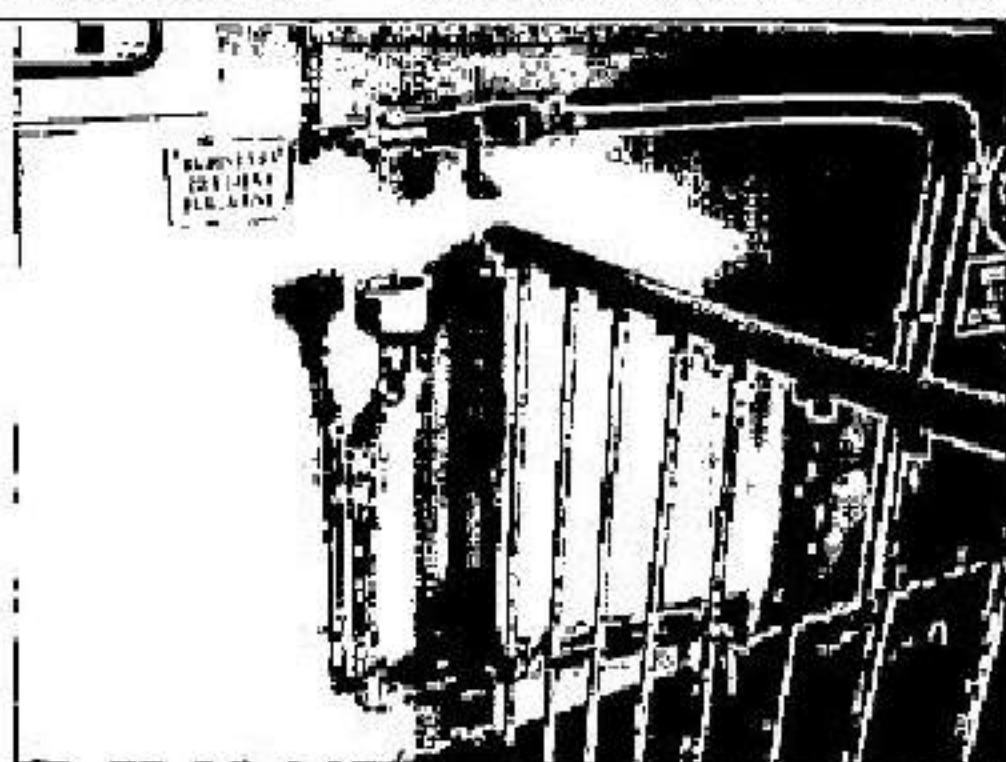

Il Punto di Consegna Serra Marignano, la Misura e il Punto di Campionamento, per le verifiche analitiche relative alla conformità e qualità dell'acqua fornita, sono ubicati presso il serbatoio in gestione ad Hera, denominato Serra Marignano in Via Santa Cristina, località Galazzano, comune di Rimini. Ciascun componente sarà mantenuto in efficienza a cura e spese di HERA.

Presso il serbatoio sono presenti utenza elettrica e dispositivi di telecontrollo con trasmissione a remoto dello stato di funzionamento delle pompe e livello vasca.

La fornitura di acqua potabile da Hera alla Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino, approvvigiona il serbatoio denominato Galazzano, in gestione alla A.A.S.S..

Il mantenimento del corretto grado di cloro copertura presso il punto di consegna è garantito da Hera mediante trattamento di disinfezione con reagente a base di cloro (Ipoclorito), il cui dosaggio in funzione della portata è attuato presso il serbatoio Monte Cieco. L'acqua viene quindi sollevata al serbatoio Serra Marignano. Dalla vasca di accumulo, la rete di distribuzione in comune di Rimini è servita per gravità, mentre per caricare il serbatoio Galazzano in San Marino, presso lo stabile è stato allestito un gruppo di pompaggio, costituito da tre pompe con portata minima di 8 l/s a un massimo di 13 l/s, che modula il fabbisogno stagionale (due pompe funzionanti nel periodo estivo, una nel periodo invernale e una di scorta).

La portata max garantita è di 13 l/s, con quantitativi mensili variabili da 14.500 mc a 25.500 mc e volume annuo di circa 230.000 mc.

Punto di Consegna da Hera a A.A.S.S.R.S.M.

Denominazione Punto di Consegna: Dogana 1


Ubicazione: Via Strada di Fondovalle

Comune: Rimini

Matricola contatore in gestione a Hera: presso pozzetto PDC



Punto di campionamento: predisposto ma non programmato

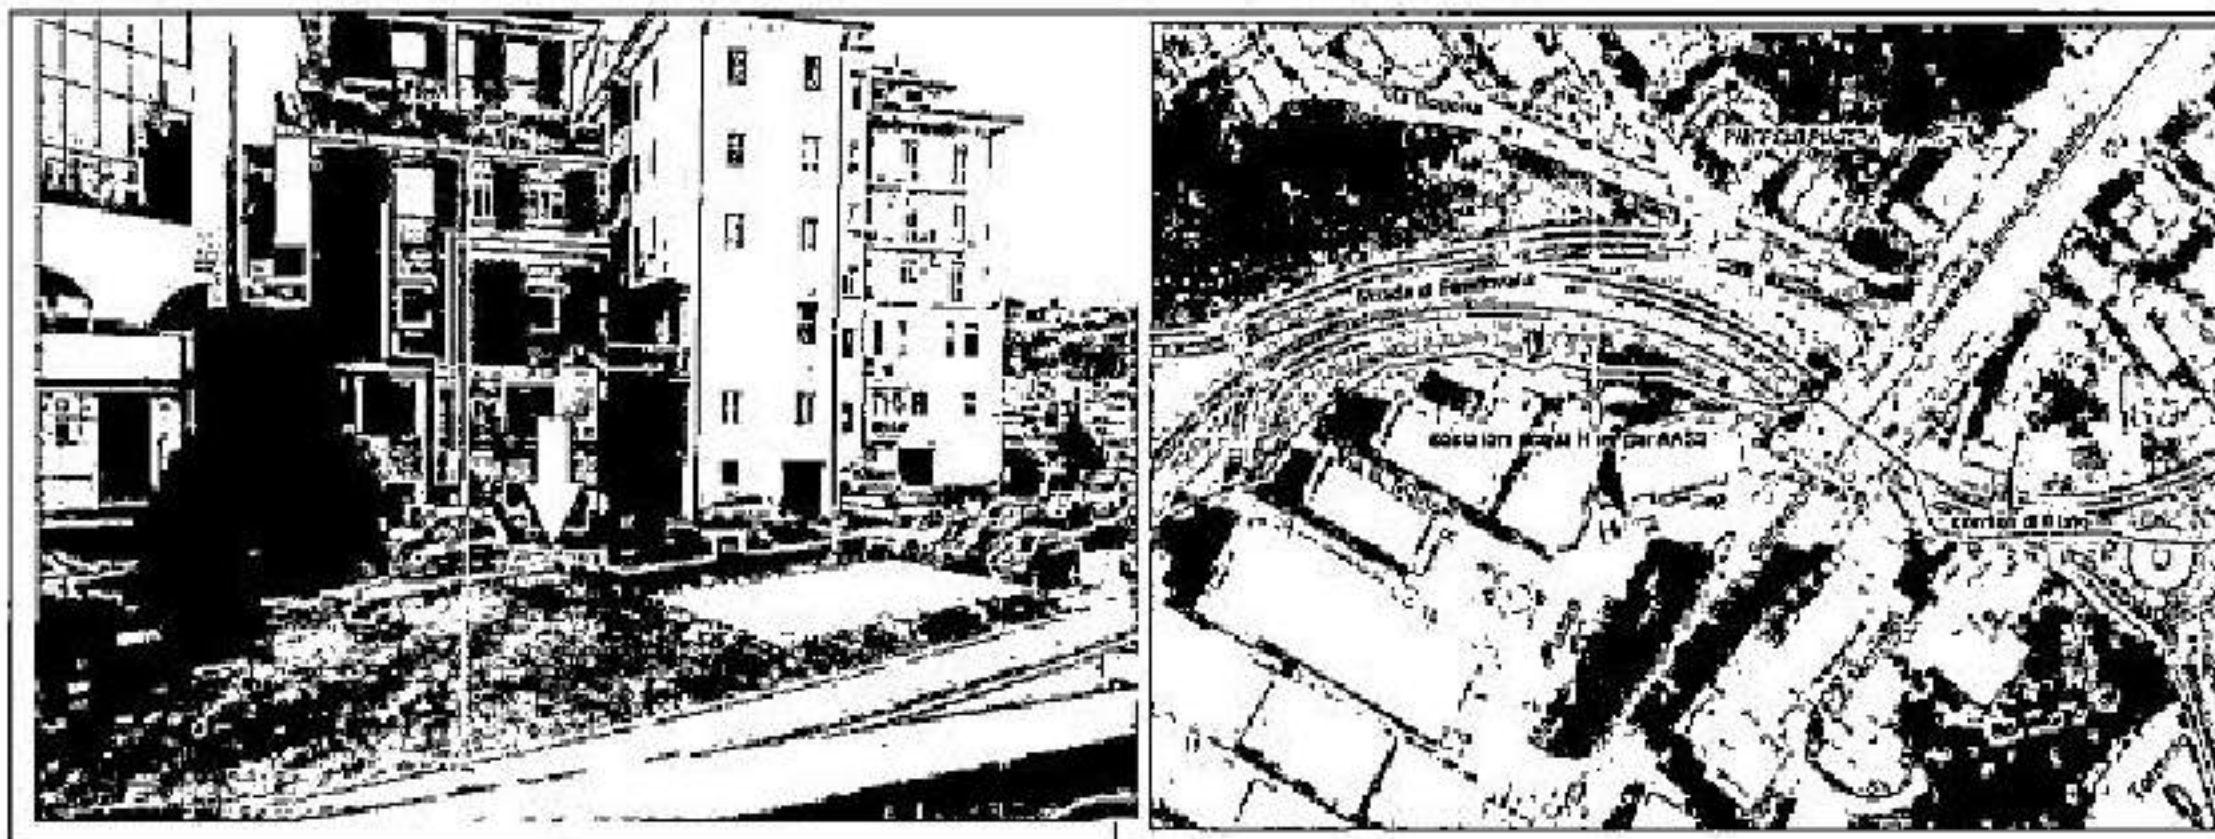

Il Punto di Consegna Dogana 1, la Misura e il Punto di Campionamento, per le verifiche analitiche relative alla conformità e qualità dell'acqua fornita, sono ubicati presso il pozzetto a bordo strada in Via Strada di Fondovalle, comune di Rimini.

Ciascun componente sarà mantenuto in efficienza a cura e spese di Hera.

Presso il Punto di fornitura nessun dispositivo di telecontrollo è al momento allestito, né è presente utenza elettrica.

La fornitura di acqua potabile da Hera alla Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino, approvvigiona la rete, in gestione alla A.A.S.S., in prossimità di piazza di Dogana.

Il mantenimento del corretto grado di cloro copertura presso il punto di consegna è garantito da Hera mediante trattamento di disinfezione con reagente a base di cloro (Ipoclorito), il cui dosaggio in funzione della portata è attuato presso il serbatoio Monte Cieco.

I quantitativi mensili erogati, sulla base della serie storica, risultano variabili dai 300 ai 850 mc, così come i volumi annui di fornitura oscillano fra i 8.000 e i 9.000 mc/anno


Punto di Consegna da Hera a A.A.S.S.R.S.M.

Denominazione Punto di Consegna: Dogana 2


Ubicazione: Via Strada di Fondovalle

Comune: Rimini

Matricola contatore in gestione a HERA: presso pozzetto PDC

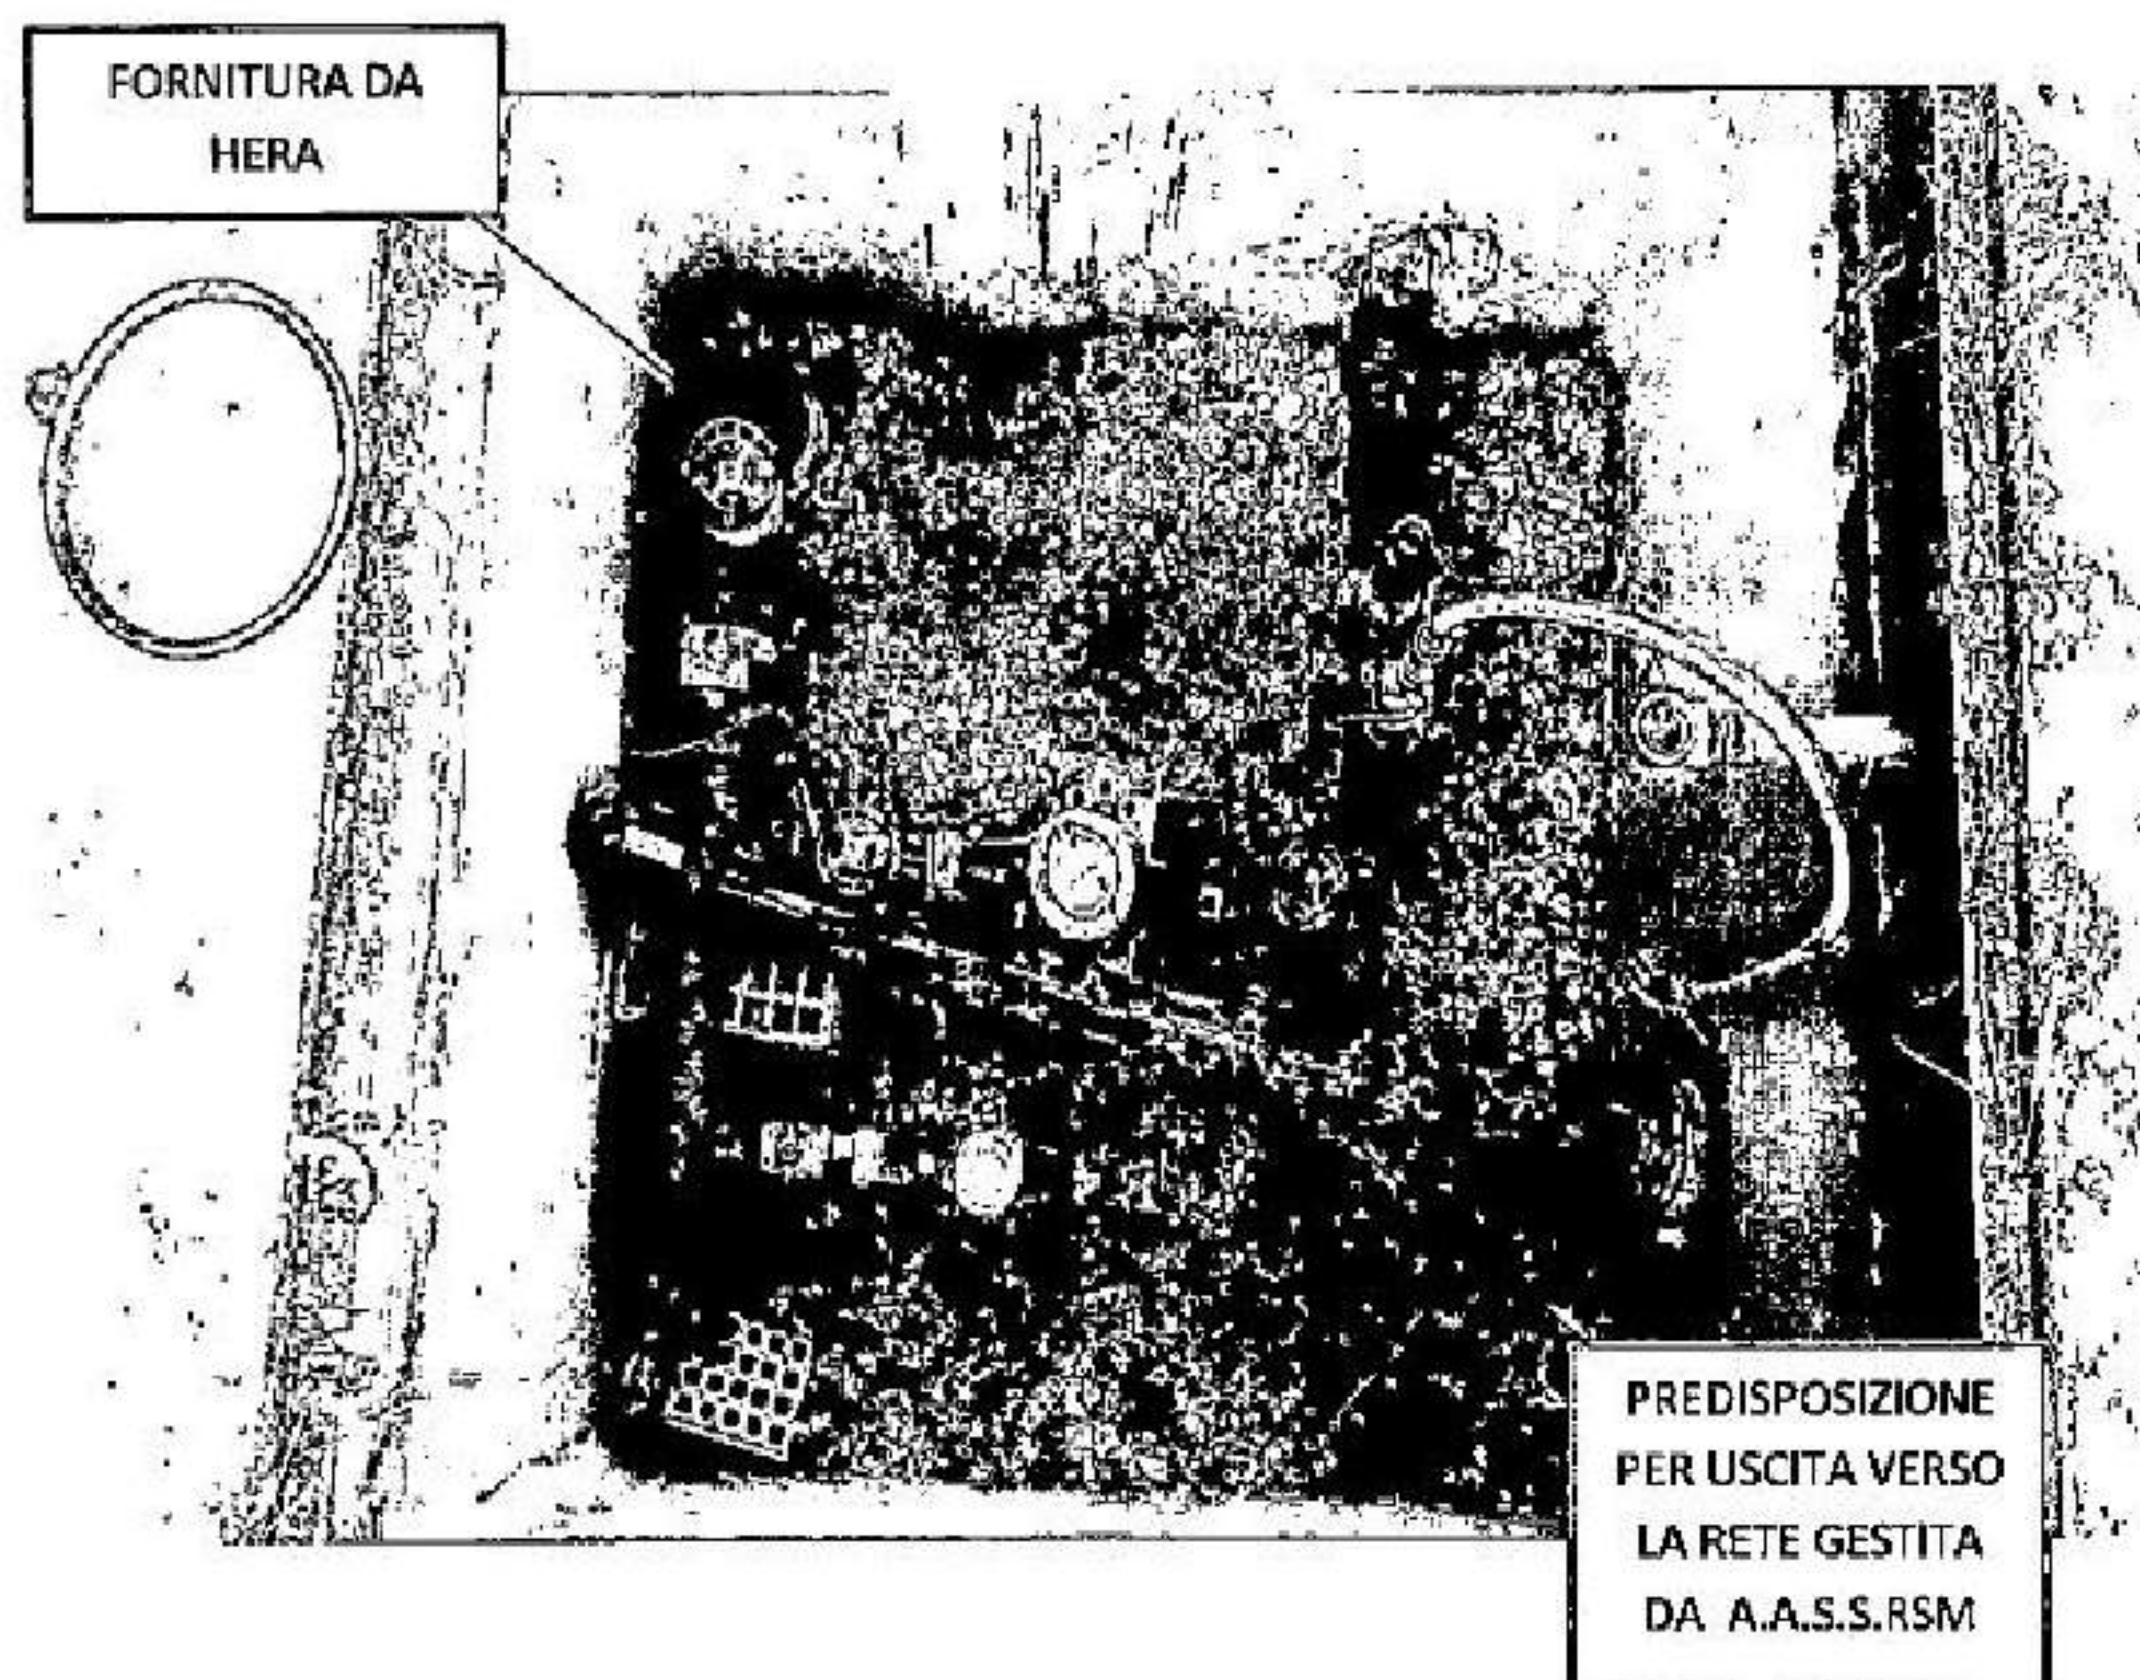

Punto di campionamento: predisposto ma non programmato

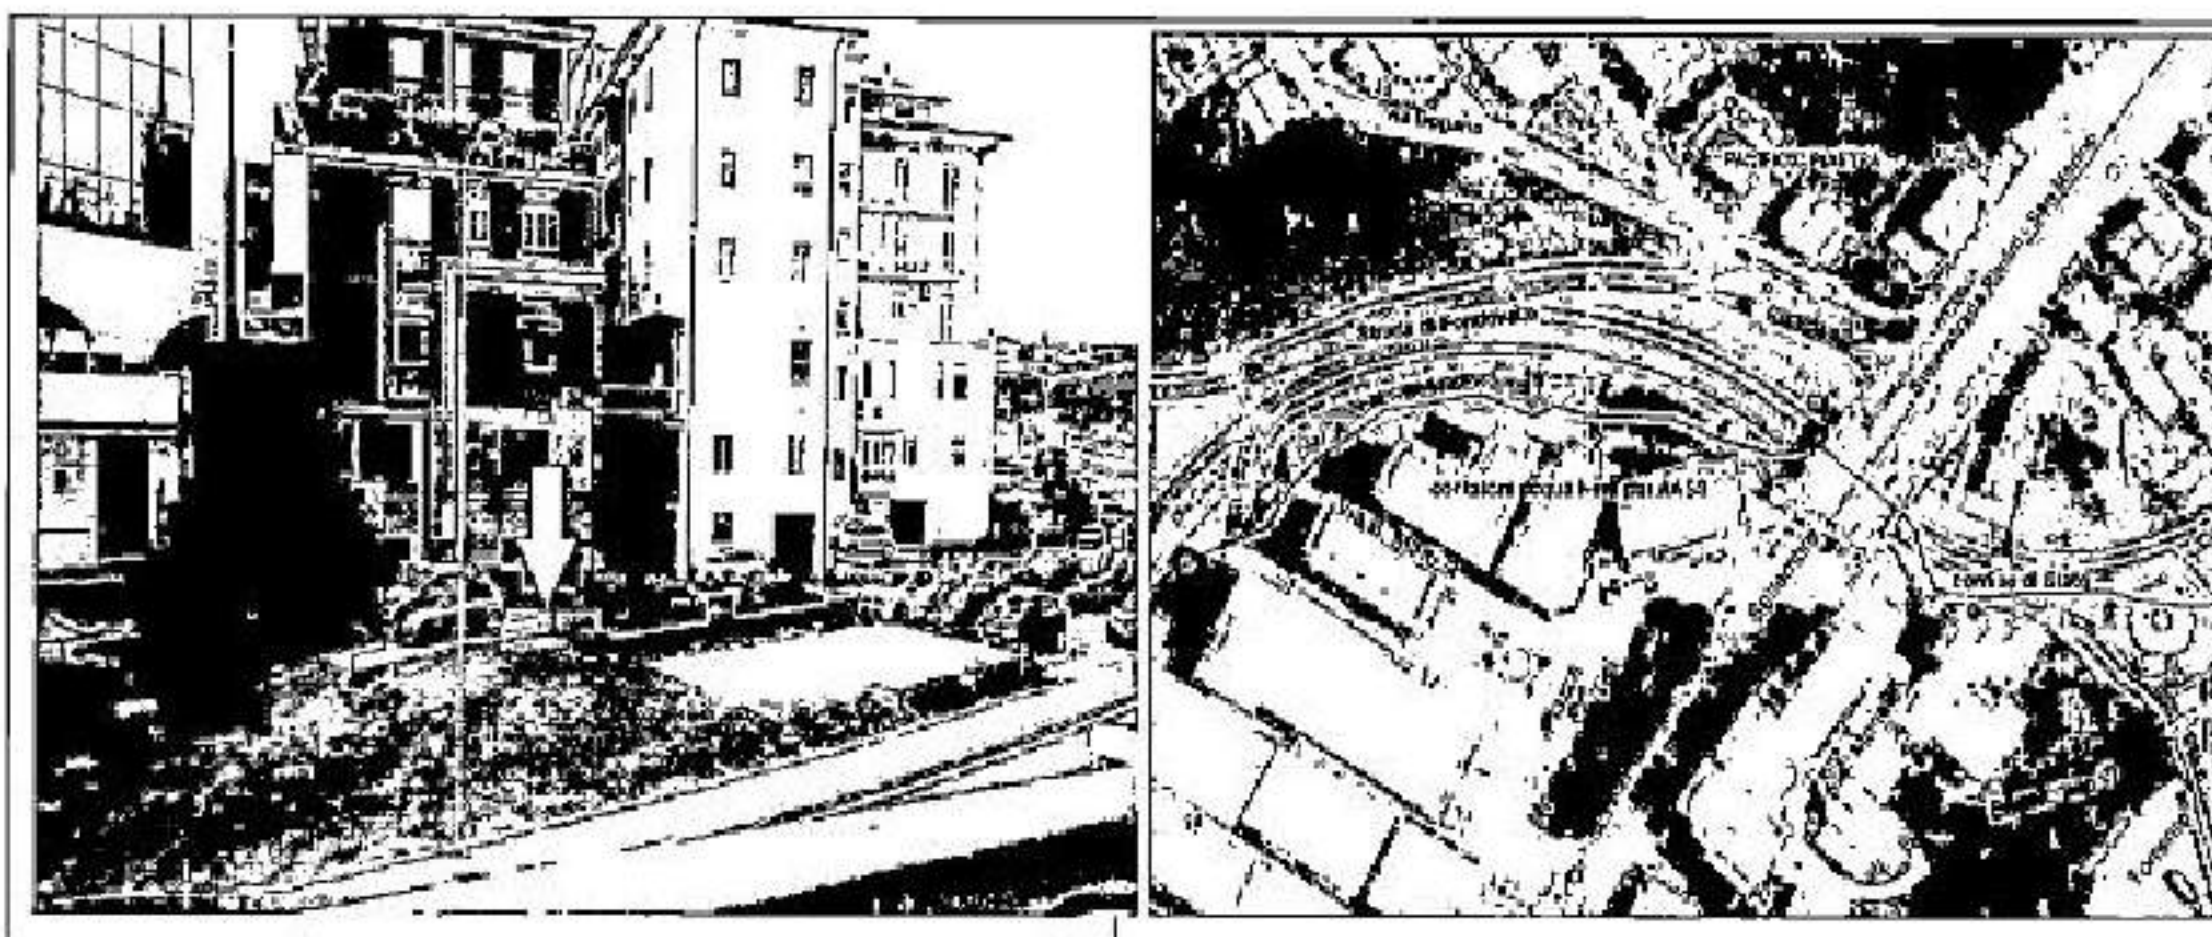

Il Punto di Consegna Dogana 2, la Misura e il Punto di Campionamento, per le verifiche analitiche relative alla conformità e qualità dell'acqua fornita, sono ubicati presso il pozzetto a bordo strada in Via Strada di Fondovalle, comune di Rimini.

Ciascun componente sarà mantenuto in efficienza a cura e spese di Hera.

Presso il Punto di fornitura nessun dispositivo di telecontrollo è al momento allestito, né è presente utenza elettrica.

La fornitura di acqua potabile da Hera alla Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino, approvvigiona la rete, in gestione alla A.A.S.S., in prossimità di piazza di Dogana.


Il mantenimento del corretto grado di cloro copertura presso il punto di consegna è garantito da Hera mediante trattamento di disinfezione con reagente a base di cloro (Ipoclorito), il cui dosaggio in funzione della portata è attuato presso il serbatoio Monte Cieco.

Presso il punto di consegna non si registrano consumi in quanto al momento è presente la sola predisposizione per futura fornitura, forse a fontanella di pubblica erogazione.


Punto di Consegna da R.S.M. a Hera
Serbatoio Capacci
Via Serra Ventoso_Verucchio




ALLEGATO 4

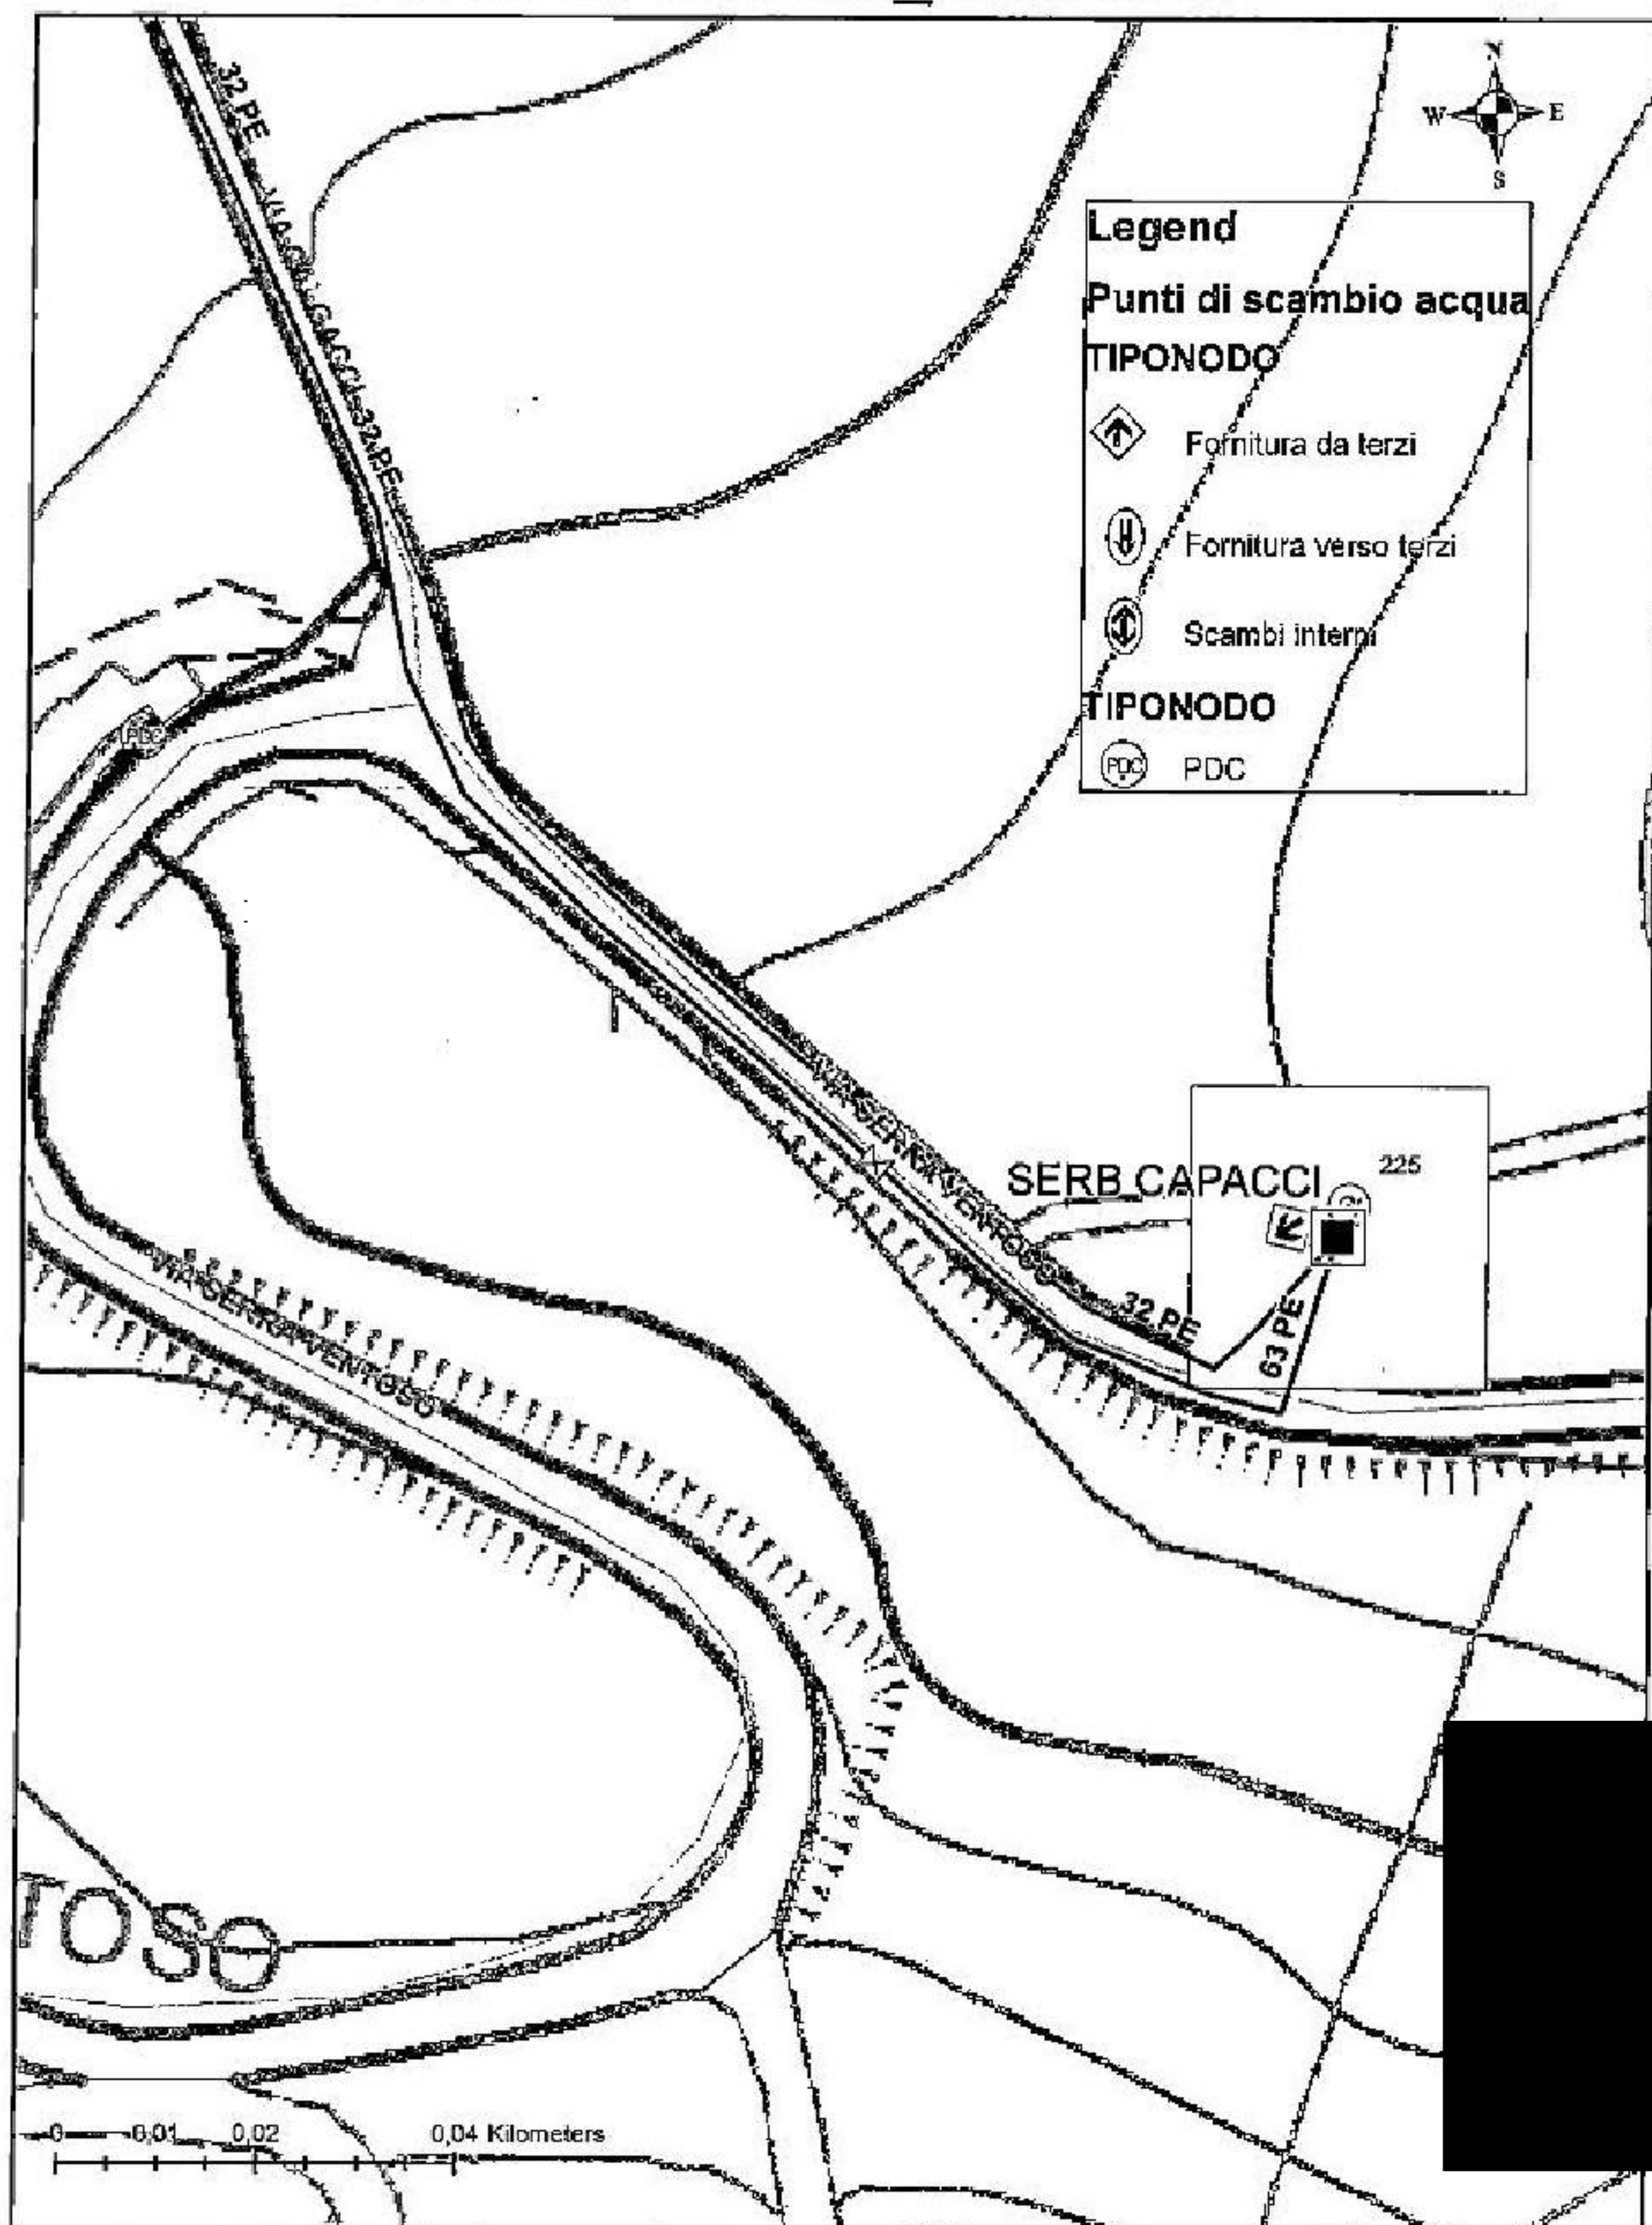

Punto di Consegna da R.S.M. a Hera Capacci - Verucchio

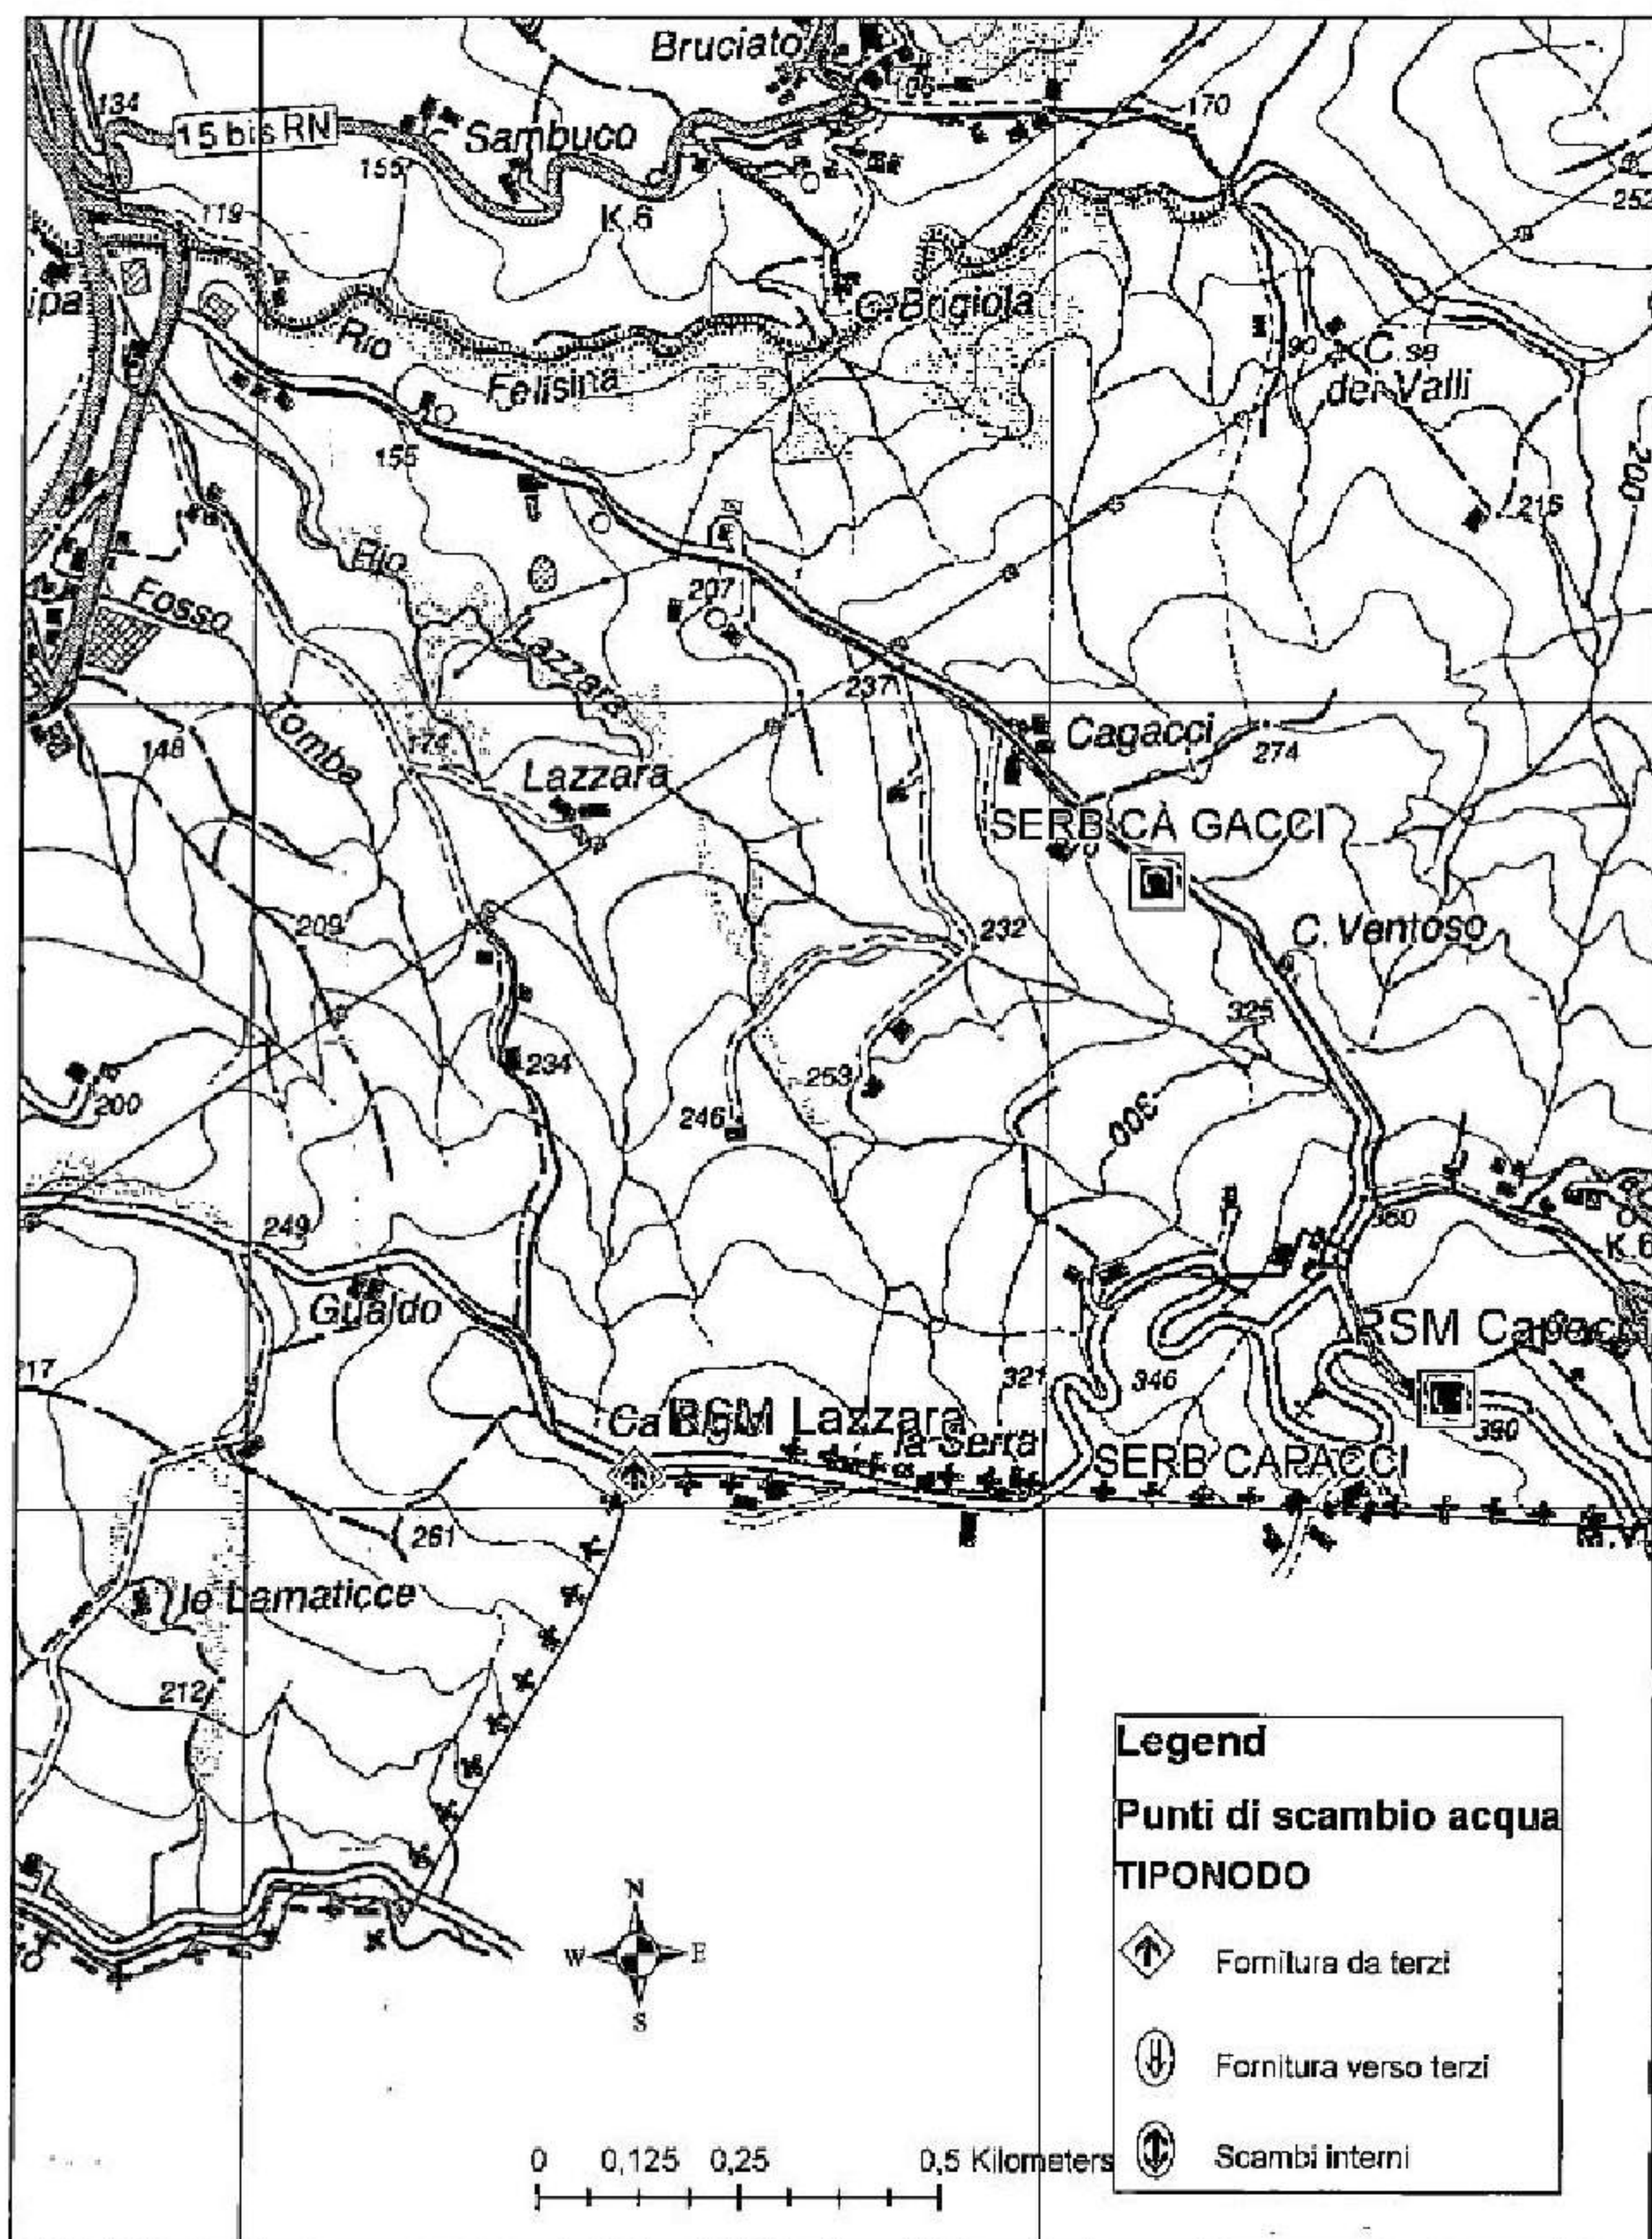


Punto di Consegna da Hera a R.S.M.
Dogana 1 e 2
Strada di Fondovalle_Rimini

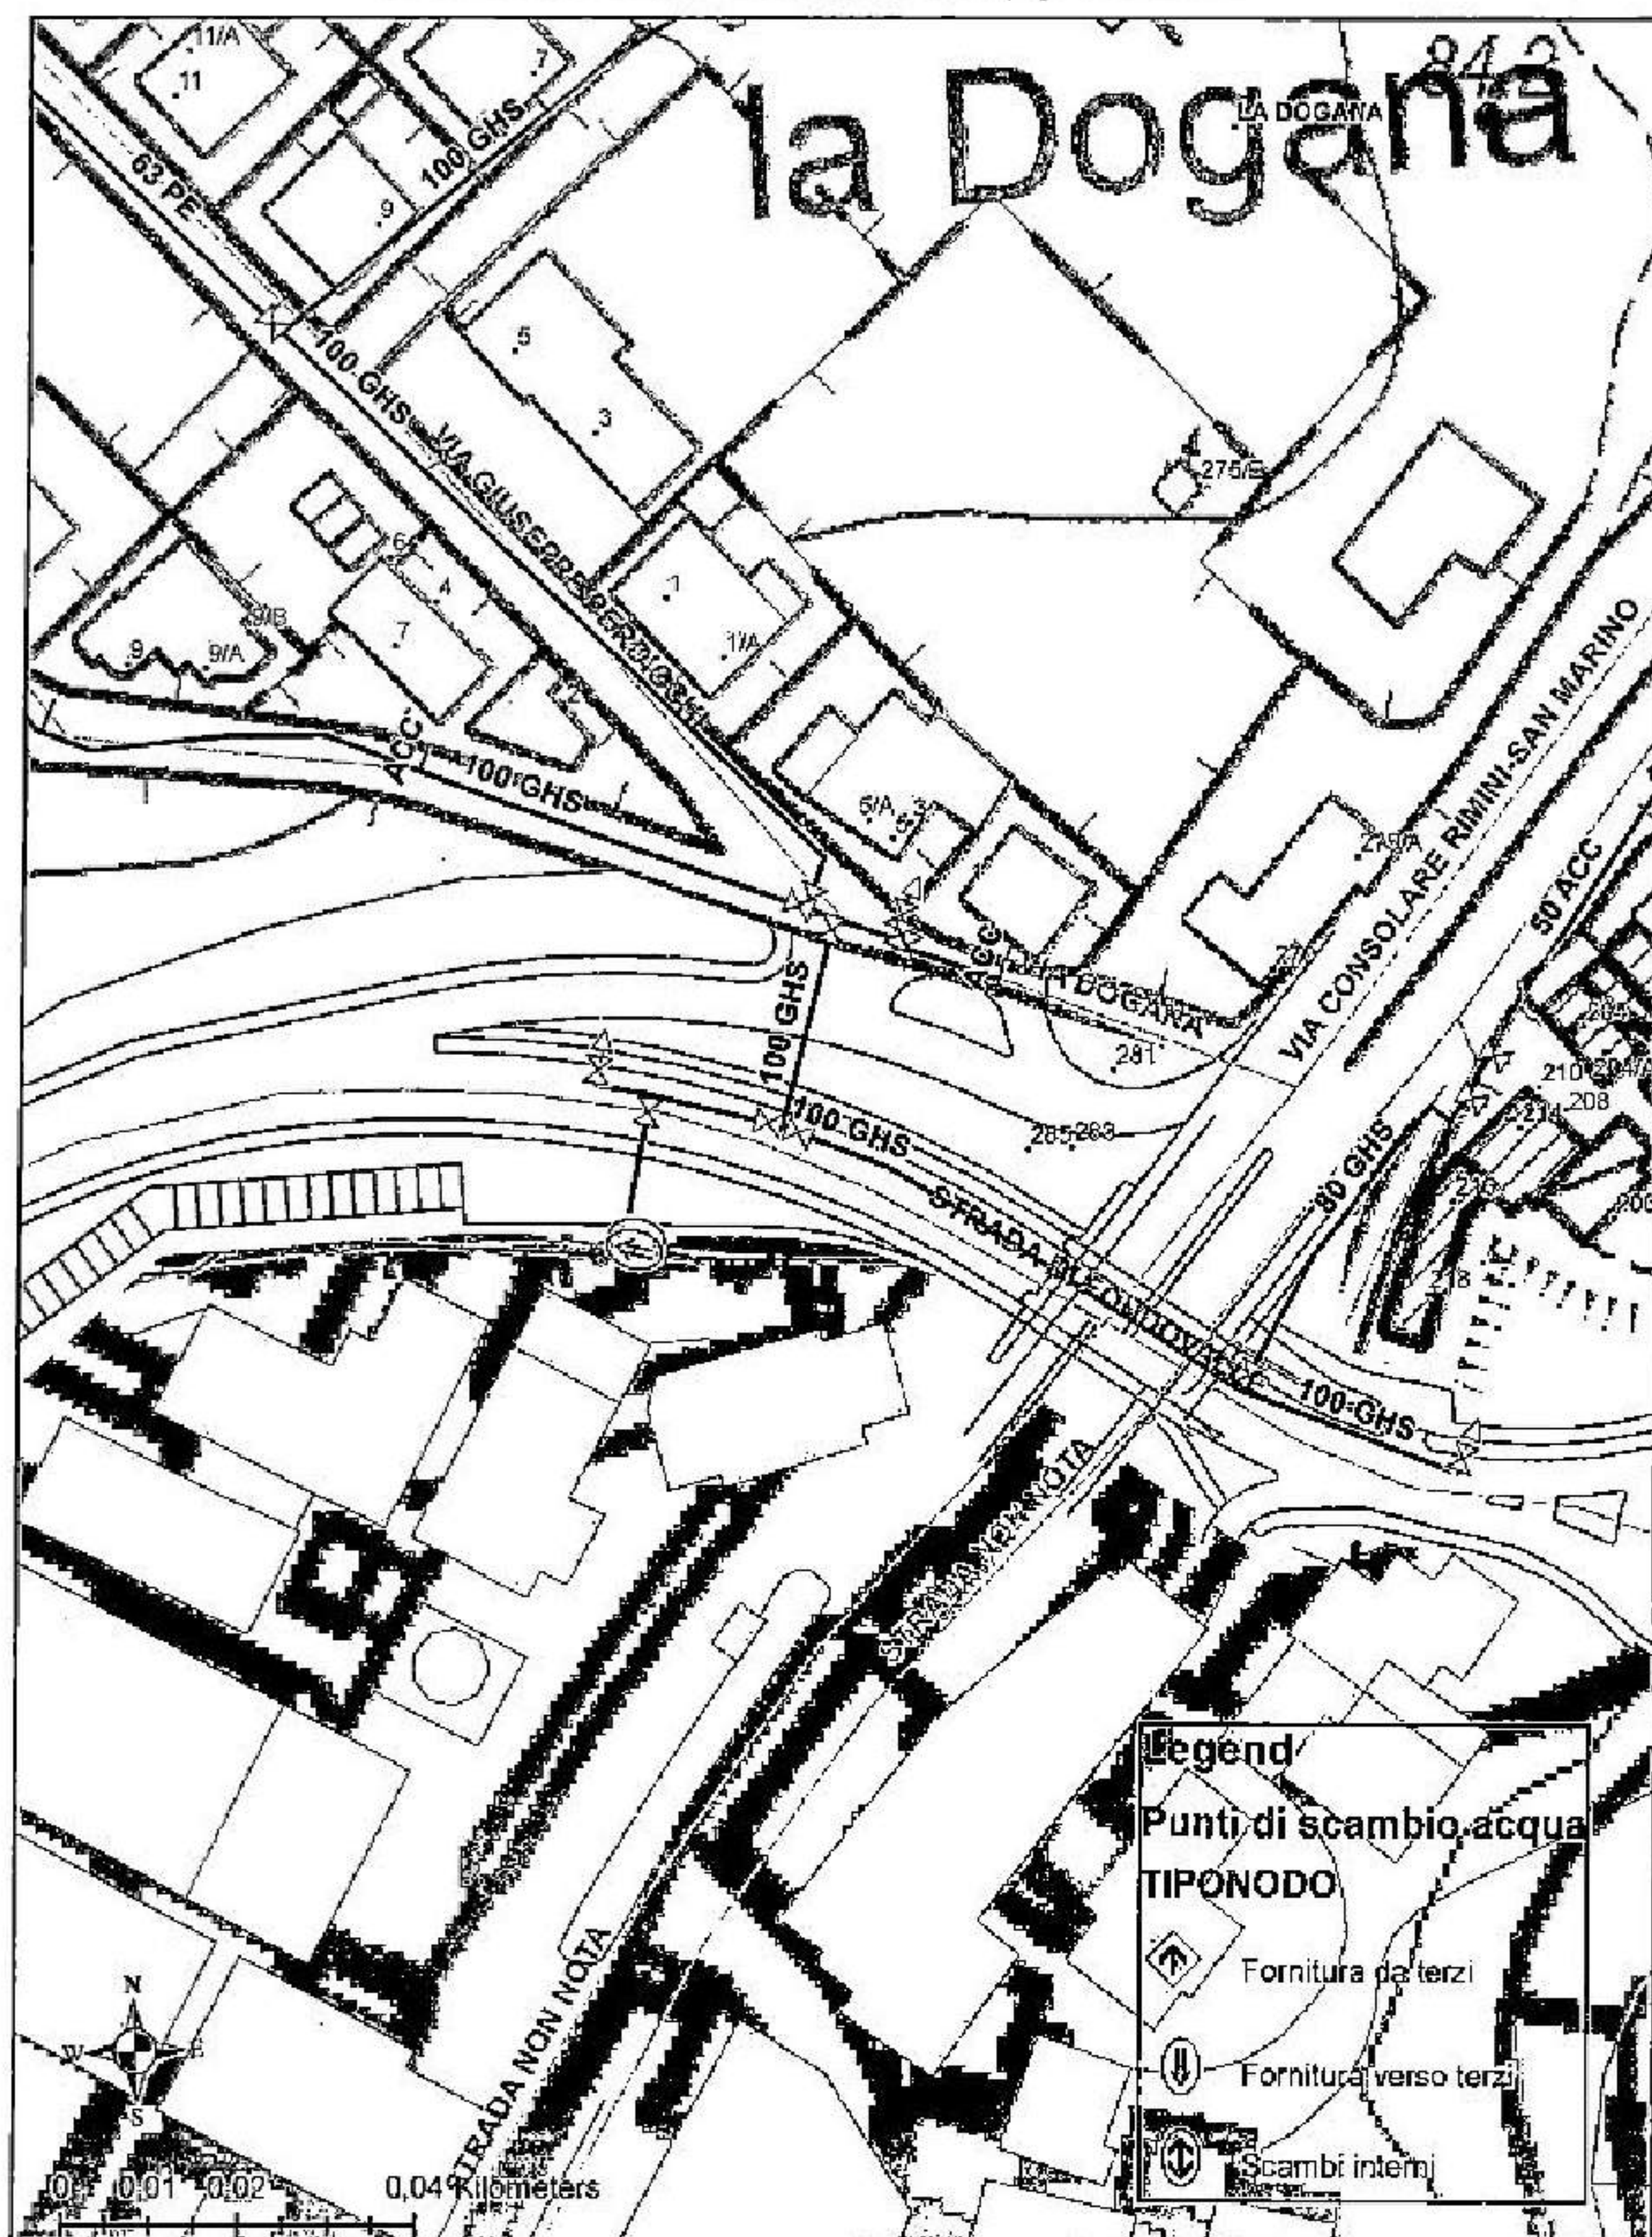


Punto di Consegna da R.S.M. a Hera

Lazzara


Via Lazzara_Verucchio

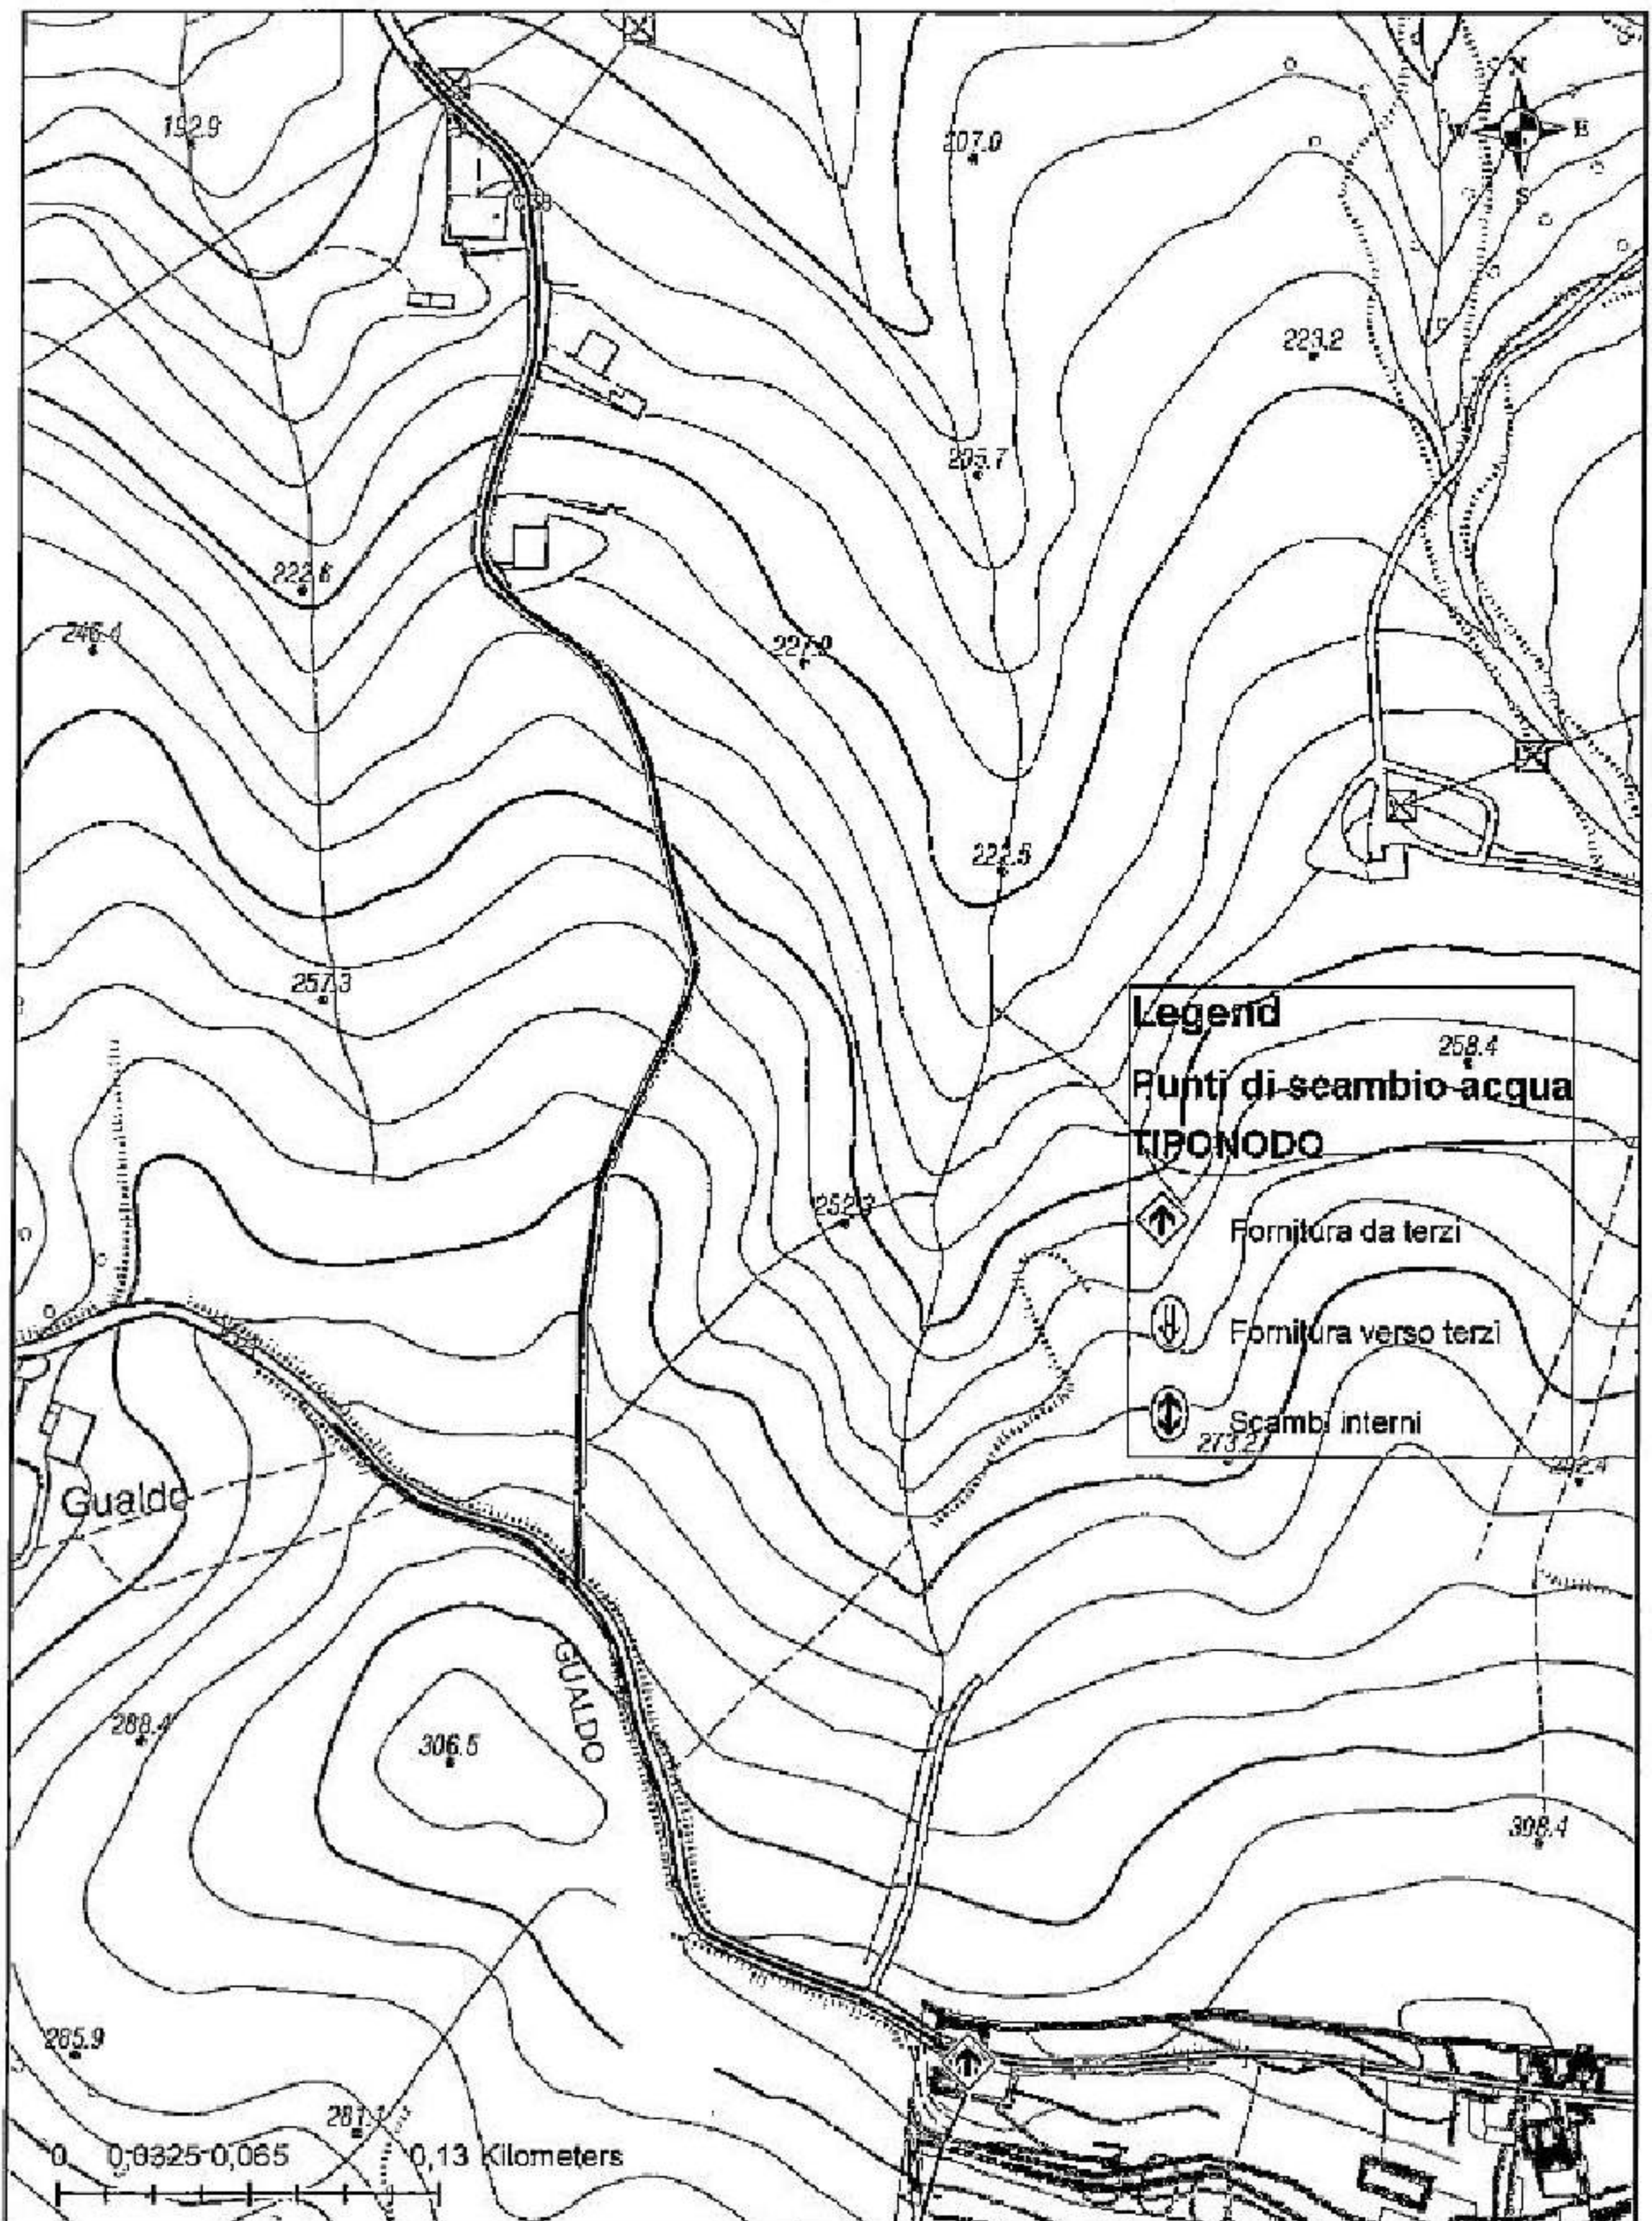


Punto di Consegna da Hera a R.S.M. Monte Olivo_Coriano

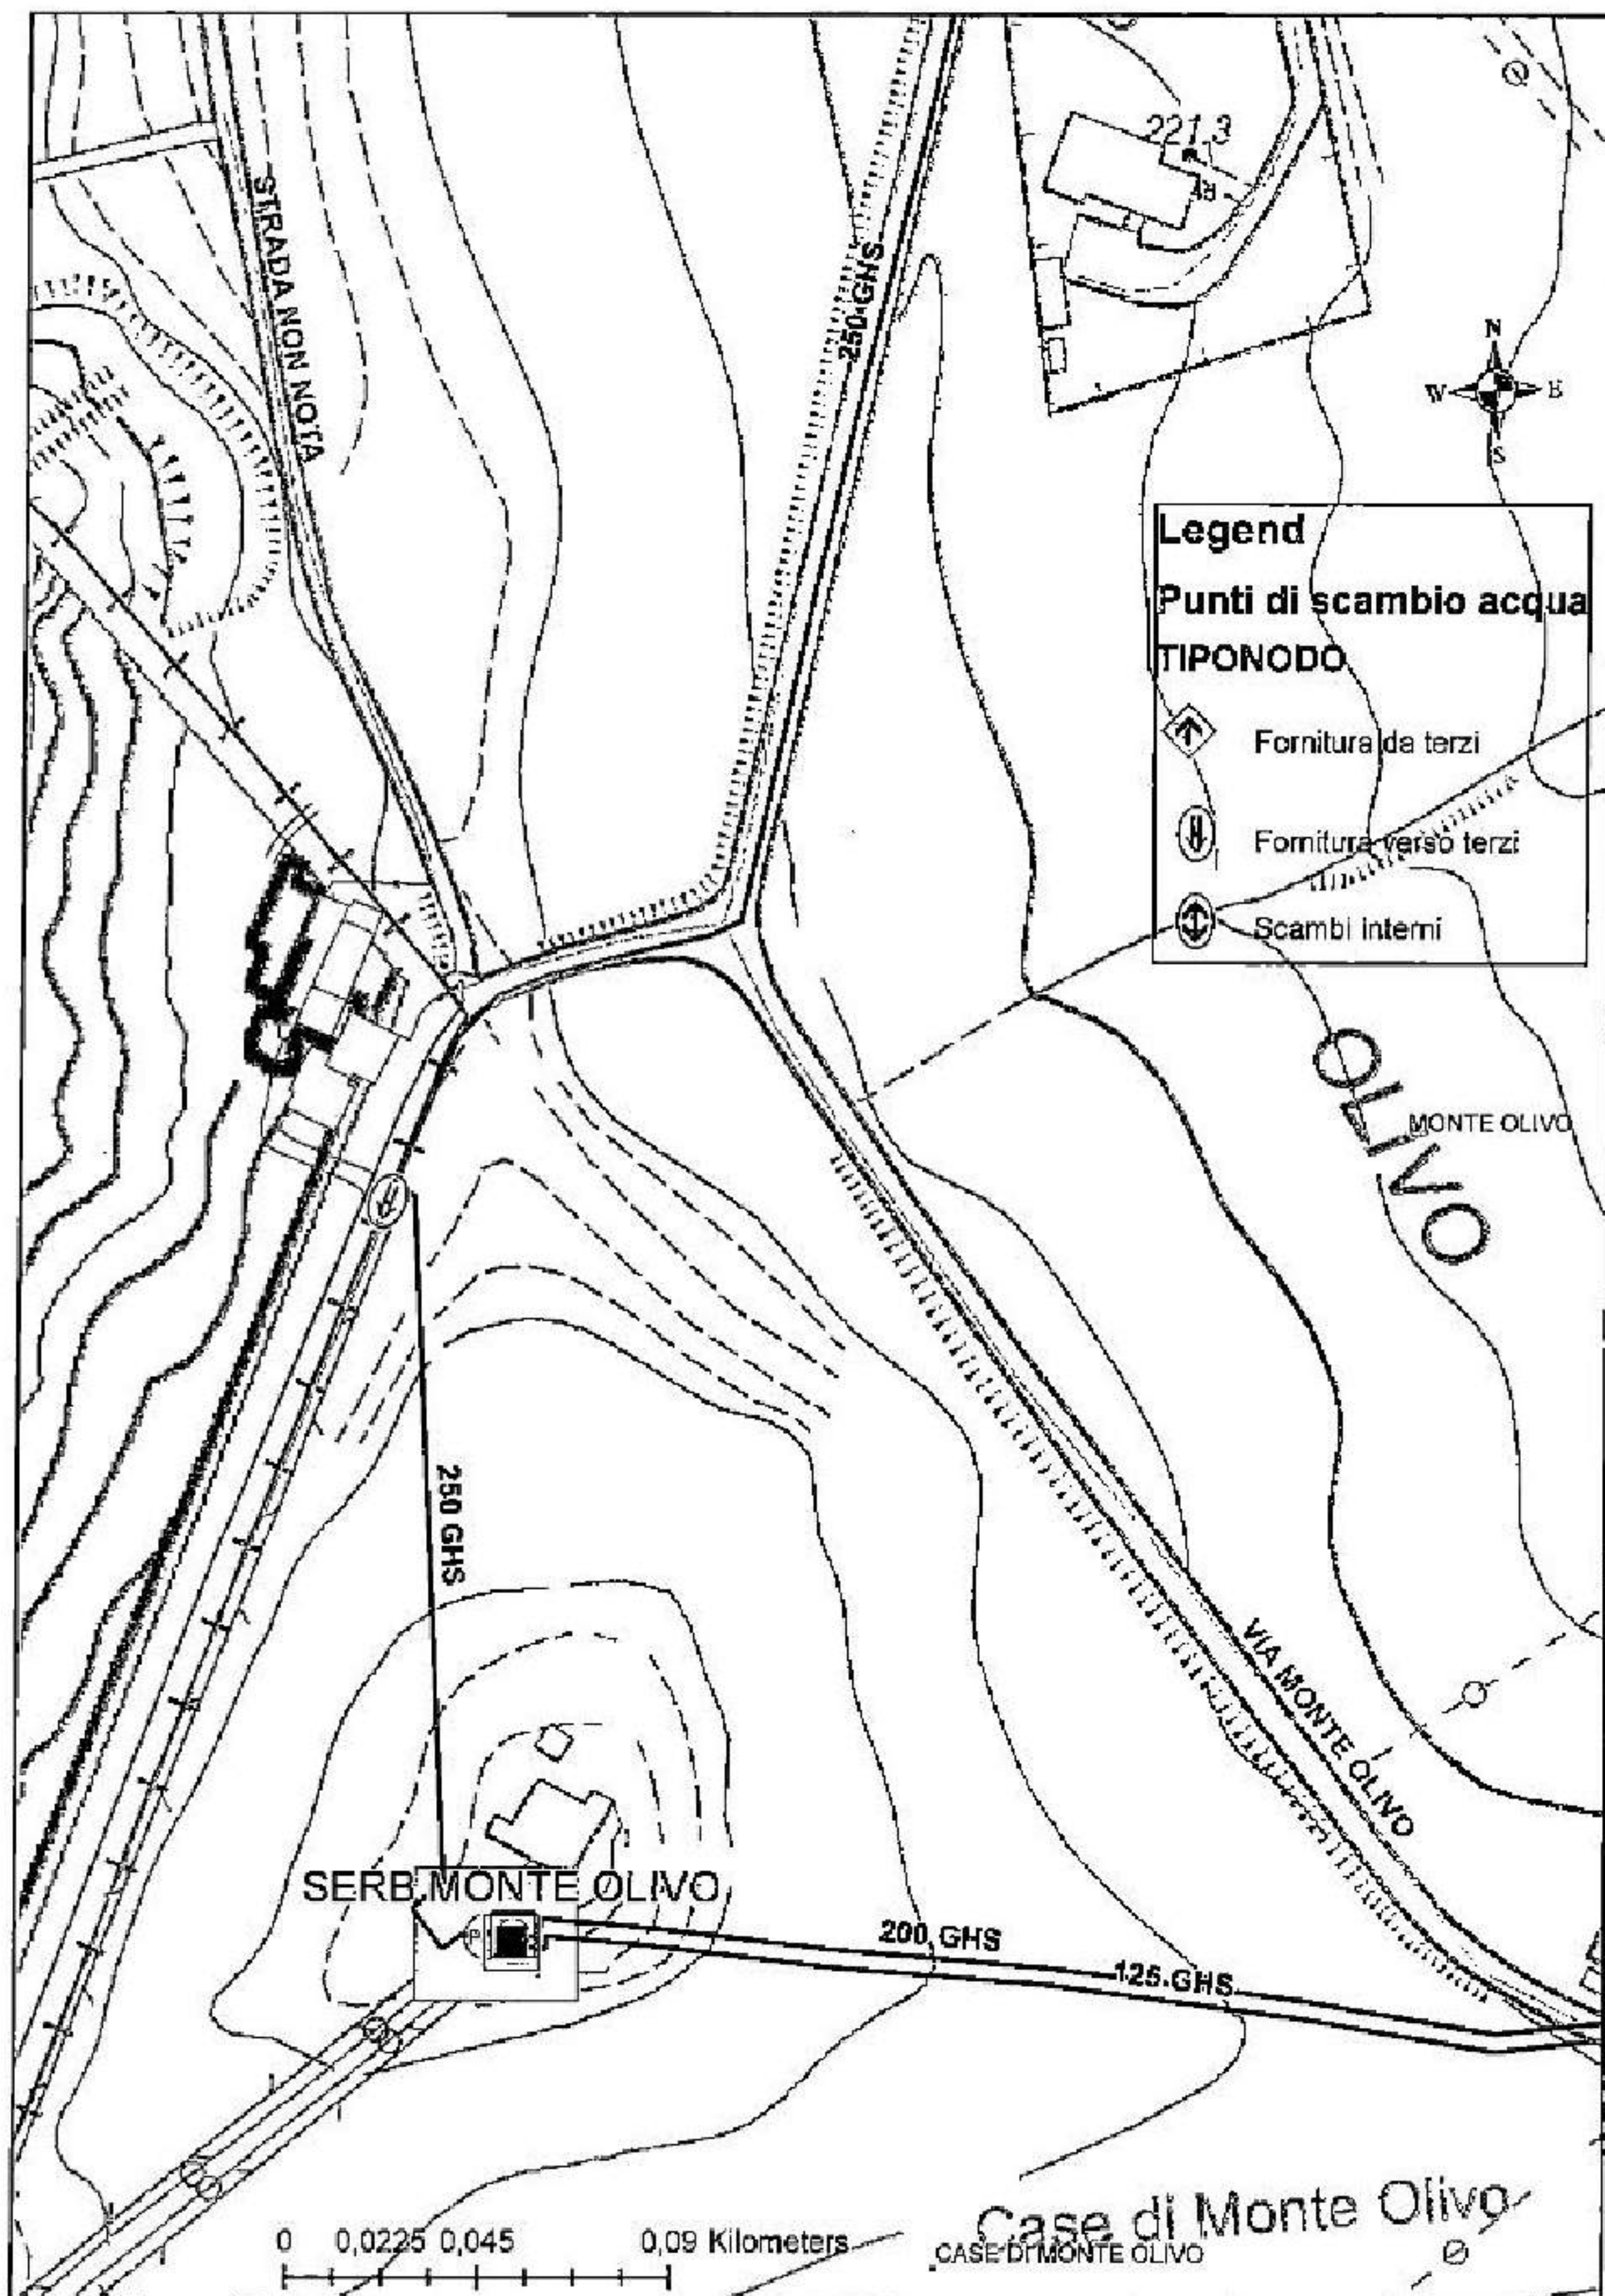

Punto di Consegna da Hera a R.S.M. Monte Olivo_Coriano

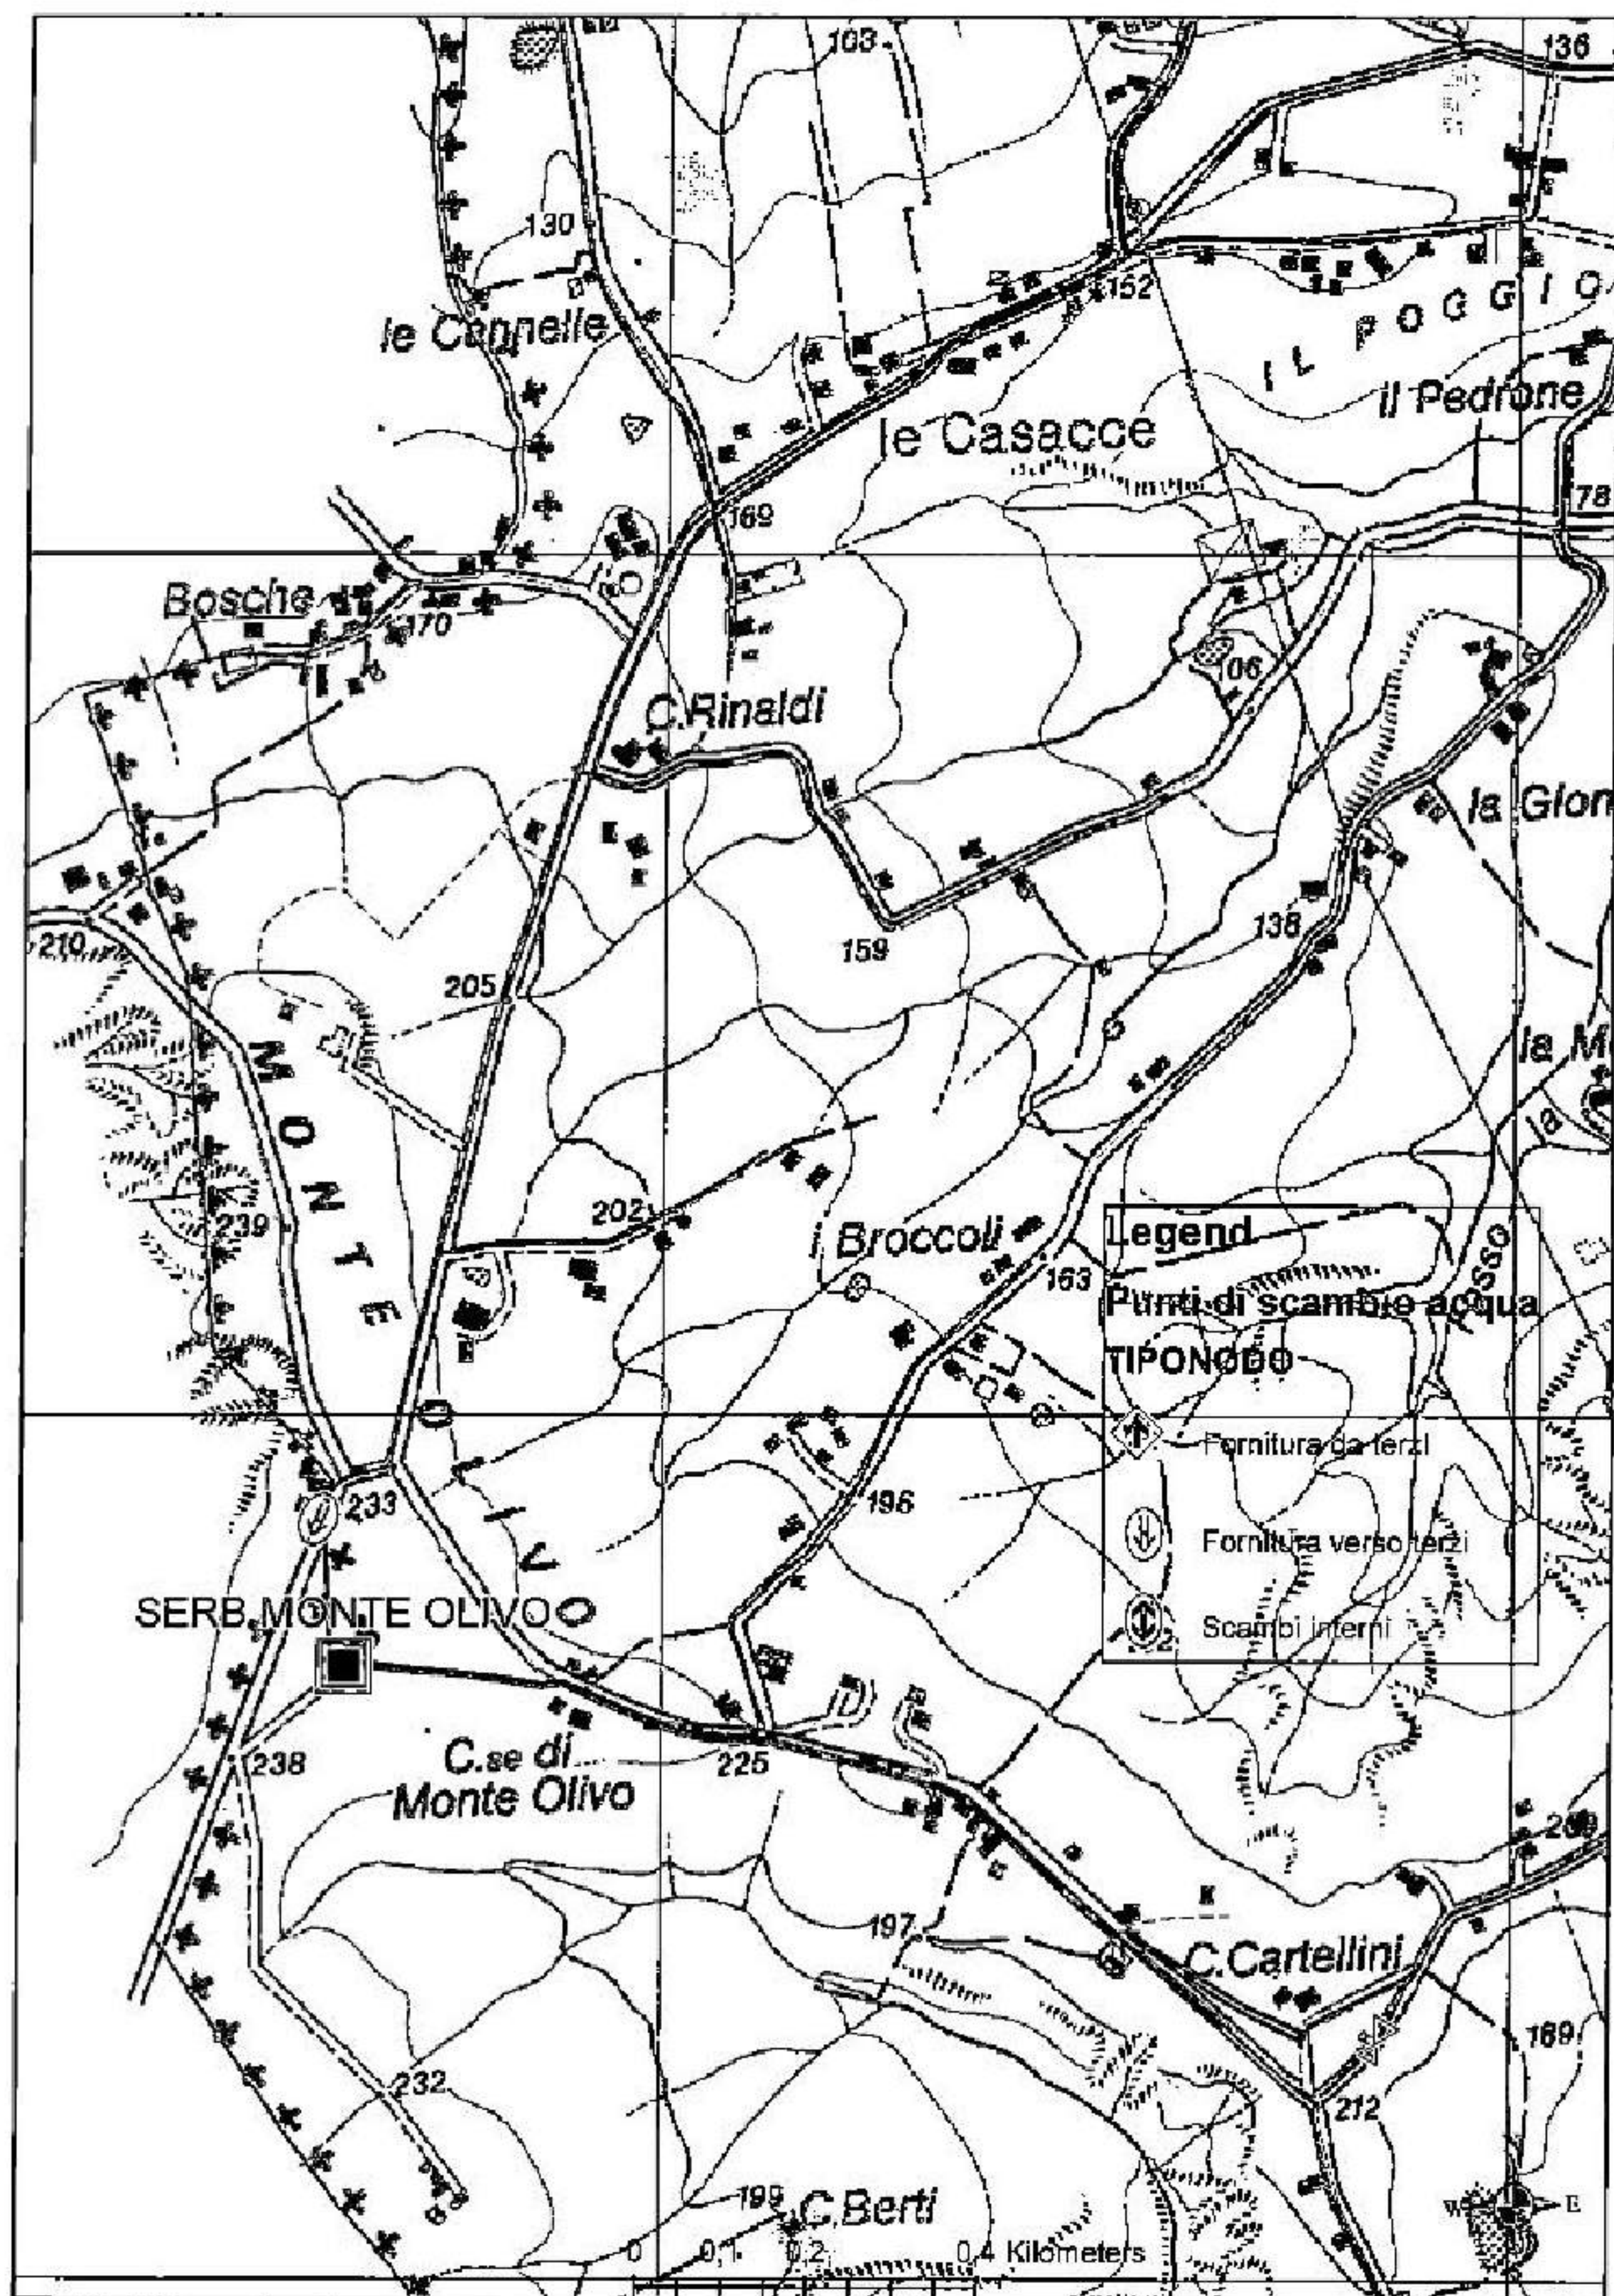


Punto di Consegna da R.S.M. a Hera Pieve Corena_Verucchio

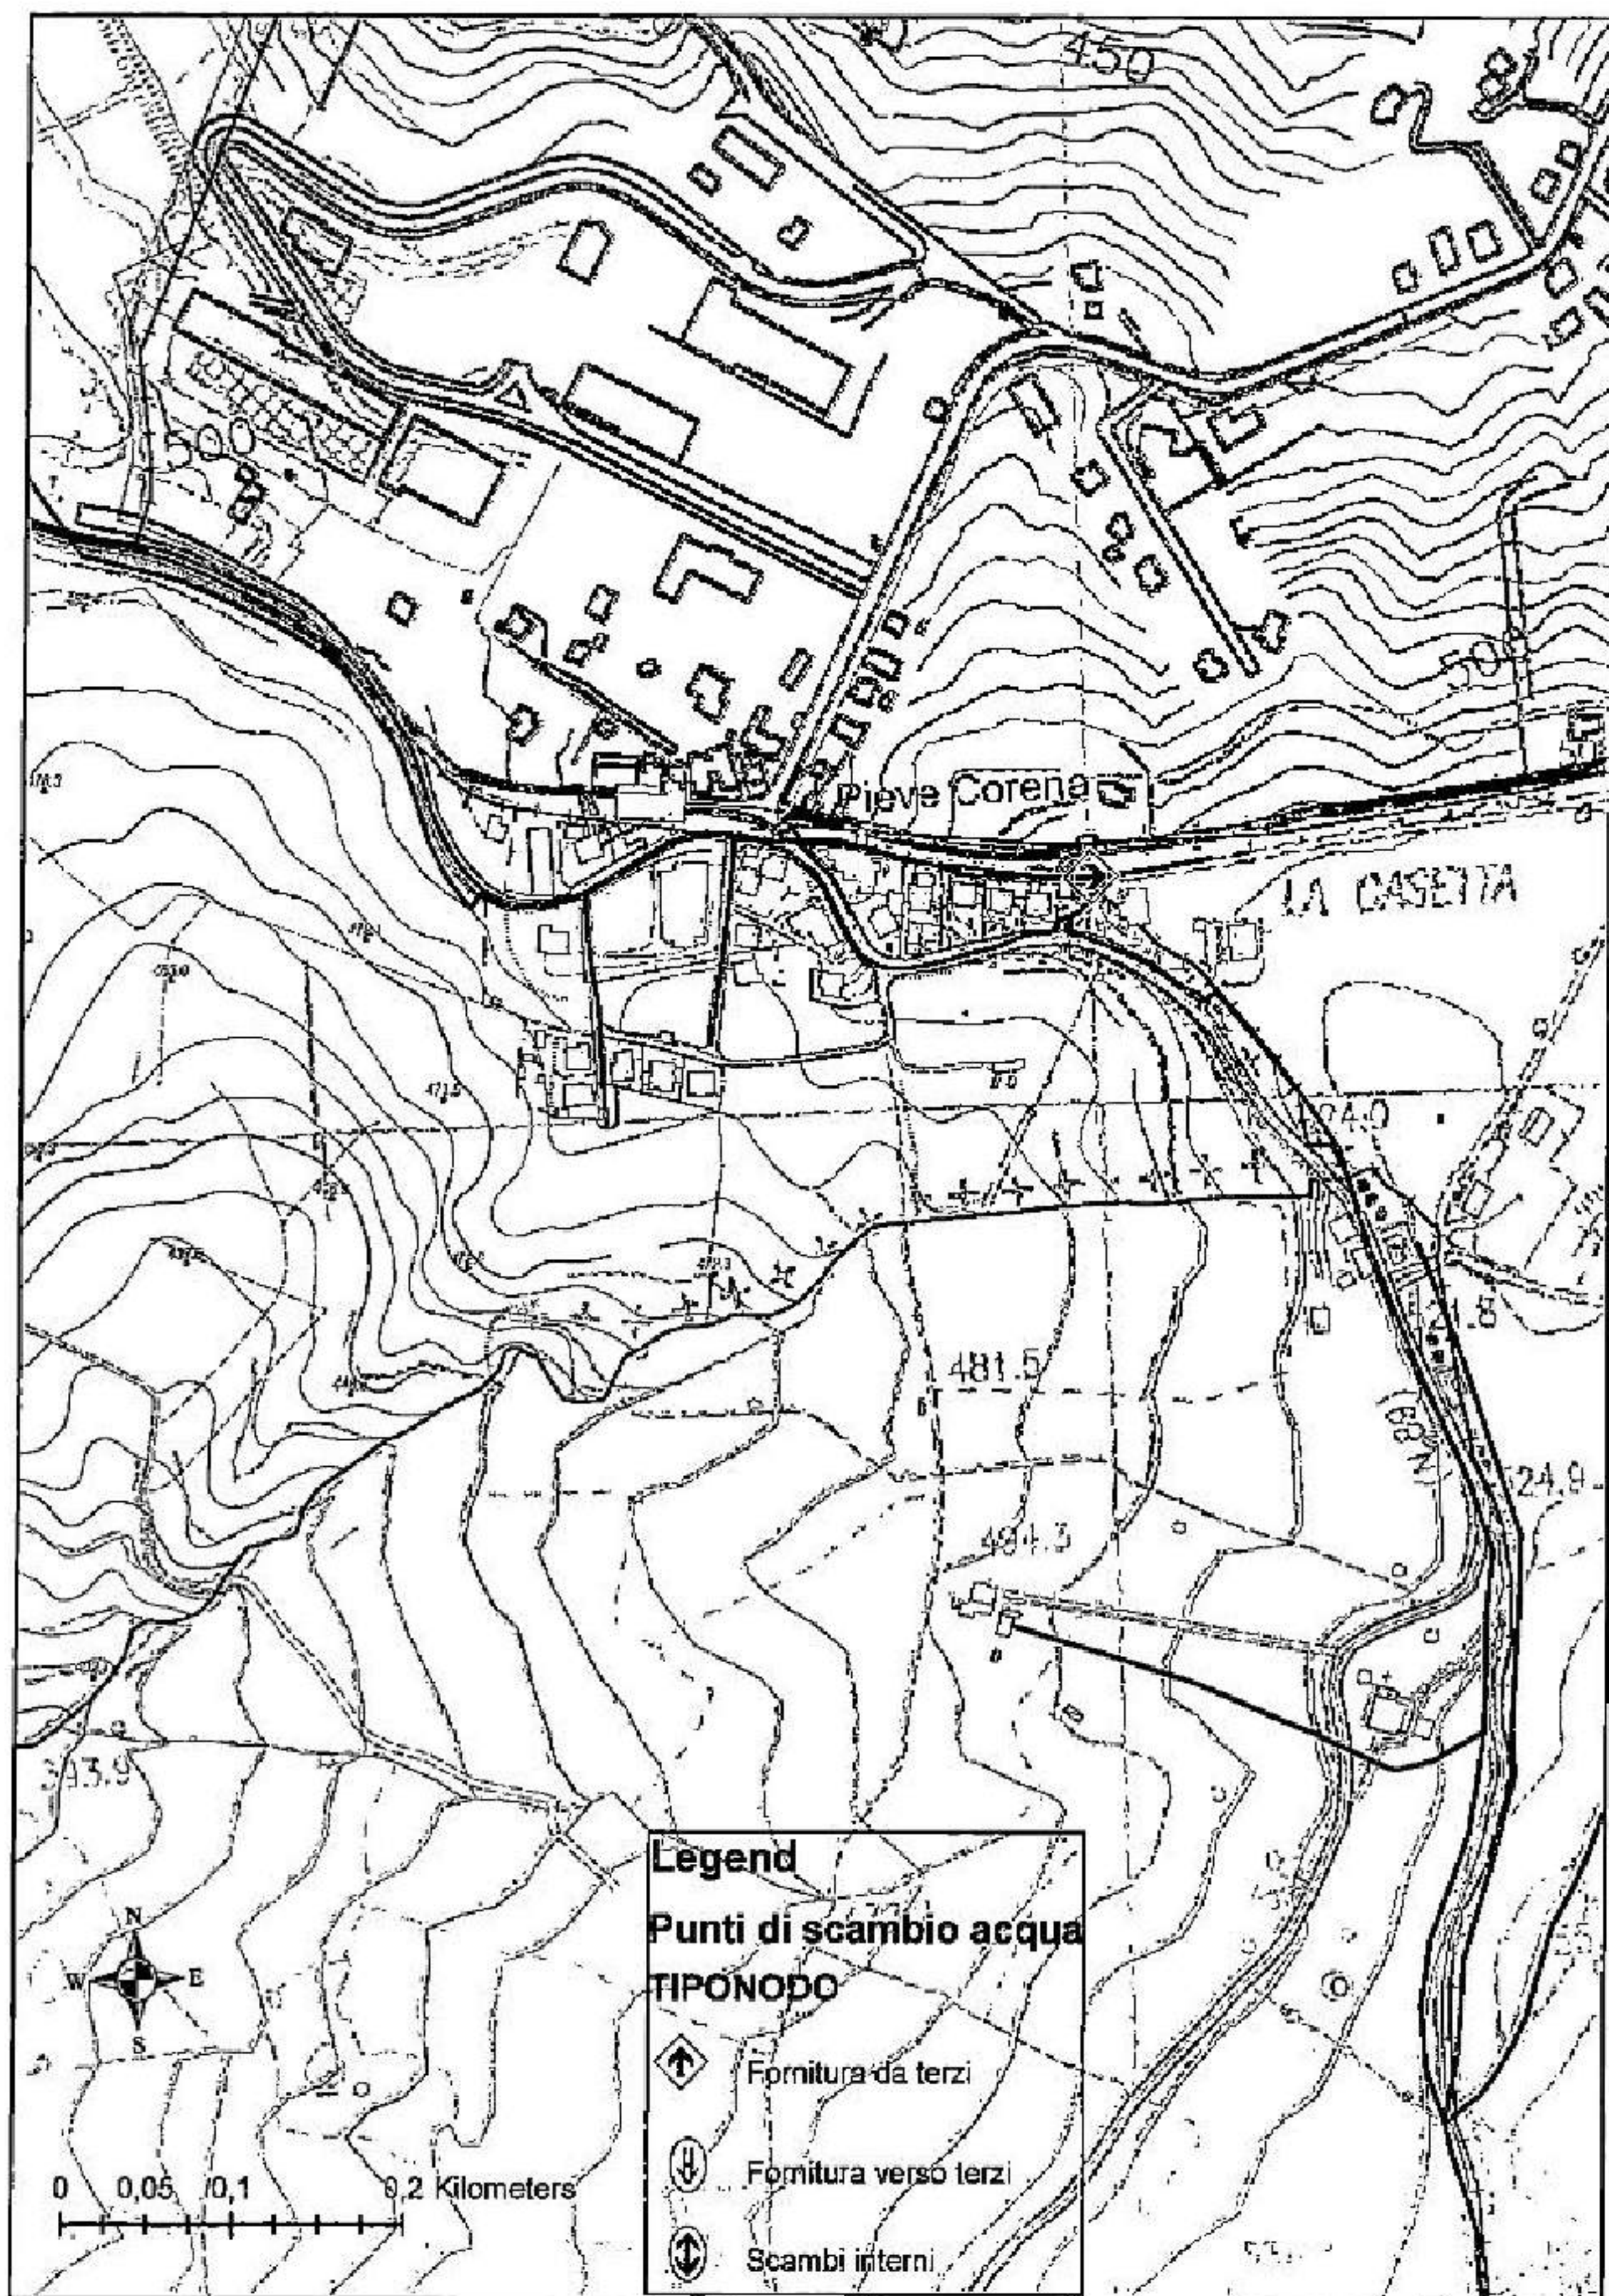


Punto di Consegna da R.S.M. a Hera


Pieve Corena_Verucchio

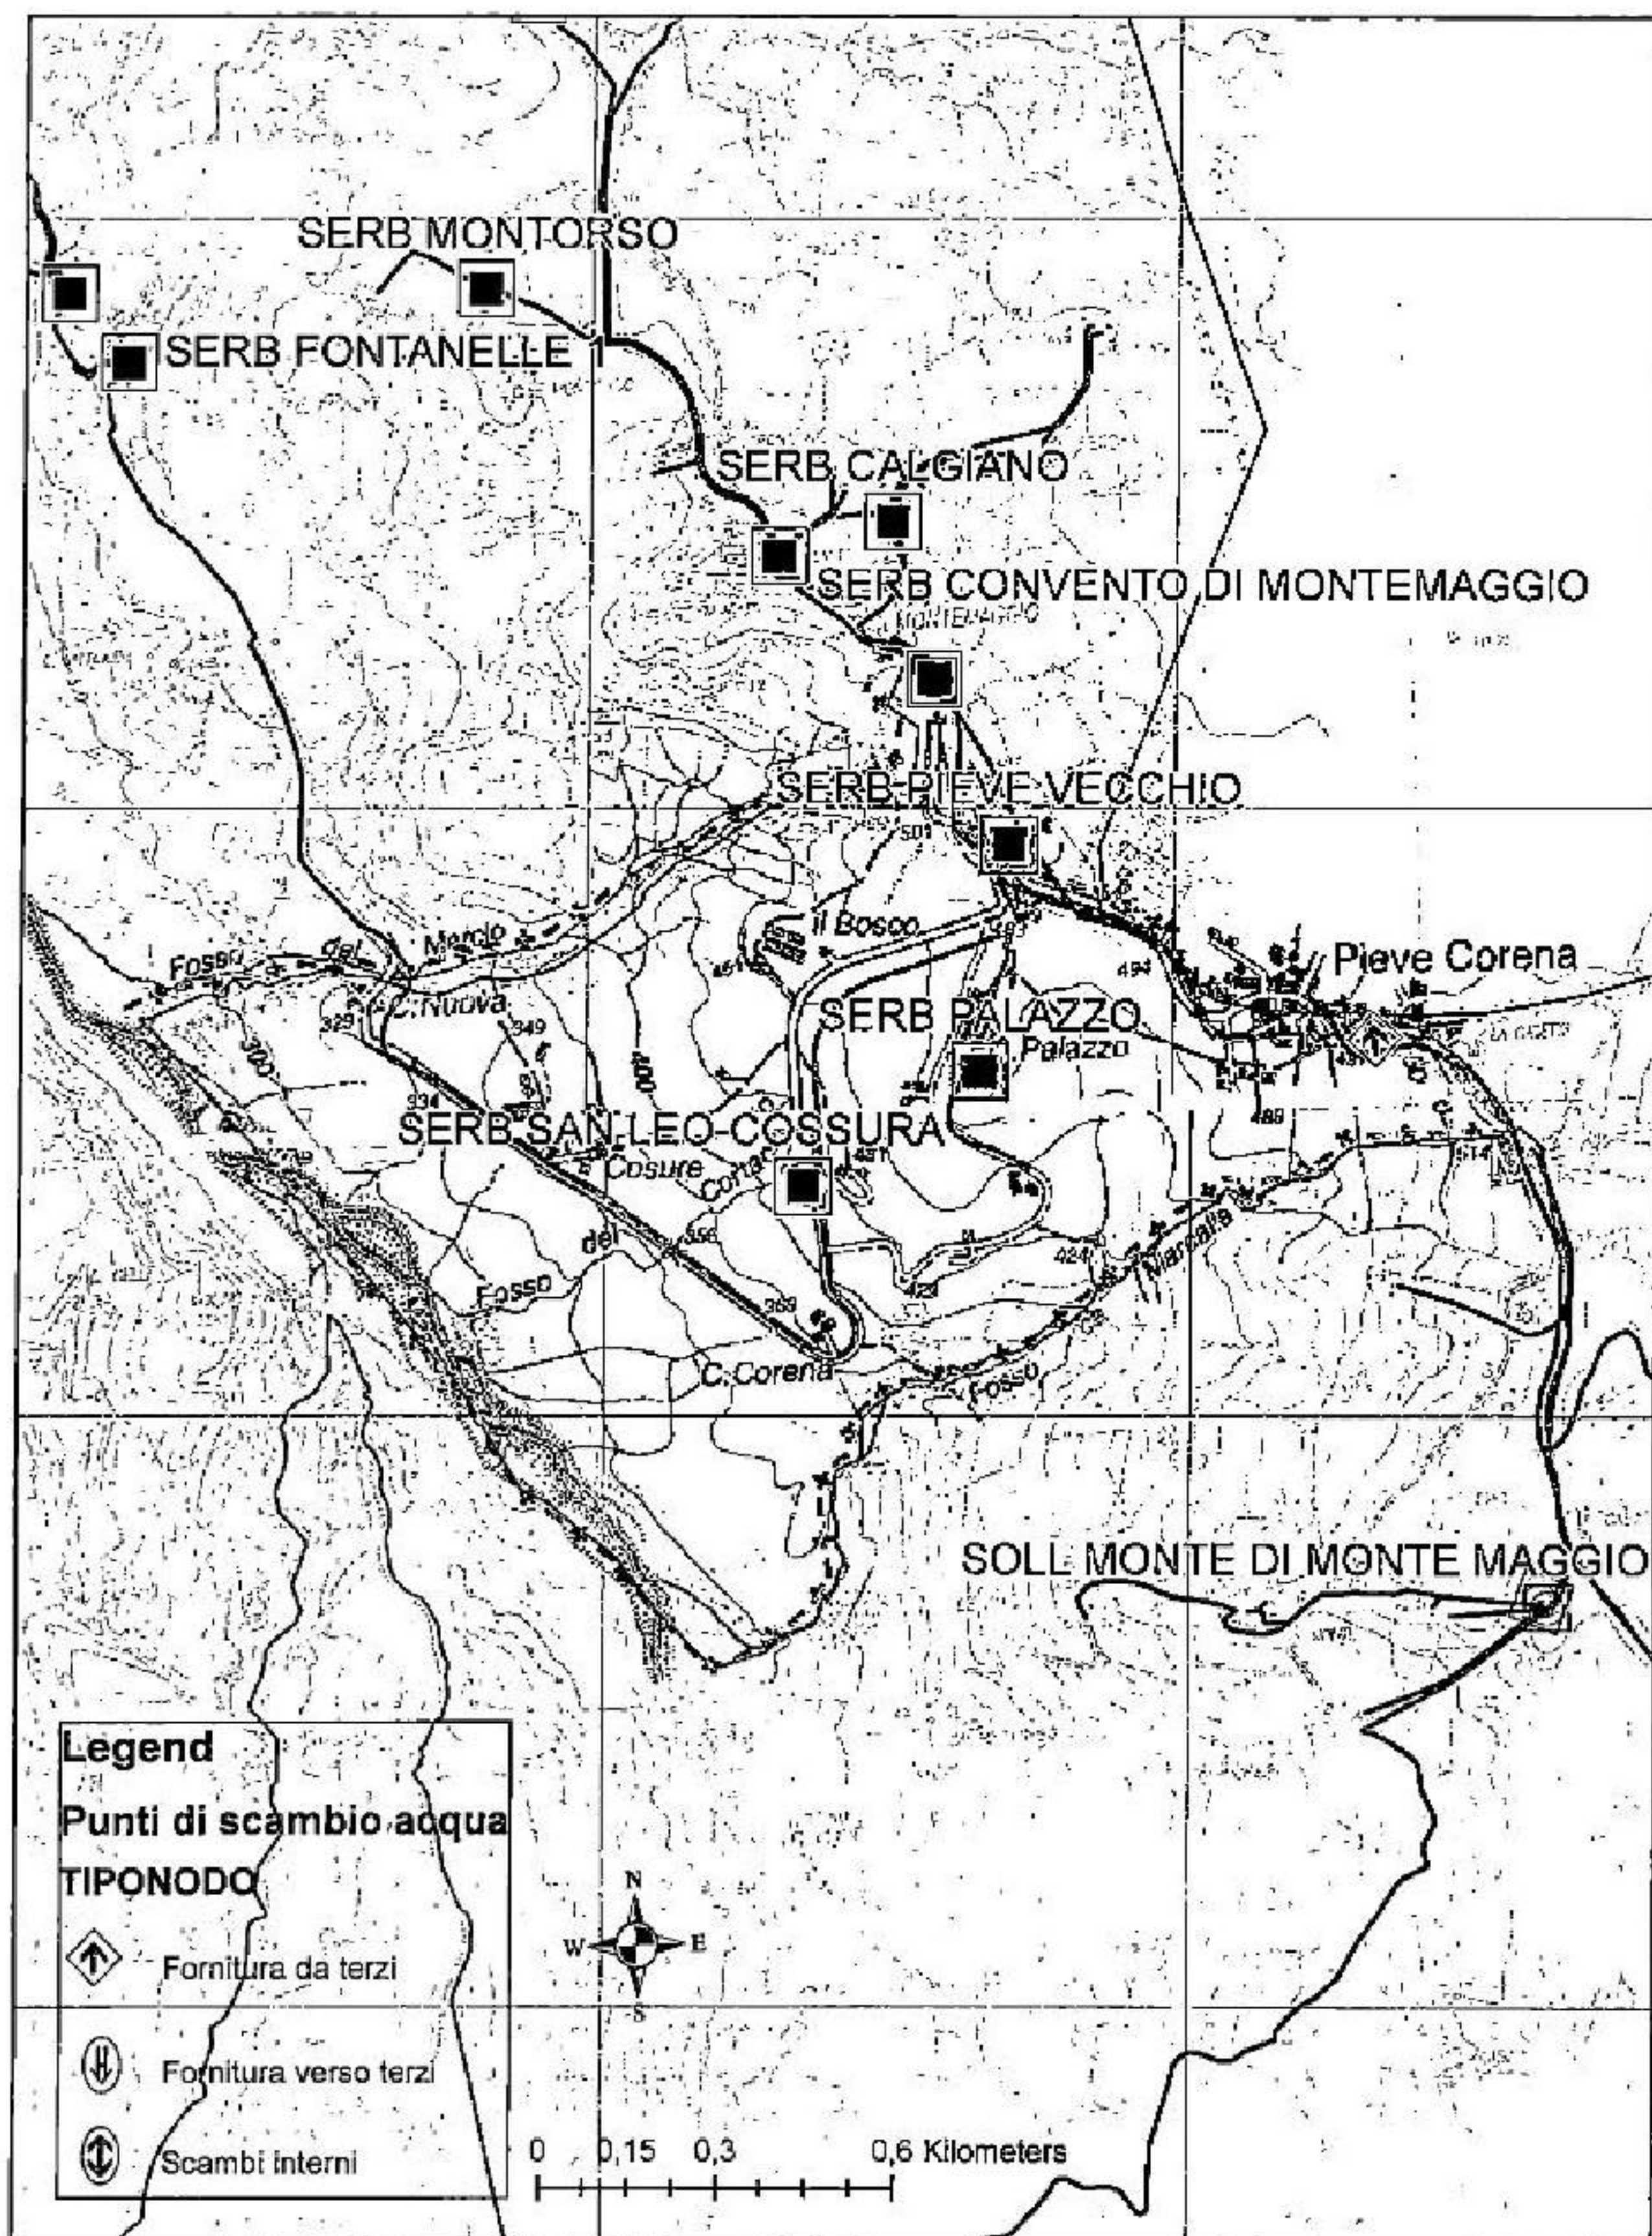


Punto di Consegna da Hera a R.S.M. Serra Marignano_Rimini

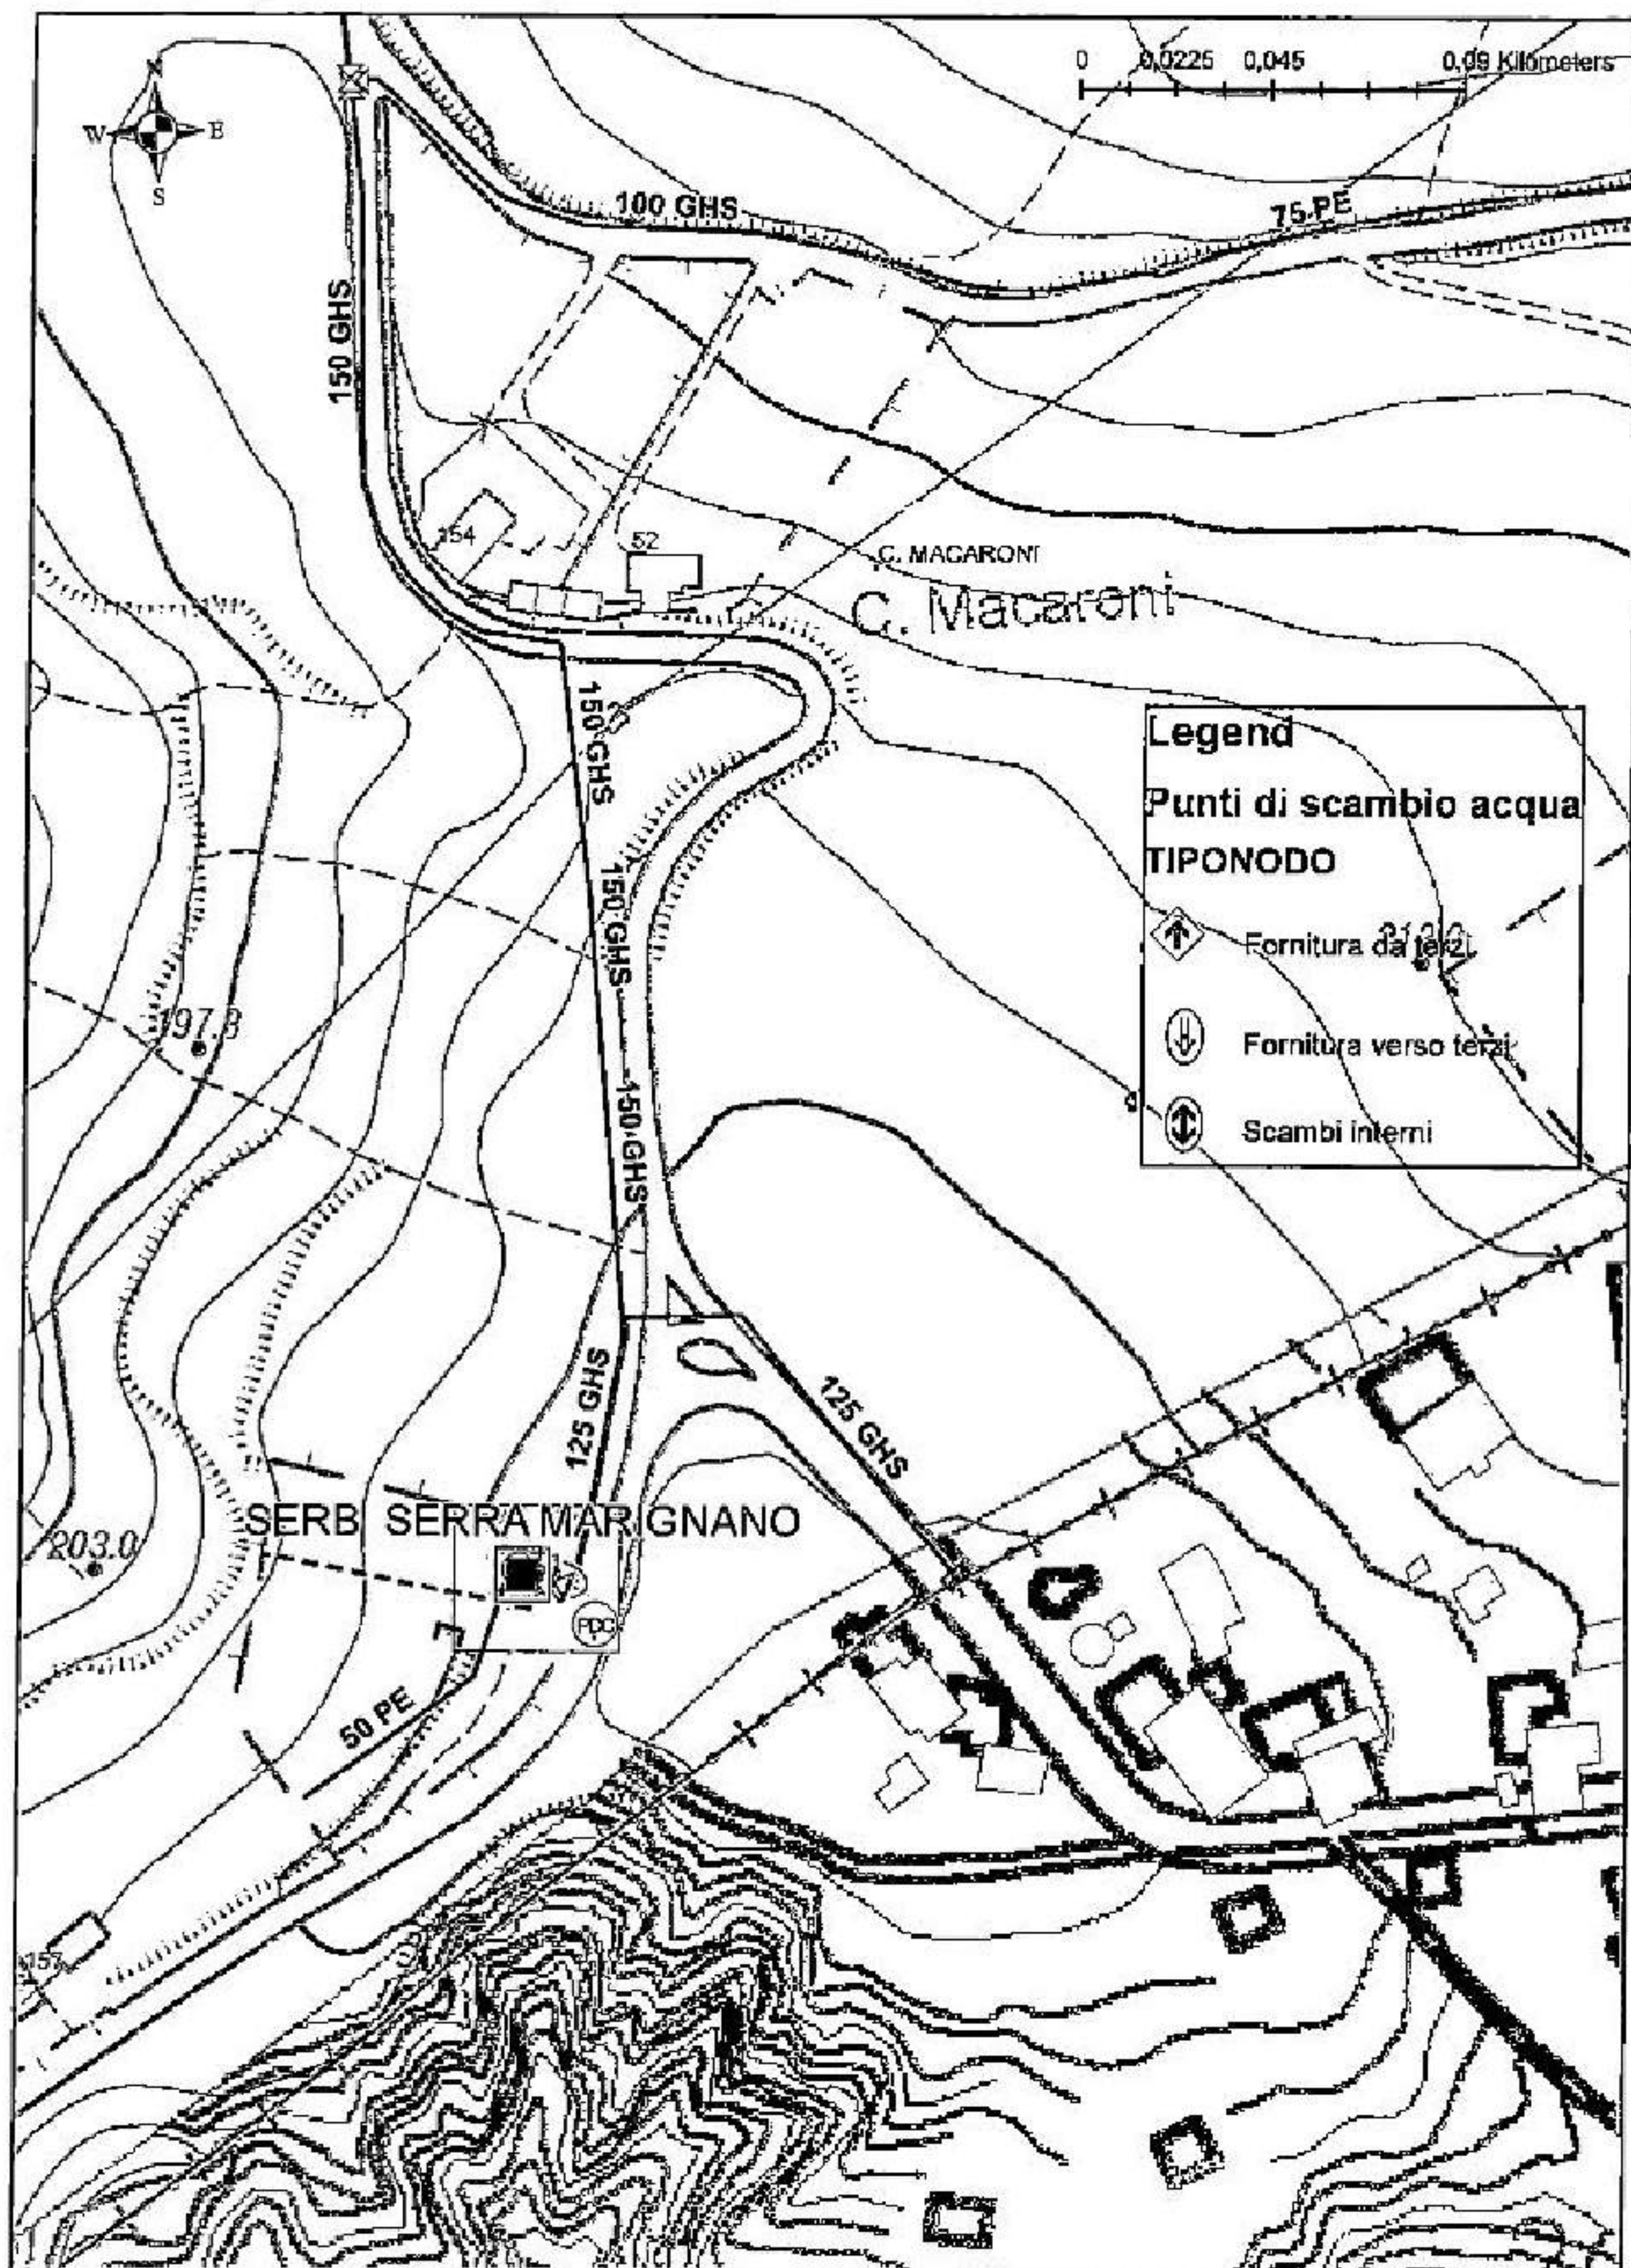


Punto di Consegna da R.S.M. a Hera Torello - San Leo

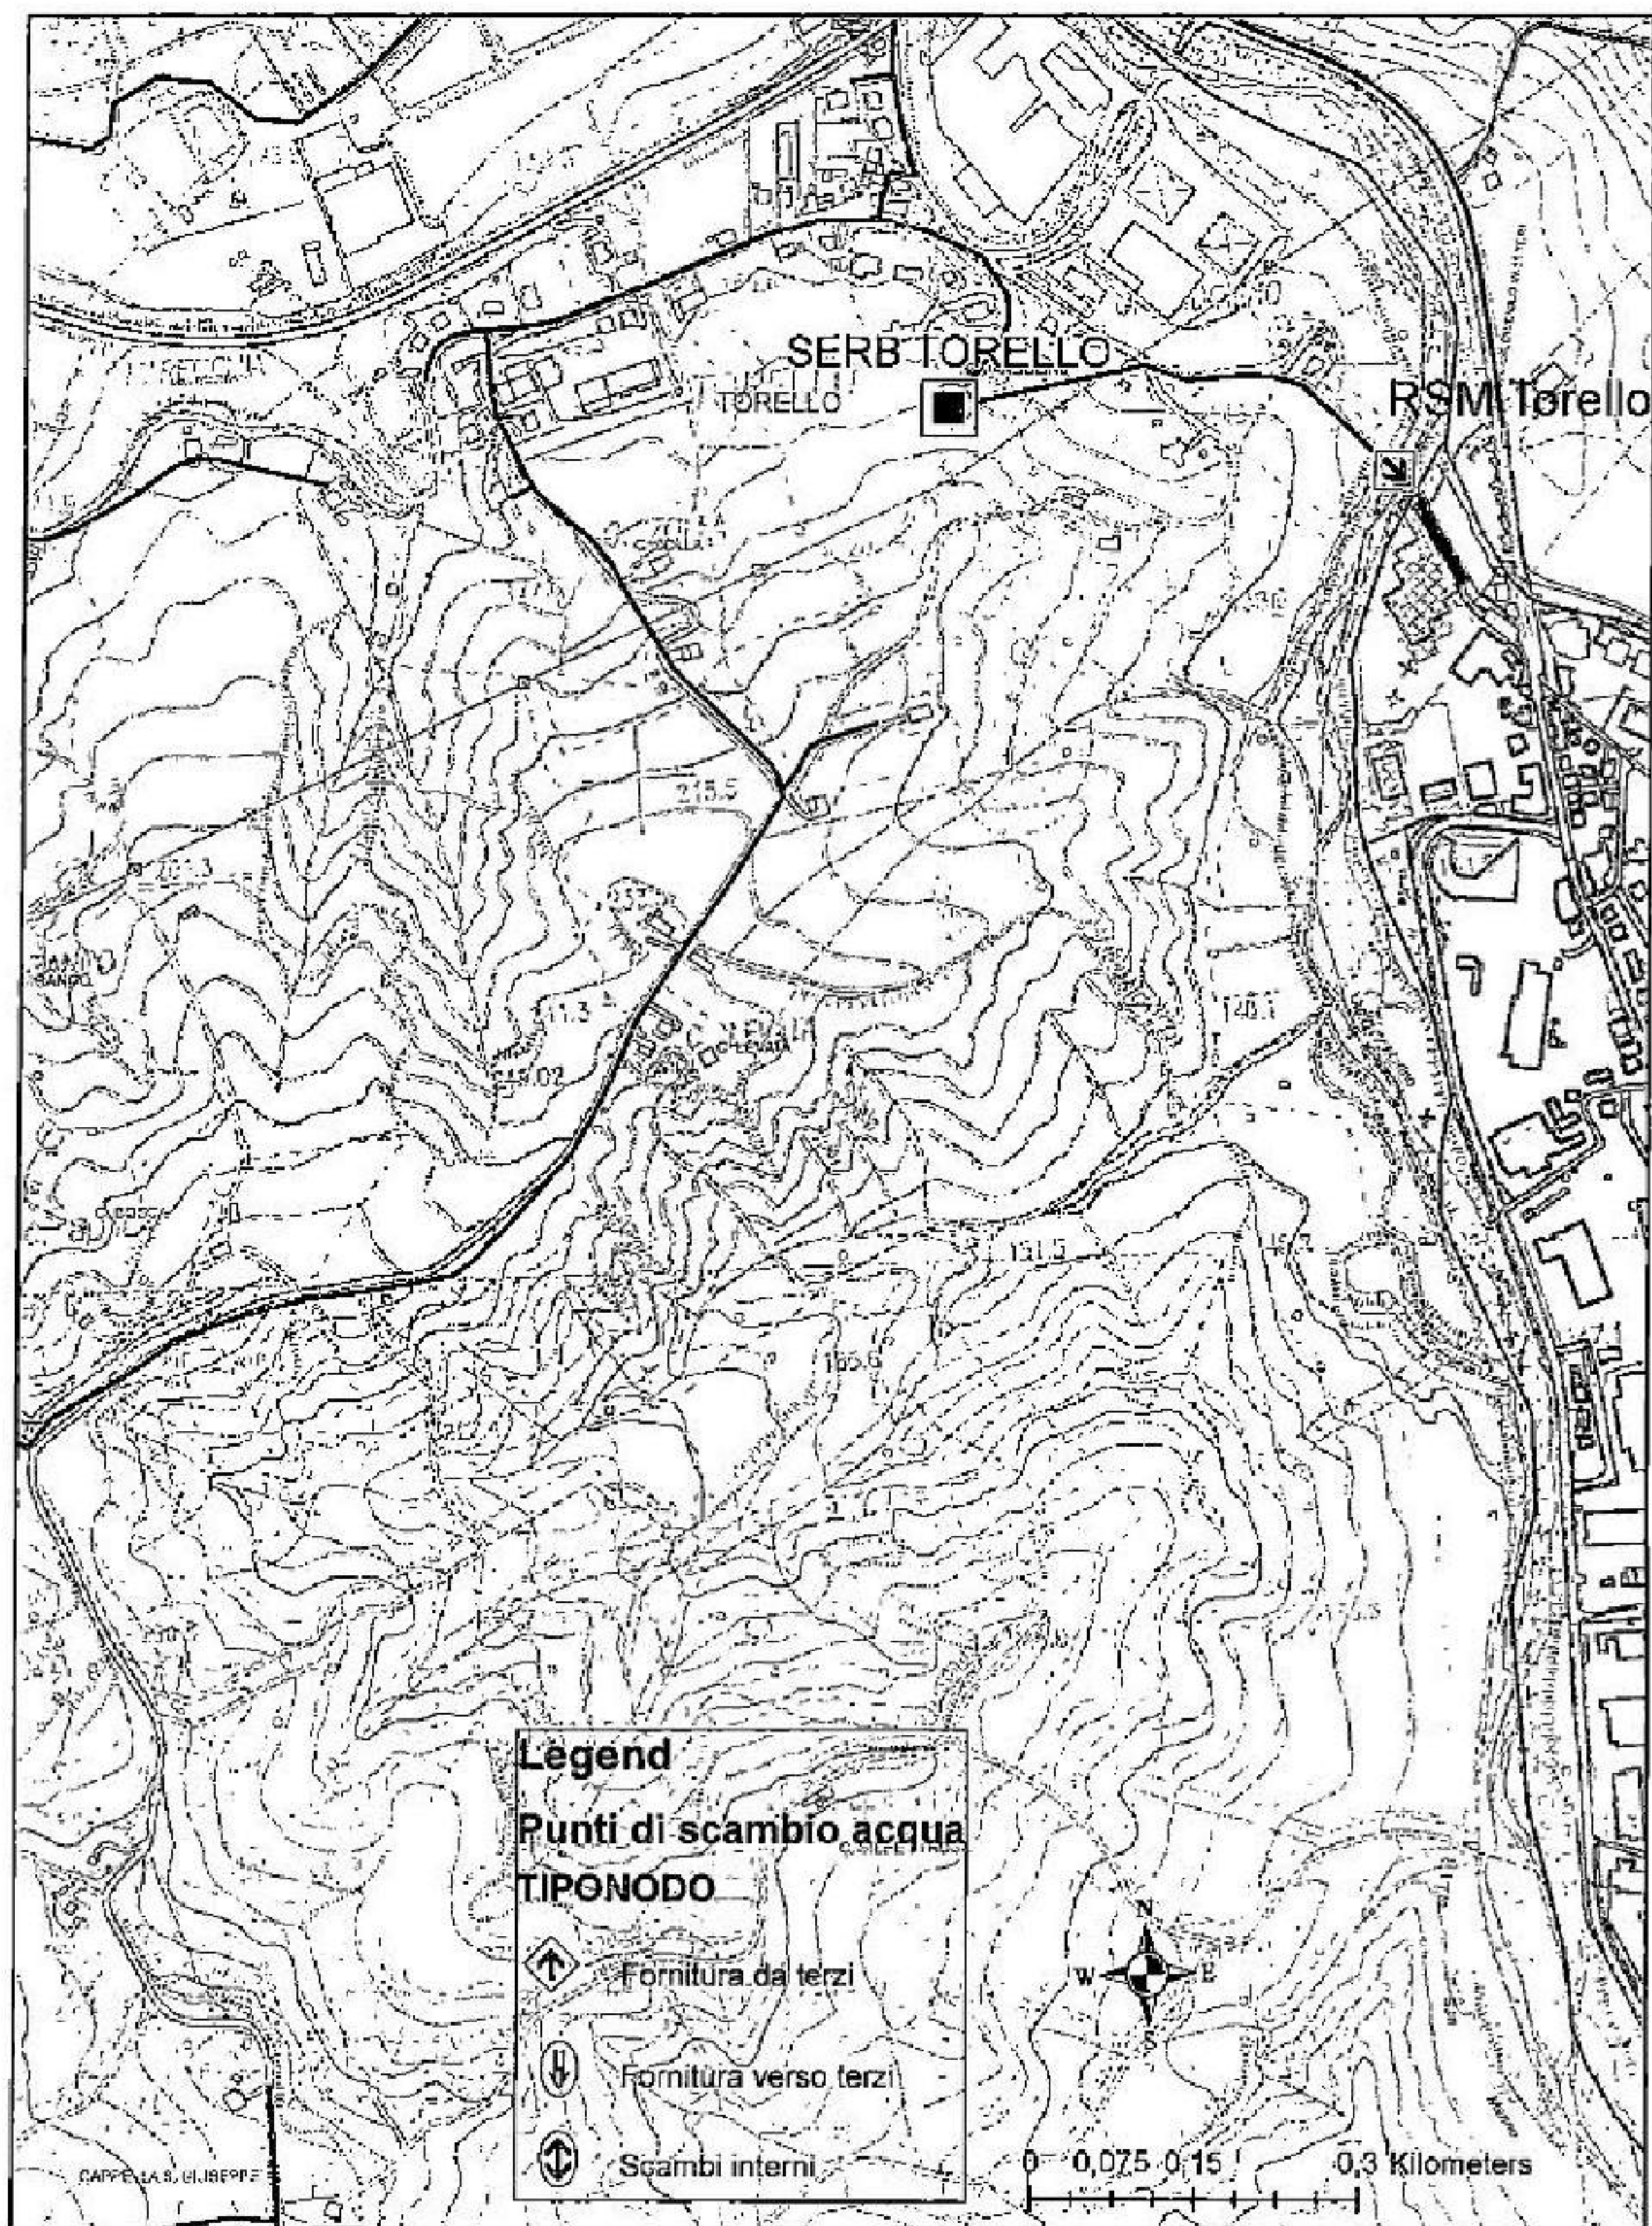

Punto di Consegna da R.S.M. a Hera Torello Via Torello_San Leo

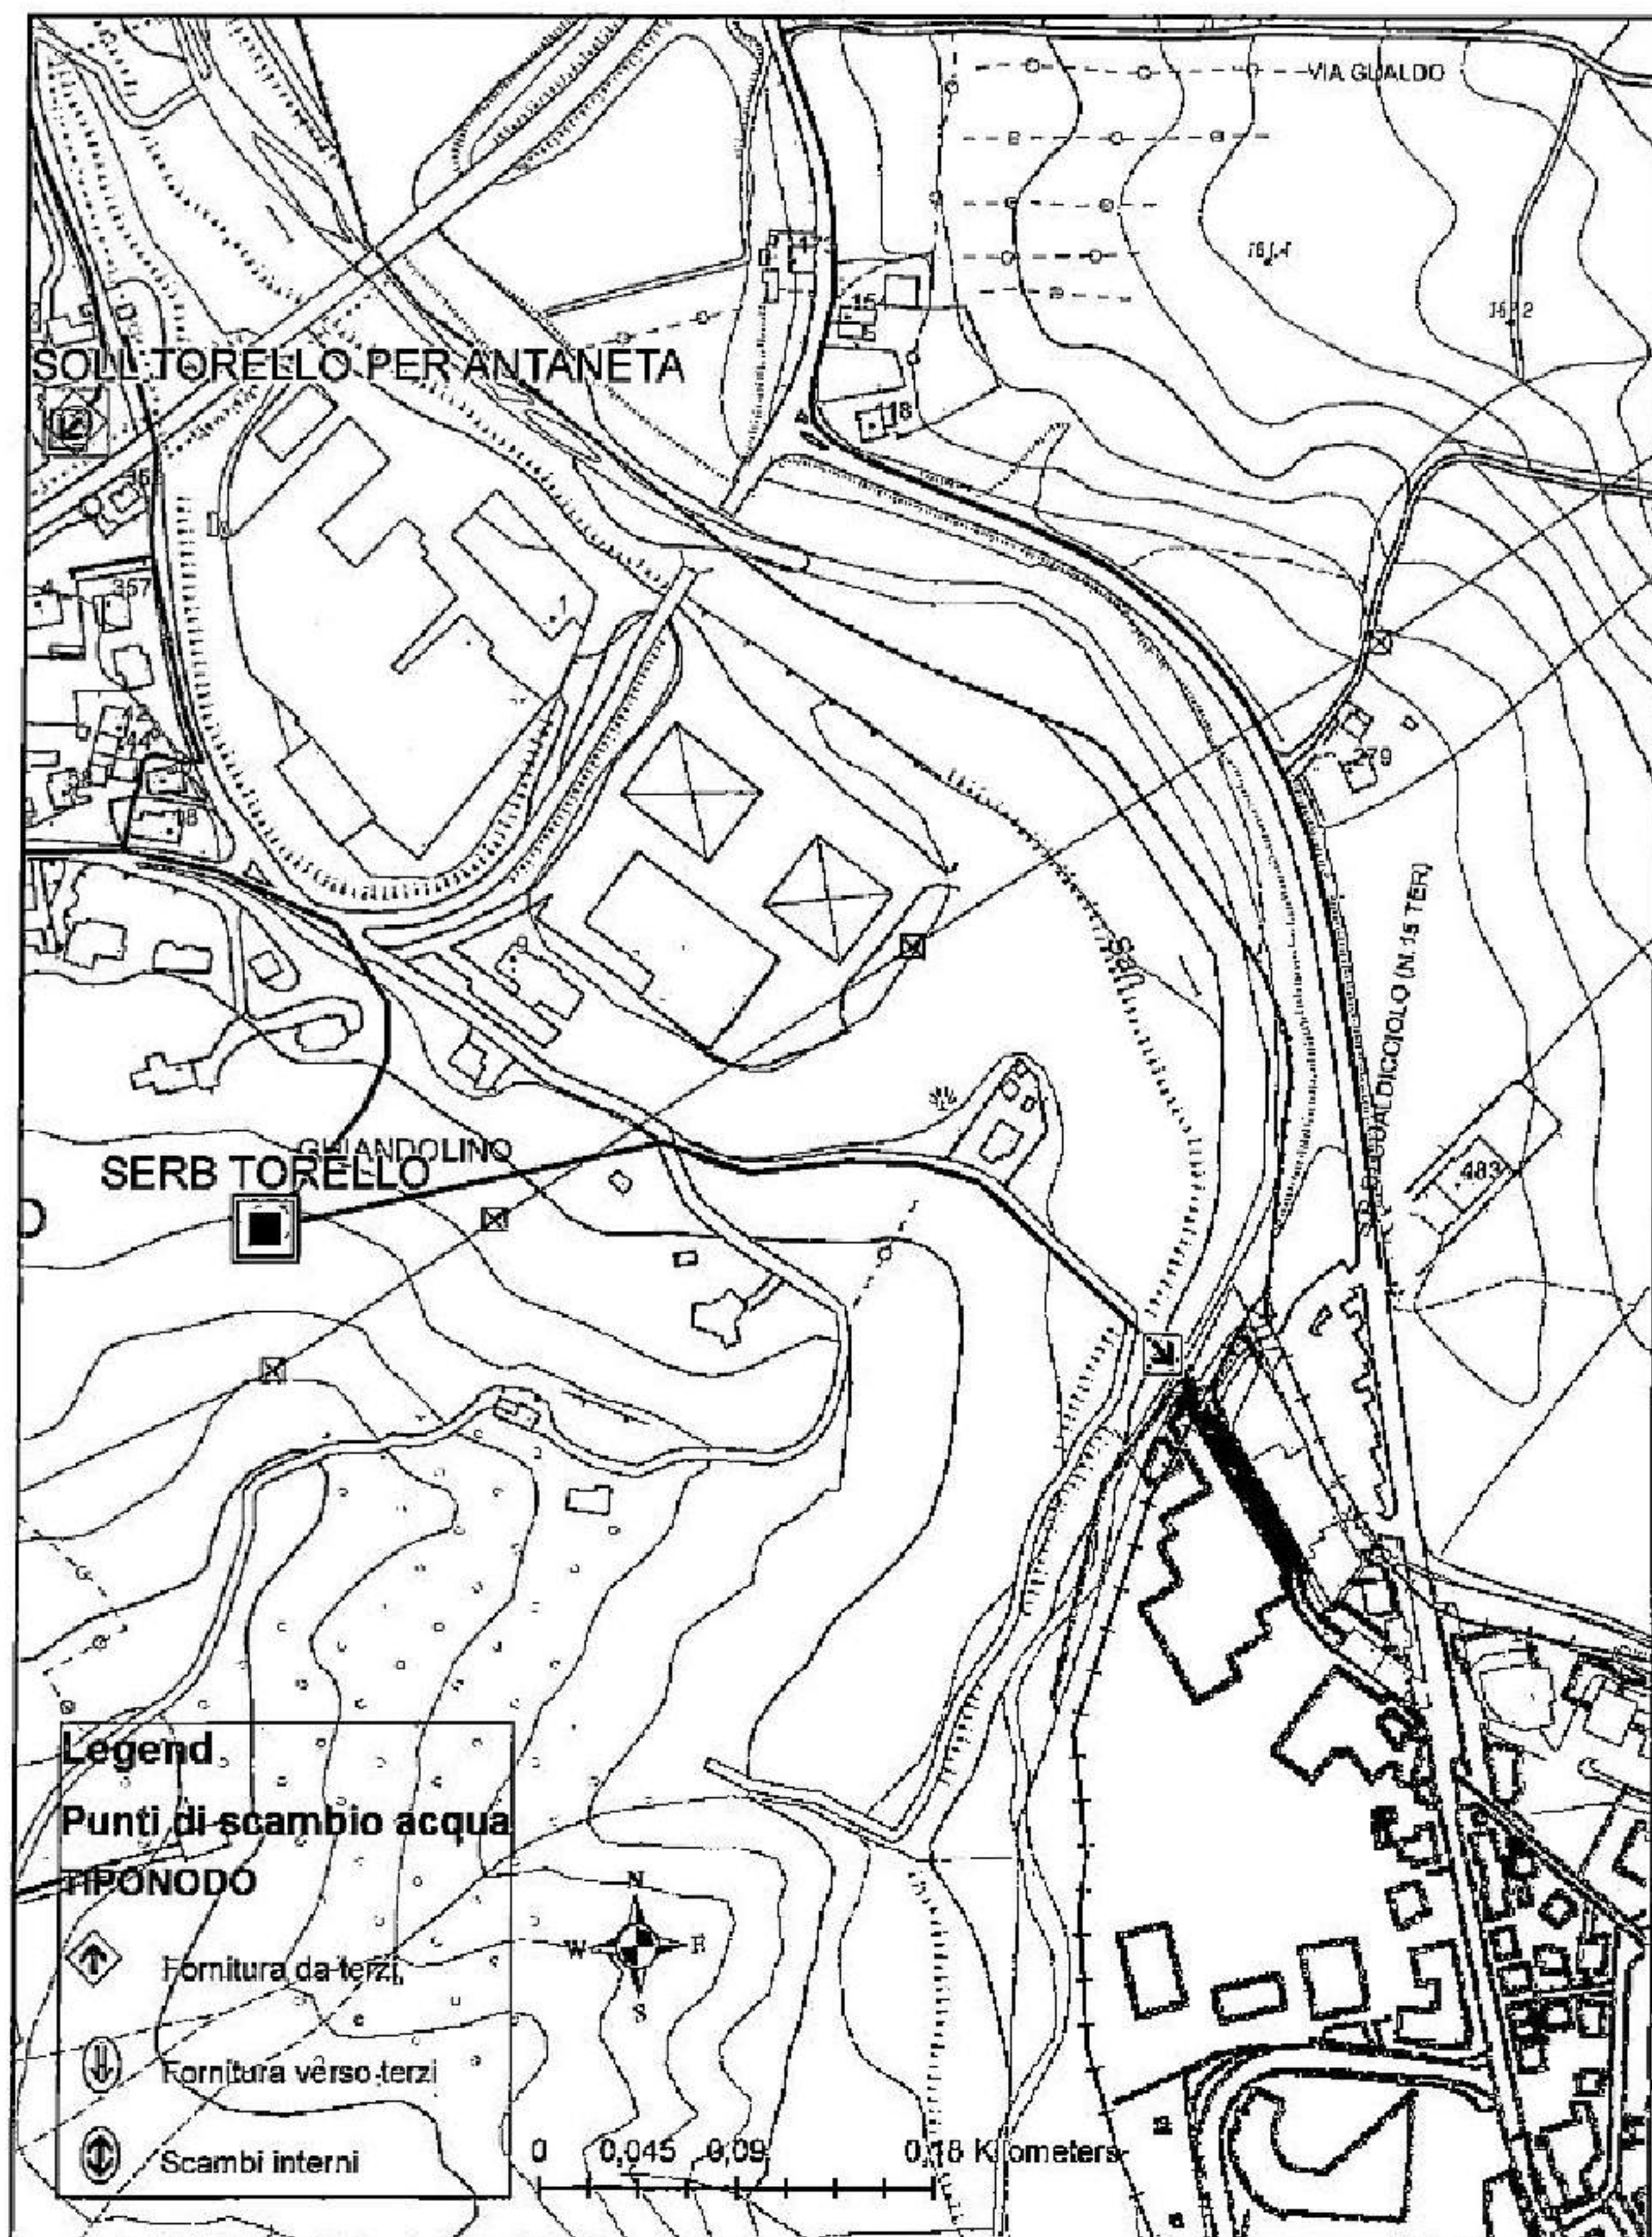

Punto di Consegna da R.S.M. a Hera
Ventoso - Verucchio

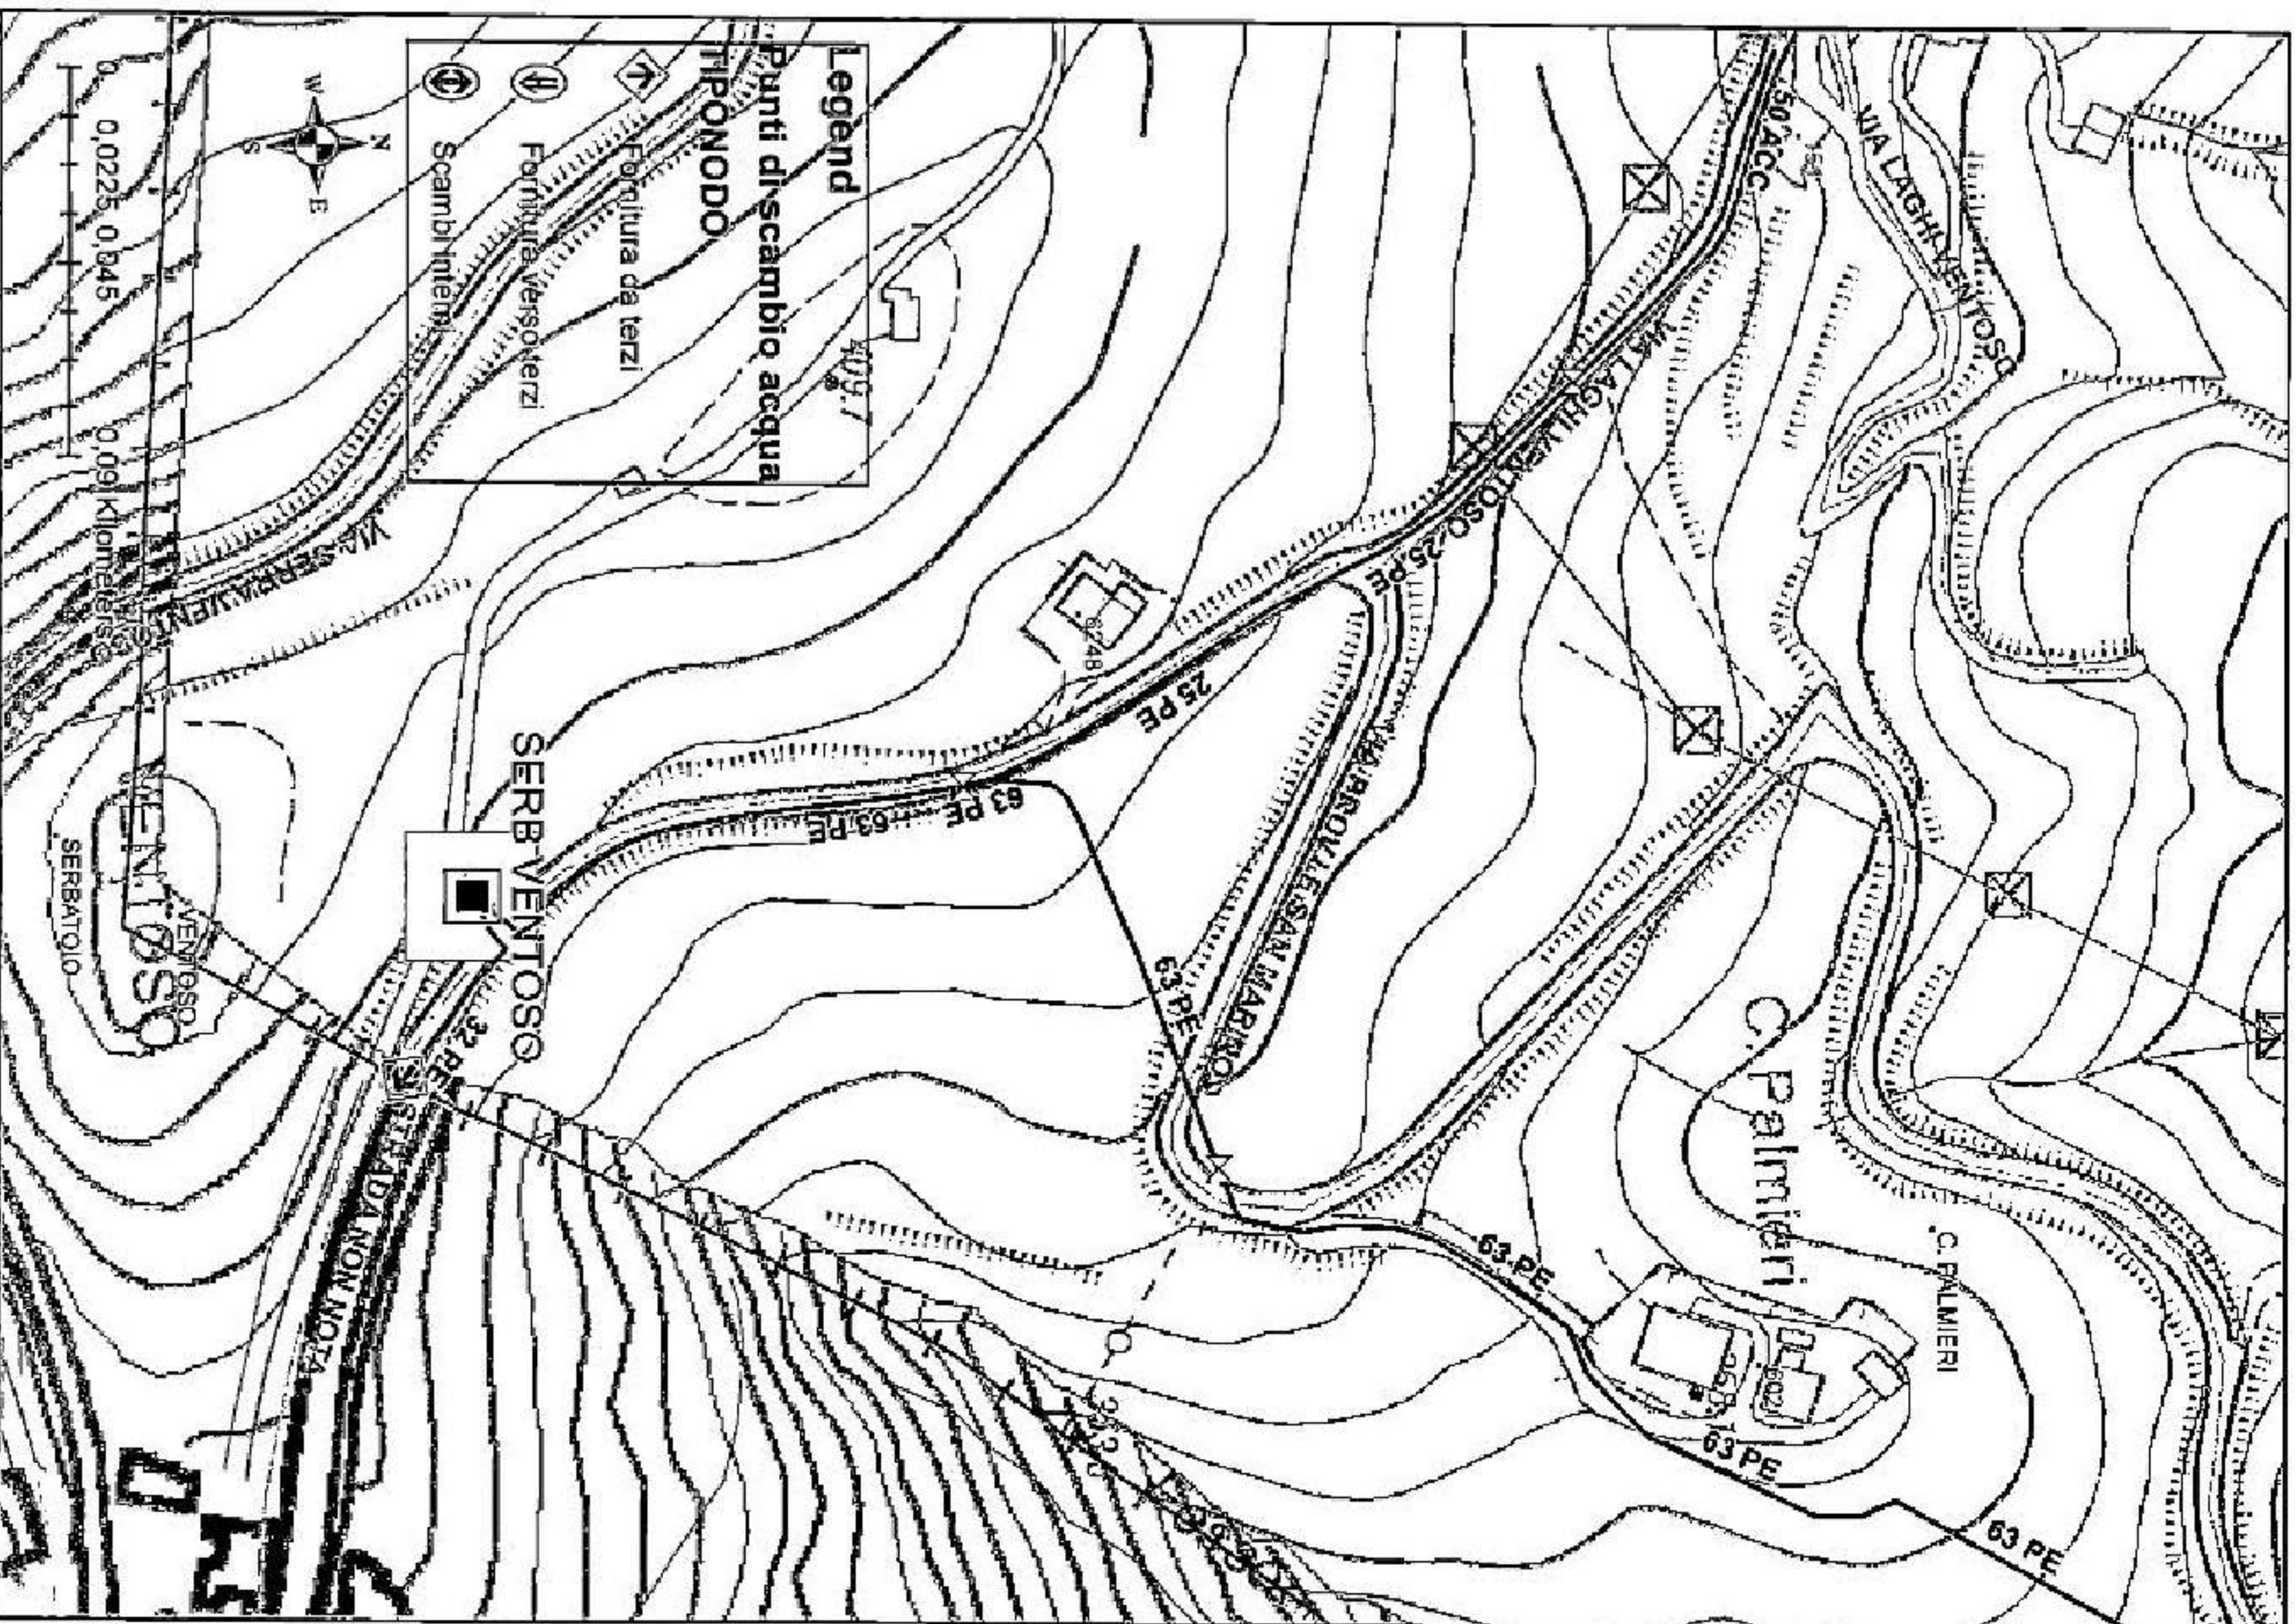


	Allegato 5
 AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI	Informazione rischi specifici - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali - Misure di prevenzione e protezione e gestione delle emergenza art. 26 comma 1 lett. b) e comma 3 D.lgs 81/08 e smi

**Il presente documento è riferito ed è parte integrante del Contratto di
scambio di fornitura di risorsa idrica ad uso potabile tra i Gestori dei
servizi idrici HERA S.p.A. e Azienda Autonoma di Stato per i Servizi
Pubblici della Repubblica di San Marino.**

Dati Aziendali HERA Spa

Regione Sociale	Hera Spa
Direzione	Direzione Acqua
Sede Legale	Modena via Razzaboni 80
Partita IVA	BO 04245520376
Datore di lavoro	Franco Fogacci
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Claudio Coltelli
Medici Competenti	Sante Tabanelli Giacomo Garagnani Roberto Rambaldi Stefania Vanzini Andrea Sirri Paolo Candoli Nino Santerri Fiorangela Orsini
Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza	Barilli Maurizio Brazzorolto Oliviano Cecconi Gianfranco Chiodi Matteo D'Antoni Antonio Fabbri Marco Mancini Orano Massari Giampaolo Pacini Paola Palareti Aldo Dino Perazzini Stefano Rosa Cristian Rossato Silvio Soli Giuseppe Tonioni Emanuele

	Allegato 5 Informazione rischi specifici - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Misure di prevenzione e protezione e gestione delle emergenza art. 26 comma 1 lett. b) e comma 3 D.lgs 81/08 e smi
 AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI	

Dati Aziendali A.A.S.S.

Regione Sociale	Azienda Autonoma di stato per i Servizi Pubblici
Sede Legale	Via Andrea di Superschio, 16 – Rep. San Marino
Partita IVA	11 03202220400
Datore di lavoro – In sua rappresentanza il Direttore	Arch. Emanuele Valli
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Dott. Antonio Balanzone ING. SIOIANA BARULLI
Capo Servizio Acqua Gas	p.i Oscar Mina
Medico Competente	Dott.ssa Lucia Bonini
RLS	Geom. Luca Canarezza /Paolo Zafferani
Recapiti telefonici	0549 – 999102 (Centrale Acquedotto Galavotto) presidio 24 ore

Il presente documento ha lo scopo di fornire alle società HERA e A.A.S.S.:

1. dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, di cui Hera ha disponibilità giuridica, in cui il personale A.A.S.S., o suo incaricato, può operare
2. dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, di cui A.A.S.S. ha disponibilità giuridica, in cui il personale HERA, o suo incaricato, può operare
3. l'identificazione dei luoghi di lavoro dove gli operatori delle due società possono operare
4. l'identificazione delle attività che possono essere eseguite dagli operatori delle due società nei luoghi di lavoro oggetto del contratto
5. l'identificazione delle interferenze
6. l'analisi delle interferenze
7. la definizione delle misure di prevenzione e protezione al fine della mitigazione dei rischi sopra citati
8. costi per la sicurezza dei rischi interferenziali

Per quanto riguarda i punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 si rimanda all'elenco impianti Allegato 5a contenente:


- indirizzo dell'impianto
- locali dell'impianto ove sono possibili le interferenze tra le due società
- attività svolte nell'impianto dal personale di HERA e A.A.S.S.
- rischi ambientali presenti nell'intero impianto
- stato della conformità elettrica dell'impianto
- competenza impianto elettrico

L'analisi dei rischi specifici e delle interferenze ha portato a condividere le seguenti misure di prevenzione e protezione che le due Società si impegnano ad adottare:

	Allegato 5
 AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI	Informazione rischi specifici - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali - Misure di prevenzione e protezione e gestione delle emergenza art. 26 comma 1 lett. b) e comma 3 D.lgs 81/08 e smi

RISCHI DA INTERFERENZA	MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Compresenza operatori di Hera Spa e A.A.S.S. e/o ditte terze	Si definisce che per la gestione delle interferenze dovute alla compresenza di operatori delle due società o operatori di ditte terze incaricate dalle stesse, l'operatore che arriva presso un impianto nel quale è già presente un operatore dell'altra società, prima di procedere all'attività assegnata, chiama il proprio referente aziendale che a sua volta contatterà il referente aziendale dell'altra società per definire quale delle due attività va sospesa (esempio pratico: un operatore incaricato da Hera per fare il campionamento arriva presso un impianto di A.A.S.S., all'interno del quale, in prossimità del punto di campionamento, un operatore della ditta incaricata da A.A.S.S. sta eseguendo lo sfalco dell'erba, l'operatore addetto al campionamento deve telefonare al suo referente Hera il quale telefonerà al referente di A.A.S.S. e insieme concorderanno chi deve sospendere momentaneamente l'attività)
Traffico veicolare	Condurre il mezzo a passo d'uomo, seguire le indicazioni della segnaletica orizzontale e verticale qualora presente, indossare indumenti ad alta visibilità
Rumore ambientale superiore 85 dB sedi Hera	Segnalare con idonea cartellonistica l'obbligo di uso di otoprotettori
Rumore ambientale superiore 80 dB sedi AASS	Segnalare con idonea cartellonistica l'obbligo di uso di otoprotettori
Rischio chimico	Nei siti ove è presente un impianto di produzione a biossido e/o stoccaggio reagenti devono essere presenti le schede di sicurezza dei reagenti stoccati. È fatto divieto di entrare in locali ove sia in funzione l'allarme di rilevazione fuga di biossido.
Rischio elettrico	Le parti si impegnano ad effettuare regolarmente le verifiche di conformità dell'impianto elettrico di propria competenza secondo i dettati normativi
Rischi di natura ambientali (pavimenti sconnessi o scivolosi):	Uso di scarpe antinfortunistiche
Spazi confinati	Nel caso si verificasse la necessità di svolgere attività in tali luoghi il caso dovrà essere studiato e valutato in maniera specifica. Le rispettive Società adotteranno le proprie procedure interne

Per quanto riguarda i costi per la messa in campo delle suddette misure di prevenzione e protezione questi sono stimati pari a zero in quanto già coperti dalla normale attività dei servizi prevenzione e protezione delle 2 aziende; i DPI previsti dal presente documento fanno già parte della dotazione personale di HERA e di A.A.S.S. e anche per le misure di tipo organizzativo non si stimano costi aggiuntivi.

	Allegato 5 Informazione rischi specifici - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Misure di prevenzione e protezione e gestione delle emergenze art. 26 comma 1 lett. b) e comma 3 D.lgs 81/08 e smi
 AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI	

A.A.S.S. nel sottoscrivere il presente documento, dichiara che dallo stesso ha individuato tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione, collettiva e individuale volta a eliminare i rischi presenti.

A.A.S.S. con la sottoscrizione del presente documento, solleva il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nel sito oggetto dei lavori e delle modalità di cooperazione, di reciproca informazione e di coordinamento.

HERA nel sottoscrivere il presente documento, dichiara che dallo stesso ha individuato tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione, collettiva e individuale volta a eliminare i rischi presenti.

HERA con la sottoscrizione del presente documento, solleva il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nel sito oggetto dei lavori e delle modalità di cooperazione, di reciproca informazione e di coordinamento.


Si stabilisce, altresì, che al fine di garantire una reciproca informazione, cooperazione e coordinamento sarà indetta almeno annualmente una riunione tra le due società.

Per ogni attività non prevista nell'elenco impianti Allegato 5a, è necessario vengano preventivamente valutati i rischi da interferenza e gestiti con atti integrativi al presente documento (es. verbali di coordinamento e/o DUVRI aggiuntivi o qualora necessario l'applicazione di quanto previsto dal titolo IV° del D.Lgs 81/08).

Di seguito l'elenco di tutte le ditte che lavorano per Hera e che potrebbero operare nei siti di A.A.S.S. per lavorazioni di tipo ordinario. Tale elenco deve essere mantenuto costantemente aggiornato, pertanto Hera dovrà tempestivamente inviare a A.A.S.S. ogni eventuale variazione. Hera, inoltre, si impegna a fornire alle ditte terze sotto riportate, l'informativa sui contenuti dei documenti relativi a Informazione rischi specifici - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali - Misure di prevenzione e protezione e gestione delle emergenze fornite ad Hera da A.A.S.S..

DITTA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	SCADENZA
GLOBO TRASPORTI & AUTOSPURGHI ROMAGNA (ATI)	SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTI	31/09/2017
NUOVA SAIMAR	LAVAGGIO SERBATOI	30/06/2017
GREEN TECH	AREE VERDI	30/09/2016
CEA ESTINTORI	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO AREA ROMAGNA	31/12/2016
CSR SOC COOP (Cieli e Terra)	AREE VERDI	31/12/2016

Per la gestione delle emergenze si riporta il documento con le Norme comportamentali, per sedi non presidiate, con le modalità di comportamento da seguire.

	Allegato 5
 AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI	Informazione rischi specifici - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali - Misure di prevenzione e protezione e gestione delle emergenze art. 26 comma 1 lett. b) e comma 3 D.lgs 81/08 e smi

NUMERI E INFORMAZIONI UTILI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Ricordarsi che, se si è spettatore di un incidente, infortunio, motore, incendio o altra situazione di emergenza tale da richiedere l'intervento di un'ambulanza o di un mezzo dei Vigili del Fuoco, si dovrà innanzitutto mantenere la calma ed osservare bene cosa sta accadendo, per essere molto preciso nelle informazioni che si dovranno comunicare.

TELEFONI UTILI	
VIGILI DEL FUOCO	115
EMERGENZA SANITARIA	118
POLIZIA	113
CARABINIERI	112
SALA OPERATIVA FORLÌ	800 713900

Ricordarsi di comunicare sempre con calma e sistematicamente quanto hai visto e sentito. Fornire le seguenti informazioni:

- NOME E COGNOME DI CHI EFFETTUA LA CHIAMATA
- TIPO DI EMERGENZA (INCIDENTE, VALORE, INFORTUNIO, INCENDIO)
- LUOGO DELL'EMERGENZA
- EVENTUALE PRESENZA E NUMERO DEI FERITI
- EVENTUALE PRESENZA E NUMERO DI PERSONE IMPOSSIBILITATE AD ABBANDONARE IL LUOGO INTERESSATO DALL'EMERGENZA
- NON RIATTACCARE MAI IL TELEFONO PER PRIMI MA ATTENDERE CHE RIATTACCHI L'INTERLOCUTORE (poiché potrebbe necessitare di ulteriori informazioni da parte vostra)

Se si attende l'arrivo del soccorso, ricordarsi di tenere lontano le persone non adatte all'intervento di primo soccorso, di evitare ogni azione su cose o persone di cui non si conosce l'esito e di rendersi visibile all'arrivo dei soccorsi. Il personale di soccorso ha bisogno di spazio per operare meglio, se ha bisogno di aiuto lo chiederà.

Nota: per AASS numero di Emergenza 0549 998102 (CENTRALE ACQUEDOTTO GALAVOTTO PRESIDIO 24 ORE)

Allegato al Duvri: Allegato 5a: Elenco Impianti e rischi ambientali

Data <u>06/07/2017</u>	Hera Spa Responsabile Impianti Acquedotto Francesco [Firma]
Data <u>06/07/2017</u>	Hera Spa Responsabile Acquedotto Area Romagna Mirco Boscetti (Firma)
Data <u>07/07/2017</u>	A.A.S.S. Direttore di Esercizio Sauro Cecchini (Firma)

Allegato al Duvri 5a - Identificazione dei rischi specifici presso gli impianti nei quali è prevista una attività ordinaria da parte del personale delle due società

Competenza gestionale	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto	Comune	LOCALE DEL SITO OVE E' PRESENTE LA "PROMISCUITA"	ATTIVITA' PERSONALE HERA IN AREA DELLA A.A.S.S. RSM	ATTIVITA' PERSONALE A.A.S.S. RSM IN AREA DI HERA	Rischio veicolare	Luoghi di transito sopraelevati	Pavimenti scivolosi e scabrosi	Luoghi confinati	Periti caldi, fiamma libera	Linee elettriche interrate/aeree	Zona a rischio esplosione	Carrelli elevatori	Specchi d'acqua	Materiali contenenti amianto	Vibrazioni	Zona a rischio incendio	Zona con più di 85 dB(A)	Zona di movimentazione carichi	Recipienti sotto pressione	Apparecchiature in tensione	Rischi ambientali di origine chimica	Condotta trasporto bioassido	Rischi ambientali di origine biologica	Pericolo di urto/estricciamento	Pericolo di infortunio	Attrezzature macchine in movimento (esc. pompe, carro ponte, estrattori d'aria)	Giatura di oggetti dall'alto sia nell'area che all'interno	Punture insetti	CONFORMITA' IMPIANTI ELETTRICI HERA	CONFORMITA' SCARICHE ATMOSFERICHE HERA	CONFORMITA' IMPIANTI ELETTRICI A.A.S.S.	CONFORMITA' SCARICHE ATMOSFERICHE A.A.S.S.	
A.A.S.S.	Pozzetto PDC Capacci	VIA SERRA VENTOSO o STRADA FORALENETTO_BORGO MAGGIORE	VERUGGIO	pozzetto alloggiamento PDC	Letture contatore volumetrico		X								X						X				X										
A.A.S.S.	Pozzetto PDC Lazzara	VIA LAZZARA, 1058 o STRADA GENGA AGUZZA_AQUAVIVA	VERUGGIO	pozzetto alloggiamento PDC	Letture contatore volumetrico e prelievo campioni		X								X						X				X										
A.A.S.S.	Pozzetto PDC Fiesse Corna	VIA SAN GIOVANNI IN CORTE, 601 o VIA ZORLO_CHESSANOVIA	VERUGGIO	pozzetto alloggiamento PDC	Letture contatore volumetrico e prelievo campioni		X								X						X				X										
A.A.S.S.	Pozzetto PDC Toretto	VIA TORELLIO O VIA DEGLI ACERI_AQUAVIVA	SAN LEO	pozzetto alloggiamento PDC	Letture contatore volumetrico e prelievo campioni		X								X						X				X										
A.A.S.S.	Pozzetto PDC Ventosa	VIA PROVILE SAN MARINO o DECIMA GUARDARA_BORGO MAGGIORE	VERUGGIO	pozzetto alloggiamento PDC	Letture contatore volumetrico e prelievo campioni		X								X						X				X										
A.A.S.S.	Pozzetto PDC Monte Olivo (Bosche)	VIA MONTE OLIVO, CERASOLO	CORRADO	pozzetto alloggiamento PDC	regolazione valvola idraulica che alimenta il PDC + Letture contatore volumetrico		X								X						X				X									PRESENTE	
HERA	Pozzetto-alloggiamento Punto di Campionamento Calceste	VIA SERRA VENTOSO o STRADA FORALENETTO_BORGO MAGGIORE	VERUGGIO	pozzetto alloggiamento Punto di Campionamento	Prelievo campioni		X								X						X				X										
HERA	Pozzetto PDC Dogera 1	STRADA DI FONDOVALLE	RIMINI	pozzetto alloggiamento PDC	Letture contatore volumetrico e prelievo campioni		X								X						X				X										
HERA	Pozzetto PDC Dogera 2 (gradi posizionale)	STRADA DI FONDOVALLE	RIMINI	pozzetto alloggiamento PDC	Letture contatore volumetrico e prelievo campioni		X								X						X				X										
HERA	Servizio Monte Olivo	VIA MONTE OLIVO, CERASOLO	RIMINI	cella di servizio alla base della condotta d'aria - area impianto	Prelievo campioni			X	X			X			X		X			X	X	X			X	X	X		X			PRESENTE	PRESENTE		
HERA	Servizio Sema Martignone	VIA SANTA CRISTINA, GALAZZANO	RIMINI	area manovra o pompaggio del servizio Heja + area impianto	Letture contatore volumetrico e prelievo campioni			X	X			X			X		X			X	X	X			X	X	X		X			PRESENTE	PRESENTE		



REPUBBLICA DI SAN MARINO AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI	
02 FEB 2018	
PROTOCOLLO N.	0670
POSIZIONE N.	21

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le
Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della
Repubblica di San Marino

PEC evalli.aass@legalmail.it

Modena, 30 gennaio 2018
Prot. n. 10191

Oggetto: proroga del Contratto di fornitura reciproca di risorsa idrica ad uso potabile tra i Gestori dei servizi idrici HERA S.p.A. e Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino.

Con riferimento all'art. 3 del contratto in oggetto siamo a comunicarVi la nostra disponibilità a prorogarlo fino al 31/12/2018, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 22 dello stesso.

Si resta in attesa della presente debitamente sottoscritta da parte Vostra in segno di accettazione.

Cordiali saluti.

Firmata digitalmente
Il Direttore
Franco Fogacci

Per espressa accettazione

Azienda Autonoma di Stato
per i Servizi Pubblici
della Repubblica di San Marino



(data e firma)

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



**AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI**

REP. SAN MARINO – Via A. di Superchio, 16 – 47893 CAILUNGO (B-5)
Tel. 0549 883700 – Fax 0549 883720 – e-mail: info@aass.sm – www.aass.sm
Cod.Op. Econ. SM 02463



San Marino, li 11 gennaio 2021

Spett.le
HERA S.p.A.
Via Razzaboni, 80
41122 Modena

Oggetto: Contratto fornitura risorsa idrica

Si trasmette in allegato la proroga del contratto per la reciproca fornitura di risorsa idrica ad uso potabile tra i Gestori dei servizi idrici Hera Spa ed Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (periodo anno 2021) debitamente firmato per accettazione dal Direttore Raoul Chiaruzzi e dal Legale Rappresentante di AASS Francesco Raffaeli.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
-Raoul Chiaruzzi-

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi di SAN MARINO

14-11-88-DD-B9-6B-68-E5-50-2B-6A-65-D3-F3-94-4E-77-8E-26-47

PAdES 1 di 1 del 11/01/2021 14:55:29

Soggetto: Raoul Chiaruzzi PNOSM-8483



Validità certificato di firma dal 30/04/2019 14:21:29 al 30/04/2022 00:00:00

Rilasciato da INFOCERT SPA con S.N. C22378

Commento: pj



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le
**AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO**

PEC: rchiaruzzi.aass@legalmail.it

Modena, 18 dicembre 2020
prot. gen. n. 0106989/20

Oggetto: Contratto di fornitura reciproca di risorsa idrica ad uso potabile tra i Gestori dei servizi idrici HERA S.p.A. e Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino. Anno 2021.

Con riferimento al Contratto in oggetto siamo a comunicarVi la nostra disponibilità a prorogarlo fino al 31/12/2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 dello stesso.

Resta inteso che le tariffe applicate al contratto continueranno ad essere quelle definite dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) le cui eventuali variazioni verranno applicate ai volumi fatturati e conseguentemente conguagliate.

Il referente del contratto è il Marcello Togni in qualità di Responsabile Acquedotto Romagna.

Si resta in attesa della presente debitamente sottoscritta da parte Vostra in segno di accettazione.

Cordiali saluti.

Il Direttore

Dott. Franco Fogacci
(firmata digitalmente)

Per espressa accettazione

Il Direttore AASS di San Marino

Ing. Raoul Chiaruzzi
(firmata digitalmente)

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi di SAN MARINO

4A-BB-F1-98-BD-34-6F-CC-14-66-A4-0D-28-FE-2D-E7-3A-C8-87-56

PAdES 1 di 2 del 04/01/2021 14:12:34

Soggetto: Raoul Chiaruzzi PNOSM-8483

Validità certificato di firma dal 30/04/2019 14:21:29 al 30/04/2022 00:00:00

Rilasciato da INFOCERT SPA con S.N. C22378

Commento: pj



PAdES 2 di 2 del 04/01/2021 15:46:45

Soggetto: Francesco Raffaeli TINIT-RFFFNC64M07E388P

Validità certificato di firma dal 05/11/2020 09:00:18 al 05/11/2023 00:00:00

Rilasciato da INFOCERT SPA con S.N. 13CEE9F

