

CLFE/2021/7 del 1 giugno 2021

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2019**

IL COORDINATORE
F.to Daniele Garuti

CLFE/2021/1

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

L'anno **2021** il giorno 1 del mese di giugno alle ore 10.00, in modalità videoconferenza, si è riunito il Consiglio Locale di Ferrara convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/0004841 del 27/05/2021.

Risultano presenti all'appello:

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI FERRARA				10,0000
COMUNE DI ARGENTA	Borea Sauro	Assessore	SI'	5,5003
COMUNE DI BONDENO	Simone Saletti	Sindaco	SI'	3,8924
COMUNE DI CENTO				8,3853
COMUNE DI CODIGORO				3,2675
COMUNE DI COMACCHIO	AntonioCardi	Assessore	SI'	5,6183
COMUNE DI COPPARO	Pagnoni Fabrizio	Sindaco	SI'	4,3280
COMUNE DI FERRARA	Balboni Alessandro	Assessore	SI'	30,8012
COMUNE DI FISCAGLIA				2,6098
COMUNE DI GORO				1,3211
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA				1,1167
COMUNE DI LAGOSANTO				1,5633
COMUNE DI MASI TORELLO				0,9712
COMUNE DI MESOLA	Gianni Michele Padovani	Sindaco	SI'	2,0647
COMUNE DI OSTELLATO	Rossi Elena	Sindaco	SI'	1,9073
COMUNE DI POGGIO RENATICO	Garuti Daniele	Sindaco	SI'	2,6454
COMUNE DI PORTOMAGGIORE				3,2208
COMUNE DI RIVA DEL PO	Astolfi	Assessore	SI'	2,3782
COMUNE DI TERRE DEL RENO	Roberto Lodi	Sindaco	SI'	2,8509
COMUNE DI TRESIGNANA	Laura Perelli	Sindaco	SI'	2,1160
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA				2,1314
COMUNE DI VOGHIERA	Bandiera Dante	Assessore	SI'	1,3101

Presenti n 12, quote 65.41

Assenti n 10, quote 33.59

Riconosciuta la validità della seduta Daniele Garuti, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2019

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- l'art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

premessato che:

- l'art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio d'Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
- l'art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

considerato che:

- con deliberazione n.11 del 19 novembre 2015 del Consiglio locale di Ferrara è stato approvato il programma degli interventi 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 41 del 26 luglio 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Ferrara, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale ultima deliberazione inoltre dispone che:
 - o entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - o il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che:

- il gestore HERA S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2019 attraverso il software ARSI;

rilevato che:

- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell'anno 2019 dal Gestore risultano essere superiori di 3.160.479 euro rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 vigente;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto pertanto:

- di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 12 (quote 65,41), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 per il gestore HERA S.p.A. per il bacino tariffario di Ferrara come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 1 del 01 giugno 2021.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2019.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 1 giugno 2021

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ferrara
F.to Daniele Garuti

Il segretario verbalizzante
F.to Daniele Cristofori

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 gennaio 2022

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2019**

**GESTORE: HERA S.P.A.
BACINO TARIFFARIO: FERRARA**

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2019, del Programma operativo degli interventi (POI) degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato approvato con Delibera del Consiglio Locale di Ferrara n.5 del 16 Dicembre 2015 e aggiornato con Delibera del Consiglio locale di Ferrara n. 12 del 19 Novembre 2019, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015. Gli importi sono al netto degli investimenti di struttura.

	PIANIFICATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA%
GESTORE HERA	9.939.000€	13.106.789€	-3.167.789€	32%
ACOSEA IMPIANTI	-€	278.743€	-278.743€	NA
FONDO PERDUTO	20.000€	12.690€	7.310€	-37%
TOTALE	9.959.000€	13.119.479€	-3.160.479€	32%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2019 investimenti significativamente superiori rispetto al pianificato, per circa un 32 %.

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione.

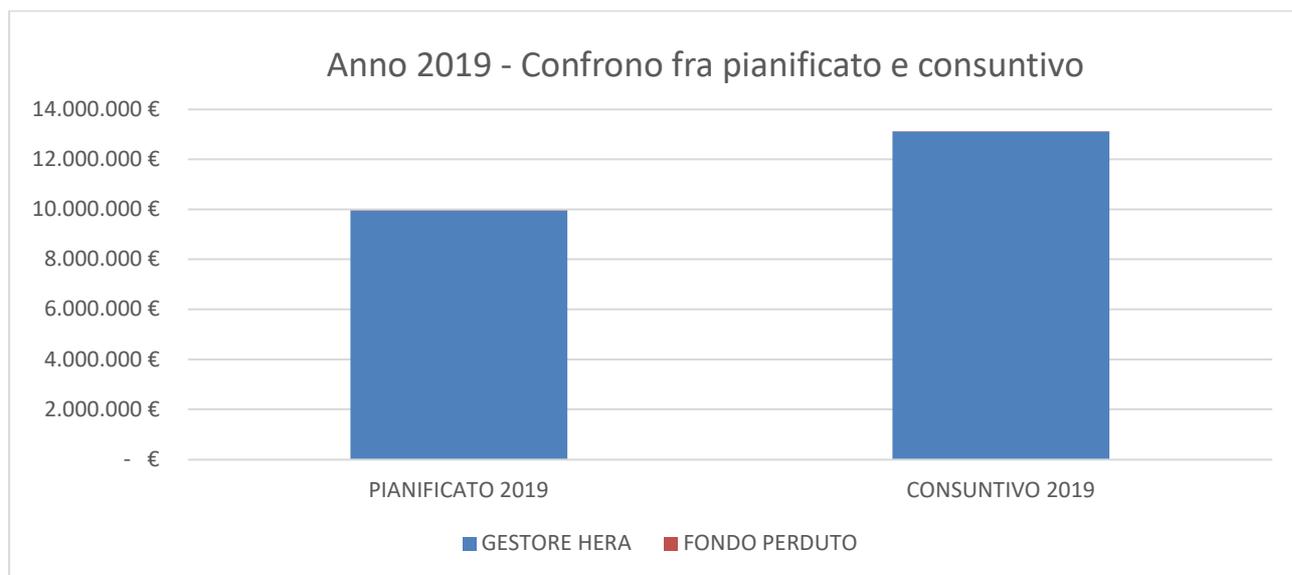


FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019

ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si nota un sostanziale equilibrio degli investimenti consuntivati fra il comparto acquedottistico e quello fognario-depurativo, con scostamenti degli importi consuntivati rispetto a quelli pianificati decisamente elevati per il comparto fognario-depurativo, mentre risultano modesti per quello acquedottistico.

	PIANIFICATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA%
ACQUEDOTTO	5.820.000€	6.644.359€	-824.359€	14%
FOGNATURA	2.434.000€	3.854.741€	-1.420.741€	58%
DEPURAZIONE	1.525.000€	2.512.936€	-987.936€	65%
ACQUE BIANCHE	180.000€	107.443€	72.557€	-40%
TOTALE	9.959.000€	13.119.479€	-3.160.479€	32%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

La tabella di seguito riportata sintetizza invece lo scostamento tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato.

COD	TIPOLOGIA	Numero	Importo Lordo Pianificato nel 2019 (€)	Importo Lordo a consuntivo nel 2019 (€)
1a	Interventi non avviati (scostamento pari al -100%)	2	210.000 €	- €
1b	Interventi non avviati dalle scorse annualità (con importo pianificato pari a 0 nel 2019)	0	- €	- €
2a	Interventi con avvio anticipato nel 2019 (già presente nel POI o nel Piano d'Ambito)	1	- €	121 €
2b	Chiusure di interventi già avviati contenuti nel POI o nel Piano d'Ambito	14	60.000 €	1.010.796 €
3	Interventi avviati nel 2019 che non erano contenuti nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	6	- €	329.817 €
4	Interventi con scostamento rendicontato rispetto al pianificato inferiore al $\pm 20\%$	19	2.255.000 €	2.491.591 €
5	Interventi con scostamento rendicontato rispetto al pianificato superiore al $\pm 20\%$	46	7.434.000 €	9.287.154 €
	TOTALE	88	9.959.000 €	13.119.479 €

TAB.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta quanto segue:

- Il gestore nel 2019 non ha avviato 2 interventi che erano stati programmati ma che sono stati oggetto di ripianificazione, e per essi ha addotto delle motivazioni che sono riportate all'interno dell'allegato 1 al presente documento;
- il gestore ha rendicontato nel 2019 un totale di 86 interventi (categorie 2a, 2b, 3, 4 e 5);

- c'è un intervento con avvio anticipato rispetto a quanto pianificato (2a) e ci sono 14 interventi (2b) che rappresentano una "coda" di interventi già terminati e per i quali quindi il gestore in sede di programmazione non aveva imputato alcuna somma (si tratta spesso di chiusure di attività contabili).

Inoltre si può notare come poco più della metà degli 86 interventi che il gestore ha rendicontato, abbia avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno.

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo degli interventi.

	Numero	PIANIFICATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA %
Fino a 500'000 €	49	1.905.000€	2.378.712€	473.712€	25%
500'000-1'000'000 €	21	1.000.000€	2.615.578€	1.615.578€	162%
1'000'000-2'000'000 €	8	1.764.000€	2.117.082€	353.082€	20%
2'000'000-5'000'000 €	4	2.600.000€	1.903.281€	-696.719€	-27%
Oltre 5'000'000 €	1	700.000€	251.520€	-448.480€	-64%
Manutenzioni	5	1.990.000€	3.853.306€	1.863.306€	94%
TOTALE	88	9.959.000€	13.119.479€	3.160.479€	32%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

Si nota che gli scostamenti in termini percentuali maggiori sono riferibili ad interventi di proporzioni medio-piccole e alle manutenzioni.

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Soggetto investitore	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento su Inv. Lordo	Scostamento %	Note giustificative
2014FEHA0070	MODELLAZIONE FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		0
2018FEHA0009	INVESTIMENTI STRUTTURA - TICSÌ e TIBSI	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		0
2014FEHA0007	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI FILO	DEPURAZIONE	Argenta	Gestore	511.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		0
2017FEHA0007	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SANT'AGOSTINO II STRALCIO	FOGNATURA	Sant'Agostino	Gestore	161.000,00 €	- €	- €	- €	100.640,01 €	- €	100.640,01 €	100.640,01 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. COME INDICATO GIA' NELLE NOTE 2018 LO SCOSTAMENTO E' LEGATO AL FATTO CHE E' STATO NECESSARIO ANTICIPARE L'INTERVENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE INIZIALE IN QUANTO RITENUTO DI PRIORITARIA URGENZA
2015FEHA0016	RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI FE-ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	3.169.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	252.090,77 €	- €	252.090,77 €	202.090,77 €	404	ID CHE RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEI PENSILI. LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA PER SINGOLO ANNO INSERITA NEL PIANO E' DI LARGA MASSIMA; OGNI ANNO VENGONO ATTIVATE LE ATTIVITA' RITENUTE NECESSARIE DAL SERVIZIO, TENENDO CONTO DELLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA DI TALI INTERVENTI. NEL 2019 SONO STATI COMPLETATI I LAVORI PREVISTI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE AREA PENSILE QUARTESANA E CASAGLIA, AVVIATE LA ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE AREA PENSILE FILO, CONSANDOLO E S.NICOLO'
2018FEHA0001	RINNOVO RETE ACQUEDOTTO VIA CROCE BIANCA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	90.000,00 €	- €	- €	- €	65.633,02 €	- €	65.633,02 €	65.633,02 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL RECUPERO DEGLI IMPORTI PREVISTI NEL 2018. CONSUNTIVO COMPLESSIVO IN LINEA CON L'IMPORTO DI PROGETTO
2015FEHA0002	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA S.MARIA CODIFIUME	FOGNATURA	Argenta	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		0
2014FEHA0079	POTENZIAMENTO A VIGARANO PIEVE-ASSE3	ACQUEDOTTO	Vigarano Mainarda	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		0
2014FEHA0048	COLLEGAMENTO A POGGIO E ELIMINAZIONE IMP. DI MONTALBANO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	3.023.000,00 €	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	23.516,97 €	- €	23.516,97 €	- 376.483,03 €	-94	LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO ALLE MOTIVAZIONI GIA' ADOTTE NEGLI ANNI PRECEDENTI CON SLITTAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA A CAUSA DELLA COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEGLI ACCORDI CON LE PROPRIETA' INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA TUBAZIONE DI PROGETTO (CIRCA 100 PROPRIETA' INTERESSATE)
2014FEHA0013	COLLET SCARICHI V.PIRONI ALFIERI RENO	DEPURAZIONE	Bondeno	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		0
2014FEHA0047	MANUT IMP DI SOLL IN VIA COMACCHIO (56)	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		0
2014FEHA0024	MANUT.GIUNTI BACINILAGUNAGGIO E DRENAGGI	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	-100	ID CONCLUSO E CHIUSO IN ARSI. COME INDICATO NELLA NOTA 2018 SI TRATTAVA SOSTANZIAMENTE DI UN ID PER LE ANNUALI ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PIANIFICATO CON UN IMPORTO FLAT DI LARGA MASSIMA. IN ANALOGIA A TUTTI GLI ALTRI INTERVENTI DI NATURA PURAMENTE MANUTENTIVA ULTERIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI GIUNTI VERRANNO RENDICONTATE NEL CONTO CUMULATIVO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO (2014FEHA0058)
2014FEHA0027	SUBURBANA - INTERFERENZE RETE IDRICA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	376.000,00 €	- €	- €	- €	4.915,84 €	- €	4.915,84 €	4.915,84 €	100	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' INTERVENTO IN RELAZIONE A SLITTAMENTO DELLE TEMPSTICHE PROGETTUALI E REALIZZATIVE DA PARTE DELL' ATTUATORE DELLE OPERE INTERFERENTI (FER - INTERRAMENTO LINEA FERROVIARIA)
2018FEHA0002	RINNOVO RETE FOGNARIA VIA CROCE BIANCA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	34.287,12 €	- €	34.287,12 €	34.287,12 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2019 CONSEGUENZIALE AL RECUPERO DI ATTIVITA' PREVISTE NEGLI ANNI PRECEDENTI E AD UN CONTENUTO INCREMENTO DI COSTI IN FASE REALIZZATIVA
2015FEHA0008	REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA VIA PENAVARA - SAN MARTINO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		- €	- €	- €	4.205,79 €	- €	4.205,79 €	4.205,79 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO ALLA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' CONTABILI
2014FEHA0069	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		50.000,00 €	- €	50.000,00 €	67.219,77 €	- €	67.219,77 €	17.219,77 €	34	
2014FEHA0043	COLLEGAMENTO BAURA A IMP.CONTRAPO - ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	1.226.000,00 €	37.000,00 €	- €	37.000,00 €	52.958,76 €	- €	52.958,76 €	15.958,76 €	43	
2014FEHA0028	DEMOLIZIONE PENSILE S.MARTINO, FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		0
2014FEHA0086	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PRONTO INTERVENTO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		250.000,00 €	- €	250.000,00 €	258.947,53 €	- €	258.947,53 €	8.947,53 €	3	
2017FEHA0005	REVAMPING LINEA OSSIDAZIONE 1 DEP.GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	1.144.000,00 €	- €	- €	- €	22.524,61 €	- €	22.524,61 €	22.524,61 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI
2017FEHA0015	COLLETTAMENTO DEGLI SCARICHI DI VIA MONTALE ALLA FOGNATURA DI VIA C. DIANA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	90.000,00 €	- €	- €	- €	19.087,48 €	- €	19.087,48 €	19.087,48 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2019 CONSEGUENZIALE AL RECUPERO DI ATTIVITA' PREVISTE NEGLI ANNI PRECEDENTI
2018FEHA0004	Rinnovo condotta idrica Via Calzolai - DE160 - da Via Acquedotto a via Fossa - FSC scheda 19	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		0
2014FEHA0001	RIFAC. TRATTO RETE ARGENTA-FILO-MENATE 3	ACQUEDOTTO	Argenta	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		0
2014FEHA0088	POTENZIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO S10 VIA FABBRI-VIA EVA E ADAMO	FOGNATURA	Ferrara	ACOSEA Impianti		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		0
2014FEHA0064	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	515.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	22.880,82 €	- €	22.880,82 €	12.880,82 €	128	
2014FEHA0067	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALLACCI FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		300.000,00 €	- €	300.000,00 €	471.541,46 €	12.690,00 €	458.851,46 €	171.541,46 €	57	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Soggetto investitore	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento su Inv. Lordo	Scostamento %	Note giustificative
2015FEHA0007	SOSTITUZIONE POZZO GOLENALE PONTE LAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	670.000,00 €	- €	- €	- €	121.433,89 €	- €	121.433,89 €	121.433,89 €	100	LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL RECUPERO DI ATTIVITA' PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI E GIA' MOTIVATE NELLE NOTE DEI CORRISPONDENTI ANNI. L' IMPORTO PROGETTO COMPLESSIVO E' STATO RIDEFINITO IN OCCASIONE DEL NUOVO POI 2020-2023 PER TENER CONTO DI UN PERCORSO DI REVAMPING PROGRESSIVO DEL CAMPO POZZI. LA RICHIESTA DI VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE E' ATTUALMENTE SOSPESA, PERTANTO IL MANTENIMENTO DEI PUNTI DI PRELIEVO ESISTENTI RIVESTE CARATTERE STRATEGICO PER L' ACQUEDOTTO DI FERRARA
2014FEHA0041	COLLEG A DEP DI V. VESCOVO E FORNO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0035	REVAMPING IMPIANTO OZONO PONTELAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	350.000,00 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	8.197,79 €	- €	8.197,79 €	- 141.802,21 €	-94	INTERVENTO DI NATURA PURAMENTE MANUTENTIVA. SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO IN FUNZIONE DELLE EFFETTIVE NECESSITA' IMPIANTISTICHE DELLA GESTIONE
2014FEHA0005	POT. ACQ. FRAZIONE S.M. CODIFUME - 1a STRALCIO	ACQUEDOTTO	Argenta	Gestore	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0014	SCARICHI NON DEP L.152-VIA MATTEOTTI	FOGNATURA	Bondeno	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0062	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	600.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	8.974,86 €	- €	8.974,86 €	- 91.025,14 €	-91	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO CON IMPORTI ANNUALI DI LARGA MASSIMA E INDICATIVI. L'ID RIGUARDA LA MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITA' DEGLI ATTRAVERSAMENTI. NEL 2019 INTERVENTI REGOLARMENTE IN CORSO
2014FEHA0029	NUOVI POZZI ED INCREMENTO CONCESSIONE POZZI ESISTENTI A PONTELAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	349.000,00 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	1.996,07 €	- €	1.996,07 €	- 148.003,93 €	-98	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA RIPROGRAMMAZIONE DELL' INTERVENTO A VALLE DI UNA RIVALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLO STATO DI FATTO DEL CAMPO POZZI
2015FEHA0005	SOSTITUZIONE POZZI GOLENALE STELLATA	ACQUEDOTTO	Bondeno	Gestore	261.000,00 €	- €	- €	- €	120,63 €	- €	120,63 €	120,63 €	100	LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO ALLA CONSUNTIVAZIONE DI COSTI SOSTENUTI PER LA VALLUTAZIONE PRELIMINARE SUI PROSSIMI INTERVENTI PREVISTI A PARTIRE DAL 2020 COME DA NUOVO POI 2020-2023
2014FEHA0049	REVAMPING SOLLEVAMENTO VOLANO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0012	NUOVI POZZI E INCREMENTO CONCESSIONE CENTRALE STELLATA	ACQUEDOTTO	Bondeno	Gestore	282.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0040	REVAMPING DIGESTORE ANAEROBICO DEPURATORE GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	5.801.000,00 €	700.000,00 €	- €	700.000,00 €	251.519,55 €	- €	251.519,55 €	- 448.480,45 €	-64	LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE A QUELLO DEL 2018. NEL 2019 E' STATO COMPLETATO IL PROGETTO ESECUTIVO, OTTENUTE LE AUTORIZZAZIONI ED ESPLETATA LA GARA D' APPALTO, IN COERENZA CON IL NUOVO POI 2020-2023 CHE VEDE L' AVVIO DEL CANTIERE A PARTIRE DAL 2020
2014FEHA0011	ADEGUAMENTO FOG SAN BIAGIO	FOGNATURA	Argenta	Gestore	638.000,00 €	- €	- €	- €	532.476,54 €	- €	532.476,54 €	532.476,54 €	100	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE AGLI SLITTAMENTI 2016/17 GIÀ MOTIVATI NELLE NOTE DEI RISPETTIVI ANNI E LEGATI ALLA NECESSITA' DI INDIVIDUARE LA SOLUZIONE PROGETTUALE OTTIMALE IN ACCORDO CON IL CONSORZIO DIBONIFICA
2018FEHA0008	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	Gestore		75.000,00 €	- €	75.000,00 €	23.080,13 €	- €	23.080,13 €	- 51.919,87 €	-69	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUE METEORICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2014FEHA0076	COLLEGAMENTO VIA MONTECASSINO E LIMITROFI A DOSSO	FOGNATURA	Sant'Agostino	Gestore	740.000,00 €	- €	- €	- €	145.669,96 €	- €	145.669,96 €	145.669,96 €	100	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA CONCLUSIVA. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL'INIZIALE FASE PROGETTUALE, DELL'ITER AUTORIZZATIVO E POI DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL II STRALCIO GIÀ GIUSTIFICATE NELLE NOTE DEGLI ANNI PRECEDENTI
2014FEHA0085	SOSTITUZIONE POZZO 21 CON NUOVO POZZO 21A	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0084	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO SAN CARLO RIFAC. TRATTO RETE ARGENTA-FILO-MENATE 2 (via Parata)	FOGNATURA	Sant'Agostino	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0004	SUBURBANA-POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIA AEROPORTO	ACQUEDOTTO	Argenta	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0051	SUBURBANA-POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIA AEROPORTO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	1.947.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2017FEHA0004	REVAMPING IMPIANTISTICO CENTRALE STELLATA	ACQUEDOTTO	Bondeno	Gestore	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2015FEHA0011	NUOVA ADDUTTRICE SUD - FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0054	POT. RETE FOGN. VIA ERCOLE DE ROBERTI	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2015FEHA0010	DISCONNESSIONE COLLETTTORE FOGNARIO V. BOLOGNA E SCOLO MAMBRO	FOGNATURA	Ferrara	ACOSEA Impianti	156.608,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0025	RIFACIMENTO RETE IDRICA VIA LAVEZZOLA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0089	POTENZIAMENTO RETE IDRICA S.AGOSTINO	ACQUEDOTTO	Sant'Agostino	ACOSEA Impianti		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0037	ADEG E POTENZ DEP DI GAIBANELLA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0034	RINN.RETE DN400 E DN250 VVIVALDI FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0015	REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE BUONACOMPRÀ	DEPURAZIONE	Cento	Gestore	885.000,00 €	- €	- €	- €	455.607,13 €	- €	455.607,13 €	455.607,13 €	100	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE AI RITARDI DELLE ANNUALITA' 2016-2017 CAUSATI DAL LUNGO ITER AUTORIZZATIVO

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Soggetto investitore	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento su Inv. Lordo	Scostamento %	Note giustificative
2014FEHA0068	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		320.000,00 €	- €	320.000,00 €	294.376,68 €	- €	294.376,68 €	- 25.623,32 €	-8	
2014FEHA0026	IMPLEMENTAZIONE AUTOMAZIONE PONTELAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- 50.000,00 €	-100	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2017. GLI IMPORTI 2018 E 2019 NON SONO STATI UTILIZZATI IN QUANTO L'AUTOMAZIONE DELL'IMPIANTO HA RICHIESTO MINORI RISORSE RISPETTO A QUELLE PIANIFICATE
2014FEHA0052	COLLEGAMENTO ZONA STAZIONE-CONA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	1.370.000,00 €	140.000,00 €	- €	140.000,00 €	20.310,50 €	- €	20.310,50 €	- 119.689,50 €	-85	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLO SLITTAMENTO DELL' INTERVENTO A CAUSA DELLA COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEGLI ACCORDI CON LE PROPRIETA' INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA TUBAZIONE DI PROGETTO
2014FEHA0058	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		670.000,00 €	- €	670.000,00 €	1.793.863,36 €	- €	1.793.863,36 €	1.123.863,36 €	167	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2015FEHA0001	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO BANDO ARGENTA	FOGNATURA	Argenta	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2017FEHA0001	COLLETTAMENTO SCARICO "SCUOLE" VIA SOSTEGNO A CONA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	33.664,60 €	- €	33.664,60 €	33.664,60 €	100	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI SCARICHI
2017FEHA0017	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA VIA PORTA SAN PIETRO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0016	SISTEMA CASUMARO (Amplimento del depuratore di Casumaro-nuovo impianto)	DEPURAZIONE	Cento	Gestore	1.134.000,00 €	- €	- €	- €	75.303,63 €	- €	75.303,63 €	75.303,63 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEGUENZIALE ALLA RIPIANIFICAZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI, GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELLE CORRISPONDENTI ANNUALITA'
2014FEHA0083	SUBURBANA-INTERFERENZE RETE FOGNARIA ZEP LINEA OSSIDAZIONE 1 INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI DIFFUSIONE ARIA A PIATTELLI	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2019FEHA0004	DEPURATORE DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	550.000,00 €	- €	- €	- €	183.316,08 €	- €	183.316,08 €	183.316,08 €	100	INTERVENTO IN ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE L' ID NON ERA PRESENTE NEL POI 2017-2019, MA E' STATO INSERITO CON L' APPROVAZIONE DEL POI 2020-2023
2014FEHA0066	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		100.000,00 €	- €	100.000,00 €	60.458,82 €	- €	60.458,82 €	- 39.541,18 €	-39	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2014FEHA0044	COLLEGAMENTO DI CORLO E MALBORGHETTO DI CORREGGIO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	1.603.000,00 €	87.000,00 €	- €	87.000,00 €	40.143,37 €	- €	40.143,37 €	- 46.856,63 €	-53	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DI NATURA ECONOMICA PER UNA DIVERSA CONSUNTIVAZIONE DEI COSTI DI PROGETTAZIONE NELLE ANNUALITA'. REALIZZAZIONE PREVISTA IN LINEA CON LE TEMPSTICHE DEFINITE DALLA DGR 201/2016 E DELLA DGR 569/2019
2017FEHA0003	REVAMPING IMPIANTISTICO CENTRALE MONESTIROLO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	120.000,00 €	- €	- €	- €	1.365,52 €	- €	1.365,52 €	1.365,52 €	100	NEL CORSO DEL 2019 E' STATA AVVIATA L' ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DELL' INTERVENTO RELATIVO ALLA NUOVA CABINA ELETTRICA MT/BT AL SERVIZIO DELL' IMPIANTO DI MONESTIROLO. L' INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO A PARTIRE DAL 2020 COME RECEPITO NEL NUOVO POI 2020-2023
2014FEHA0039	MANUTENZIONE A DUE SEDIMENTATORI SECONDARI DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0046	SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA AEROPORTO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0008	NUOVO ATTRAV FERROV FOG AD ARGENTA	FOGNATURA	Argenta	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0063	VERIFICHE SISMICHE IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	4.250.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	28.595,94 €	- €	28.595,94 €	- 71.404,06 €	-71	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L'ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 6. GLI IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL'ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. IN CORSO LA PROGETTAZIONE PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA TORRE DI ARGENTA E DEL PENSILE DI PORTO MAGGIORE
2018FEHA0003	Rinnovo condotta idrica Via Foro Boario DN 150. 2° stralcio - FSC scheda 18	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	150.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	645,50 €	- €	645,50 €	- 39.354,50 €	-98	SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA PROGETTAZIONE A PARTIRE DAL 2020, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI RITARDI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN ARCO PIANO
2017FEHA0008	COLLETTAMENTO MOLINO ALBERGATI A BUONACOMPRA	FOGNATURA	Cento	Gestore	438.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0071	RILIEVO RETI FOGNARIE	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	746.000,00 €	- €	- €	- €	67.215,96 €	- €	67.215,96 €	67.215,96 €	100	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E PIANIFICATO IN MODO OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE ATTIVITA' ANNUALI SVOLTE SONO LEGATE ALLE ESIGENZE MANIFESTATESI NELL'ANNUALITA' STESSA
2014FEHA0017	SOLLEVAMENTO VIA XX SETTEMBRE	FOGNATURA	Cento	Gestore	891.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0030	RINN.RETE IDRICA V. SALINGUERRA FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2019FEHA0016	REVAMPING OSSIDAZIONE PORTOMAGGIORE	DEPURAZIONE	Portomaggiore	Gestore	300.000,00 €	- €	- €	- €	15.977,30 €	- €	15.977,30 €	15.977,30 €	100	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE L' ID NON ERA PRESENTE NEL POI 2017-2019, MA E' STATO INSERITO CON L' APPROVAZIONE DEL POI 2020-2023
2014FEHA0019	COLLETTAMENTO ALBERONE A DEPURATORE BUONACOMPRA	FOGNATURA	Cento	Gestore	595.000,00 €	- €	- €	- €	32.706,35 €	- €	32.706,35 €	32.706,35 €	100	NEL 2019 E' STATA CONCLUSA LA PROGETTAZIONE ED E' STATA AVVIATA LA FASE DI GARA. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEGUENZIALE AL LUNGO ITER PROGETTUALE E DI APPROVAZIONE, GIA' AMPIAMENTE DOCUMENTATO NELLE NOTE DI SCOSTAMENTO DEGLI ANNI PRECEDENTI E SUPPORTATO DALLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA. INOLTRE TALE INTERVENTO RISULTA CONDIZIONATO DALLE TEMPSTICHE DEL DEPURATORE DI BUONACOMPRA ID 2014FEHAD015 (VEDI RELATIVA NOTA DI SCOSTAMENTO 2018 LEGATO AD UN ITER APPROVATIVO LUNGO). LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA RISULTA COMUNQUE COERENTE CON GLI OBIETTIVI FISSATI DA DGR 201/2016

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Soggetto investitore	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento su Inv. Lordo	Scostamento %	Note giustificative
2017FEHA0018	RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO VIA PORTA SAN PIETRO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0078	POTENZIAMENTO RETE VIA RONDONA-ASSE3	ACQUEDOTTO	Vigarano Mainarda	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0031	RINN.RETE DN250-VIA VIAZZA BOARA FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2015FEHA0004	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO S.BIAGIO ARGENTA	FOGNATURA	Argenta	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0009	DISMISSIONE IMPIANTO BOCCALONE-COLLETTAMENTO DEP.ARGENTA	FOGNATURA	Argenta	Gestore	947.000,00 €	- €	- €	- €	22.457,19 €	- €	22.457,19 €	22.457,19 €	100	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALL' ALLUNGAMENTO DELL' ITER PROGETTUALE AUTORIZZATIVO (VEDI NOTE SCOSTAMENTO 2018)
2019FEHA0005	ZEP LINEA OSSIDAZIONE 2 INSTALLAZIONE TURBO SOFFIANTI DEPURATORE DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	70.000,00 €	- €	- €	- €	80.486,34 €	- €	80.486,34 €	80.486,34 €	100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L' ID E' STATO INSERITO IN SEDE DI APPROVAZIONE POI 2020-2023 E PERTANTO NON AVEVA PIANIFICAZIONE NEL POI 2015-19. L' INTERVENTO E' STATO REALIZZATO INTERAMENTE NEL 2019 IN QUANTO PRIORITARIO NELLA GESTIONE DELL' IMPIANTO
2014FEHA0045	COLLETTORE DI VIA CERVELLA VIA CAVO DUCALE	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2014FEHA0073	COLLEGAMENTO SCARICHI NON DEPURATI DI QUARTIERE	FOGNATURA	Portomaggiore	Gestore	594.000,00 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	44.219,45 €	- €	44.219,45 €	- 105.780,55 €	-70	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLO SLITTAMENTO DELL' INTERVENTO A CAUSA DELLA COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEGLI ACCORDI CON LE PROPRIETA' INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA TUBAZIONE DI PROGETTO
2014FEHA0020	COLLETTAMENTO PILASTRELLO A BUONACOMPIA	FOGNATURA	Cento	Gestore	511.000,00 €	- €	- €	- €	24.769,77 €	- €	24.769,77 €	24.769,77 €	100	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI SCARICHI, COME GIA' ADDOTTO ANCHE NELLE NOTE DI SCOSTAMENTO 2018
2014FEHA0087	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		50.000,00 €	- €	50.000,00 €	130.715,38 €	- €	130.715,38 €	80.715,38 €	161	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO ANCHE ASSOCIATO AI MAGGIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO
2014FEHA0060	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		80.000,00 €	- €	80.000,00 €	96.181,62 €	- €	96.181,62 €	16.181,62 €	20	
2014FEHA0074	SCARICHI NON DEPURATI DI RUNCO E COLLEGAMENTO A GAMBÙ	FOGNATURA	Portomaggiore	Gestore	289.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
TOTALE					9.959.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	9.939.000,00 €	13.119.479,11 €	12.690,00 €	13.106.789,11 €	3.160.479,11 €		
