

CLPR/2020/14 del 4 dicembre 2020

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore Emiliambiente S.p.A. Approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2019. Programma Operativo Interventi 2015 – 2019**

IL COORDINATORE
F.to Tiziana Benassi

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

L'anno **2020** il giorno 4 del mese di dicembre alle ore 14.30, si è riunito il Consiglio Locale di Parma convocato con lettera protocollo PG.AT/2020/0008624 del 01/12/2020.

La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle “Linee Guida temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza dell'emergenza epidemiologica COVID 19”, approvate dal Consiglio di Ambito con deliberazione n.13 del 14/04/2020.

Assume la presidenza il Coordinatore Tiziana Benassi.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBARETO			NO	0,6059
BARDI			NO	0,6385
BEDONIA	Serpagli Giampaolo	Sindaco	SI'	0,8811
BERCETO			NO	0,6019
BORE			NO	0,3471
BORGO VAL DI TARO	Rossi Diego	Sindaco	SI'	1,5743
BUSSETO	Capelli Stefano	Sindaco	SI'	1,5303
CALESTANO			NO	0,5809
COLLECCHIO	Pietralunga William	Assessore	SI'	2,8284
COLORNO	Grassi Mirka	Assessore	SI'	1,8860
COMPIANO	Mariani Francesco	Sindaco	SI'	0,4083
CORNIGLIO	Delsante Giuseppe	Sindaco	SI'	0,5741
FELINO			NO	1,8294
FIDENZA	Amigoni Franco	Assessore	SI'	5,0320
FONTANELLATO			NO	1,5152
FONTEVIVO			NO	1,2243
FORNOVO DI TARO	Zanetti Michela	Sindaco	SI'	1,3691
LANGHIRANO			NO	2,0497
LESIGNANO DE' BAGNI			NO	1,0975
MEDESANO	Ghidini Riccardo	Assessore	SI'	2,2163
MONCHIO DELLE CORTI			NO	0,3823
MONTECHIARUGOLO	Olivieri Maurizio	Assessore	SI'	2,1820

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
NEVIANO DEGLI ARDUINI			NO	0,8951
NOCETO	Maini Giovanna	Assessore	SI'	2,6033
PALANZANO	Boraschi Ermes	Sindaco	SI'	0,4164
PARMA	Benassi Tiziana	Assessore	SI'	33,5283
PELLEGRINO PAR.SE			NO	0,3977
POLESINE - ZIBELLO			NO	1,3746
ROCCABIANCA			NO	0,7772
SALA BAGANZA			NO	1,2175
SALSOMAGGIORE TERME	Marco Trevisan	Assessore	SI'	3,8919
S. SECONDO PAR.SE			NO	1,2415
SISSA TRECASALI	Tonini Sara	Assessore	SI'	1,7100
SOLIGNANO			NO	0,5385
SORAGNA			NO	1,1189
SORBOLO MEZZANI	Comelli Marco	Consigliere	SI'	2,6562
TERENZO			NO	0,4221
TIZZANO VAL PARMA			NO	0,5961
TORNOLO			NO	0,4045
TORRILE			NO	1,6090
TRAVERSETOLO	Lanzi Michele	Assessore	SI'	1,9533
VALMOZZOLA	Alzapiedi Claudio	Sindaco	SI'	0,3031
VARANO DE' MELEGARI			NO	0,7052
VARSÌ			NO	0,4384
PROVINCIA DI PARMA			NO	10,000

Presenti n. 19, quote 67,7132

Assenti n. 26, quote 32,2868

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Emiliambiente S.p.A. Approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2019. Programma Operativo Interventi 2015 – 2019.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'Ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazioni n.2 del 24 marzo 2016 e n.7 del 11 maggio 2018 del Consiglio locale di Parma è stato approvato il Programma operativo degli interventi per gli anni 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore Emiliambiente S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. n. 9 del 6 marzo 2019 è stato approvato il Programma Operativo Interventi 2020-2023 con revisione straordinaria dell'annualità 2019;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- la deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 inoltre dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.
- con deliberazione n.60 del 25 luglio 2018 del Consiglio d'ambito è stato approvato l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria vigente (MTI-2), ai fini della relativa

rideterminazione per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione Arera n. 918/2017/R/idr, per il bacino tariffario di Parma gestito da Emiliambiente S.p.A

dato atto che:

- il gestore Emiliambiente S.p.A ha completato la rendicontazione degli investimenti 2019 attraverso il software ARSI;

rilevato che dai dati presentati è emerso per l'annualità 2019 che:

- non sono stati introdotti interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal programma operativo degli interventi 2015-19, approvato con deliberazioni n.2 del 24 marzo 2016 e n.7 del 11 maggio 2018 e n.9 del 6 marzo 2019 del Consiglio Locale di Parma, ai sensi della Delibera n° 75 del 12 ottobre 2017;
- non sono stati avviati n.2 interventi, relativi alla gestione delle acque meteoriche ed alla cartografia, per un importo complessivo lordo di € 200.000;
- sono stati anticipati/conclusi n.2 interventi previsti in altre annualità per un importo complessivo lordo di € 86.636;
- per n.13 interventi si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- per n.3 interventi si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al +/- 20% per i quali non è necessario produrre giustificazione;
- gli investimenti realizzati risultano essere di importo inferiore rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi approvato per le annualità 2015-2019, così come revisionato con le deliberazioni sopra richiamate relativo all'anno 2019;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

dato atto che:

- il Gestore ha terminato nel 2019 una serie di interventi nei territori maggiormente colpiti dalla crisi idrica, finanziati dalla Protezione Civile – atto DPGR n.158/2017, DPGR 178/2017 e DPC 1922/2019, rendicontati con il cod. 2019PREA0049;

ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto,

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti.

a voti unanimi favorevoli e palesi,

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 per il gestore Emiliambiente S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2019
Gestore: Emiliambiente S.p.A. (PR)**

4 dicembre 2020

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2019, del Programma Operativo Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.2 del 24 marzo 2016 e revisionato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.7 del 11 maggio 2018, revisionato con delibera n. 9 del 6 marzo 2019, che il gestore EMILIAMBIENTE S.p.A. ha presentato tramite il software ARSI.

PIANIFICATO 2019		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2019	
Importo Lordo Pianificato [A]	€ 5.340.000	- € 1.068.685	€ 4.271.315	Importo Lordo a Consuntivo [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 455.000	- € 252.831	€ 202.169	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 4.855.000	- € 785.854	€ 4.069.146	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]

Tab.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore EMILIAMBIENTE S.p.A. abbia effettuato minori investimenti lordi rispetto alla pianificazione approvata precisamente pari ad €. 1.068.685 a fronte anche di minori contributi incassati pari a - € 252.831. I contributi non incassati si riferiscono in larga parte a quelli relativi ai fondi FSC, pianificati per complessivi €. 335.000.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

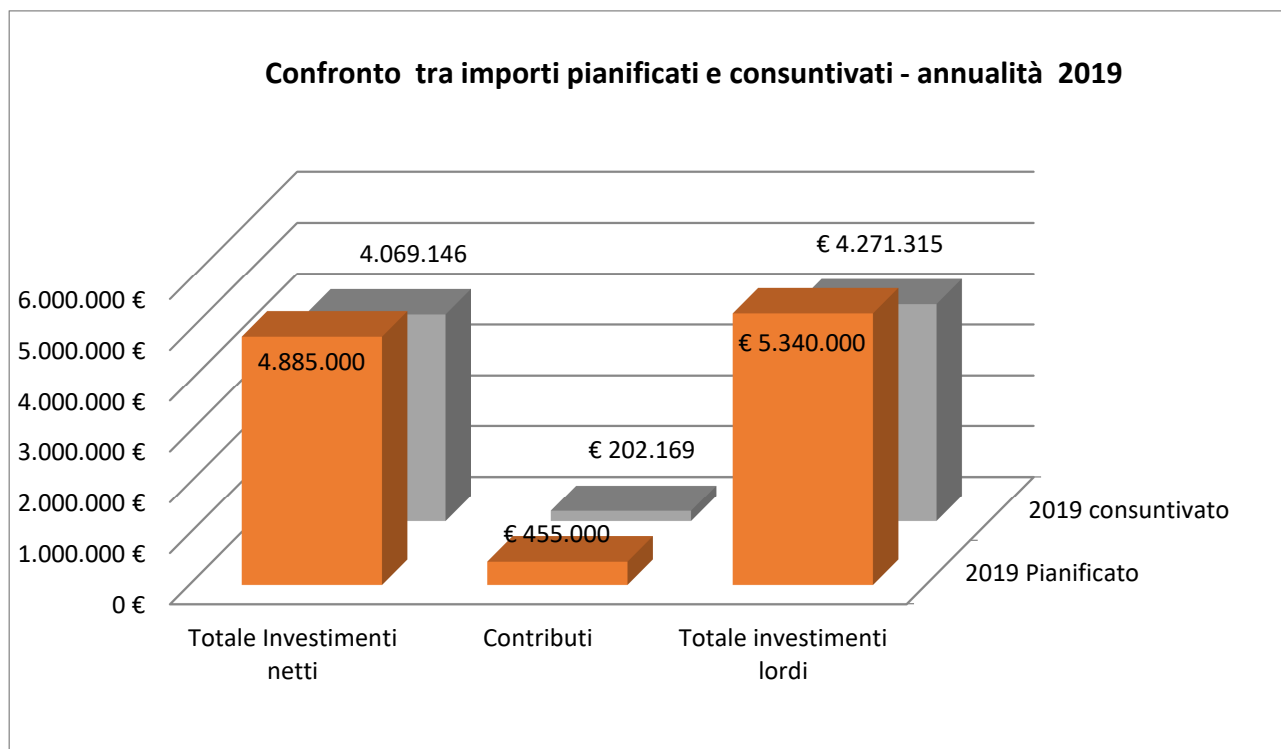


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2019 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

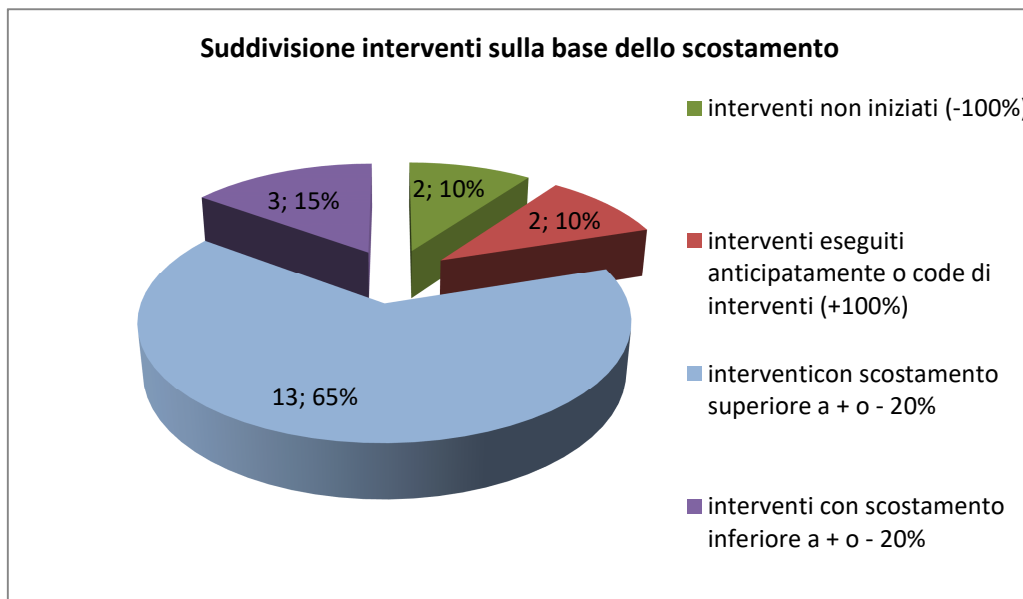


Fig.2 –Suddivisione investimenti 2019 per servizio

Nella tabella e nel grafico che seguono è riportato il numero degli interventi raggruppati sulla base degli scostamenti verificati e la rappresentazione grafica con indicazione della percentuale di ciascuna categoria rapportata al totale:

interventi non iniziati (-100%)	2
interventi eseguiti anticipatamente o code di interventi (+100%)	2
interventi con scostamento superiore a + o - 20%	13
interventi con scostamento inferiore a + o - 20%	3

Tab.2– Interventi che presentano scostamento tra pianificato e quanto rendicontato

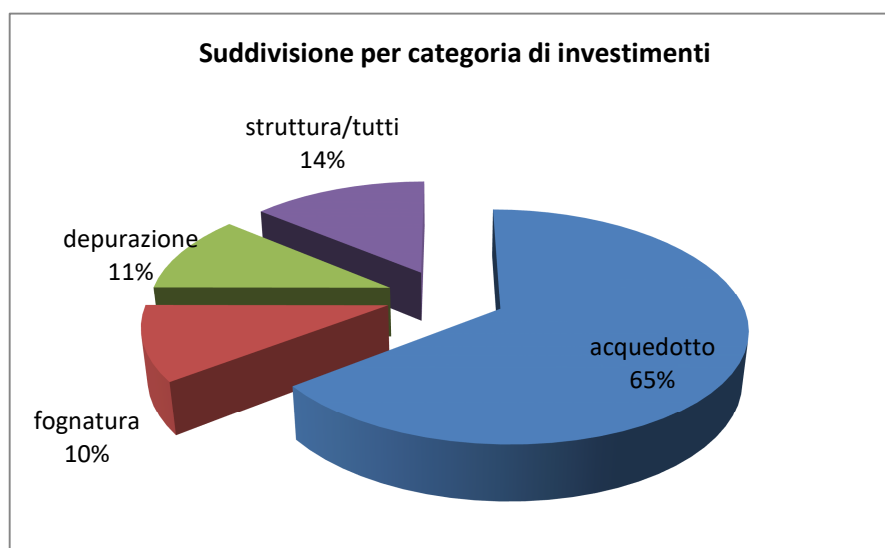


Fig.3 –Interventi realizzati nell'annualità 2019 suddivisi per scostamento

Dalla tabella sopra riportata e dal relativo grafico risulta che per l'annualità 2019, n.2 interventi, che erano stati programmati per complessivi €. 200.000, non sono stati avviati (scostamento pari a -100%), (per l'elenco si veda la Tab. 4), per i quali la giustificazione è risultata esaustiva (Allegato 1).

Il Gestore ha avviato anticipatamente oppure chiuso prima rispetto a quanto programmato n.2 interventi e n.13 interventi hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno, e per i quali la giustificazione fornita è risultata esaustiva. Per n.3 interventi lo scostamento è inferiore al +/- 20% e quindi non passibile di giustificazione.

Il Gestore ha terminato nel 2019 una serie di interventi nei territori maggiormente colpiti dalla crisi idrica, finanziati dalla Protezione Civile – atto DPGR n.158/2017, DPGR 178/2017 e DPC 1922/2019, rendicontati con il cod. 2019PREA0049.

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o meno e il relativo provvedimento che ATERSIR intende eventualmente adottare.

Numero di interventi programmati nel 2019 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 18

Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2019: 18

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2019	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2019	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	2	€ 0	€ 200.000	NO	Vedi TAB.L, 2 e 4 e Fig. 3. Vedi il dettaglio in ALLEGATO 1	
Interventi con avvio anticipato nel 2019 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito (+100%)	2	€ 86.636	€ 0	NO	2014PREA0020 2019PREA0037	
Interventi avviati nel 2019 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	nessuno					
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	13	€ 3.033.554	€ 3.886.000	NO	2014PREA0013 2014PREA0016 2018PREA0032 2018PREA0033 2018PREA0034 2018PREA0035 2019PREA0040 2019PREA0042 2019PREA0043 2019PREA0044 2019PREA0046 2019PREA0047 2019PREA0048	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	3	€ 1.151.125	€ 1.254.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

Tab.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Gli interventi pianificati e non realizzati, con scostamento -100% sono n. 2 e sintetizzati nella tabella che segue:

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019
2019PREA0038	Manutenzione Straordinaria Acque meteoriche	FOGNATURA	Opere pluricomunali		100.000,00
2019PREA0039	Cartografia	FOGNATURA	Opere pluricomunali	325.000,00	100.000,00

Tab.4 – Interventi pianificati ma non avviati

PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.2 del 24 marzo 2016 e n.7 del 11 maggio 2018, revisionato con delibera n. 9 del 6 marzo 2019								CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PREA0001	Potenz.depuratore Busseto (abbattimento azoto/linea fanghi) + Adeguamento impianto depuraz. Busseto	DEPURAZIONE	Busseto	700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PREA0002	008-EA - Condotte fognarie collettamento reflui Vedole-Colorno	FOGNATURA	Colorno	205.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PREA0003	009-EA - Adeguamento e potenziamento depuratore Fidenza	DEPURAZIONE	Fidenza	1.587.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PREA0004	013-EA - Condotte fognarie collettamento reflui S.Margherita-Fidenza per adeguamento scarichi EA 200-2000	FOGNATURA	Fidenza	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PREA0005	019-EA - Adeguamento e miglioramento reti e imp.acqua e sistema fognario-depurativo	FOGNATURA	Fontanellato	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PREA0006	022-EA - Realizzazione fognatura per collettamento reflui Ragazzola a Roccabianca	FOGNATURA	Roccabianca	330.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PREA0007	024-EA - Adeguamento impianto depurazione San Secondo, livello III.	DEPURAZIONE	San Secondo	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PREA0008	030-EA - Rifacimento condotta alimentazione San Polo	ACQUEDOTTO	Torrile, Colorno	425.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PREA0009	032-EA - Depuratore Vicomero (quotaparte)	FOGNATURA	Torrile	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PREA0010	034-EA - Collettamento Viarolo a R.C.Canneto e potenziamento depuratore	FOGNATURA	Sissa Trecasali	1.060.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PREA0011	037-EA - Sostituzione condotta adduttrice interconnessione comuni della Bassa	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	1.567.100,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PREA0012	041-EA - Manut. Straordinaria reti e centrali di adduzione	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	1.440.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PREA0013	042-EA - Potenziamento telecontrollo rete idrica e fognaria	TUTTI	Opere pluricomunali	295.000,00	135.000,00	0	135.000,00	52.500,16	0	52.500,16	-61	Lavori in corso di esecuzione. I lavori sono iniziati in ritardo rispetto alla pianificazione iniziale a causa delle procedure di affidamento.
2014PREA0014	043-EA - Manut. straordinaria reti e centrali di distribuzione	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	6.900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.2 del 24 marzo 2016 e n.7 del 11 maggio 2018, revisionato con delibera n. 9 del 6 marzo 2019				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PREA0015	045-EA - Manutenzione straordinaria patrimonio in uso (impianti, reti fognatura e depurazione)	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	6.351.601,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PREA0016	054-EA - Realizzazione collettore fognario e aumento potenzialità del depuratore di Colorno sud (3° Livello).	DEPURAZIONE	Colorno	720.000,00	520.000,00	0	520.000,00	134.973,58	0	134.973,58	-74	Intervento in corso di realizzazione. I lavori sono iniziati in ritardo rispetto alla pianificazione iniziale a causa delle procedure di affidamento.
2014PREA0017	055-EA - Sistema fognario-depurativo SALSOMAGGIORE-Fidenza. Potenziamento depuratore urbano Fidenza 2°stralcio	DEPURAZIONE	Fidenza, Salsomaggiore	10.900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PREA0018	057-EA - Riqualficazione impianti e reti acquedotto/fognatura Salsomaggiore	FOGNATURA	Salsomaggiore	8.770.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PREA0019	058-EA - Rifacimento e potenziamento reti acquedotto e serbatoio Salsomaggiore	ACQUEDOTTO	Salsomaggiore	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PREA0020	060-EA - Bonifica c.le di Priorato ed efficientamento pozzi nelle c.li di captazione.	ACQUEDOTTO	Fontanellato, Fidenza	2.410.000,00	0	0	0	84.888,80	0	84.888,80	100	Completamento opere aggiuntive richieste dall'Amm. provinciale di Parma
2014PREA0021	061-EA - Ricerca perdite acquedotto, controllo pressioni, sostituzione contatori	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	3.590.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PREA0022	062-EA - Potenziamento impianto di depurazione di Trecasali (2° liv.)	DEPURAZIONE	Sissa Trecasali	1.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PREA0023	063-EA - SIT Cartografia e modellazione reti	TUTTI	Opere pluricomunali	490.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PREA0024	046-EA - Quota allestimento sede e attrezzature (HW SW)	STRUTTURA	Colorno, Fidenza, Fontanellato, Roccabianca, San Secondo, Salsomaggiore, Torrile, Sissa Trecasali, Opere pluricomunali, Busseto	3.039.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2015PREA0025	007-EA - Depurazione reflui Mezzano Rondani	DEPURAZIONE	Colorno		0	0	0	0	0	0	0	
2015PREA0026	003-EA - Collettamento reflui Soragna Busseto	FOGNATURA	Busseto, Soragna		0	0	0	0	0	0	0	
2015PREA0027	031-EA - Collettamento reflui S.Andrea al depuratore di S.Polo	FOGNATURA	Torrile		0	0	0	0	0	0	0	

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.2 del 24 marzo 2016 e n.7 del 11 maggio 2018, revisionato con delibera n. 9 del 6 marzo 2019				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2015PREA0028	056-EA - Adeguamento scarichi acque reflue Fontanellato	DEPURAZIONE	Fontanellato		0	0	0	0	0	0	0	
2015PREA0029	044-EA - Strumentazione per attività di ricerca perdite	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	325.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2016PREA0030	Intervento di riqualificazione strutturale (realizzazione laboratorio, locali telecontrollo, viabilità) dep. di Fidenza e realizzazione asfalto.	DEPURAZIONE	Fidenza	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2016PREA0031	Installazione inverter nelle c.li di captazione	ACQUEDOTTO	Fontanellato, Fidenza, Salsomaggiore	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2018PREA0032	Manutenzione straordinaria della centrale idrica di Parola (Fidenza) - FSC	ACQUEDOTTO	Fidenza	600.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	23.673,24	0	23.673,24	-70	Trattandosi di un'opera finanziata, i tempi per ottenere le autorizzazioni e la procedura di affidamento, hanno comportato un ritardo nell'avvio dei lavori che è previsto a gennaio 2021
2018PREA0033	Ricerca perdite acquedotto, contatori, pressioni e sostituzione contatori - FSC	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	400.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	6.548,44	0	6.548,44	-94	Trattandosi di un'opera finanziata, i tempi per ottenere le autorizzazioni e la procedura di affidamento, hanno comportato un ritardo nell'avvio dei lavori che ora è previsto a luglio 2020.
2018PREA0034	Sostituzione condotta adduttrice nei Comuni di Parma e Fontanellato - FSC	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	2.852.900,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	22.533,15	0	22.533,15	-92	L'opera prevede la stipula di servitù e pertanto necessita di autorizzazioni amministrative che hanno comportato un ritardo nella programmazione prevista. L'inizio lavori è previsto nel 2022
2018PREA0035	Sostituzione reti e allacciamenti reti distributive dei comuni in gestione - FSC	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	600.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	16.264,21	0	16.264,21	-89	Spese progettuali. Inizio lavori posticipato
2019PREA0036	Nuovi allacciamenti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		200.000,00	120.000,00	80.000,00	159.934,07	167.404,00	-7.469,93	-20	Minori richieste rispetto alle previsioni
2019PREA0037	Sostituzione contatori e Smart Metering	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		0	0	0	1.747,00	0	1.747,00	100	Spese progettuali
2019PREA0038	Manutenzione Straordinaria Acque meteoriche	FOGNATURA	Opere pluricomunali		100.000,00	0	100.000,00	0	0	0	-100	Mancata cessione reti bianche da parte dei comuni
2019PREA0039	Cartografia	FOGNATURA	Opere pluricomunali	325.000,00	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0	-100	Fondi utilizzati per copertura maggiori spese di altri capitoli
2019PREA0040	Interventi di rinnovo reti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		170.000,00	0	170.000,00	327.325,32	0	327.325,32	92	Rifacimento di un numero maggiore di reti causa rotture

PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.2 del 24 marzo 2016 e n.7 del 11 maggio 2018, revisionato con delibera n. 9 del 6 marzo 2019								CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2019PREA0041	Manutenzione straordinaria fognature	FOGNATURA	Opere pluricomunali		554.000,00	0	554.000,00	448.209,27	0	448.209,27	-19	Realizzati minori lavori per copertura maggiori spese altri capitoli
2019PREA0042	Manutenzione straordinaria depurazione	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali		400.000,00	0	400.000,00	265.996,79	0	265.996,79	-33	Realizzati minori lavori
2019PREA0043	Manutenzione straordinaria acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		1.415.000,00	0	1.415.000,00	1.914.039,27	6.818,18	1.907.221,09	35	Realizzati maggiori lavori di efficientamento centrali, reti, ecc
2019PREA0044	Modellazione idraulica di acquedotti, distrettualizzazione della rete, analisi e ricerca delle perdite idriche, progetto generale acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	1.400.000,00	250.000,00	0	250.000,00	16.050,69	0	16.050,69	-93	I tempi per l'affidamento delle procedure di gara sono stati di circa un anno a causa delle difficoltà di nomina della Commissione Tecnica e pertanto l'inizio dei lavori è stato posticipato a luglio 2020
2019PREA0045	Investimenti di Struttura	STRUTTURA	Opere pluricomunali		500.000,00	0	500.000,00	542.981,90	0	542.981,90	8	
2019PREA0046	Messa in sicurezza e opere accessorie di miglioramento al Depuratore di Fidenza	DEPURAZIONE	Fidenza	180.000,00	46.000,00	0	46.000,00	69.453,21	0	69.453,21	50	Realizzate lavorazioni aggiuntive (asfalti, illuminazione, ecc)
2019PREA0047	Rifacimento pozzo 3 di San Donato	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	250.000,00	250.000,00	0	250.000,00	183.390,30	0	183.390,30	-26	Economie di gara e non necessaria realizzazione di alcune opere (pavimentazione)
2019PREA0048	Ricostruzione cabina viale Battej, opere accessorie e demolizione pensile	ACQUEDOTTO	Sissa Trecasali	330.000,00	30.000,00	0	30.000,00	805,25	0	805,25	-97	La progettazione dell'intervento ha necessitato di diversi confronti con l'Amm. Com. e pertanto i tempi hanno subito un ritardo per il completamento dello stesso. L'opera verrà eseguita nel 2021
2019PREA0049	Interventi Emergenza Idrica 2017 - OCDPC 468/2017	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		0	0	0	0	27.946,58	-27.946,58	0	Intervento non pianificato
IMPORTO TOTALE:					5.340.000,00 €	455.000,00 €	4.885.000,00 €	4.271.314,65 €	202.168,76 €	4.069.145,89 €		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 14 del 4 dicembre 2020

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Emiliambiente S.p.A. Approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2019. Programma Operativo Interventi 2015 – 2019

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Bologna, 4 dicembre 2020

Il Direttore
Responsabile ad interim
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Vito Belladonna



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma

F.to Tiziana Benassi

Il segretario verbalizzante

F.to Mario Ori

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 25 marzo 2020

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna
