

CLPR/2020/16 del 4 dicembre 2020

**CONSIGLIO LOCALE di PARMA**

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore MONTAGNA 2000. Approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2019. Programma Operativo Interventi 2015 – 2019**

IL COORDINATORE  
F.to Tiziana Benassi

CLPR/2020/16

### CONSIGLIO LOCALE di PARMA

L'anno **2020** il giorno 4 del mese di dicembre alle ore 14.30, si è riunito il Consiglio Locale di Parma convocato con lettera protocollo PG.AT/2020/0008624 del 01/12/2020.

La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle "Linee Guida temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza dell'emergenza epidemiologica COVID 19", approvate dal Consiglio di Ambito con deliberazione n.13 del 14/04/2020.

Assume la presidenza il Coordinatore Tiziana Benassi.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBARETO			NO	0,6059
BARDI			NO	0,6385
BEDONIA	Serpagli Giampaolo	Sindaco	SI'	0,8811
BERCETO			NO	0,6019
BORE			NO	0,3471
BORGO VAL DI TARO	Rossi Diego	Sindaco	SI'	1,5743
BUSSETO	Capelli Stefano	Sindaco	SI'	1,5303
CALESTANO			NO	0,5809
COLLECCHIO	Pietralunga William	Assessore	SI'	2,8284
COLORNO	Grassi Mirka	Assessore	SI'	1,8860
COMPIANO	Mariani Francesco	Sindaco	SI'	0,4083
CORNIGLIO	Delsante Giuseppe	Sindaco	SI'	0,5741
FELINO			NO	1,8294
FIDENZA	Amigoni Franco	Assessore	SI'	5,0320
FONTANELLATO			NO	1,5152
FONTEVIVO			NO	1,2243
FORNOVO DI TARO	Zanetti Michela	Sindaco	SI'	1,3691
LANGHIRANO			NO	2,0497
LESIGNANO DE' BAGNI			NO	1,0975
MEDESANO	Ghidini Riccardo	Assessore	SI'	2,2163
MONCHIO DELLE CORTI			NO	0,3823
MONTECHIARUGOLO	Olivieri Maurizio	Assessore	SI'	2,1820

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
NEVIANO DEGLI ARDUINI			NO	0,8951
NOCETO	Maini Giovanna	Assessore	SI'	2,6033
PALANZANO	Boraschi Ermes	Sindaco	SI'	0,4164
PARMA	Benassi Tiziana	Assessore	SI'	33,5283
PELLEGRINO PAR.SE			NO	0,3977
POLESINE - ZIBELLO			NO	1,3746
ROCCABIANCA			NO	0,7772
SALA BAGANZA			NO	1,2175
SALSOMAGGIORE TERME	Marco Trevisan	Assessore	SI'	3,8919
S. SECONDO PAR.SE			NO	1,2415
SISSA TRECASALI	Tonini Sara	Assessore	SI'	1,7100
SOLIGNANO			NO	0,5385
SORAGNA			NO	1,1189
SORBOLO MEZZANI	Comelli Marco	Consigliere	SI'	2,6562
TERENZO			NO	0,4221
TIZZANO VAL PARMA			NO	0,5961
TORNOLO			NO	0,4045
TORRILE			NO	1,6090
TRAVERSETOLO	Lanzi Michele	Assessore	SI'	1,9533
VALMOZZOLA	Alzapiedi Claudio	Sindaco	SI'	0,3031
VARANO DE' MELEGARI			NO	0,7052
VARSÌ			NO	0,4384
PROVINCIA DI PARMA			NO	10,000

Presenti n. 19, quote 67,7132

Assenti n. 26, quote 32,2868

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore MONTAGNA 2000. Approvazione del consuntivo degli investimenti per l’anno 2019. Programma Operativo Interventi 2015 – 2019.**

**Vista** la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato** che:

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g);
- l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’Ambito la funzione di approvazione dei piani d’ambito;

**considerato** che:

- con deliberazione n.2 del 24 marzo 2016 del Consiglio locale di Parma è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore Montagna 2000 S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d’ambito;
- con deliberazione n.8 dell’11 maggio 2018 del Consiglio locale di Parma è stata approvata la revisione straordinaria del programma degli interventi per gli anni 2018-2019 del servizio idrico integrato per il gestore Montagna 2000 S.p.A., che costituisce proposta di aggiornamento del Piano d’ambito;
- con deliberazione n. 4 del 15 gennaio 2020 del Consiglio locale di Parma è stata approvato il Programma Operativo degli interventi per gli anni 2020-2023 con revisione straordinaria dell’annualità 2019, del servizio idrico integrato per il gestore Montagna 2000 S.p.A.;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 inoltre dispone che:
  - entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
  - il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
  - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all’anno (N-1);
  - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

- con deliberazione n. 30 del 10 aprile 2019 del Consiglio d'Ambito è stata approvato l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia vigente (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione Arera n.918/2017/R/idr, per il bacino tariffario di Parma gestito da Montagna2000 S.p.A.

**dato atto** che:

- il gestore Montagna 2000 S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2019 attraverso il software ARSI;

**rilevato** che dai dati presentati è emerso per l'annualità 2019 che:

- è stato eseguito n.1 intervento aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 2015-19 approvato ed autorizzato con nulla osta ai sensi della Delibera n. 75 del 12 ottobre 2017;
- non sono stati avviati n.12 interventi per un importo complessivo lordo di € 282.000;
- sono stati anticipati/conclusi n.24 interventi previsti in altre annualità per un importo complessivo lordo di € 1.630.685;
- per n.29 interventi si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- per n.7 interventi si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al +/- 20% e per i quali non è stato necessario acquisire la giustificazione dello scostamento;
- gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 e successive revisioni approvato per l'annualità 2019;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

**ritenuto** pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto,

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**dato atto** che il verbale della seduta è depositato agli atti.

**a voti unanimi favorevoli e palesi,**

## **DELIBERA**

1. di approvare il consuntivo degli investimenti per l'annualità 2019 del gestore Montagna 2000 S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA  
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato  
Consuntivo investimenti annualità 2019  
Gestore: Montagna 2000 (PR)**

**4 dicembre 2020**

## RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019


La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2019, del Programma Operativo Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.2 del 24 marzo 2016, e revisionato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.8 del 11 maggio 2018 e n. 4 del 15 gennaio 2020, su proposta presentata dal gestore Montagna 2000 tramite il software ARSI.

PIANIFICATO 2019		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2019	
Importo Lordo Pianificato [A]	€ 1.925.324	<b>+ € 1.154.628</b>	€ 3.106.952	Importo Lordo a Consuntivo [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 110.000	<b>+€ 1.155.174</b>	€ 1.265.174	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 1.815.324	<b>+ € 26.454</b>	€ 1.841.778	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]

**Tab.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019**

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore Montagna 2000 S.p.A. abbia effettuato maggiori investimenti lordi rispetto alla pianificazione approvata precisamente pari ad €. 1.154.628 a fronte di maggiori contributi incassati pari a + € 1.155.174. I contributi incassati si riferiscono all'emergenza idrica dell'anno 2017, ottenuti ai sensi dell'OCDPC 468/2017 per complessivi €. 1.265.174.


Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

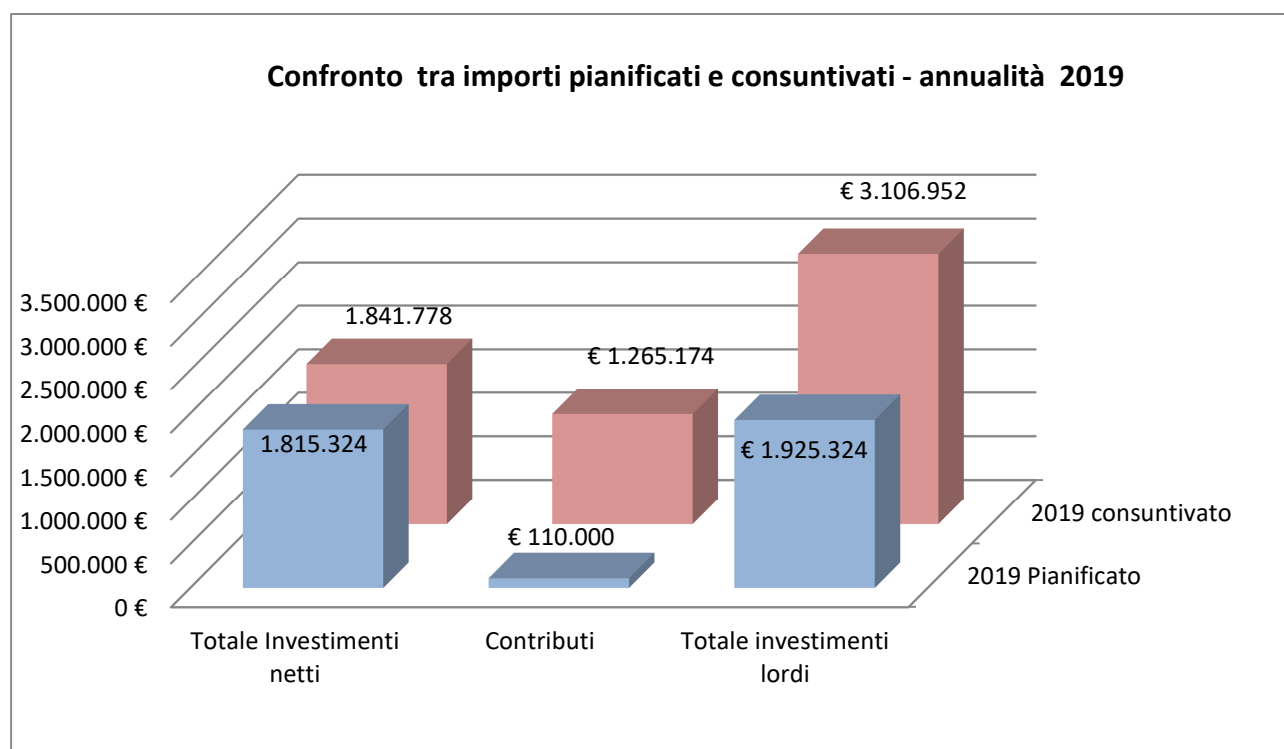

**Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019**



Gli investimenti realizzati nell'annualità 2019 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

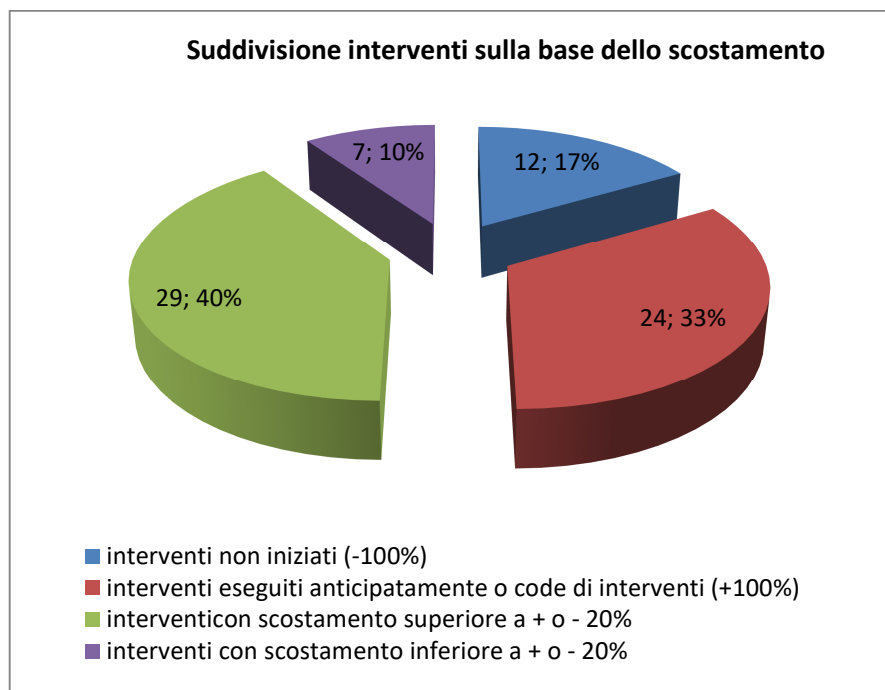


**Fig.2 –Suddivisione investimenti 2019 per servizio**

Nella tabella e nel grafico che seguono è riportato il numero degli interventi raggruppati sulla base degli scostamenti verificati e la rappresentazione grafica con indicazione della percentuale di ciascuna categoria rapportata al totale:

interventi non iniziati (-100%)	12
interventi eseguiti anticipatamente o code di interventi (+100%)	24
interventi con scostamento superiore a + o - 20%	29
interventi con scostamento inferiore a + o - 20%	7

**Tab.2– Interventi che presentano scostamento tra pianificato e quanto rendicontato**

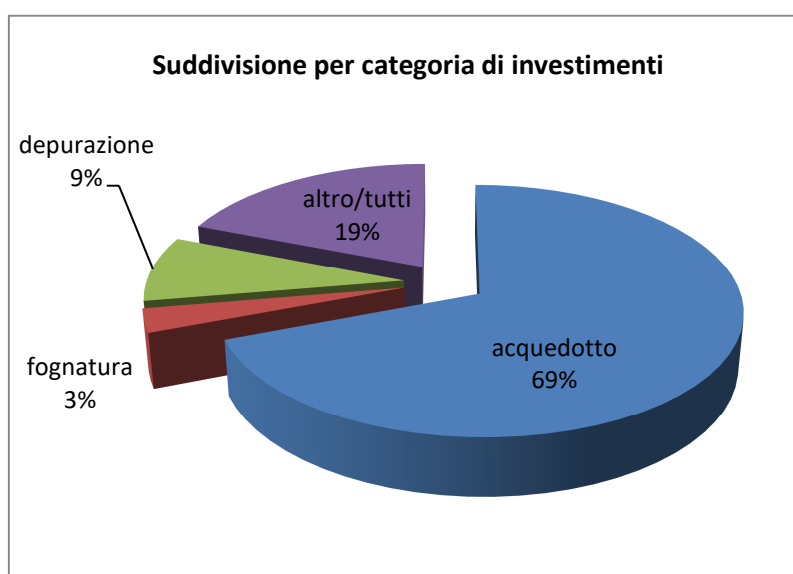

**Fig.3 –Interventi realizzati nell'annualità 2019 suddivisi per scostamento**

Dalla tabella sopra riportata e dal relativo grafico risulta che per l'annualità 2019, n.12 interventi, che erano stati programmati per complessivi €. 282.000, non sono stati avviati (scostamento pari a -100%), (per l'elenco si veda la Tab. 4), per i quali la giustificazione è risultata esaustiva (Allegato 1).

Il Gestore ha avviato anticipatamente oppure chiuso prima rispetto a quanto programmato n.24 interventi e n.29 interventi hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno, e per i quali la giustificazione fornita è risultata esaustiva. Per n.5 interventi lo scostamento è inferiore al +/- 20% e quindi non passibile di giustificazione.

#### RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o meno e il relativo provvedimento che ATERSIR intende eventualmente adottare.

Numero di interventi programmati nel 2019 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 48

Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2019: 60

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2019	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2019	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	12	€ 0	€ 282.000	NO	Vedi TAB.L. 2 e 4 e Fig. 3. Vedi il dettaglio in ALLEGATO 1	
Interventi con avvio anticipato nel 2019 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito (+100%)	24	€ 1.630.384	€ 0	NO	2014PRMA0002 2014PRMA0016 2014PRMA0027 2014PRMA0033 2014PRMA0034 2014PRMA0038 2014PRMA0044 2014PRMA0045 2014PRMA0055 2014PRMA0060 2014PRMA0061 2014PRMA0069 2014PRMA0070 2014PRMA0071 2014PRMA0079 2016PRMA0091 2016PRMA0097 2016PRMA0099 2016PRMA0100 2018PRMA0122 2018PRMA0125 2018PRMA0128 2018PRMA0137 2019PRMA0138	
Interventi avviati nel 2019 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	1		€ . 62.000		2018PRMA0137	

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2019	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2019	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	29	€ 1.174.546	€ 1.341.324	NO	2014PRMA0001 2014PRMA0007 2014PRMA0018 2014PRMA0043 2014PRMA0046 2014PRMA0075 2014PRMA0081 2014PRMA0084 2016PRMA0093 2016PRMA0098 2016PRMA0102 2018PRMA0121 2018PRMA0123 2018PRMA0124 2018PRMA0126 2018PRMA0127 2018PRMA0130 2018PRMA0133 2018PRMA0134 2020PRMA0145 2020PRMA0152 2020PRMA0160 2020PRMA0166 2020PRMA0169 2020PRMA0174 2020PRMA0180 2020PRMA0181 2020PRMA0184 2020PRMA0185	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	7	€ 302.021	€ 302.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

**Tab.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato**

Gli interventi pianificati e non realizzati, con scostamento -100% sono n. 12 e sintetizzati nella tabella che segue:

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale
2014PRMA0032	BVT102 - Completamento opere di presa acquedotto Tre Fontane e collegamento alla rete di adduzione	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Tarò	42.000,00
2014PRMA0037	BVT107 - Sistemazione reti di adduzione acquedotti	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Tarò	45.000,00
2014PRMA0057	SOL162 - Lavori di miglioramento e potenziamento reti fognarie del Capoluogo	FOGNATURA	Solignano	30.000,00

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale
2014PRMA0066	TO169 - Ristrutturazione vecchi allacciamenti utenze acquedotti in località varie	ACQUEDOTTO	Tornolo	60.000,00
2014PRMA0074	VM134 - Sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica e impianto di sollevamento acquedotti	ACQUEDOTTO	Varano de' Melegari	114.000,00
2016PRMA0094	Rifacimento di un tratto di fognatura comunale danneggiata da frana a servizio dell'agglomerato di Rovina e	ACQUEDOTTO	Bore	43.000,00
2018PRMA0129	Installazione misuratori non precedentemente censiti e in punti nodali della rete acquedotto	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	60.000,00
2018PRMA0131	Installazione misuratori non precedentemente censiti e in punti nodali della rete acquedotto	ACQUEDOTTO	Varano de' Melegari	30.000,00
2018PRMA0136	Manutenzioni straordinarie acque bianche	ACQUE BIANCHE	Opere pluricomunali	
2020PRMA0162	PP140 - Sostituzione ed adeguamento impianto elettrico depuratore di Pellegrino Capoluogo	DEPURAZIONE	Pellegrino Parmense	20.000,00
2020PRMA0187	Installazione di impianto di gassificazione fanghi/cippato per la disidratazione dei fanghi con produzione di energia elettrica. Potenza 27 KW, finalizzato alla riduzione dei costi energetici e a beneficio esclusivo del S.I.I.	TUTTI	Opere pluricomunali	50.000,00
2020PRMA0188	Acquisizione, adeguamento e messa in funzione di 4 impianti fotovoltaici in Comune di Fornovo: Campo sportivo Riccò (KW 14,26), Serbatoio Casa Tebaldi (KW 10,81), Scuola Materna P.zza Libertà (KW 28,6), Condominio ACER Riccò (KW 13,57). Interventi finalizzati alla riduzione dei costi energetici e a beneficio esclusivo del S.I.I.	TUTTI	Opere pluricomunali	30.000,00

**Tab.4 – Interventi pianificati ma non avviati**

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.8 del 11 maggio 2018, revisionato con delibera n. 4 del 15 gennaio 2020**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PRMA0001	AL90A - Potenziamento capacità di stoccaggio serbatoio di accumulo in località Roncole di Gotra - 1° STRALCIO	ACQUEDOTTO	Albareto	69.000,00	30.000,00	0	30.000,00	1.301,30	0	1.301,30	-95	Difficoltà nell'ottenimento delle autorizzazioni e nulla-osta da parte degli Enti; difficoltà nell'ottenimento di accordi bonari con proprietari dei terreni
2014PRMA0002	AL108 - Estendimento e rifacimento dell'acquedotto rurale a servizio delle località Case Mazzetta, Casale, Case Sartori, ecc. (PRIP 2011)	ACQUEDOTTO	Albareto	77.000,00	0	0	0	15.634,36	0	15.634,36	100	Lavori previsti in annualità precedenti ma conclusi nel 2019 a causa del maltempo autunnale invernale
2014PRMA0003	AL109 - Interventi su fossa Imhoff a servizio dell'agglomerato di Boschetto	DEPURAZIONE	Albareto		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0004	AL110 - Interventi vari	TUTTI	Albareto		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0005	AL111 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	Albareto		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0006	AL112 - Telecontrolli serbatoi	ACQUEDOTTO	Albareto		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0007	BA126 - Sostituzione e adeguamento tratti reti idrica acquedotti Capoluogo, Lagacci, Granere e altri minori	ACQUEDOTTO	Bardi	102.000,00	20.000,00	0	20.000,00	6.383,30	0	6.383,30	-68	Scostamento dovuto ai ribassi in fase di affidamento lavori e a economie realizzate in fase esecutiva
2014PRMA0008	BA127 - Realizzazione impianti clorazione a pannelli fotovoltaici in Loc. Gazzo, Grezzo, Ca' Alfieri e altri minori	ACQUEDOTTO	Bardi	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0009	3MD - Adeguamento impianto Saliceto (attualmente 1° Livello)	DEPURAZIONE	Bardi	12.000,00	0	0	0		0		0	
2014PRMA0010	BA128 - Interventi vari	TUTTI	Bardi		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0011	BA129 - Telecontrollo serbatoi idrici	ACQUEDOTTO	Bardi		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0012	BA130 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	Bardi		0	0	0	0	0	0	0	

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI  
 PARMA n.8 del 11 maggio 2018, revisionato con delibera n. 4 del 15  
 gennaio 2020**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PRMA0013	BE113 - Installazione di nuovi impianti di disinfezione sugli acquedotti frazionali	ACQUEDOTTO	Bedonia	65.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0014	BE114 - Estendimento/rifacimento di alcuni tratti della fognatura di Masanti di Sopra	FOGNATURA	Bedonia	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0015	BE115 -Nuovo impianto di trattamento reflui e collegamento alla fognatura esistente in loc. Alpe (175 A.E.)	DEPURAZIONE	Bedonia	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0016	BE116 - Sistemazione acquedotti e serbatoi danneggiati da frane	ACQUEDOTTO	Bedonia	30.000,00	0	0	0	21.381,88	0	21.381,88	100	
2014PRMA0017	BE117 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	Bedonia		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0018	BE118 - Recupero funzionale e messa in sicurezza opere di presa e serbatoio a servizio degli acquedotti di Scopolo-Pilati e Alpe	ACQUEDOTTO	Bedonia	45.000,00	20.000,00	0	20.000,00	3.016,00	0	3.016,00	-84	Conclusione intervento iniziato nell'annualità precedente
2014PRMA0019	BE119 - Interventi vari	TUTTI	Bedonia		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0020	BE120 - Telecontrolli serbatoi idrici e depuratore Capoluogo	ACQUEDOTTO	Bedonia		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0021	16MD - Lavori di sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotti in località Pian Farioli, Ghiare ed altri minori	ACQUEDOTTO	Berceto	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0022	BER143 - Ristrutturazione rete fognaria in loc. Fugazzolo di Sotto, Tralariva e Case Brusini	FOGNATURA	Berceto	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0023	BER144 - Interventi vari (comprese manutenzioni straordinarie)	TUTTI	Berceto		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0024	BER145 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	Berceto	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI  
PARMA n.8 del 11 maggio 2018, revisionato con delibera n. 4 del 15  
gennaio 2020**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PRMA0025	BSVV86A - Lavori di realizzazione e potenziamento serbatoi e collegamento alla rete acquedottistica ex Consorzio	ACQUEDOTTO	Berceto, Solignano, Valmozzola, Varsi	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0026	20 MD - Ripristino sorgenti e serbatoi, sostituzione e adeguamento tratti di rete idrica acquedotti Capoluogo, Zani,	ACQUEDOTTO	Bore	47.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0027	BO131 - sostituzione e adeguamento tratti rete idrica in loc.Felloni, Castiglione,Pozzolo, Franchi, altri minori e ripristino sorgenti In loc. Pozzolo	ACQUEDOTTO	Bore	45.000,00	0	0	0	536,62	0	536,62	100	Lavori previsti in annualità precedenti ma conclusi nel 2019 a causa della difficoltà nel reperire dati e tracciati delle condotte esistenti da sostituire
2014PRMA0028	BO132 - Interventi vari	TUTTI	Bore		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0029	BO133 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	Bore		0	0	0	0	0	0	0	ANNULLATO
2014PRMA0030	BVT100 - Adeguamento e recupero funzionale del serbatoio idrico in località Peticcio a servizio dell'acquedotto di	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	53.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0031	BVT101 - Potenziamento/rifacimento tratti acquedotto rurale delle Tre Fontane (ex PRIP 2011)	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	175.000,00	85.000,00	42.500,00	42.500,00	83.593,54	0	83.593,54	-1	Scostamento dovuto ai ribassi in fase di affidamento lavori e a economie realizzate in fase esecutiva
2014PRMA0032	BVT102 - Completamento opere di presa acquedotto Tre Fontane e collegamento alla rete di adduzione	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	42.000,00	42.000,00	0	42.000,00	0	0	0	-100	Approfondimento studi per valutare l'economicità dell'intervento in relazione all'effettiva produttività delle nuove captazioni
2014PRMA0033	BVT103 - Rifacimento/estendimento collettore fognario nel Rio Varacola in loc. Costazza	FOGNATURA	Borgo Val di Taro	40.000,00	0	0	0	1.242,45	0	1.242,45	100	Autorizzazioni e nulla-osta degli Enti in corso
2014PRMA0034	BVT104 - Rifacimento e messa a norma impianto di trattamento reflui in loc. Monticelli (100AE)	DEPURAZIONE	Borgo Val di Taro	56.000,00	0	0	0	3.780,40	0	3.780,40	100	ANNULLATO
2014PRMA0035	BVT105 - Interventi vari	TUTTI	Borgo Val di Taro		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0036	BVT106 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro		0	0	0	0	0	0	0	

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI  
PARMA n.8 del 11 maggio 2018, revisionato con delibera n. 4 del 15  
gennaio 2020**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PRMA0037	BVT107 - Sistemazione reti di adduzione acquedotti	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	45.000,00	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	-100	Ritardo dovuto alla carente conoscenza delle reti e georeferenziazione degli impianti ancora da completare
2014PRMA0038	CO121 - Rifacimento/potenziamento tratti di rete di distribuzione di Sugremaro e Compiano Capoluogo	ACQUEDOTTO	Compiano	65.000,00	0	0	0	383,3	0	383,3	100	Intervento previsto in precedenti annualità ma iniziato nel 2019 e da concludere nel 2020. Ritardo dovuto a carenza di dati attendibili e georeferenziazione rete idrica ancora incompleta
2014PRMA0039	CO122 - Potenziamento/miglioramento acquedotto rurale di Costa Mezzana, Oratorio, ecc. (PRIP)	ACQUEDOTTO	Compiano		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0040	CO123 - Interventi vari	TUTTI	Compiano		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0041	CO124 - Telecontrollo serbatoi idrici e sollevamento fognario di Isola	ACQUEDOTTO	Compiano		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0042	CO125 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	Compiano		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0043	FDT146 - Variante alla condotta di pompaggio acquedotto del Capoluogo e alimentazione località Salita con	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	185.000,00	30.000,00	0	30.000,00	918	0	918	-96	Ritardo dovuto alla carente conoscenza della rete idrica e georeferenziazione degli impianti ancora da completare.
2014PRMA0044	FDT147 - Lavori di ristrutturazione impianto sollevamento gallerie filtranti	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	100.000,00	0	0	0	20.136,89	0	20.136,89	100	Lavori previsti in annualità precedenti ma conclusione non ancora completata a causa della difficoltà di reperire le autorizzazioni da parte dei proprietari dei terreni
2014PRMA0045	FDT148 - Lavori di ristrutturazione depuratore del Capoluogo (II livello)	DEPURAZIONE	Fornovo di Taro	150.000,00	0	0	0	113.128,62	0	113.128,62	100	Intervento previsto in precedenti annualità ma concluso nel 2019 a causa sospensione lavori per maltempo e per completare l'acquisizione dei dati delle opere elettromeccaniche a servizio del depuratore di Fornovo di Taro
2014PRMA0046	FDT149 - Lavori di ristrutturazione rete fognaria del Capoluogo	FOGNATURA	Fornovo di Taro	150.000,00	40.000,00	0	40.000,00	4.194,15	0	4.194,15	-89	Affidamento lavori fermo in attesa di autorizzazioni e nulla-osta Enti e RFI
2014PRMA0047	FDT150 - Interventi vari	TUTTI	Fornovo di Taro		0	0	0	0	0	0	0	



				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.8 del 11 maggio 2018, revisionato con delibera n. 4 del 15 gennaio 2020						CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PRMA0048	FDT151 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro		0	0	0	0	0	0	0	ANNULLATO
2014PRMA0049	FDT152 - Telecontrolli serbatoi	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0050	PP139 - Sostituzione ed adeguamento tratti rete idrica acquedotti Capoluogo, Ca' del Rengo ed altri minori	ACQUEDOTTO	Pellegrino Parmense	60.000,00	15.000,00	0	15.000,00	15.700,00	0	15.700,00	4	
2014PRMA0051	PP140 - Sostituzione ed adeguamento impianti elettrici serbatoi Case Volpi, Casa Bianca ed altri minori	ACQUEDOTTO	Pellegrino Parmense	33.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0052	PP141 - Interventi vari	TUTTI	Pellegrino Parmense		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0053	PP142 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	Pellegrino Parmense		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0054	SOL159 - Ripristino sorgenti, sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotto Capoluogo, Fopla e loc. diverse	ACQUEDOTTO	Solignano	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0055	SOL160 - Lavori di ristrutturazione condotte idriche del Capoluogo	ACQUEDOTTO	Solignano	40.000,00	0	0	0	344,97	0	344,97	100	Ritardo dovuto alla carente conoscenza delle rete e georeferenziazione degli impianti ancora da completare. I lavori saranno completati nell'anno successivo
2014PRMA0056	SOL161 - Completamento rete fognaria e fossa imhoff in loc. Case Boselli di Fosio	DEPURAZIONE	Solignano	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0057	SOL162 - Lavori di miglioramento e potenziamento reti fognarie del Capoluogo	FOGNATURA	Solignano	30.000,00	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	-100	Ritardo dovuto alla carente conoscenza della rete fognaria e georeferenziazione degli impianti ancora da completare.
2014PRMA0058	SOL163 - Interventi vari	TUTTI	Solignano		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0059	SOL164 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	Solignano		0	0	0	0	0	0	0	

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI  
PARMA n.8 del 11 maggio 2018, revisionato con delibera n. 4 del 15  
gennaio 2020**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PRMA0060	TE65A-TE66F - Lavori di sostituzione tratti di rete fognaria ed idrica in loc. Boschi di Bardone	FOGNATURA	Terenzo	68.000,00	0	0	0	9.610,73	0	9.610,73	100	Lavori previsti in annualità precedenti ma conclusi nel 2019 a causa della difficoltà di reperire le autorizzazioni da parte dei proprietari dei terreni e il nulla osta di ANAS per l'attraversamento della strada statale
2014PRMA0061	TE165 - Lavori di rifacimento tratti di condotte fognarie nel Capoluogo	FOGNATURA	Terenzo	35.000,00	0	0	0	15.986,85	0	15.986,85	100	Intervento previsto in precedenti annualità ma concluso nel 2019 a causa di carenza di dati e georeferenziazione della rete fognaria depurativa
2014PRMA0062	TE166 - Interventi vari	TUTTI	Terenzo		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0063	TE167 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	Terenzo		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0064	TE168 - Installazione di telecontrolli sui serbatoi idrici di Tarsogno, Tornolo e S.Maria del Taro	ACQUEDOTTO	Tornolo		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0065	TO86 - Sistemazione ed adeguamento impianto di depurazione di Tarsogno (AGGLOMERATO 547 A.E.)	DEPURAZIONE	Tornolo	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0066	TO169 - Ristrutturazione vecchi allacciamenti utenze acquedotti in località varie	ACQUEDOTTO	Tornolo	60.000,00	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0	-100	Lavori anticipati e conclusi nell'annualità precedente
2014PRMA0067	TO170 - Interventi vari	TUTTI	Tornolo		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0068	TO171 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	Tornolo		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0069	VA70A-VA72F -Lavori di costruzione impianto di depurazione in loc. Mormorola (AGGLOMERATO 145 A.E.)	DEPURAZIONE	Valmazzola	52.000,00	0	0	0	200	0	200	100	Conclusione intervento iniziato nell'annualità precedente
2014PRMA0070	VA72F- Lavori di costruzione rete fognaria ed impianto di trattamento reflui in loc. San Martino -La Borella (50AE),	DEPURAZIONE	Valmazzola	137.000,00	0	0	0	17.091,48	0	17.091,48	100	Intervento previsto in precedenti annualità ma concluso nel 2019 a causa di carenza di dati e georeferenziazione della rete fognaria depurativa
2014PRMA0071	VA157 - Sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotti in loc. Mormorola, Mariano ecc..	ACQUEDOTTO	Valmazzola	15.000,00	0	0	0	18.188,05	0	18.188,05	100	Intervento previsto in precedenti annualità ma concluso nel 2019 a causa di carenza di dati e georeferenziazione della rete acquedottistica

					PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.8 del 11 maggio 2018, revisionato con delibera n. 4 del 15 gennaio 2020					CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PRMA0072	VA158 - sistemi di contabilizzazione acqua	TUTTI	Valmozzola		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0073	VAR156 - Interventi vari	ACQUEDOTTO	Valmozzola		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0074	VM134 - Sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica e impianto di sollevamento acquedotti Capoluogo e	ACQUEDOTTO	Varano de' Melegari	114.000,00	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0	-100	Ritardo dovuto alla carente conoscenza della rete idrica e georeferenziazione degli impianti ancora da completare.
2014PRMA0075	VM135 - Adeguamento e sostituzione tratti di rete idrica in Loc. Riviano, Monte Salso, Monti Alti e altre minori.	ACQUEDOTTO	Varano de' Melegari	65.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	3.607,30	0	3.607,30	-91	Il ritardo è dovuto alla carente conoscenza delle rete e mancata georeferenziazione degli impianti
2014PRMA0076	VM136 - Interventi vari	TUTTI	Varano de' Melegari		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0077	VM137 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	Varano de' Melegari		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0078	VM138 - Realizzazione impianti di telecontrollo serbatoi Pozzo Peschiera, Castagnola, Castello, Monte Mariolo e Lovai	ACQUEDOTTO	Varano de' Melegari		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0079	81MD - Lavori di ripristino sorgenti e serbatoi e sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotti in loc. Varsi,	ACQUEDOTTO	Varsi	20.000,00	0	0	0	15.624,50	0	15.624,50	100	Lavori previsti in annualità precedenti ma conclusi nel 2019 a causa della difficoltà di reperire le autorizzazioni da parte dei proprietari dei terreni. Economie originate da
2014PRMA0080	VAR153 - Lavori di ripristino sorgenti e serbatoi e sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotti frazionali	ACQUEDOTTO	Varsi	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0081	VAR80F-VAR82F - Lavori di costruzione impianto di trattamento reflui in loc. Lubbia di sopra e adeguamento collettori	DEPURAZIONE	Varsi	35.000,00	35.000,00	0	35.000,00	3.436,45	0	3.436,45	-90	Lavori previsti in annualità precedenti ma conclusi nel 2019 a causa della difficoltà di reperire le autorizzazioni da parte dei proprietari dei terreni
2014PRMA0082	VAR154 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	Varsi		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0083	VAR155 - Interventi vari	TUTTI	Varsi		0	0	0	0	0	0	0	

**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI  
PARMA n.8 del 11 maggio 2018, revisionato con delibera n. 4 del 15  
gennaio 2020**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2014PRMA0084	RICA156 - Rilievi e cartografia	TUTTI	Opere pluricomunali	100.000,00	10.000,00	0	10.000,00	73.440,60	0	73.440,60	634	Lavori parzialmente previsti in annualità precedenti ma completato nel 2019 a causa della difficoltà di reperire dati e cartografie affidabili dai Comuni o da precedenti Gestori
2014PRMA0085	DEP157 -Interventi di adeguamento al sistema depurativo (sistemazione fosse Imhoff, rifacimenti carraie e	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	135.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2015PRMA0086	BER14D - adeguamento depuratori Capoluogo e Ghiare	DEPURAZIONE	Berceto	70.883,00	0	0	0	0	0	0	0	
2015PRMA0087	BER15F - Adeguamento collettore via di Sales e località Poggio	FOGNATURA	Berceto	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2015PRMA0088	BER16A - Ripristino sorgenti , sostituzione adeguamento tratti rete idrica acquedotti località Cervellino, Corchia e altri minori	ACQUEDOTTO	Berceto	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2015PRMA0089	BSVV85A - Nuova captazione e condotta di adduzione rete idrica acquedotto ex Consorzio Monte Barigazzo loc.Monte Barigazzo	ACQUEDOTTO	Berceto, Solignano, Valmozzola, Varsi	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2016PRMA0090	Interventi vari di manutenzione straordinaria	TUTTI	Opere pluricomunali	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2016PRMA0091	Rifacimento e adeguamento della rete idrica di distribuzione del Capoluogo in Via Gotelli, via Partigiani per la Libertà, Via	ACQUEDOTTO	Albareto	35.000,00	0	0	0	8.341,74	0	8.341,74	100	Lavori previsti in annualità precedenti ma conclusi nel 2019 a causa della difficoltà di reperire le autorizzazioni da parte dei proprietari dei terreni
2016PRMA0092	Lavori di somma urgenza per rifacimento tratto acquedotto di Borio	ACQUEDOTTO	Bedonia	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2016PRMA0093	Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	465.000,00	137.000,00	0	137.000,00	90.457,40	0	90.457,40	-33	Il ritardo è dovuto alla carente conoscenza delle rete e mancata georeferenziazione degli impianti
2016PRMA0094	Rifacimento di un tratto di fognatura comunale danneggiata da frana a servizio dell'agglomerato di Rovina e altre	ACQUEDOTTO	Bore	43.000,00	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0	-100	Ritardo generato da difficoltà a reperire autorizzazioni dai proprietari. I lavori saranno completati nel 2020
2016PRMA0095	Rifacimento parziale e recupero funzionale cunicolo fognario in Piazza Verdi.Largo Roma nel Capoluogo	FOGNATURA	Borgo Val di Taro	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	

					PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.8 del 11 maggio 2018, revisionato con delibera n. 4 del 15 gennaio 2020					CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2016PRMA0096	Potenziamento sistema depurativo (II livello) dell'agglomerato di Borgotaro (7.500 AE)	DEPURAZIONE	Borgo Val di Taro	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2016PRMA0097	Lavori di miglioramento e adeguamento acquedotti minori e reti di distribuzione	ACQUEDOTTO	Compiano	20.000,00	0	0	0	17.174,21	0	17.174,21	100	Lavori previsti in annualità precedenti ma conclusi nel 2019 a causa della difficoltà nel reperire dati e tracciati delle condotte esistenti da sostituire
2016PRMA0098	Ampliamento depuratore a servizio dell'agglomerato di Sugremaro (a.e.>200)	DEPURAZIONE	Compiano	348.000,00	50.000,00	0	50.000,00	16.721,23	0	16.721,23	-66	Ritardi legati al reperimento dei nulla-osta, atti di assenso e autorizzazioni da parte degli Enti. Ritardi anche nell'acquisizione dell'area
2016PRMA0099	Completamento e messa in esercizio nuovo serbatoio idrico in loc. Case Tebaldi	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	143.000,00	0	0	0	77.736,55	0	77.736,55	100	Intervento previsto in precedenti annualità ma conclusi nel 2019 dopo la risoluzione di contenzioso con S.A.
2016PRMA0100	Lavori di miglioramento e potenziamento reti di adduzione e distribuzione degli acquedotti funzionali	ACQUEDOTTO	Solignano	20.000,00	0	0	0	153,32	0	153,32	100	Lavori previsti in annualità precedenti ma iniziati nel 2019 a causa della difficoltà di reperire dati e cartografie dai Comuni o da precedenti Gestori
2016PRMA0101	Lavori di messa in sicurezza delle captazioni idriche	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	350.000,00	50.000,00	0	50.000,00	55.829,51	0	55.829,51	11	Maggiori lavori eseguiti rispetto al preventivato per messa a norma zona di tutela sorgenti
2016PRMA0102	Messa a norma degli impianti elettrici e interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	200.000,00	25.000,00	0	25.000,00	16.290,31	0	16.290,31	-34	Scostamento dovuto ai ribassi in fase di affidamento lavori e a economie realizzate in fase esecutiva
2016PRMA0103	Sistemi di telecontrollo dei serbatoi, degli impianti di depurazione e delle reti idriche-fognarie	TUTTI	Opere pluricomunali	150.000,00	30.000,00	0	30.000,00	34.127,72	0	34.127,72	13	Lo scostamento è dovuto a maggiori lavori eseguiti sugli impianti in gestione e agli oneri per l'implementazione del sistema SCADA aziendale
2016PRMA0104	Realizzazione nuova linea di distribuzione a servizio di via Cenni nel Capoluogo	ACQUEDOTTO	Varsi	19.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2016PRMA0105	Costruzione fossa imhoff e collegamento scarichi autorizzati loc. Carniglia	DEPURAZIONE	Bedonia	112.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2016PRMA0106	* Interventi strutturali necessari al superamento delle criticità sull'acquedotto intercomunale Monte Bosso, a servizio dei	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro, Terenzo	67.587,00	0	0	0	0	0	0	0	
2016PRMA0107	* Collettore acque reflue Viazzano e Piani Riva	FOGNATURA	Varano de' Melegari		0	0	0	0	0	0	0	

					PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.8 del 11 maggio 2018, revisionato con delibera n. 4 del 15 gennaio 2020					CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2018PRMA0108	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc.	ACQUEDOTTO	Albareto	189.840,00	0	0	0	0	0	0	0	
2018PRMA0109	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc.	ACQUEDOTTO	Bardi	129.909,00	0	0	0	0	0	0	0	
2018PRMA0110	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc.	ACQUEDOTTO	Bardi	161.438,00	0	0	0	0	0	0	0	
2018PRMA0111	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc.	ACQUEDOTTO	Bardi	131.920,00	0	0	0	0	0	0	0	
2018PRMA0112	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc.	ACQUEDOTTO	Bardi	122.853,00	0	0	0	0	0	0	0	
2018PRMA0113	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc.	ACQUEDOTTO	Bardi	238.143,00	0	0	0	0	0	0	0	
2018PRMA0114	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc.	ACQUEDOTTO	Bedonia	146.846,00	0	0	0	0	0	0	0	
2018PRMA0115	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc.	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	103.765,00	0	0	0	0	0	0	0	
2018PRMA0116	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc.	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	177.352,00	0	0	0	0	0	0	0	
2018PRMA0117	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc.	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	108.970,00	0	0	0	0	0	0	0	
2018PRMA0118	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc.	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	198.280,00	0	0	0	0	0	0	0	
2018PRMA0119	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc.	ACQUEDOTTO	Solignano	93.171,00	0	0	0	0	0	0	0	



					PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.8 del 11 maggio 2018, revisionato con delibera n. 4 del 15 gennaio 2020					CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2018PRMA0120	Fornitura, adeguamento e installazione impianti di rimozione cromo VI da acque destinate al consumo umano loc.	ACQUEDOTTO	Varsi	107.515,00	0	0	0	0	0	0	0	
2018PRMA0121	Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati	ACQUEDOTTO	Albareto	100.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	191,65	0	191,65	-98	Il ritardo è dovuto alla carente conoscenza delle rete e mancata georeferenziazione degli impianti
2018PRMA0122	AL91A - Nuovi estendimenti loc. Case Sartori, Case Bosini, ecc.. Installazione impianti clorazione e sistemazione opere captazione	ACQUEDOTTO	Albareto		0	0	0	76,66	0	76,66	100	Saldo lavori di completamento impianto di clorazione iniziato in annualità precedente
2018PRMA0123	Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati	ACQUEDOTTO	Bardi	100.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	191,65	0	191,65	-98	Progettazione esecutiva in corso. Ritardo dovuto alla carente conoscenza delle rete e georeferenziazione degli impianti ancora da completare
2018PRMA0124	Rinnovo delle reti idriche nei centri abitati	ACQUEDOTTO	Bedonia	100.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.517,65	0	1.517,65	-84	Progetto in corso. Ritardi generati dai nulla-osta e autorizzazioni da parte degli Enti
2018PRMA0125	BED8A - Ripristino sorgenti, sostituzione e/o potenziamento tratti di rete acquedotto Alpe e Castagnola	ACQUEDOTTO	Bedonia		0	0	0	964,99	0	964,99	100	Lavori previsti in annualità precedenti ma conclusi nel 2019 a causa della difficoltà di reperire le autorizzazioni da parte dei proprietari dei terreni
2018PRMA0126	Installazione misuratori non precedentemente censiti e in punti nodali della rete acquedotto	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	60.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	12.684,11	0	12.684,11	-57	Ritardo dovuto al maltempo dei mesi autunnali
2018PRMA0127	Progetto per la riduzione delle perdite delle reti di distribuzione mediante gestione e controllo delle pressioni e la	ACQUEDOTTO	Varano de' Melegari, Borgo Val di Taro,	180.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	3.700,00	0	3.700,00	-63	Lavori in corso di progettazione
2018PRMA0128	BVT27A - Ripristino sorgenti potenziamento tratto reti acquedotti del Capoluogo e in loc. Arola - Monticelli	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro		0	0	0	191,65	0	191,65	100	
2018PRMA0129	Installazione misuratori non precedentemente censiti e in punti nodali della rete acquedotto	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	60.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0	0	0	-100	ANNULLATO
2018PRMA0130	Rinnovo delle reti idriche nei centri abitati	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	100.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	191,65	0	191,65	-98	Progettazione esecutiva in corso. Ritardo dovuto alla carente conoscenza delle rete e georeferenziazione degli impianti ancora da completare
2018PRMA0131	Installazione misuratori non precedentemente censiti e in punti nodali della rete acquedotto	ACQUEDOTTO	Varano de' Melegari	30.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0	0	0	-100	ANNULLATO

					PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.8 del 11 maggio 2018, revisionato con delibera n. 4 del 15 gennaio 2020					CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2018PRMA0132	VDM74D - Costruzione impianto di depurazione loc. Vianino	DEPURAZIONE	Varano de' Melegari		0	0	0	0	0	0	0	
2018PRMA0133	Manutenzione straordinaria acquedotti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	1.000.000,00	220.000,00	0	220.000,00	318.844,62	0	318.844,62	44	Lo scostamento è dovuto a maggiori lavori imprevisi verificatisi sugli impianti in gestione
2018PRMA0134	Manutenzioni straordinarie fognature	FOGNATURA	Opere pluricomunali		60.000,00	0	60.000,00	42.051,53	0	42.051,53	-29	Scostamento dovuto ai ribassi in fase di affidamento lavori e a economie realizzate in fase esecutiva
2018PRMA0135	Manutenzione straordinaria depuratori	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali		100.000,00	0	100.000,00	92.118,33	0	92.118,33	-7	Scostamento dovuto ai ribassi in fase di affidamento lavori e a economie realizzate in fase esecutiva
2018PRMA0136	Manutenzioni straordinarie acque bianche	ACQUE BIANCHE	Opere pluricomunali		20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	-100	Nessun intervento si è reso necessario
2018PRMA0137	* Lavori di rifacimento fognatura via Lungo Taro Imbriani	FOGNATURA	Borgo Val di Taro	62.000,00	0	0	0	7.300,00	0	7.300,00	100	Ritardo dovuto all'ottenimento dell'allacciamento alla rete ENEL e all'autorizzazione ad eseguire lavori in strada provinciale
2019PRMA0138	Interventi Emergenza Idrica 2017 - OCDPC 468/2017	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		0	0	0	1.265.174,35	1.265.174,35	0	100	Opere interamente finanziate dalla Protezione Civile
2020PRMA0141	3MD- Adeguamento impianto di trattamento Noveglia	DEPURAZIONE	Bardi	12.000,00	12.000,00	0	12.000,00	11.360,53	0	11.360,53	-5	Scostamento dovuto ai ribassi in fase di affidamento lavori e a economie realizzate in fase esecutiva
2020PRMA0145	Rinnovo delle reti idriche e dei serbatoi a servizio delle località Custi, Momarola e altre minori	ACQUEDOTTO	Bedonia	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00	18.893,47	0	18.893,47	-24	Scostamento dovuto ai ribassi in fase di affidamento lavori e a economie realizzate in fase esecutiva
2020PRMA0152	Interconnessione agglomerato di Monticelli (APR0157) con l'agglomerato di Borgo Val di Taro Capoluogo (APR0028) attraverso	DEPURAZIONE	Borgo Val di Taro	90.000,00	90.000,00	0	90.000,00	4.511,68	0	4.511,68	-94	Intervento concluso nell'anno successivo poiché pareri e nulla osta arrivati in ritardo
2020PRMA0160	Adeguamento impianto elettrico a servizio stazione di sollevamento acquedotto Tebaldi-Monte Croce	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	191,65	0	191,65	-99	Lavori affidati al termine del 2019, saranno completati nell'anno successivo
2020PRMA0162	PP140 - Sostituzione ed adeguamento impianto elettrico depuratore di Pellegrino Capoluogo	DEPURAZIONE	Pellegrino Parmense	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	-100	Ritardo dovuto alla carente e non completa conoscenza dell'impianto di depurazione



**PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI  
PARMA n.8 del 11 maggio 2018, revisionato con delibera n. 4 del 15  
gennaio 2020**

**CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2020PRMA0166	Lavori di rifacimento tratti di condotte fognarie nelle località Selva Grossa, Ca* Sana e Boschi Bardone	FOGNATURA	Terenzo	35.000,00	35.000,00	0	35.000,00	15.234,34	0	15.234,34	-56	Scostamento dovuto ai ribassi in fase di affidamento lavori e a economie realizzate in fase esecutiva
2020PRMA0169	Sistemi di contabilizzazione acqua sugli allacciamenti utenze delle frazioni di Santa Maria del Taro, Casale, Tornolo Capoluogo, Tarsogno e zone limitrofe	ACQUEDOTTO	Tornolo	440.000,00	88.000,00	0	88.000,00	5.026,90	0	5.026,90	-94	Difficoltà nel reperire le autorizzazioni da parte dei proprietari e utenti
2020PRMA0174	Lavori collettamento reflui di Varano Capoluogo, di Piani di Riva e delle località limitrofe al depuratore di Rubbiano e contestuale dismissione del depuratore del capoluogo	DEPURAZIONE	Varano de' Melegari	280.000,00	75.000,00	0	75.000,00	5.139,96	0	5.139,96	-93	Lavori conclusi nell'anno successivo a causa di imprevisti in fase progettuale che hanno richiesto modifiche al progetto esecutivo delle opere strutturali ed elettromeccaniche
2020PRMA0177	Nuovo sistema di controllo della torbidità sull'acquedotto della loc. Peracchi con impianto alimentato da pannelli fotovoltaici	ACQUEDOTTO	Varsi	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	9.291,65	0	9.291,65	-7	Scostamento dovuto ai ribassi in fase di affidamento lavori e a economie realizzate in fase esecutiva
2020PRMA0180	Installazione di nuovi impianti di disinfezione per acqua potabile alimentati con energia elettrica per il miglioramento della qualità dell'acqua erogata	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	50.000,00	15.000,00	0	15.000,00	37.099,98	0	37.099,98	147	Adeguamento delibera ARERA 917/2017 - Macroindicatore M3 - Qualità acqua erogata. Intervento cumulativo interventi 2014PRMA0008 (Bardi), 2014PRMA0013 (Bedonia) e altri Comuni. Il maggior costo a consuntivo è dovuto alle non conformità
2020PRMA0181	"Ricerca nuove fonti di approvvigionamento idrico per impinguamento degli acquedotti. Loc. Pontremoli (Varsi), Rubbiano	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	50.000,00	20.000,00	0	20.000,00	5.318,25	0	5.318,25	-73	Intervento concluso nell'anno successivo poiché RER in ritardo nel rilascio della Concessione di derivazione pozzo
2020PRMA0184	Investimenti di struttura *	TUTTI	Opere pluricomunali		148.424,00	0	148.424,00	53.074,09	0	53.074,09	-64	
2020PRMA0185	Realizzazione di centralina idroelettrica da 99KW per recupero energetico su acquedotto Nola-Frasso, finalizzato alla riduzione dei costi energetici e a beneficio esclusivo del S.I.I.	TUTTI	Opere pluricomunali	414.606,00	22.900,00	0	22.900,00	430.917,16	0	430.917,16	1781	Nel 2018 erano ancora in corso le operazioni di collaudo della centrale, poi completate ad inizio 2019
2020PRMA0187	Installazione di impianto di gassificazione fanghi/cippato per la disidratazione dei fanghi con produzione di energia elettrica. Potenza 27 KW, finalizzato alla riduzione dei costi energetici e a beneficio esclusivo del S.I.I.	TUTTI	Opere pluricomunali	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	-100	Intervento realizzato, manca la messa in funzione. Rendicontato nel 2018 con codice ARSI 2016PRMA0102

					PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n.8 del 11 maggio 2018, revisionato con delibera n. 4 del 15 gennaio 2020					CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2019	Contributi pianificati 2019	Importo netto pianificato 2019	Importo lordo consuntivo 2019	Contributi consuntivo 2019	Importo netto consuntivo 2019	Scostamento	Note giustificative
2020PRMA0188	Acquisizione, adeguamento e messa in funzione di 4 impianti fotovoltaici in Comune di Fornovo: Campo sportivo Riccò (KW 14,26), Serbatoio Casa Tebaldi (KW 10,81), Scuola Materna P.zza Libertà (KW 28,6), Condominio ACER Riccò (KW 13,57). Interventi finalizzati alla riduzione dei costi energetici e a beneficio esclusivo del S.I.I.	TUTTI	Opere pluricomunali	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	-100	Fatture non caricate su ARSI perché il codice 2020PRMA0188 non era ancora stato creato. Le fatture verranno caricate adesso. Importo fatture € 12.850 (ENFOR-ISVEGI) + € 1.285 (ISVEGI)
<b>IMPORTO TOTALE:</b>					<b>1.925.324 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>1.815.324 €</b>	<b>3.106.952 €</b>	<b>1.265.174 €</b>	<b>1.841.778 €</b>		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 16 del 4 dicembre.2020

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato – Gestore MONTAGNA 2000. Approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2019. Programma Operativo Interventi 2015 – 2019**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Bologna, 4 dicembre 2020

Il Direttore  
Responsabile ad interim  
Area Servizio Idrico Integrato  
F.to Ing. Vito Belladonna



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma

F.to Tiziana Benassi

Il segretario verbalizzante

F.to Mario Ori

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 25 marzo 2021

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna
