

CLPR/2021/7 del 14 ottobre 2021

**CONSIGLIO LOCALE di PARMA**

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.A. Programma Operativo Interventi 2020-2023. Approvazione Consuntivo 2020**

IL COORDINATORE  
Tiziana Benassi

### CONSIGLIO LOCALE di PARMA

L'anno **2021** il giorno **14** del mese di **Ottobre** alle ore 14.00 si è riunito il Consiglio Locale di Parma convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/9113 del 08/10/2021.

La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle *“Linee Guida temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza dell'emergenza epidemiologica COVID 19”*, approvate dal Consiglio di Ambito con deliberazione n.13 del 14/04/2020.

Assume la presidenza il Coordinatore Tiziana Benassi.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBARETO	Davide Riccoboni	Sindaco	SI	0,6148
BARDI			NO	0,6474
BEDONIA			NO	0,8900
BERCETO			NO	0,6108
BORE			NO	0,3560
BORGO VAL DI TARO	Marco Moglia	Sindaco	SI	1,5832
BUSSETO			NO	1,5392
CALESTANO			NO	0,5898
COLLECCHIO	William Pietralunga	Assessore	SI	2,8373
COLORNO	Cristiano Vecchi	Consigliere	SI	1,8949
COMPIANO	Francesco Mariani	Sindaco	SI	0,4172
CORNIGLIO	Giuseppe Delsante	Sindaco	SI	0,5830
FELINO			NO	1,8383
FIDENZA	Franco Amigoni	Assessore	SI	5,0409
FONTANELLATO	Corrado Modernelli	Consigliere	SI	1,5241
FORTEVIVO			NO	1,2332
FORNOVO DI TARO	Michela Zanetto	Sindaco	SI	1,3779
LANGHIRANO			NO	2,0586
LESIGNANO DE' BAGNI			NO	1,1064
MEDESANO	Michele Giovanelli	Sindaco	SI	2,2252
MONCHIO DELLE CORTI			NO	0,3912
MONTECHIARUGOLO			NO	2,1909

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
NEVIANO DEGLI ARDUINI			NO	0,9040
NOCETO			NO	2,6122
PALANZANO			NO	0,4253
PARMA	Tiziana Benassi	Assessore	SI	33,5372
PELLEGRINO PAR.SE	Alberto Canepari	Sindaco	SI	0,4066
POLESINE - ZIBELLO			NO	0,8390
ROCCABIANCA	Alessandro Gattara	Sindaco	SI	0,7861
SALA BAGANZA			NO	1,2263
SALSOMAGGIORE TERME	Marco Trevisan	Assessore e delegato CAMB	SI	3,9008
S. SECONDO PAR.SE			NO	1,2504
SISSA TRECASALI			NO	1,7189
SOLIGNANO			NO	0,5474
SORAGNA	Matteo Concari	Consigliere	SI	1,1278
SORBOLO MEZZANI	Marco Comelli	Consigliere	SI	2,6651
TERENZO			NO	0,4310
TIZZANO VAL PARMA			NO	0,6050
TORNOLO			NO	0,4134
TORRILE			NO	1,6179
TRAVERSETOLO			NO	1,9622
VALMOZZOLA			NO	0,3120
VARANO DE' MELEGARI	Giuseppe Restiani	Sindaco	SI	0,7141
VARSÌ	Angelo Peracchi	Sindaco	SI	0,4473
PROVINCIA DI PARMA	Giuseppe Delsante	Consigliere prov.le e vice presidente	SI	10,0000

**Presenti n. 19, quote 71,6834**

**Assenti n. 26, quote 28,3166**

Riconosciuta la validità della seduta Tiziana Benassi, in qualità di Coordinatore, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.A. Programma Operativo Interventi 2020-2023. Approvazione Consuntivo 2020**

**Vista** la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato che:**

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’Ambito la funzione di approvazione dei piani d’ambito;

**considerato che:**

- con deliberazione n.6 del 15 gennaio 2020 del Consiglio locale di Parma è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore Iren S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d’Ambito;
- con deliberazione n.57 del Consiglio d’Ambito 11 dicembre 2020 sono state approvate le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Parma, Piacenza e Reggio Emilia gestiti da IREN S.p.A. e dalla partecipata IRETI S.p.A.;
- con deliberazione n.3 del 22 marzo 2021 del Consiglio d’Ambito è stato approvato l’aggiornamento del Piano d’Ambito del bacino territoriale di Parma;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’Ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 inoltre dispone che:
  - entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
  - il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
  - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all’anno (N-1);
  - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

**dato atto che:**

- il gestore Iren S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2020 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata ai Comuni interessati in allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale;

**rilevato** che i dati presentati relativi all'annualità 2020 sono stati analizzati e sintetizzati nell'Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:

- interventi non avviati;
- interventi anticipati/conclusi;
- interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 2020 - 2023 vigente - annualità 2020, autorizzati con nulla osta ai sensi della CAMB 75/2017;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al +/- 20%;

**rilevato che:**

- gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore, esclusi gli investimenti di struttura, rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 approvato per l'annualità 2020;
- è stata effettuata un'analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore del +/- 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

**ritenuto** pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 come indicato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**dato atto** che il verbale della seduta è depositato agli atti.

**posta** quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti favorevoli 17 (quote 68,5761), astenuti 2 (quote 3,10723), o contrari, resi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 per il gestore Iren S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

\*\*\*\*\*



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 7 del 14/10/2021

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.A. Programma Operativo Interventi 2020-2023. Approvazione Consuntivo 2020.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Bologna, 14/10/2021

La Dirigente  
Area Servizio idrico Integrato  
Ing. Marialuisa Campani



Allegato n.1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Parma n.7 del 14.10.2021

---

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA  
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato  
Consuntivo investimenti annualità 2020  
Gestore: IREN S.p.A. (PR)**

**14 ottobre 2021**



## RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2020, del Programma Operativo Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.6 del 15 gennaio 2020, che il gestore IREN S.p.A. ha presentato tramite il software ARSI.

	PIANIFICATO 2020	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2020	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 19.985.625	<b>+ € 2.381.070</b>	€ 22.366.695	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributi Pianificati esclusi gli Investimenti di Struttura [B]	€ 642.317	<b>-€ 8.706</b>	€ 633.611	Importo Contributi a Consuntivo esclusi gli in- vestimenti di Struttura[B]
Importo Netto Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]-[B]	€ 19.343.308	<b>+ € 2.389.777</b>	€ 21.733.085	Importo Netto a Consuntivo esclusi gli In- vestimenti di Struttu- ra[A]-[B]


**Tab.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020**

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IREN S.p.A. abbia effettuato maggiori investimenti rispetto alla pianificazione approvata, esclusi gli Investimenti di Struttura.

Precisamente maggiori investimenti netti per complessivi + €. 2.389.777 e maggiori investimenti lordi per complessivi + €. 2.381.070 a fronte di minori contributi incassati per complessivi - €. 8.706 rispetto a quanto pianificato.


La percentuale degli investimenti realizzati dal Gestore rispetto agli investimenti pianificati per l'annualità 2020 con riferimento all'importo lordo, esclusi gli investimenti di struttura, è pari a 112%.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

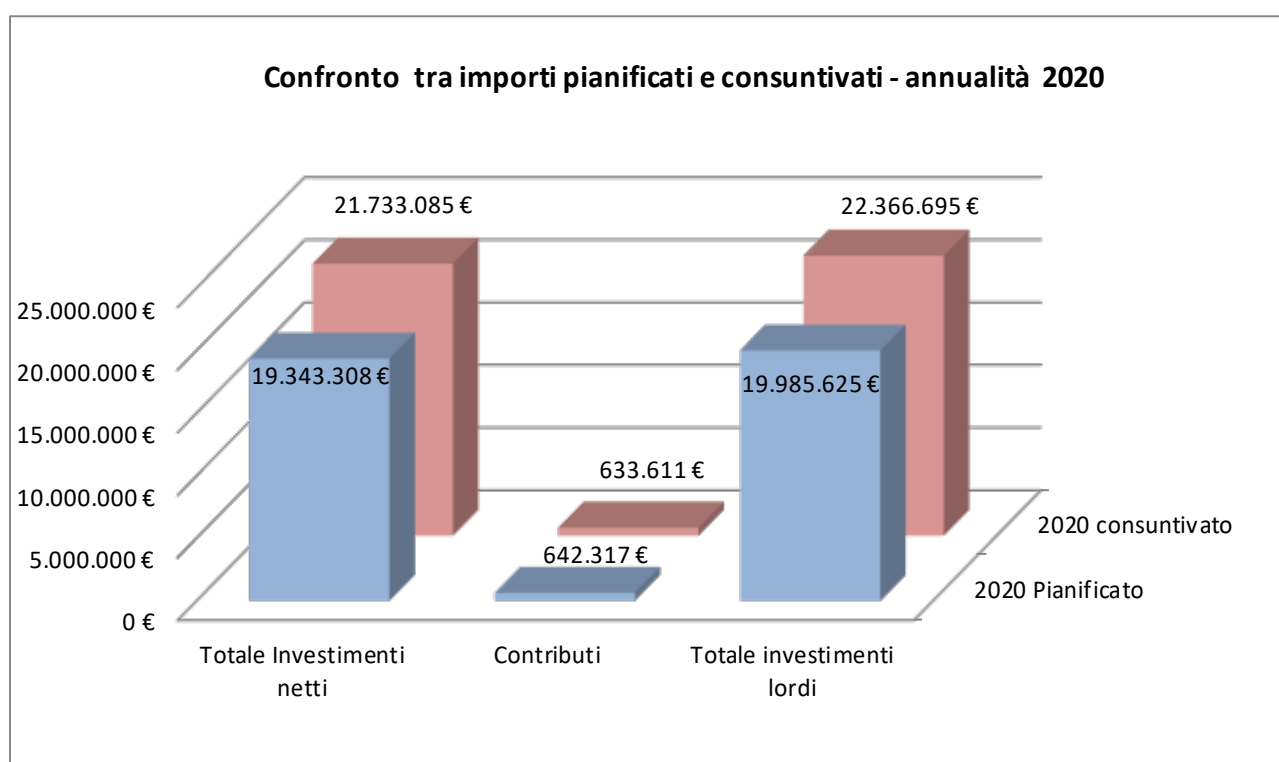

**Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020**

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2020 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

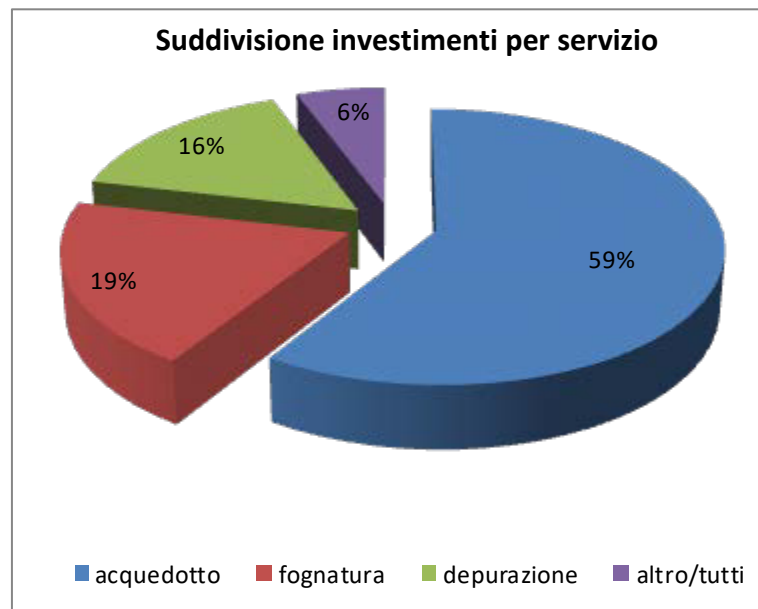


**Fig.2 –Suddivisione investimenti 2020 per servizio**

Nella tabella e nel grafico che seguono è riportato il numero degli interventi raggruppati sulla base degli scostamenti verificati e la rappresentazione grafica con indicazione della percentuale di ciascuna categoria rapportata al totale:

Interventi non iniziati (-100%)	29
interventi eseguiti anticipatamente o code di interventi (+100%)	34
Interventi con scostamento superiore a + o - 20%	45
interventi con scostamento inferiore a + o - 20%	5

**Tab.2– Interventi che presentano scostamento tra pianificato e quanto rendicontato**

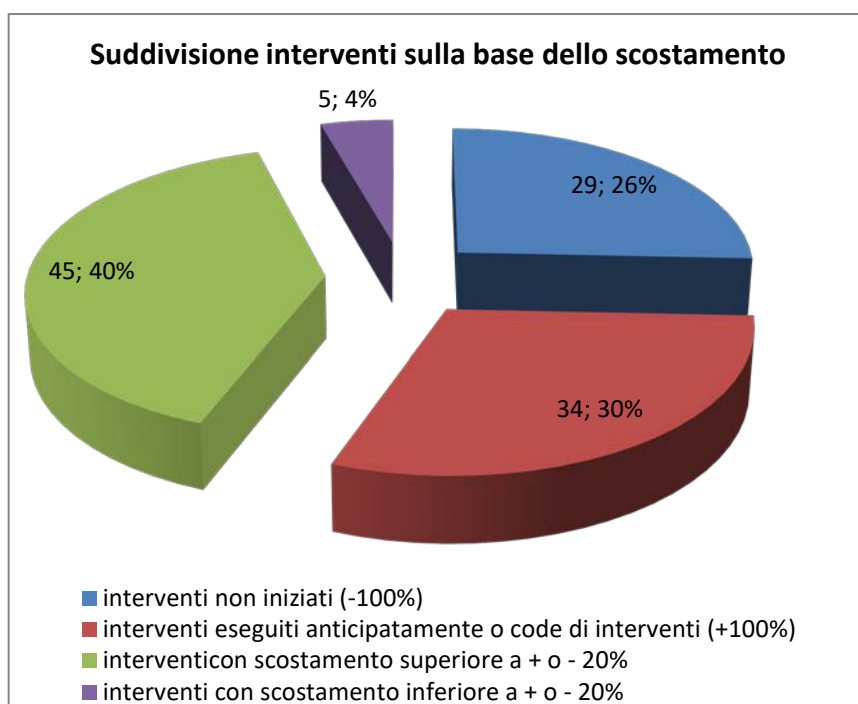

**Fig.3 –Interventi realizzati nell'annualità 2020 suddivisi per scostamento**

Dalla tabella sopra riportata e dal relativo grafico risulta che per l'annualità 2020, n.29 interventi, che erano stati programmati per complessivi €. 2.505.000, non sono stati avviati (scostamento pari a -100%), (per l'elenco si veda la Tab. 4), per i quali la giustificazione è risultata esaustiva (Allegato 1).

Il Gestore ha avviato anticipatamente oppure chiuso prima rispetto a quanto programmato n.34 interventi e n.45 interventi, esclusi gli investimenti di struttura, hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno, e per i quali la giustificazione fornita è risultata esaustiva. Per n.5 interventi lo scostamento è inferiore al +/- 20% e quindi non passibile di giustificazione.

### RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o meno e il relativo provvedimento che ATERSIR intende eventualmente adottare, esclusi gli investimenti di struttura.

Numero di interventi programmati nel 2020 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 79

Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2020: 84

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2020	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2020	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	29	€ 0	€ 2.505.000	NO	Vedi TAB.L, 2 e 4 e Fig. 3. Vedi il dettaglio in ALLEGATO 1	
Interventi con avvio anticipato nel 2020 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito (+100%)	34	€ 2.427.988	€0	NO	2014PRIA0009 2014PRIA0013 2014PRIA0015 2014PRIA0016 2014PRIA0026 2014PRIA0038 2014PRIA0040 2014PRIA0056 2014PRIA0058 2014PRIA0063 2014PRIA0068 2014PRIA0071 2014PRIA0074 2014PRIA0077 2014PRIA0091 2014PRIA0092 2014PRIA0093 2014PRIA0094 2016PRIA0111 2016PRIA0126 2016PRIA0131 2016PRIA0149 2016PRIA0155 2018PRIA0161 2018PRIA0162 2018PRIA0163 2018PRIA0164 2019PRIA0167 2020PRIA0170 2020PRIA0171 2020PRIA0184 2020PRIA0194 2020PRIA0202 2020PRIA0204	

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2020	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2020	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	45	€ 19.400.158	€ 16.890.625	NO	2014PRIA0001 2014PRIA0005 2014PRIA0006 2014PRIA0008 2014PRIA0012 2014PRIA0014 2014PRIA0020 2014PRIA0023 2014PRIA0029 2014PRIA0032 2014PRIA0037 2014PRIA0039 2014PRIA0042 2014PRIA0051 2014PRIA0052 2014PRIA0055 2014PRIA0059 2014PRIA0061 2014PRIA0062 2014PRIA0065 2014PRIA0075 2014PRIA0083 2014PRIA0084 2014PRIA0086 2014PRIA0095 2014PRIA0096 2014PRIA0097 2014PRIA0098 2014PRIA0099 2014PRIA0100 2014PRIA0104 2014PRIA0105 2016PRIA0108 2016PRIA0114 2016PRIA0121 2016PRIA0125 2016PRIA0135 2018PRIA0160 2019PRIA0166 2020PRIA0176 2020PRIA0177 2020PRIA0182 2020PRIA0214 2020PRIA0217 2020PRIA0220	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	5	€ 538.549	€ 590.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA	2014PRIA0024 2014PRIA0102 2014PRIA0103 2016PRIA0130 2020PRIA0219	

**Tab.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato**

Si specifica che è stato aperto il cod. 2020PRIA0220 che non era previsto nel POI 2020-2023 approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.6/2020, autorizzato con nulla osta ai sensi della CAMB 75/2017 e relativo all'”Adeguamento edile e funzionale del pozzo per acque potabile Joker” in comune di Langhirano.

Gli interventi pianificati e non realizzati, con scostamento -100% sono n. 29 e sintetizzati nella tabella che segue:

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2020
2014PRIA0002	154EN - Completamento rete adduttrici di collegamento, dorsale torrente Enza	ACQUEDOTTO	Montechiarugolo, Traversetolo, Parma, Neviano degli Arduini	2.000.000,00	50.000,00
2014PRIA0025	155EN - Potenziamento condotta Molino Cozzano Langhirano e ampliamento trattamento acque	ACQUEDOTTO	Langhirano, Felino, Lesignano de Bagni	1.450.000,00	100.000,00
2014PRIA0033	21IAG - Nuova Captazione Ceno Accordo Barilla-ATO-IREN	ACQUEDOTTO	Collecchio, Noceto, Medesano	2.500.000,00	50.000,00
2014PRIA0041	26IAG - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione sorgenti Navert	ACQUEDOTTO	Monchio delle Corti	200.000,00	200.000,00
2014PRIA0078	59IAG - Zona Martorano strada S.Anna, str. Borghetto, str. S.Cosimo, str. Quingenti - estendimento fognatura - opera comp. A7	FOGNATURA	Parma	1.000.000,00	50.000,00
2014PRIA0085	65IAG - Studio degli acquiferi e relativa modellazione per governo problema nitrati Acquedotti Parma e comuni limitrofi.	ACQUEDOTTO	Parma	20.038,00	25.000,00
2014PRIA0090	69IAG - Nuova condotta adduttrice San Vitale serbatoio Torre del Boriano	ACQUEDOTTO	Sala Baganza		50.000,00
2014PRIA0101	77IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali, Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Fontevivo, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Parma, Sala Baganza, Sorbolo, Tizzano Val Parma, Traversetolo, Palanzano	330.000,00	50.000,00
2014PRIA0106	80IAG - Interventi di ripristino serbatoi acqua - Ristrutturazione edile e idraulica dei serbatoi a servizio dell'acquedotto compresi adeguamenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		100.000,00

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2020
2014PRIA0107	81IAG - Interventi di ripristino sorgenti area montagna - Opere per nuove sorgenti e manutenzione straordinaria delle sorgenti esistenti a servizio dell'acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		50.000,00
2016PRIA0133	73IAG - Collettamento zona Mazzabue al depuratore di M. I. (opera compensazione A7)	FOGNATURA	Mezzani	150.000,00	50.000,00
2016PRIA0157	sistemazione tratti di collettori fognari interessati da movimenti franosi nelle seguenti località: Capoluogo; Carpaneto; Reno di TIZZANO; Capriglio; Pianestolla, Boschetto, Pietta e Groppo.	FOGNATURA	Tizzano Val Parma	500.000,00	100.000,00
2019PRIA0165	Adeguamento Sistema Depurativo loc. Bannone	DEPURAZIONE	Traversetolo	350.000,00	250.000,00
2020PRIA0173	Ampliamento campo pozzi Vignale	ACQUEDOTTO	Traversetolo	125.000,00	20.000,00
2020PRIA0175	Manutenzione straordinaria acque meteoriche	FOGNATURA	Opere pluricomunali		150.000,00
2020PRIA0179	Nuova fognatura Case Rosi Fontevivo per razionalizzare gli scarichi in sostituzione della fossa Imhoff esistente	FOGNATURA	Fontevivo	200.000,00	10.000,00
2020PRIA0181	Progetto e realizzazione sistema di rilevamento attivazione scolmatori di piena Parma e Provincia	FOGNATURA	Opere pluricomunali	800.000,00	100.000,00
2020PRIA0183	Progetto riduzione fanghi depuratore Parma EST	DEPURAZIONE	Parma	350.000,00	20.000,00
2020PRIA0187	Ristrutturazione linea trattamento aria al depuratore Parma EST	DEPURAZIONE	Parma	150.000,00	150.000,00
2020PRIA0191	Installazione gruppo elettrogeno dep Traversetolo capoluogo e rifacimento quadro elettrico	DEPURAZIONE	Traversetolo	120.000,00	60.000,00
2020PRIA0192	Installazione gruppo elettrogeno al depuratore di Medesano capoluogo	DEPURAZIONE	Medesano	60.000,00	60.000,00
2020PRIA0193	Copertura digestori Parma OVEST	DEPURAZIONE	Parma	150.000,00	150.000,00
2020PRIA0199	Adeguamento tecnico e funzionale del telecontrollo di Medesano	ACQUEDOTTO	Medesano	175.000,00	20.000,00
2020PRIA0200	Manutenzione straordinaria edile e idraulica della centrale idrica Centolance	ACQUEDOTTO	Noceto	225.000,00	50.000,00

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo pro- gettuale	Importo lordo pianificato 2020
2020PRIA0201	Manutenzione straordinaria degli impianti di disinfezione a biossido servizio del comune di Parma (Marore, Firenze e altri)	ACQUEDOTTO	Parma	30.000,00	10.000,00
2020PRIA0207	Manutenzione straordinaria dei pozzi a servizio dell'acquedotto	ACQUEDOTTO	Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Sala Baganza, Traversetolo		100.000,00
2020PRIA0208	Nuove installazioni e manutenzioni straordinarie degli impianti di disinfezione a servizio dell'acquedotto	ACQUEDOTTO	Collecchio, Felino, Medesano, Montechiarugolo, Noceto, Sala Baganza, Traversetolo		50.000,00
2020PRIA0209	Potenziamento del sistema acquedottistico della località Bassa e della frazione Rivalta	ACQUEDOTTO	Lesignano de Bagni	900.000,00	400.000,00
2020PRIA0211	Studi di fattibilità e modellazioni	TUTTI	Opere pluricomunali		30.000,00

**Tab.4 – Interventi pianificati ma non avviati**

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n. 6 del 15/01/2020				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento %	Note giustificative
2014PRIA0001	153EN - Razionalizzazione ovvero potenziamento delle captazioni torrente Enza	ACQUEDOTTO	Neviano degli Arduini, Montechiarugolo, Traversetolo, Parma	1.000.000	100.000	0	100.000	20.999	0	20.999	-79	Computati costi progettazione, tempi lunghi acquisizione area
2014PRIA0002	154EN - Completamento rete adduttrici di collegamento, dorsale torrente Enza	ACQUEDOTTO	Montechiarugolo, Traversetolo, Parma, Neviano degli Arduini	2.000.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100	Progettazione iniziata a fine anno, i costi saranno computati nel 2021
2014PRIA0034	145EN - Nuova Captazione fiume Taro impianto trattamento; condotta interconnessione acquedotti	ACQUEDOTTO	Medesano, Fontevivo, Parma, Noceto	5.480.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRIA0059	41IAG - Nuova centrale idrica Roncopascolo con vasche accumulo permeato e miscelato e impianto trattamento nitrati (risoluzione problema Nitrati)	ACQUEDOTTO	Parma	5.350.000	100.000	0	100.000	68.756	0	68.756	-31	Minori costi realizzazione Pozzo
2014PRIA0060	42IAG - Nuova Condotta collegamento campo pozzi Roncopascolo con Parma Cornocchio (risoluzione problema Nitrati)	ACQUEDOTTO	Parma	2.330.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRIA0061	43IAG - Adeguamento depuratore Corcagnano	DEPURAZIONE	Parma	2.400.000	200.000	0	200.000	45.531	0	45.531	-77	Saldo attività progettuali e appalto opera
2014PRIA0062	44IAG - Collettamento Baganzola e depuratore Parma Ovest	DEPURAZIONE	Parma	1.500.000	50.000	0	50.000	34.353	0	34.353	-31	CAMB 75 Franchigia < 20.000- Scostamento < 100%
2014PRIA0063	45IAG - Sistemazione rete fognaria Corcagnano nord fra depuratore e Parma	FOGNATURA	Parma	1.991.000	0	0	0	1.819	0	1.819	100	In ritardo con ottenimento autorizzazioni progetto
2014PRIA0064	105EN - Manutenzione straordinaria elettromeccanica digestori PR ovest	DEPURAZIONE	Parma	131.151	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRIA0065	46IAG - Manutenzione straord. depuratore Parma EST con adeguamento prescrizioni nuova autorizzazione e DGR 286/2005 acque di prima pioggia	DEPURAZIONE	Parma	480.000	200.000	0	200.000	3.422	0	3.422	-98	Ritardo dovuto alla scelta progettuale da attuare condivisa con il gestore dell'impianto. Iniziativa progettazione esecutiva, realizzazione nel 2021
2014PRIA0067	48IAG - Sostituzione condotte idriche sottopasso ferroviario PR-SP via Emilia OVEST con DN 400	ACQUEDOTTO	Parma	425.138	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRIA0068	49IAG - Nuova condotta idrica DN 400 via Reggio; strada Baganzola; pozzo Cornocchio per risoluzione problema nitrati	ACQUEDOTTO	Parma	470.000	0	0	0	1.343	0	1.343	100	Rivisitazione progetto in corso
2014PRIA0071	52IAG - Estendimento fognatura Via Argini	FOGNATURA	Parma	2.000.000	0	0	0	8.979	0	8.979	100	Code cantiere
2014PRIA0074	55IAG - Zona Vicopò via Principale Beneceto, via Naviglia - estendimento fognatura	FOGNATURA	Parma	400.000	0	0	0	360	0	360	100	Code anni precedenti
2014PRIA0075	56IAG - Via Cava Vigatto, estendimento fognatura	FOGNATURA	Parma	100.000	100.000	0	100.000	5.333	0	5.333	-94	Indagine ricognitiva degli scarichi esistenti si è protratta più del dovuto itardando la progettazione, esecuzione 2021
2014PRIA0077	58IAG - Zona Viarolo via Lugagnano, estendimento fognatura	FOGNATURA	Parma	470.000	0	0	0	67.434	0	67.434	100	Lavori in corso. Rendicontazione secondo avanzamento cantiere
2014PRIA0078	59IAG - Zona Martorano strada S.Anna, str. Borghetto, str. S.Cosimo, str. Quingenti - estendimento fognatura - opera comp. A7	FOGNATURA	Parma	1.000.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100	Ritardo dovuto ai tempi di gara svolti per l'incarico di progettazione opere fognarie e per attivazione contratti relativamente al secondo stralcio dei lavori



				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n. 6 del 15/01/2020				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento %	Note giustificative
2014PRIA0083	95EN - Progetti distrettualizzazione rete idrica	ACQUEDOTTO	Parma	985.966	25.000	0	25.000	691.475	0	691.475	2665	Nonostante i miglioramenti ottenuti dal lavoro svolto negli ultimi 5 anni, le dispersioni di Parma hanno valori ancora considerevoli. Pertanto, nel corso del 2020, c'è stata l'esigenza di accelerare sul completamento della distrettualizzazione: il metodo che ci permette di monitorare permanentemente ed in modo selettivo il livello di perdite di ogni singola area. Il 2020 ha visto anche alcune situazioni particolarmente favorevoli, quali: la buona disponibilità delle imprese (molte delle grandi opere erano ferme a causa della pandemia), ma anche il traffico veicolare estremamente ridotto, permettendoci di lavorare agevolmente su strada con pose di camerette ed attrezzature. Gli effetti dei lavori eseguiti in termini di nuovi distretti e gestione puntuale delle pressioni, uniti alle attività di ricerca e riparazione delle dispersioni, stanno già iniziando a dare risultati concreti già a partire dai primi mesi del 2021.
2014PRIA0084	64IAG - Nuovo pozzo Cornocchio (risoluzione problema Nitrati)	ACQUEDOTTO	Parma	110.000	100.000	0	100.000	7.029	0	7.029	-92	Code lavori anno precedente per chiusura cantiere.
2014PRIA0085	65IAG - Studio degli acquiferi e relativa modellazione per governo problema nitrati Acquedotti Parma e comuni limitrofi.	ACQUEDOTTO	Parma	20.038	25.000	0	25.000	0	0	0	-100	Costi scaricati in 2014PRIA0059
2014PRIA0087	146EN - Ultimazione condotte campo Pozzi Roncopascolo e realizzazione tratti di interconnessione al fine di utilizzare la risorsa di Roncopascolo nei comuni limitrofi e viceversa	ACQUEDOTTO	Parma, Fontevivo, Noceto	936.180	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRIA0104	143EN - Estendimento reti acquedotto con contributo ripartito tra comuni e privati.	ACQUEDOTTO	Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza		50.000	25.000	25.000	1.114	5.540	-4.426	-97	Lavori in funzione delle richieste ricevute dai comuni
2014PRIA0105	144EN - Estendimento reti fognarie con contributo comuni/privati.	FOGNATURA	Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza		50.000	25.000	25.000	80.079	0	80.079	60	Lavori in funzione delle richieste ricevute dai comuni
2016PRIA0111	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Naviglio (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	125.000	0	0	0	335.593	0	335.593	100	Code lavori 2019
2016PRIA0112	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Galasso (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	120.000	0	0	0	0	0	0	0	
2016PRIA0113	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Abbeveratoia (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
2016PRIA0114	progettazione e realizzazione interventi di manutenzione impianti sollevamento acque bianche sottopassaggio (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	280.000	40.000	0	40.000	502	0	502	-98	Non sono state rilevate necessità di intervento nel corso del 2020

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n. 6 del 15/01/2020				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento %	Note giustificative
2016PRIA0118	verifiche per adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori Savani - D'Azeglio e Bernini (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
2016PRIA0121	progettazione e realizzazione paratoia su fognatura in piazzale Fiume in uscita dall'attraversamento torrente Baganza (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	100.000	50.000	0	50.000	224.801	0	224.801	349	Code lavori 2019
2016PRIA0126	75IAG - Nuovo collegamento idrico Strada Croce Dei Morti e località Casaltone (opera compensativa A7)	ACQUEDOTTO	Sorbolo, Parma	400.000	0	0	0	205.285	0	205.285	100	Code lavori 2019
2016PRIA0147	adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena Baganzale - Abbeveratoia (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
2016PRIA0148	adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori via Solari - via Bixio canale Naviglio Taro (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
2016PRIA0149	adeguamento idraulico e strutturale collettori e scolmatori di piena collettori via Sidoli - via Casa Bianca (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	480.000	0	0	0	417	0	417	100	Code anni precedenti
2016PRIA0155	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana strada Bassa dei Folli Porporano (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	50.000	0	0	0	3.347	0	3.347	100	Anticipo attività progettuali
2018PRIA0163	Sostituzione reti idriche fugganti zona Passo del Bocco	ACQUEDOTTO	Parma	300.000	0	0	0	142.019	0	142.019	100	Contabilizzazioni in funzione dell'avanzamento cantiere
2020PRIA0178	Rifacimento fognatura camminabile Via Solari tra Piazzale Fiume e Piazzale Barbieri	FOGNATURA	Parma	500.000	0	0	0	0	0	0	0	
2020PRIA0183	Progetto riduzione fanghi depuratore Parma EST	DEPURAZIONE	Parma	350.000	20.000	0	20.000	0	0	0	-100	Avviate attività propedeutiche alla progettazione
2020PRIA0184	Rifacimento disinfezione depuratore Parma OVEST	DEPURAZIONE	Parma	200.000	0	0	0	78	0	78	100	Eseguiti sopralluoghi
2020PRIA0185	Rifacimento letti di drenaggio bottini e piazzole fanghi depuratore Parma OVEST	DEPURAZIONE	Parma	500.000	0	0	0	0	0	0	0	
2020PRIA0186	Nuovo accumulo fanghi biologici depuratore Parma OVEST	DEPURAZIONE	Parma	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
2020PRIA0187	Ristrutturazione linea trattamento aria al depuratore Parma EST	DEPURAZIONE	Parma	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	-100	Intervento posticipato per subentrare altre priorità di intervento sul depuratore stesso
2020PRIA0188	Installazione sistemi cicli alternati al depuratore Parma OVEST	DEPURAZIONE	Parma	400.000	0	0	0	0	0	0	0	
2020PRIA0189	Installazione sistemi cicli alternati al depuratore Parma EST	DEPURAZIONE	Parma	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
2020PRIA0193	Copertura digestori Parma OVEST	DEPURAZIONE	Parma	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	-100	Ritardo progettazione per valutazioni su effettiva tipologia intervento (ristrutturazione o demolizione e ricostruzione)
2020PRIA0196	Pretrattamento fanghi biologici Parma OVEST	DEPURAZIONE	Parma	250.000	0	0	0	0	0	0	0	
2020PRIA0201	Manutenzione straordinaria degli impianti di disinfezione a biossido servizio del comune di Parma (Marore, Firenze e altri)	ACQUEDOTTO	Parma	30.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100	Interventi realizzati secondo necessità
2020PRIA0202	Manutenzione straordinaria idraulica della Centrale Idrica di Marore con nuova impermeabilizzazione della vasca di stoccaggio e interventi per la riduzione dei consumi energetici	ACQUEDOTTO	Parma	450.000	0	0	0	116.420	0	116.420	100	Sopravvenuta necessità di anticipazione dell'intervento
2020PRIA0203	Messa a norma cabine MT a servizio degli impianti di captazione del comune di Parma	ACQUEDOTTO	Parma	50.000	0	0	0	0	0	0	0	

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n. 6 del 15/01/2020				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento %	Note giustificative
2020PRIA0207	Manutenzione straordinaria dei pozzi a servizio dell'acquedotto	ACQUEDOTTO	Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Sala Baganza, Traversetolo		100.000	0	100.000	0	0	0	-100	Interventi realizzati secondo necessità
2020PRIA0210	Adeguamento sistema fognario area urbana canale Galasso	FOGNATURA	Parma		0	0	0	0	0	0	0	
2020PRIA0214	Completamento del risanamento del Canale Naviglio/Canale Maggiore in Via Mentana e area urbana Via Verona	FOGNATURA	Parma	820.000	220.000	0	220.000	502.821	0	502.821	128	Raddoppio dell'attività di collettamento della fognatura (posa di condotte su tutti e due i lati del canale)
2020PRIA0215	Completamento rete fognaria Via Ruffini	FOGNATURA	Parma	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
2020PRIA0216	Razionalizzazione sistema fognario zona Case Vecchie e Ravadese - studio fattibilità	FOGNATURA	Parma	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	
2020PRIA0217	Collegamento rete fognaria Via Emilia Ovest	FOGNATURA	Parma	60.000	60.000	0	60.000	1.349	0	1.349	-97	Iniziata progettazione a fine anno. Consuntivazione nel 2021

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma

Tiziana Benassi

Il segretario verbalizzante

Sara Melone

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 24 gennaio 2022

Il Direttore  
Ing. Vito Belladonna
